


## 応急仮設住宅の供給について

- ・ 3月14日に大臣より、概ね2ヶ月で約3万戸供給、さらに4月5日に、その後の3ヶ月で、3万戸程度の供給が行えるよう、供給の主力となる（社）住宅生産団体連合会に対し要請。

### ① 応急仮設住宅の標準的な平面等



新潟中越地震(2004年)

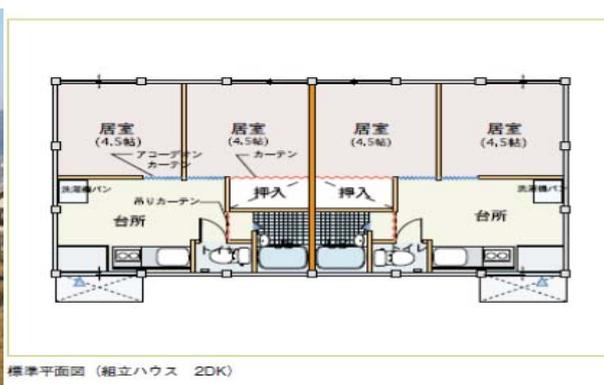

標準平面図 (組立ハウス 2DK)

(9坪：約30㎡、長屋形式、戸境壁は木質パネル 等)

### ② 応急仮設住宅の供給者

- （社）住宅生産団体連合会が中心となって、各社協力して供給。

### ③ 供給

- 岩手県が18,000戸、宮城県が30,000戸、福島県が24,000戸を当面の必要戸数として、栃木県が20戸、千葉県が230戸、長野県が40戸を必要戸数として公表。(合計72,290戸)
- 3月14日に大臣より、（社）住宅生産団体連合会に対し概ね2ヶ月で少なくとも約3万戸を供給できるよう要請。  
また、3月15日に各県の要請にこたえられるように供給の促進を要請。  
さらに、その後の3ヶ月で3万戸程度の供給が行えるよう、4月5日大臣より、供給の主力となる（社）住宅生産団体連合会に要請。  
(注) 1戸当たり30㎡、キッチンユニット、バスユニット、トイレ及び内装材は別途調達して現地で組み合わせることを前提とし、別途、現地での施工に3週間必要。
- 岩手県、宮城県、福島県の3県に対し、建設用地の確保要請及び建設支援のため、3月12日より国土交通省職員4名を派遣するほか、3月17日より11行政庁、都市再生機構からも現時点であわせて45名の職員を順次派遣。
- 岩手県が48地区(3,843戸)、宮城県が49地区(5,370戸)、福島県が40地区(3,159戸)、千葉県が3地区(230戸)、栃木県が1地区(20戸)、長野県が2地区(40戸)で着工。(合計:143地区、12,662戸着工済み、45地区3,581戸着工予定、合計188地区、16,243戸)
- 岩手県が3地区(226戸)、福島県が4地区(229戸)、計7地区(455戸)で完成。
- 住宅関連資材不足に対応するため、3月17日に農林水産省、経済産業省、環境省及び国土交通省(事務局:住宅局)で対策会議を設置し、対応を協議。

平成23年4月14日

福島県災害対策本部

## ○避難住民に係る住宅対策について

避難している住民の住宅対策として、県内において、「応急仮設住宅の供給」「民間住宅の借上げ」「公営住宅空家の提供」の3つの対策を実施して、7月末までに20,000戸の住宅供給を目指すこととしておりますが、今般の国の「計画的避難区域」等の設定方針やその後の住宅被害状況の把握を踏まえ、これまでの戸数に加え、新たに15,000戸の住宅供給を目指すこととしましたので、お知らせします。

新たに追加した仮設住宅等の供給については、当該市町村からの要請や資材調達等の状況を踏まえ、7月末以降のできるだけ早い時期に供給していく予定としております。

なお、これら住宅の入居募集等に関しては、現在、住宅供給の要請のあった市町村において順次実施しておりますが、今後とも市町村において、決定し次第、速やかに公表していくこととしております。

### 住宅供給の目標

種 別	当初の戸数	追加する戸数	計
①応急仮設住宅	14,000戸	10,000戸	24,000戸
②民間住宅の借上げ	5,000戸	5,000戸	10,000戸
③公営住宅空家	1,000戸	—	1,000戸
合 計	20,000戸	15,000戸	35,000戸

【問い合わせ先】 土木部 建築住宅課 建築住宅課長 野内 忠宏  
電話 024-521-7517 (内線) 3663 FAX 024-521-7955

## 応急仮設住宅の発注計画について

- 住宅生産団体連合会は5月6日までに30,000戸以上の生産能力を確保済み。5月中に30,000戸以上を完成させることが可能。
- さらに、7月末までに合計62,290戸を生産でき、8月中に完成させることが可能。県内業者建設分及び輸入住宅分あわせて10,000戸を加えると、現在要請されている72,290戸が完成する予定。
- 一方、岩手・宮城・福島県の三県の発注計画は5月6日までに25,736戸で、なお、5,227戸の生産余力がある。
- また、福島県については、6月半ば以降の発注計画が未定となっており、いつまでに全体を完成させることが可能か不明。

### 住団連の生産能力と県の発注計画の比較

時期	住団連の生産能力 (累計戸数)	各県の発注計画						余力
		(累計戸数)	うち住団連分	岩手県	宮城県	福島県	その他	
4月15日 まで	10,662	10,662	10,662	3,486	4,266	2,655	255	
4月22日 まで	16,652	16,236	16,236	5,761	6,530	3,655	290	416
4月29日 まで	23,837	20,736	20,736	7,761	8,030	4,655	290	3,101
5月6日 まで	30,963	25,736	25,736	9,761	9,530	6,155	290	5,227
5月13日 まで	36,209	31,736	30,536	12,261	11,030	8,155	290	5,673
5月20日 まで	39,709	38,036	35,336	14,761	12,530	10,455	290	4,373
5月27日 まで	42,709	42,081	38,081	15,761	14,030	12,000	290	4,628
6月3日 まで	44,941	45,681	40,381	16,561	15,530	13,300	290	4,560
6月10日 まで	47,141	48,320	42,320	17,300	16,730	14,000	290	4,821
6月17日 まで	49,341	50,220	未確定	18,000	17,930	24,000	290	
6月24日 まで	51,541	51,420		18,000	19,130		290	
7月1日 まで	53,741	52,620		18,000	20,330		290	
7月8日 まで	55,941	53,820		18,000	21,530		290	
7月15日 まで	58,141	55,020		18,000	22,730		290	
7月22日 まで	60,341	56,220		18,000	23,930		290	
7月29日 まで	62,290	57,420		18,000	25,130		290	
7月30日 以降		72,290		18,000	30,000		290	

※岩手県の発注計画のうち、2,000戸の発注先は地元業者等

※福島県の当初計画14,000戸のうち、4,000戸の発注先は地元業者。追加された1万戸分については、発注時期・発注先等を検討中であるため、7月30日以降時点の累計戸数に計上。

※住団連の生産能力については、72,290戸のうち約1万戸が地元業者等によるものと仮定して計上。
