

## 平成20年岩手・宮城内陸地震 河道閉塞(天然ダム)箇所における 直轄砂防災害関連緊急工事に関する状況報告(第24報)

河道閉塞(天然ダム)について、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のため工事を実施中です。

### 磐井川 市野々原地区

- ・明日(26日)は、仮排水路監視・点検予定

### 磐井川 産女川地区

- ・本日は、降雨の影響により作業中止  
(水位の影響を受けない作業を除く)
- ・明日(26日)は、除石掘削・運搬作業継続

### 迫川 浅布地区

- ・明日(26日)は、仮排水路監視・点検継続

### 迫川 小川原地区

- ・明日(26日)は、仮排水路監視・点検継続

### 迫川 温湯地区

- ・本日は、降雨の影響により作業中止
- ・明日(26日)は、除石・集積工継続

### 迫川 湯ノ倉温泉地区

- ・ポンプ16台で排水を継続(降雨の影響により作業中止)
- ・明日(26日)は、ポンプ排水を継続、工事用道路路盤整備を継続

### 迫川 湯浜地区

- ・本日は、降雨の影響により作業中止
- ・明日(26日)は、河道閉塞目視監視及び進入路現地調査予定

### 三迫川 沼倉地区

- ・本日は、降雨の影響により作業中止  
(水位の影響を受けない作業を除く)
- ・明日(26日)は、河道掘削開始、転石破碎・流木処理等継続

対策の実施状況については、状況の変化に応じて公表して参ります。  
なお、東北地方整備局の取り組みについては適宜  
<http://www.thr.mlit.go.jp/>に公表しておりますのでご参照下さい

	岩手県		宮城県					
	いしのはら 【市野々原地区】(磐井川)	うぶすめがわ 【産女川地区】(磐井川)	あさぎ 【浅布地区】(迫川)	おがわら 【小川原地区】(迫川)	ぬるゆ 【温湯地区】(迫川)	ゆのくらあんせん 【湯ノ倉温泉地区】(迫川)	ゆばま 【湯浜地区】(迫川)	ぬまくら 【沼倉地区】(三迫川)
	平成20年6月14日8時43分地震発生		平成20年6月14日8時43分地震発生					
6月14日(土) 6月15日(日)	現地調査(ヘリなどによる被災状況調査)		現地調査(ヘリなどによる被災状況調査)					
6月16日(月) (3日目)	事業採択(16日)	岩手・宮城両県知事からの強い要望を受け、国土交通省が事業区域外ではあるが、直轄砂防災害関連緊急事業に着手。	事業採択(16日)	事業採択(16日)				
6月17日(火) (4日目)	工事着手(17日)		工事着手(17日)	工事着手(17日)				
6月18日(水) (5日目)	(18日より24時間工事開始)		通行止めなどにより、水路掘削用の重機搬入が遅					
6月19日(木) (6日目)	排水ポンプ稼働開始(19日)		水路掘削 排水ポンプ設置	(19日より24時間工事開始)	(19日より24時間工事開始)			
6月20日(金) (7日目)								
6月21日(土) (8日目)	仮排水路通水(21日12:30)	事業採択(21日)	既設用水路を利用した排水開始(22日9:00)	水路掘削(硬岩掘削のため難航)	水路掘削(硬岩掘削のため難航)			事業採択(21日)
6月22日(日) (8日目)	仮水路拡幅掘削のため停止	現地調査						現地調査
6月23日(月) (9日目)								
6月24日(火) (10日目)								
6月25日(水) (11日目)		工事着手(25日)	仮排水路通水(25日12:20)	水路掘削(硬岩掘削のため難航)				
6月26日(木) (12日目)	(26日をもって24時間工事終了)			仮排水路進捗率100%				
6月27日(金) (13日目)			(27日をもって24時間工事終了)	排水路ポンプ通水(26日15:00)				
6月28日(土) (14日目)				仮排水路通水(27日19:30)	工事着手(27日)			
6月29日(日) (15日目)								
6月30日(月) (16日目)								
7月1日(火) (17日目)								
7月2日(水) (18日目)								
7月3日(木) (19日目)								
7月4日(金) (20日目)								
7月5日(土) (21日目)	仮排水路断面拡大作業終了通水開始(5日13:00)							
7月6日(日) (22日目)								
7月7日(月) (23日目)								
7月8日(火) (24日目)								
7月9日(水) (25日目)								
7月10日(木) (26日目)								
7月11日(金) (27日目)								
7月12日(土) (28日目)								
7月13日(日) (29日目)								
7月14日(月) (30日目)								
7月15日(火) (31日目)								
7月16日(水) (32日目)								
7月17日(木) (33日目)								
7月18日(金) (34日目)								
7月25日(金) (41日目)		25日現在 ・降雨の影響により作業中止 ・水位の影響を受けたい作業を除く	21日 仮排水路被災箇所復旧完了	21日 仮排水路被災箇所復旧完了	25日現在 ・降雨のため作業中止	25日現在 ・ポンプ16台による排水を継続 ・降雨のため作業中止	25日現在 ・降雨のため作業中止	25日現在 ・降雨のため一部作業中止 ・水位の影響を受けたい作業を除く
【明日(7月26日)の工事予定】	仮排水路監視・点検継続	産女川地区 ・落石点検、対策(防護柵)完了 【瑞山砂防えん堤】 ・水替工事準備継続 【機森砂防えん堤】 ・現地調査 【竜ノ口砂防えん堤】 ・水替工事準備継続 ・除石掘削、運搬作業継続	仮排水路監視・点検継続	仮排水路監視・点検継続	除石・集積工継続	ポンプ排水継続 工事用道路路盤造成継続 河床現況測量継続 河床倒木処理	天然ダム目視監視 進入路現地調査 水位観測	【沼倉地区】 ・仮設道路整備(倒木処理) ・河道掘削開始 【沼倉裏沢】 ・転石破砕継続 ・工事用道路(河道部)修正継続 ・流木処理継続

## 浅布地区、湯ノ倉温泉地区 河道閉塞(天然ダム)の対応

浅布地区では7月12日降雨の被災箇所の復旧が完了し、7月21日から通水を再開

浅布地区では、7月12日の降雨により一部損壊した仮排水路の補修が完了し、7月22日11時50分より排水を再開



### 補修完了状況




【仮排水路補修状況】



## 浅布地区、湯ノ倉温泉地区 河道閉塞(天然ダム)の対応

湯ノ倉温泉地区では、7月21日に工事用道路が完成し、重機による掘削準備を開始

湯ノ倉温泉地区では6月28日より実施してきた工事用道路の基盤整正(2.8km)が完了し、重機による掘削準備を開始

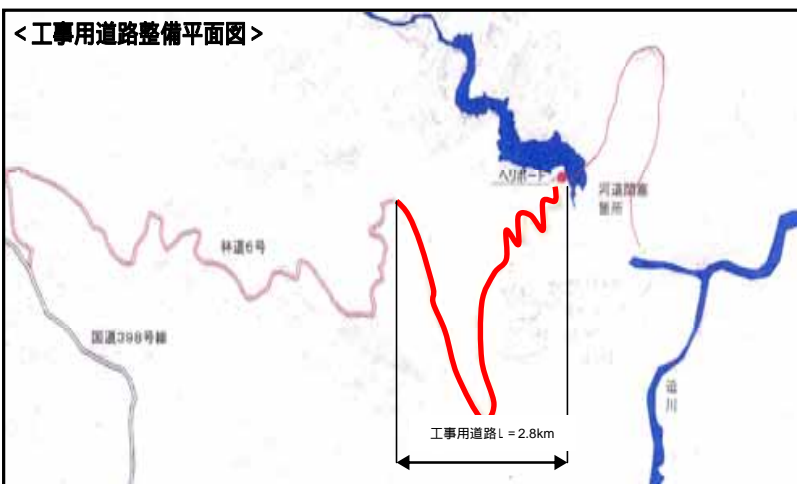

### 重機による掘削準備工



<工事用道路造成の間、排水ポンプ16台(約1.4m<sup>3</sup>/s)により水位を低下>



【排水ポンプ設置状況】



【排水ポンプ稼働状況】



【工事用道路造成状況】
