


# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

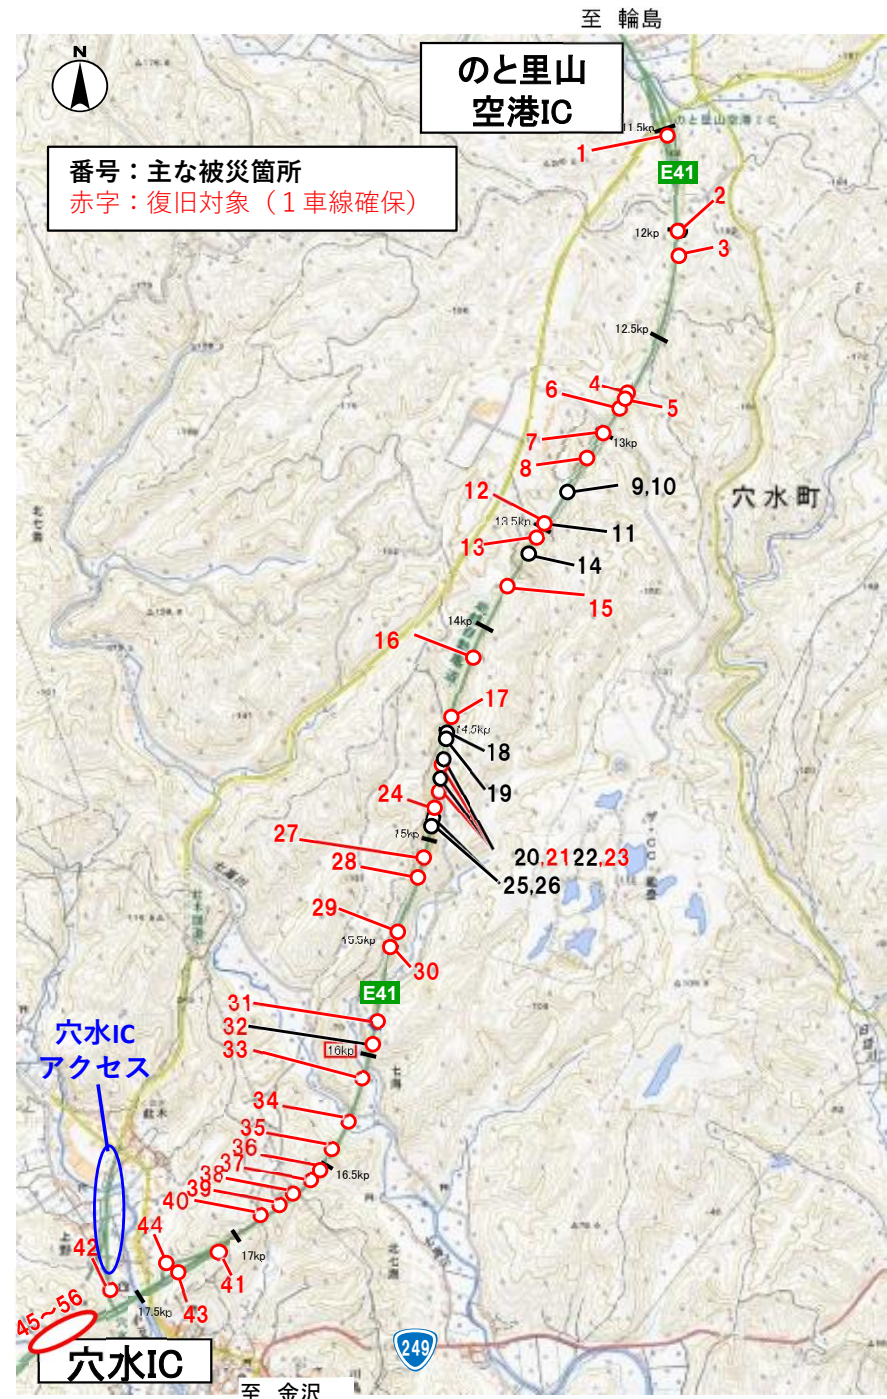

緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(39箇所完/46箇所)

穴水ICアクセス路 段差復旧状況




R6.1.21撮影



R6.1.21撮影

緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(36箇所完/46箇所)

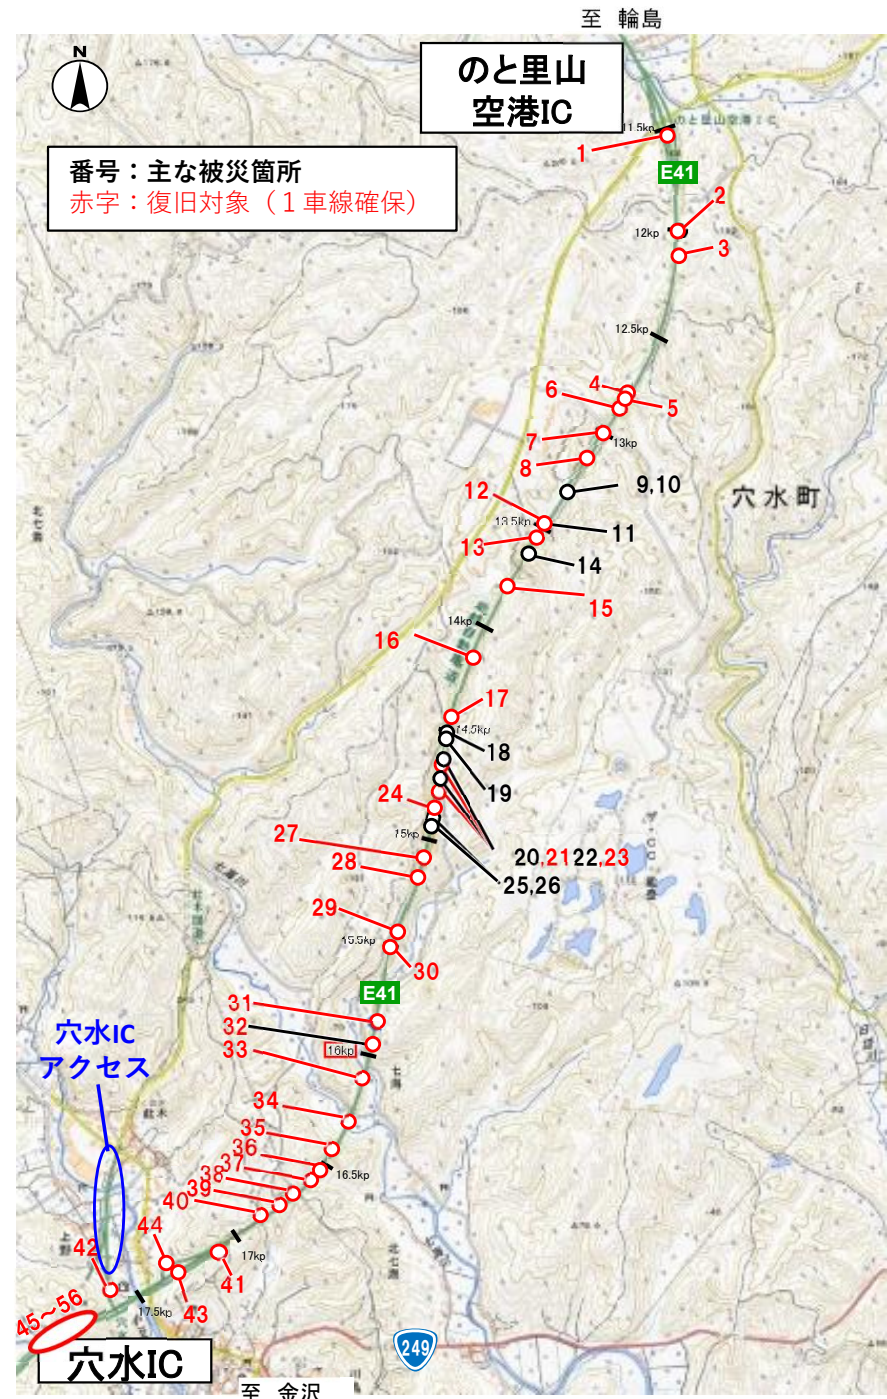

### 穴水ICアクセス路 段差復旧状況



R6.1.20撮影



緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(22箇所完 / 46箇所)

### No.6 段差復旧状況




R6.1.19撮影

### No.16 迂回路造成



R6.1.19撮影

緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(20箇所完/46箇所)

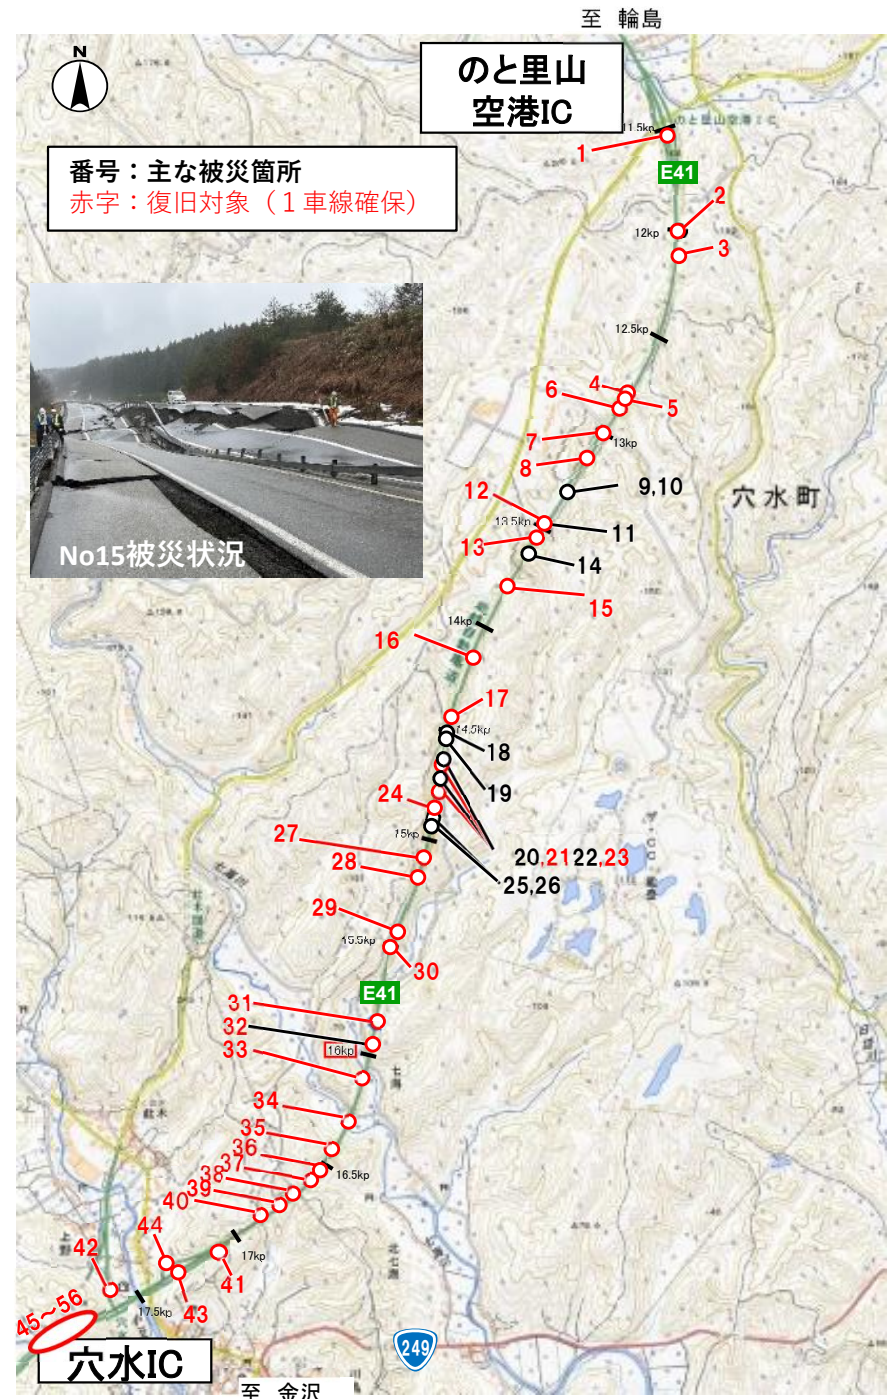

### No.6 段差復旧状況




R6.1.18撮影

### No.15 法面切土



工事名 能越道啓開工事  
 工種 測点 13.7付近  
 R6.1.18  
 施工状況  
**R6.1.18撮影**  
 9:06  
 清水建設株式会社 令和6年1月18日

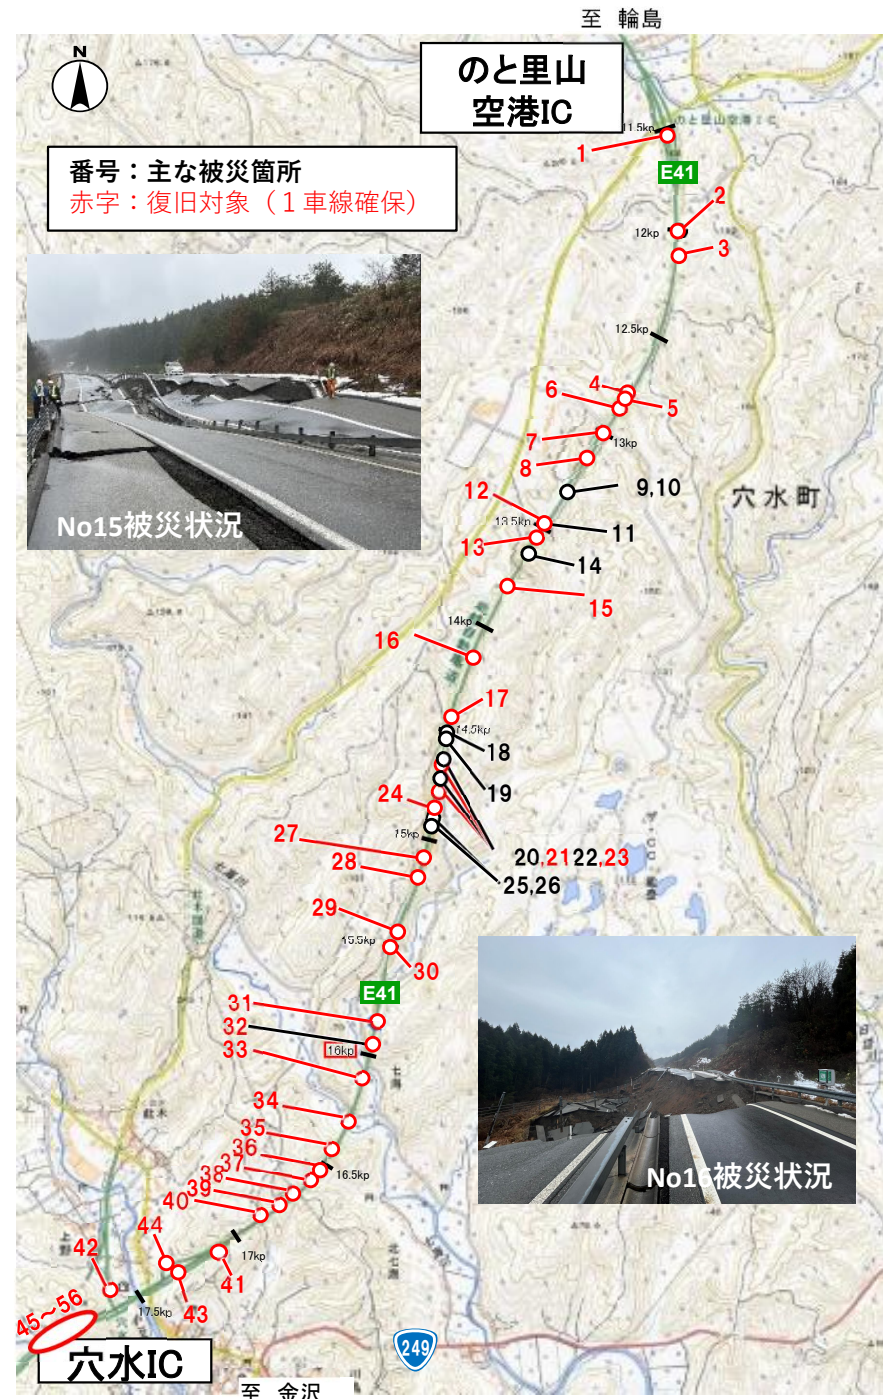

緊急復旧作業中（1車線確保）  
（13箇所完／46箇所）

No.6 段差復旧状況



No.15 砕石埋戻し状況



No.16 法面切土状況



No.51 段差擦り付け





緊急復旧作業中（1車線確保）  
（13箇所完／46箇所）

No.6 路面亀裂、段差復旧状況




No.16 法面切土



No.51 段差擦り付け



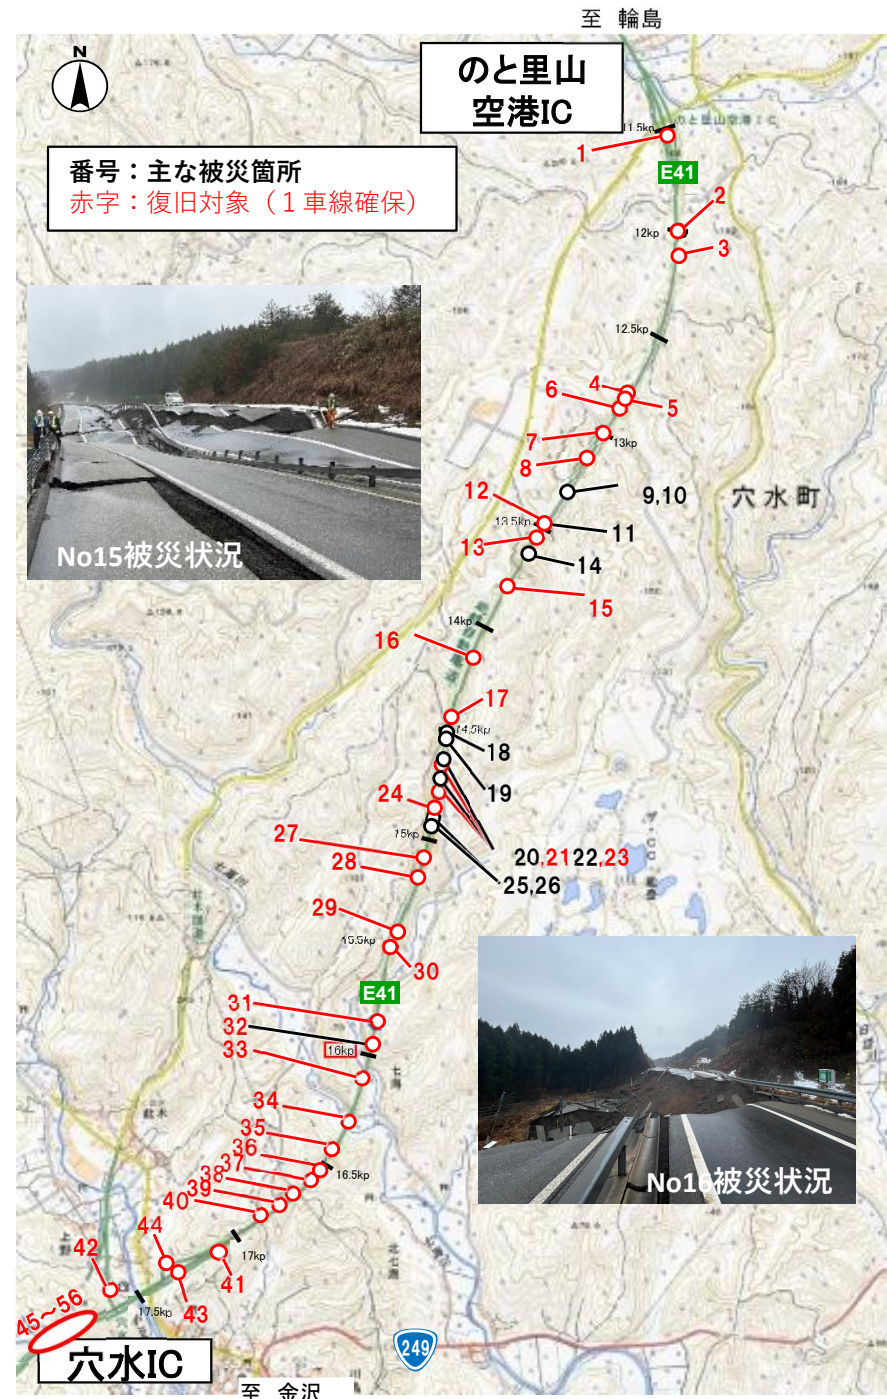

緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(13箇所完 / 46箇所)

No.6段差復旧状況



No.15碎石埋戻し状況




No.16 法面切土



No.56 段差擦り付け



緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(13箇所完 / 46箇所)

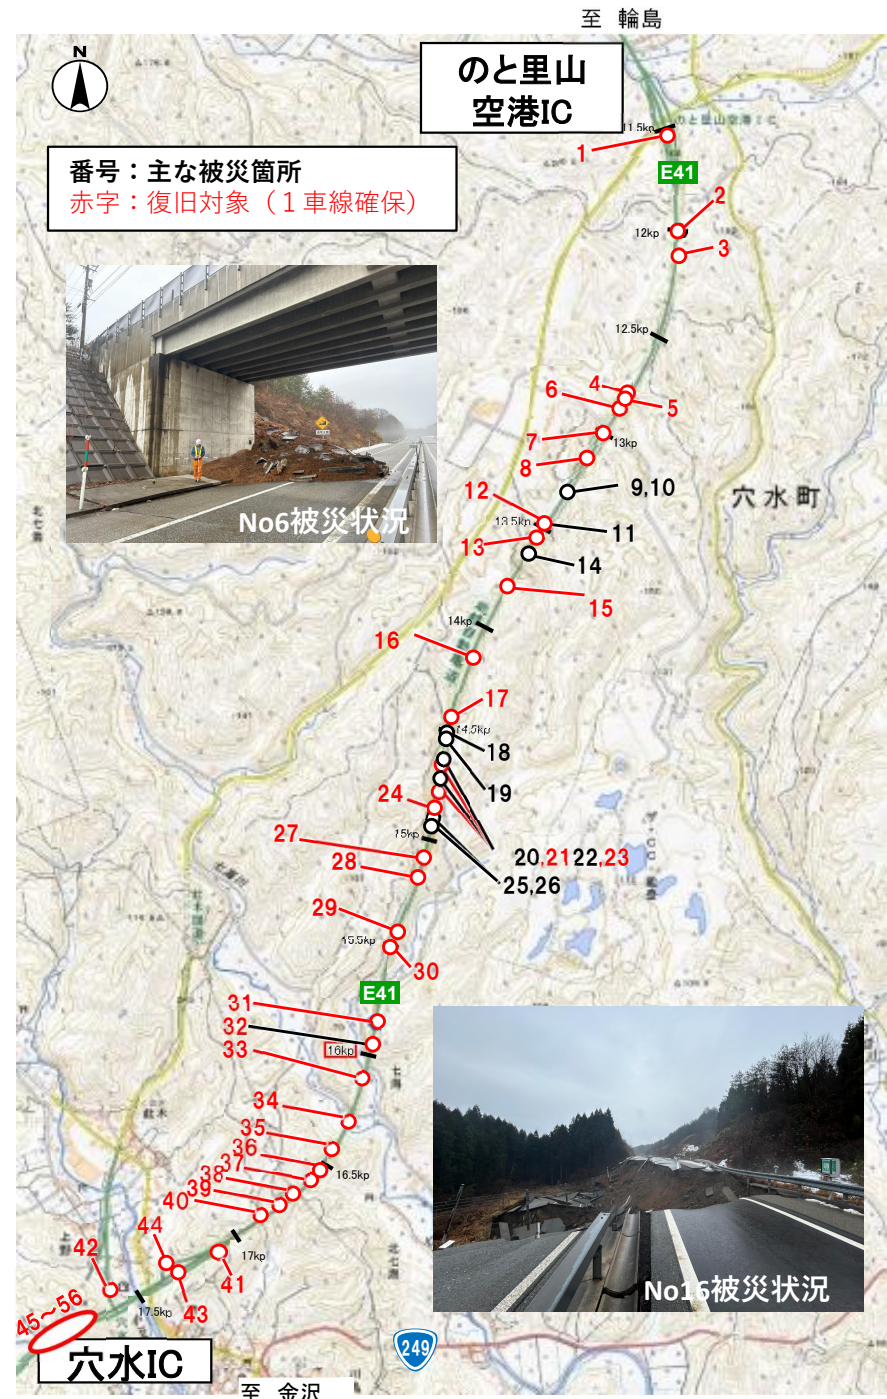

### No.6 土嚢設置



### No.16 切土状況





緊急復旧作業中 (1車線確保)

### No.6 土嚢設置




### No.16 切土状況



### No.36 ガードレール撤去



緊急復旧作業中 (1車線確保)

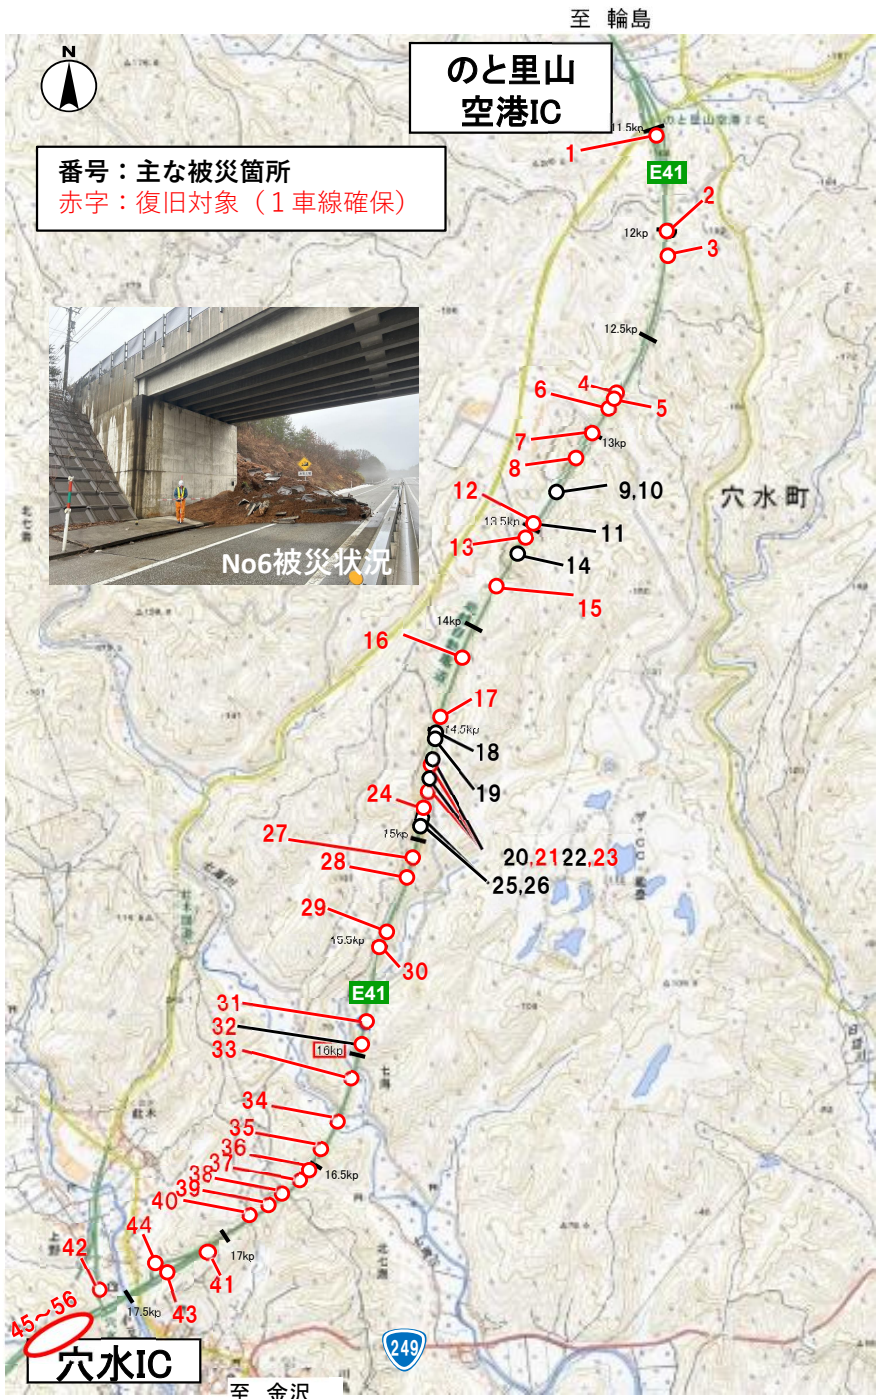

### No.6 掘削・土嚢設置状況



緊急復旧作業中 (1車線確保)




### No.15 碎石充填状況



### No.16 碎石充填状況



緊急復旧作業中 (1車線確保)

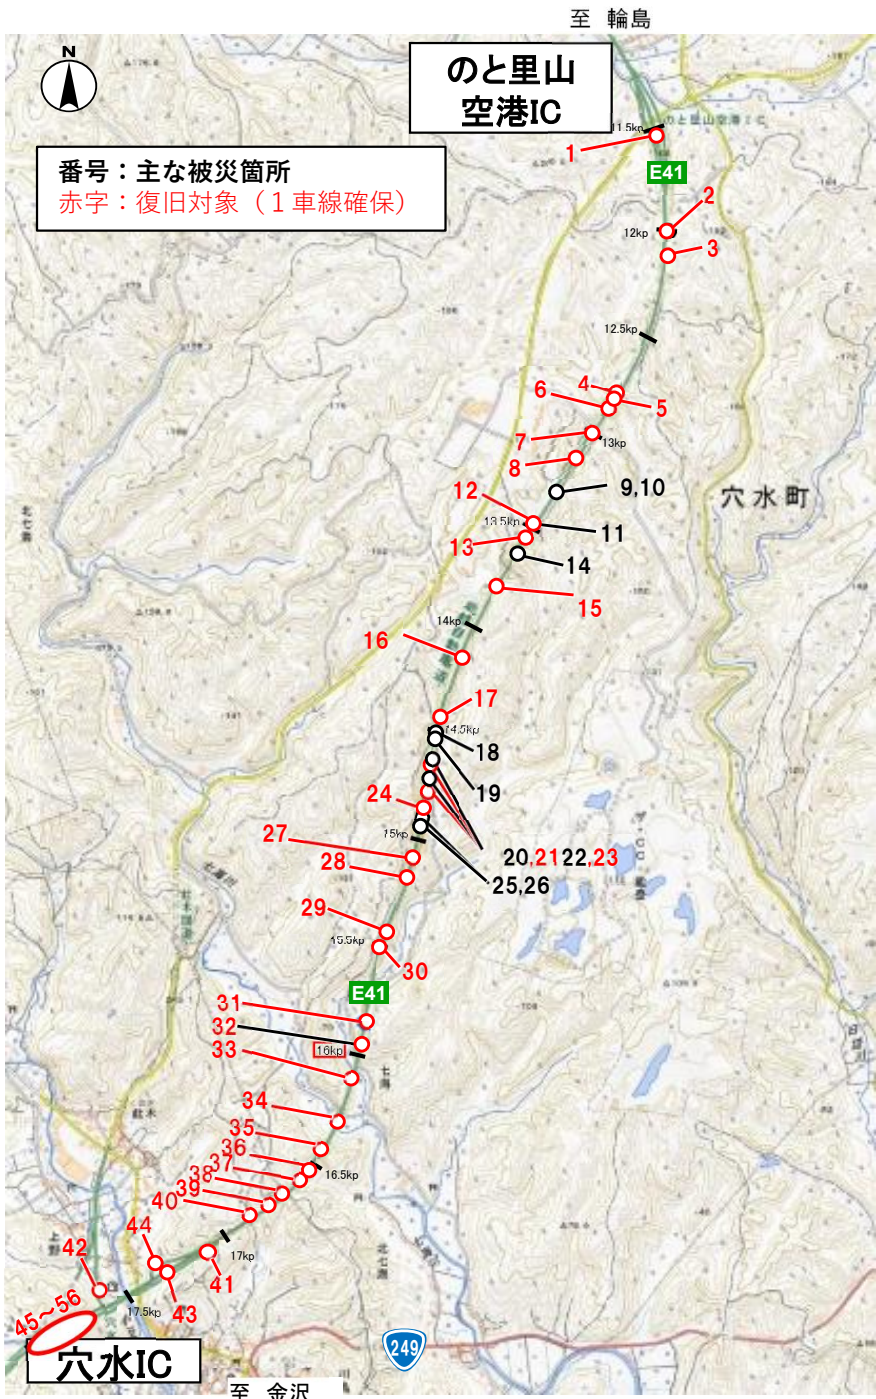

### No.35～42 碎石充填

