


令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月31日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

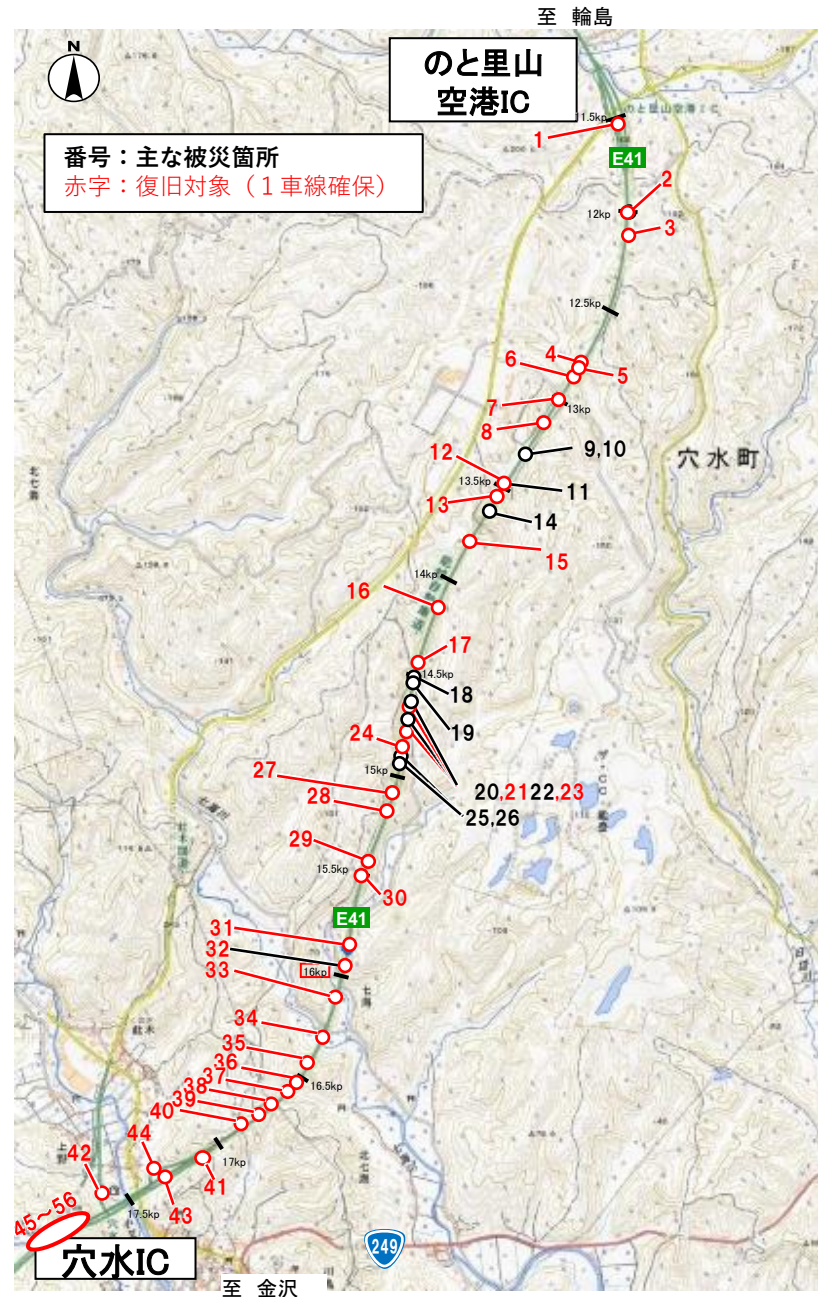

緊急復旧作業中 (1車線確保)
46箇所完了 (舗装以外) / 46箇所
※引き続き舗装施工中


No32 舗装状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月30日現在


のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

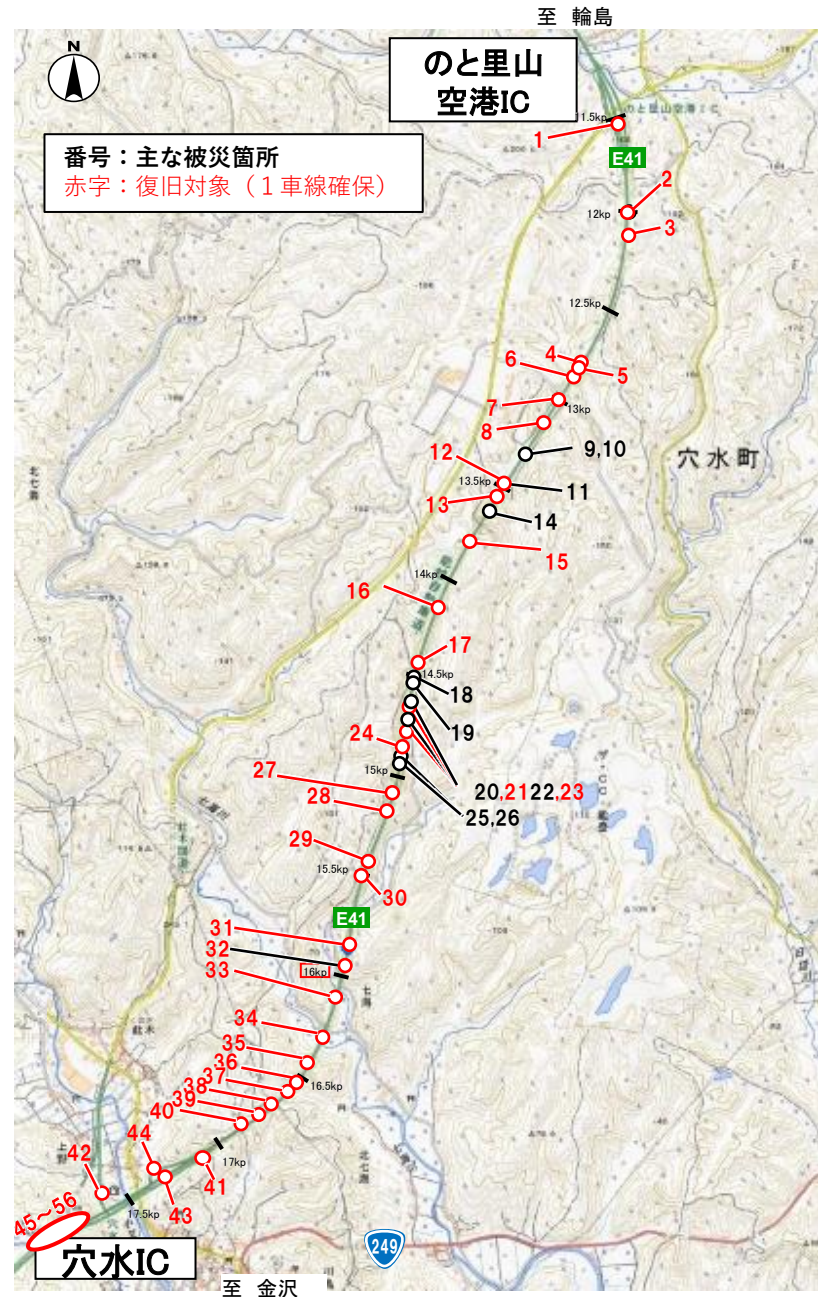

緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所舗装以外完了／46箇所）
※引き続き舗装施工中

No32 舗装状況



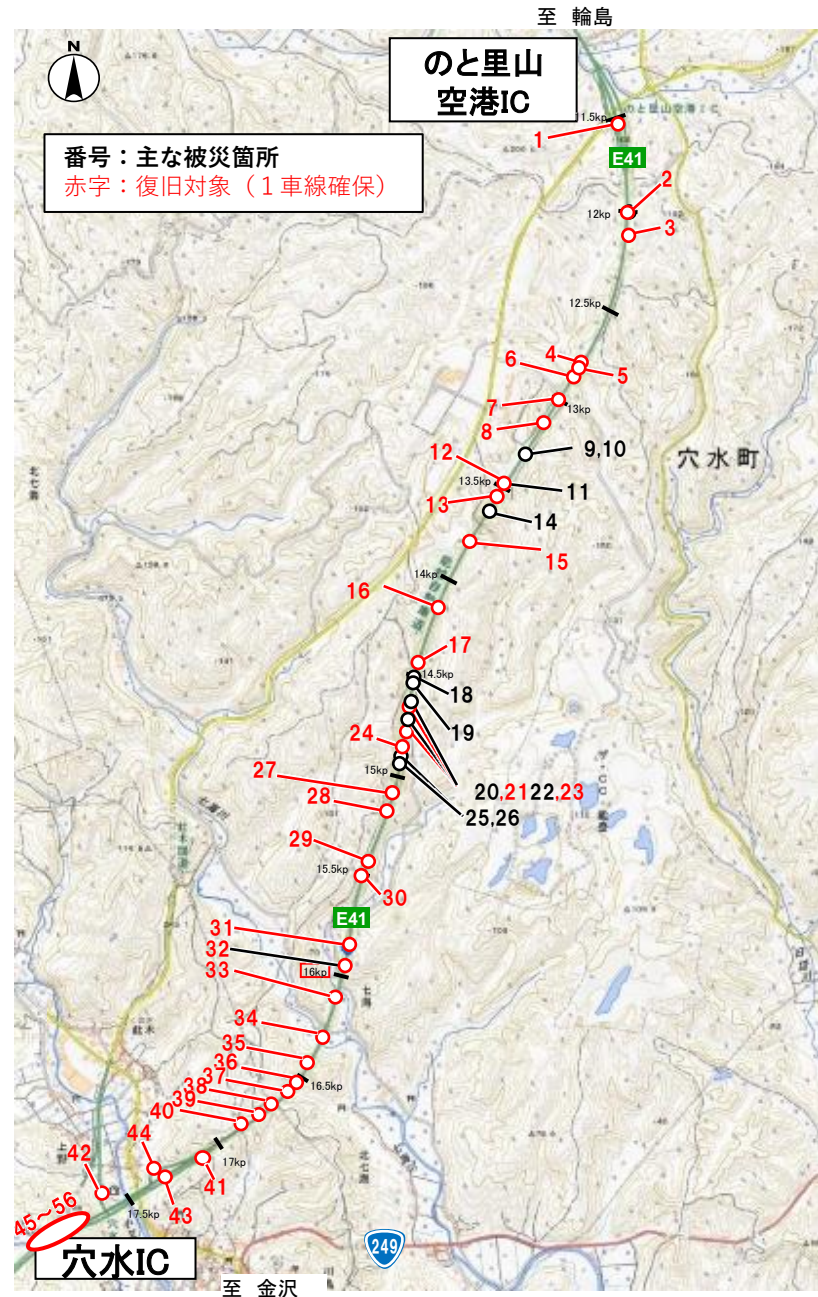

緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所舗装以外完了／46箇所）
※引き続き舗装施工中


No41～42 舗装状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月28日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

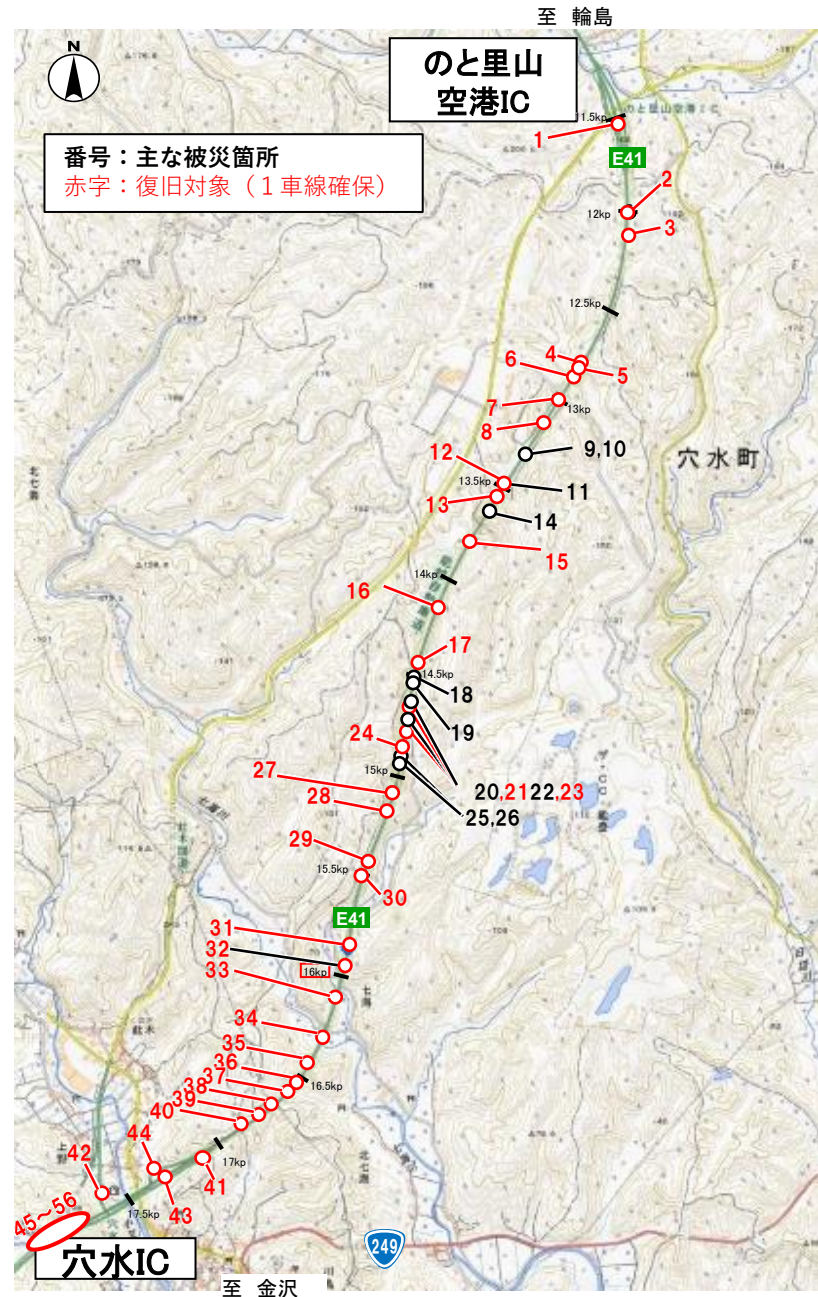

緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所 舗装以外完了 / 46箇所）
※引き続き舗装施工中


No17～29 舗装状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月27日現在


のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

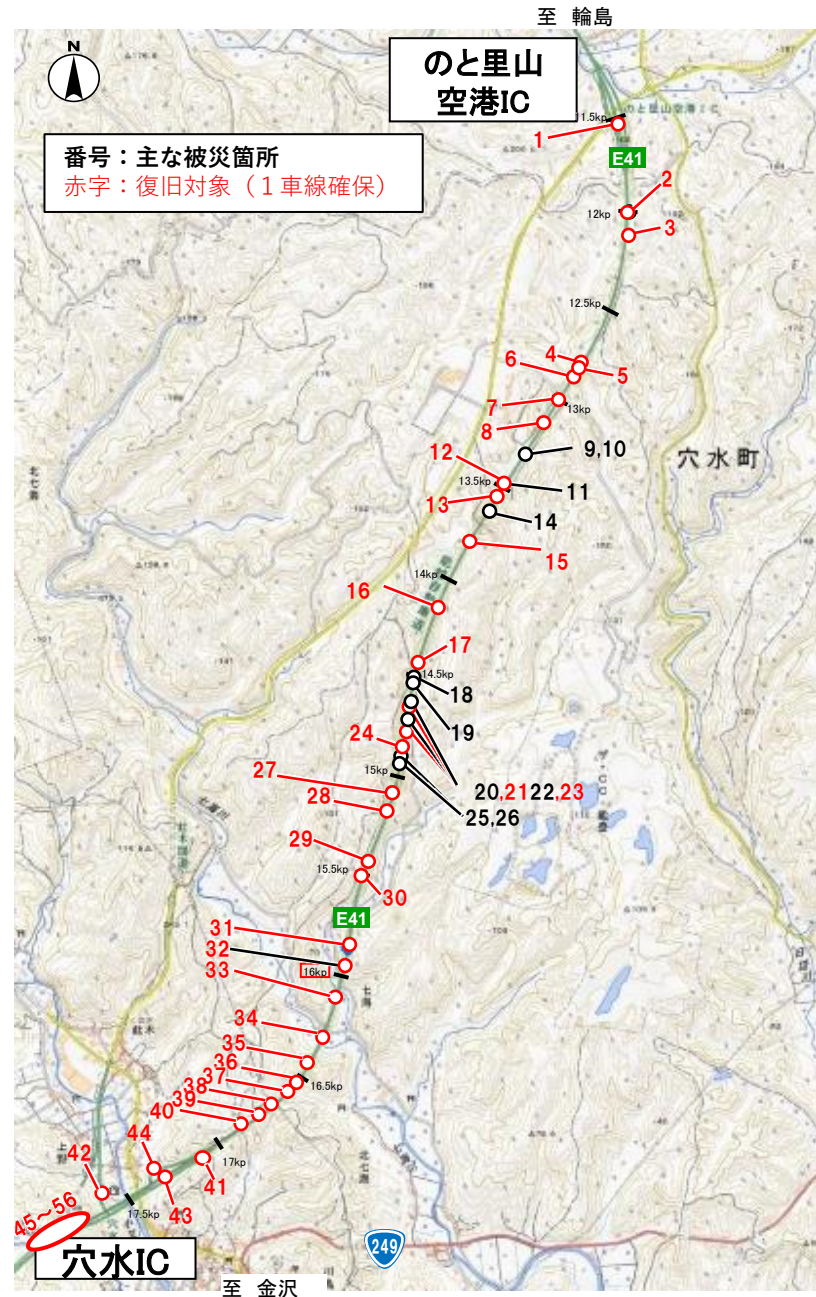

緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所 舗装以外完了 / 46箇所）
※引き続き舗装施工中

No17～29 舗装・段差復旧状況




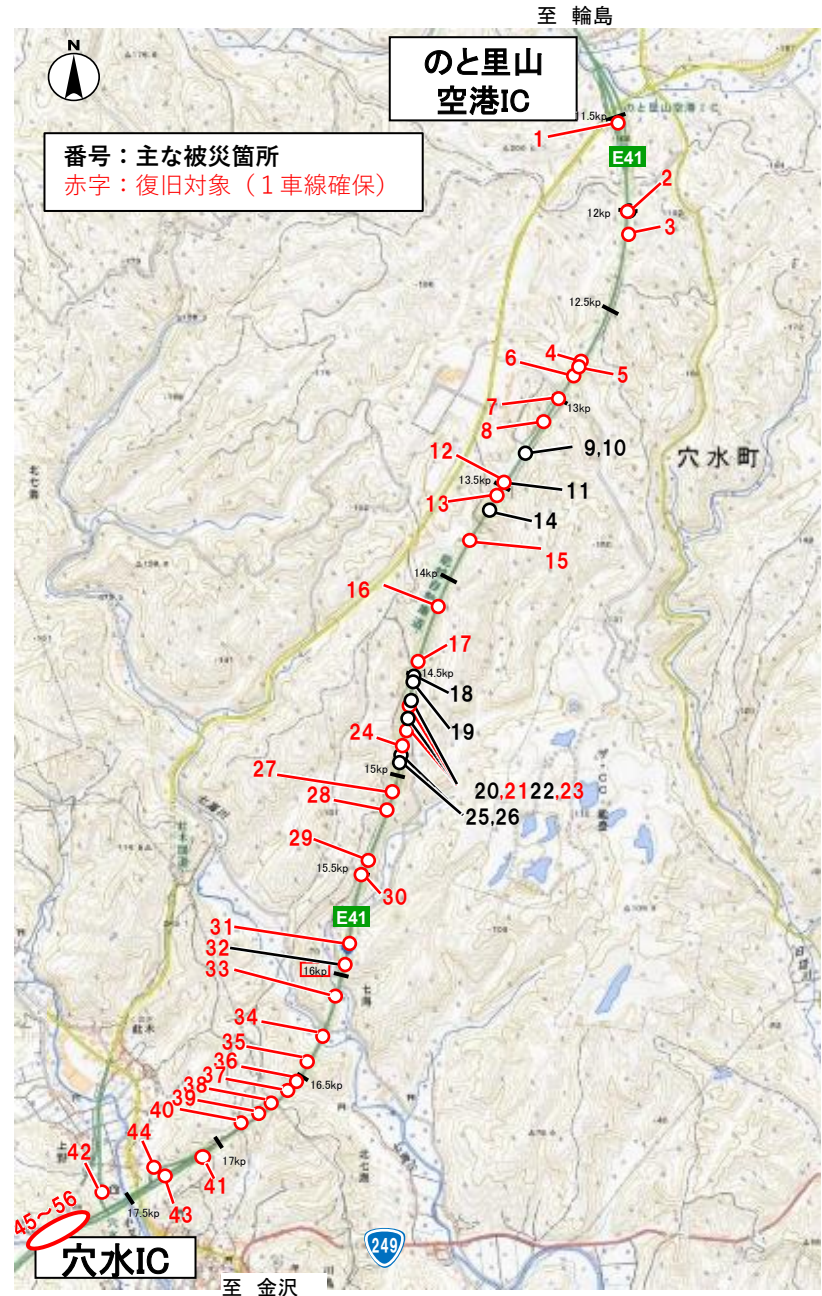

緊急復旧作業中 (1車線確保)
(46箇所 舗装以外完了 / 46箇所)
※引き続き舗装施工中


No15 舗装・段差復旧状況




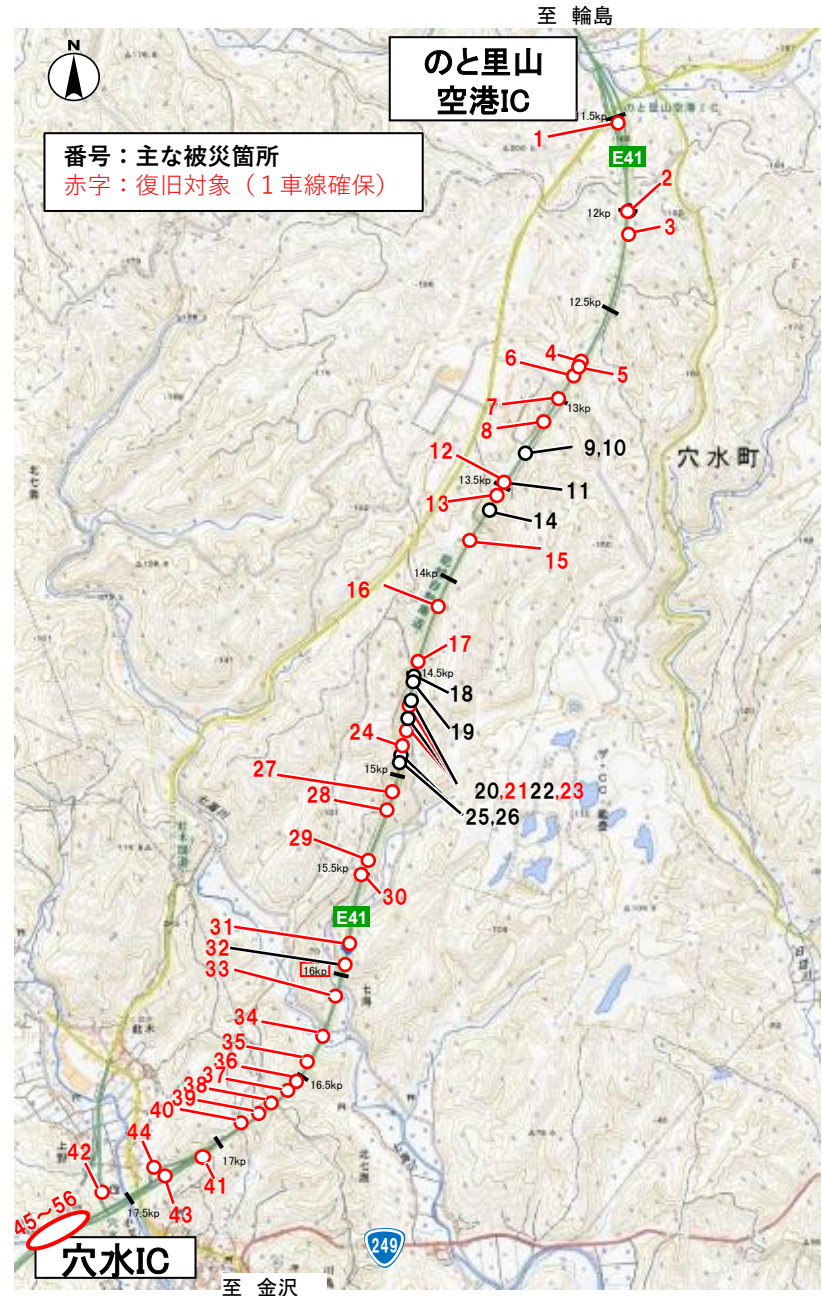

緊急復旧作業中 (1車線確保)
(46箇所 舗装以外完了 / 46箇所)
※引き続き舗装施工中

復旧箇所の除雪状況

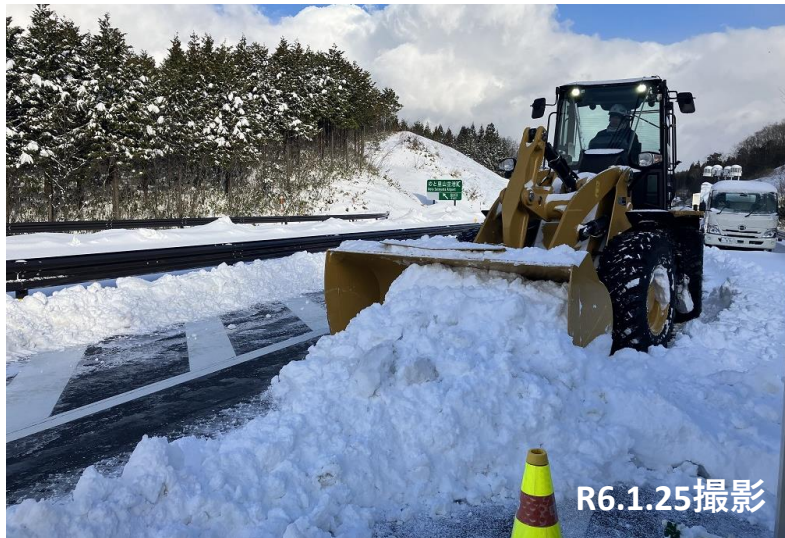

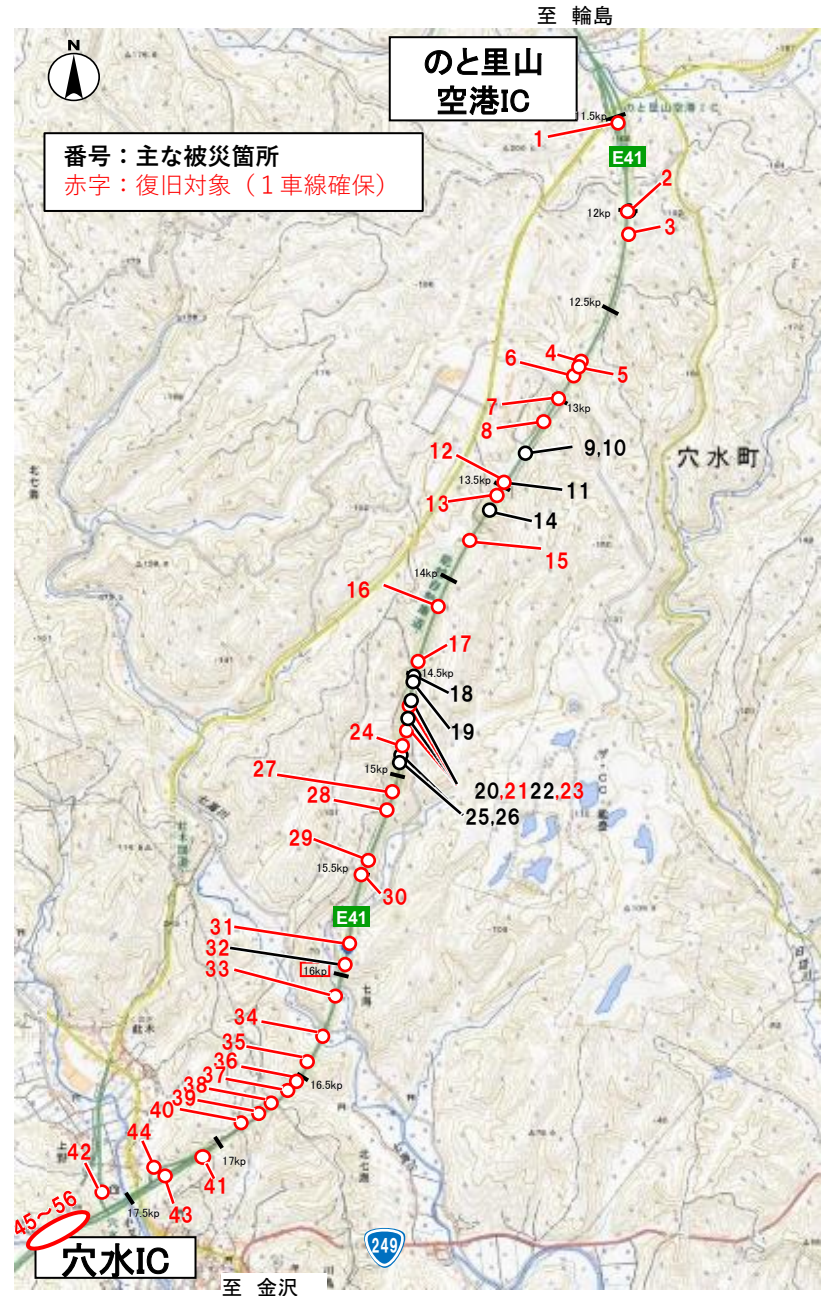

緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所 舗装以外完了 / 46箇所）
※引き続き舗装施工中


No41～42 舗装・段差復旧状況



R6.1.23撮影




R6.1.23撮影

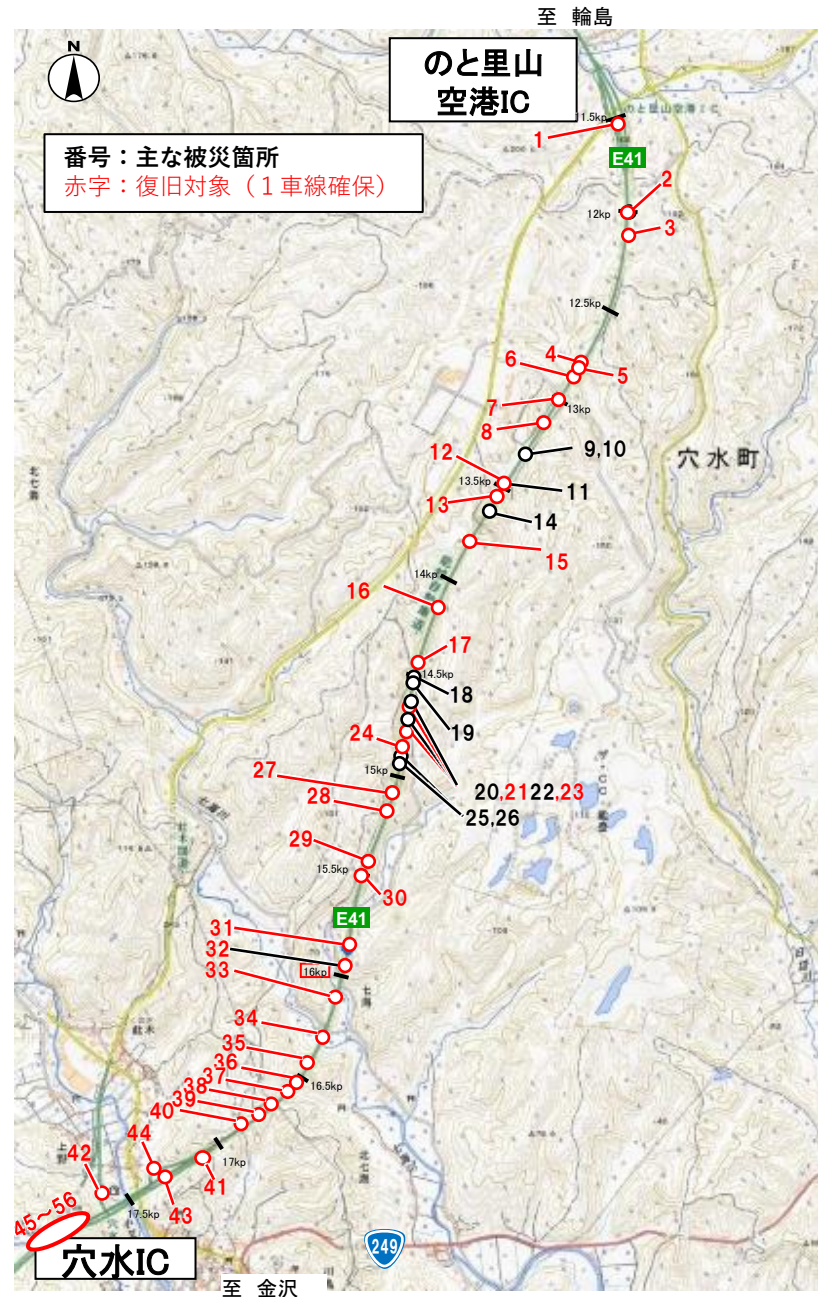

緊急復旧作業中 (1車線確保)
(39箇所完/46箇所)

No41～42 段差復旧状況



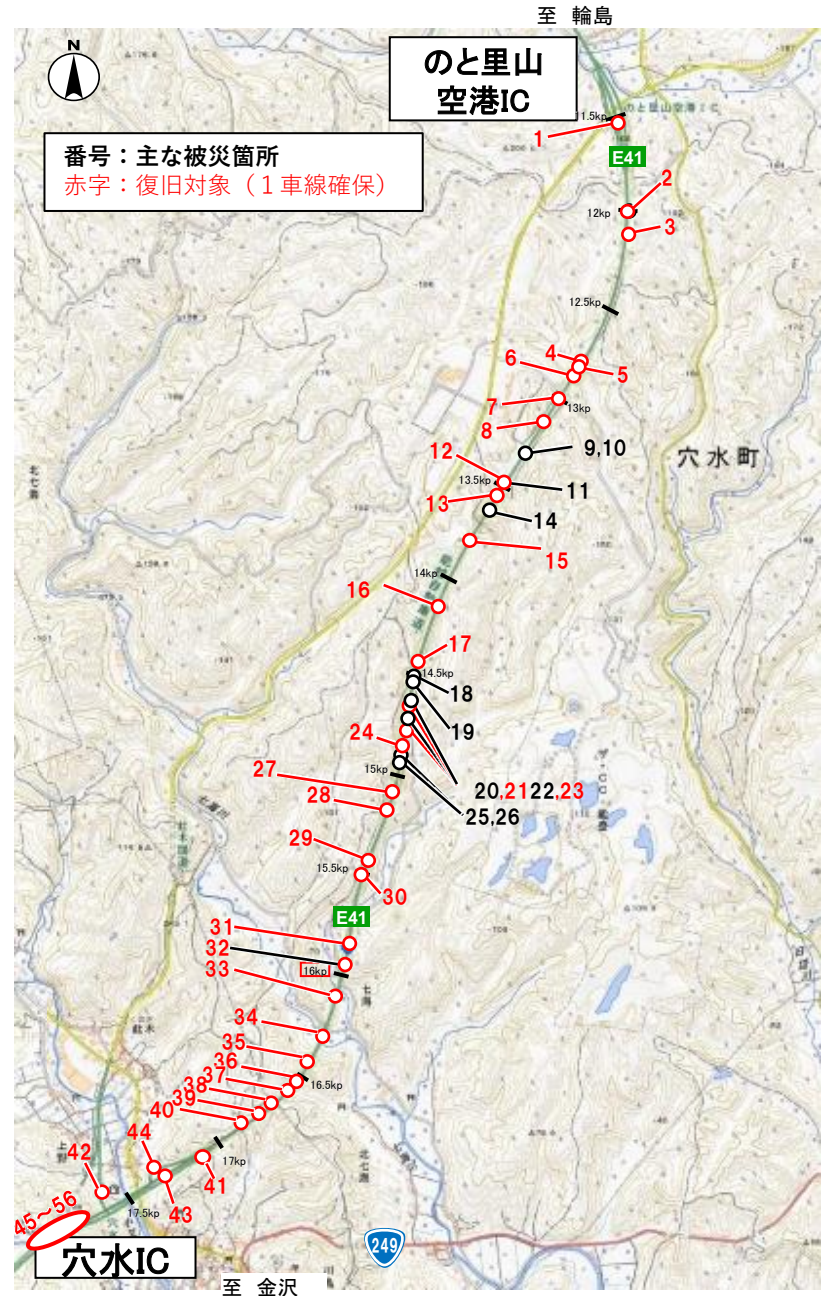

緊急復旧作業中 (1車線確保)
(39箇所完/46箇所)

No41～42 段差復旧状況




R6.1.21撮影




R6.1.21撮影

緊急復旧作業中 (1車線確保)
(36箇所完/46箇所)

No41～42 段差復旧状況

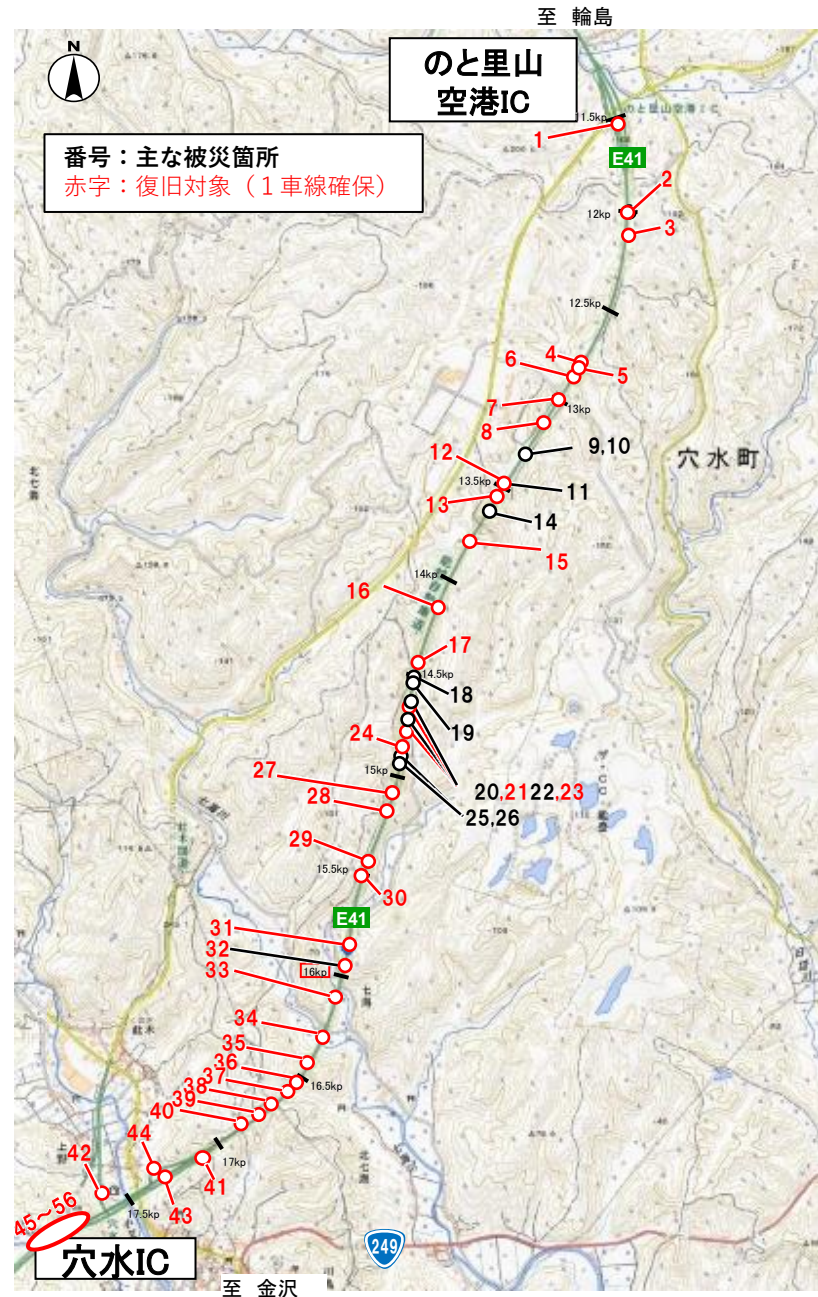

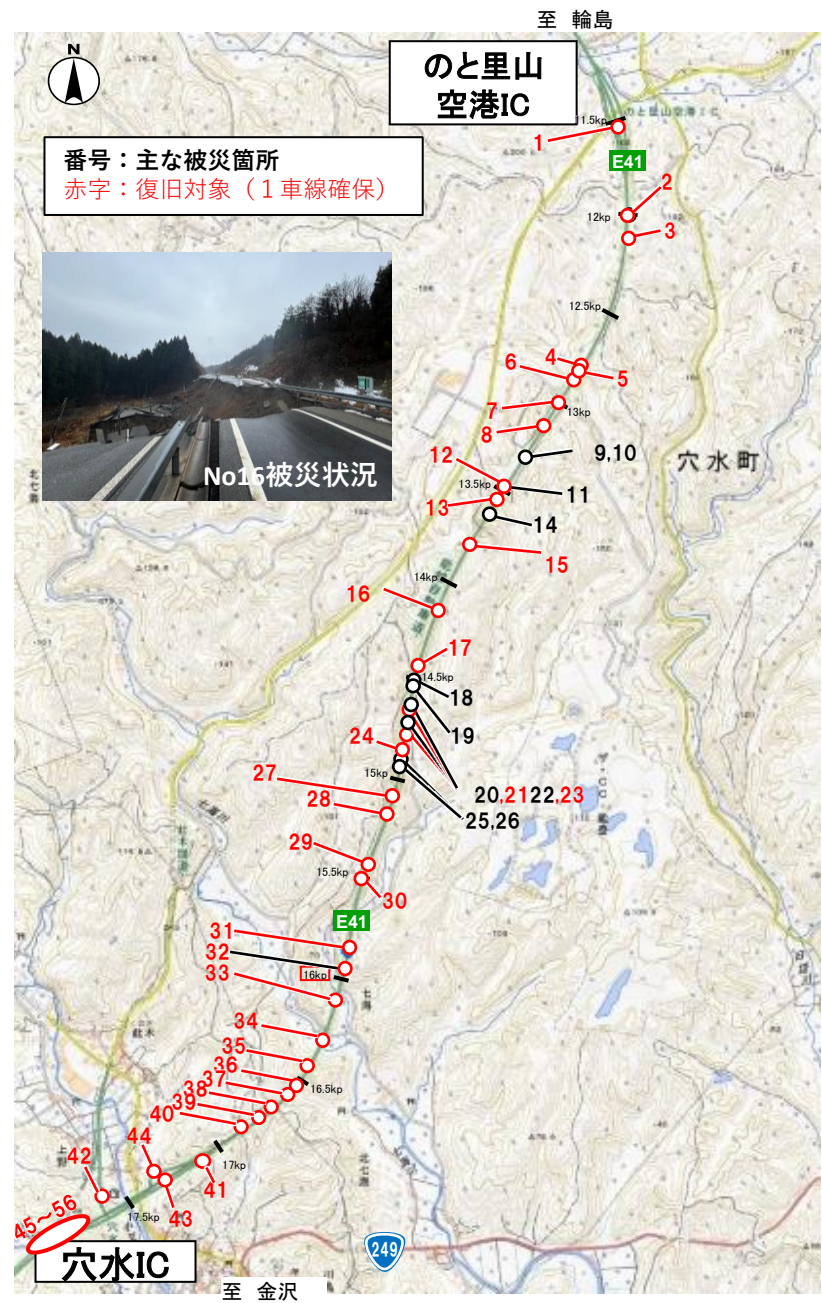

緊急復旧作業中 (1車線確保)
(22箇所完/46箇所)

No.6 段差復旧状況




R6.1.19撮影

No.16 迂回路造成



R6.1.19撮影

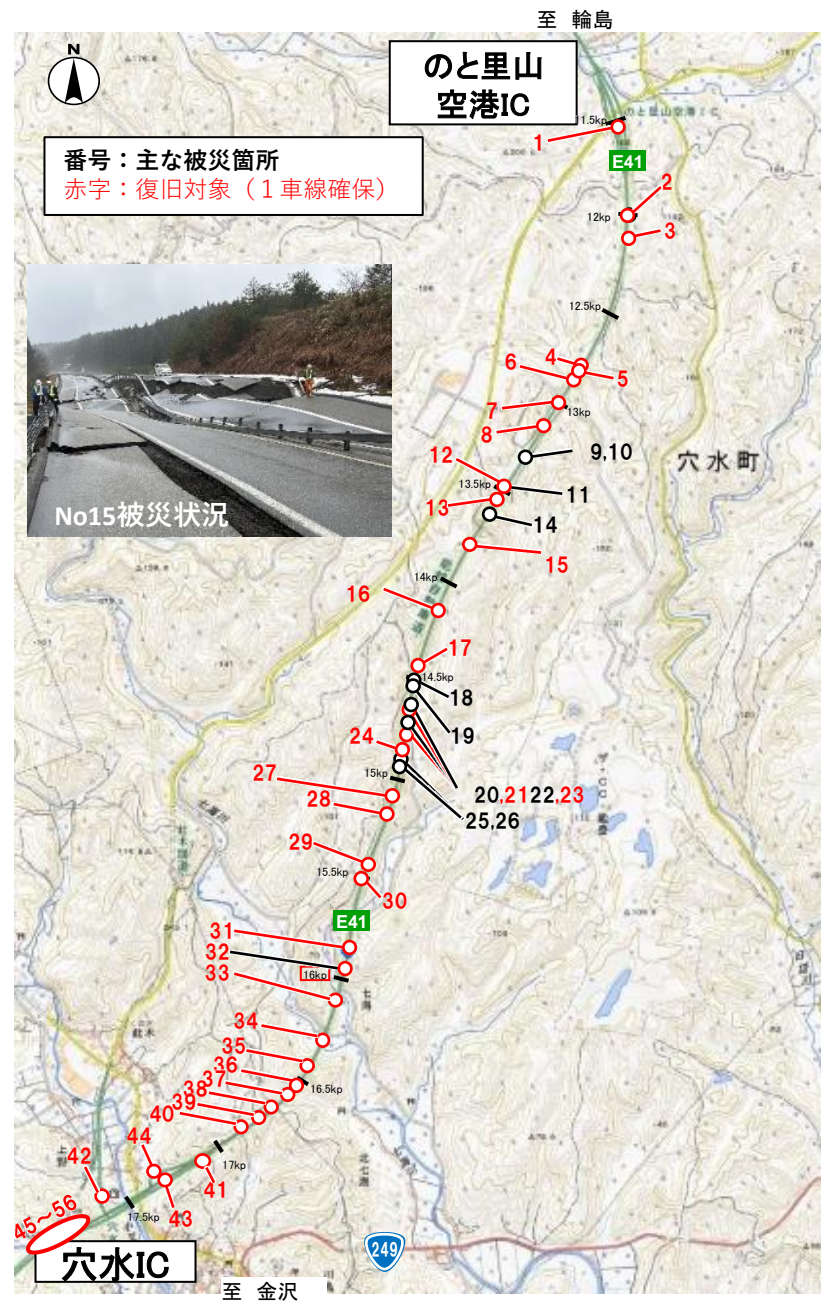

緊急復旧作業中 (1車線確保)
(20箇所完 / 46箇所)

No.6 段差復旧状況



R6.1.18撮影


No.15 法面切土



工事名 能越道啓開工事
工種 測点13.7付近
R6.1.18
施工状況

R6.1.18撮影

清水建設株式会社 令和6年1月18日

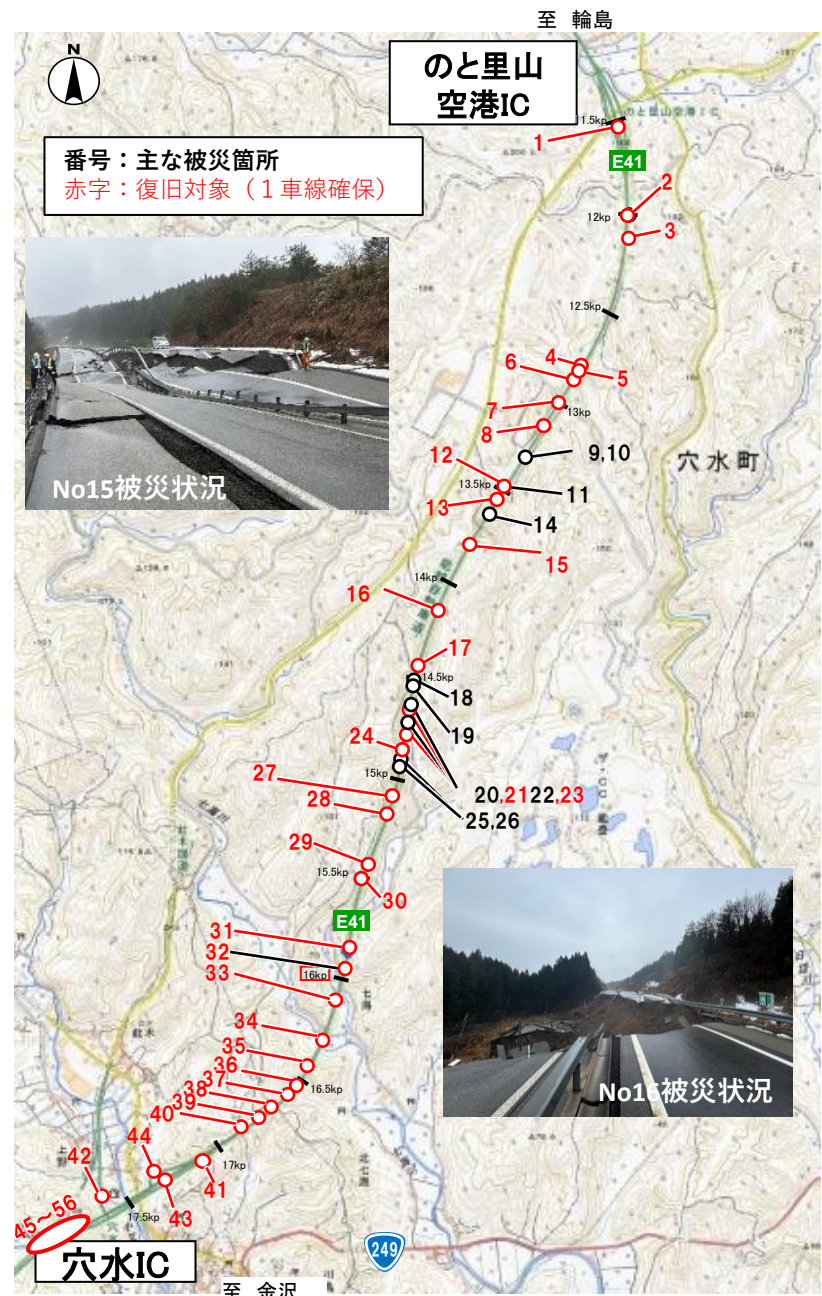

緊急復旧作業中 (1車線確保)
(13箇所完/46箇所)

No.6 段差復旧状況



No.15 碎石埋戻し状況



No.16 法面切土状況



No.51 段差擦り付け





緊急復旧作業中 (1車線確保)
(13箇所完/46箇所)

No.6 路面亀裂、段差復旧状況



R6.1.16撮影

No.16 法面切土




工事名 能越道啓開工事
工種 測点14.1付近
R6.1.16
碎石敷均し状況
R6.1.16撮影

No.51 段差擦り付け



R6.1.16撮影

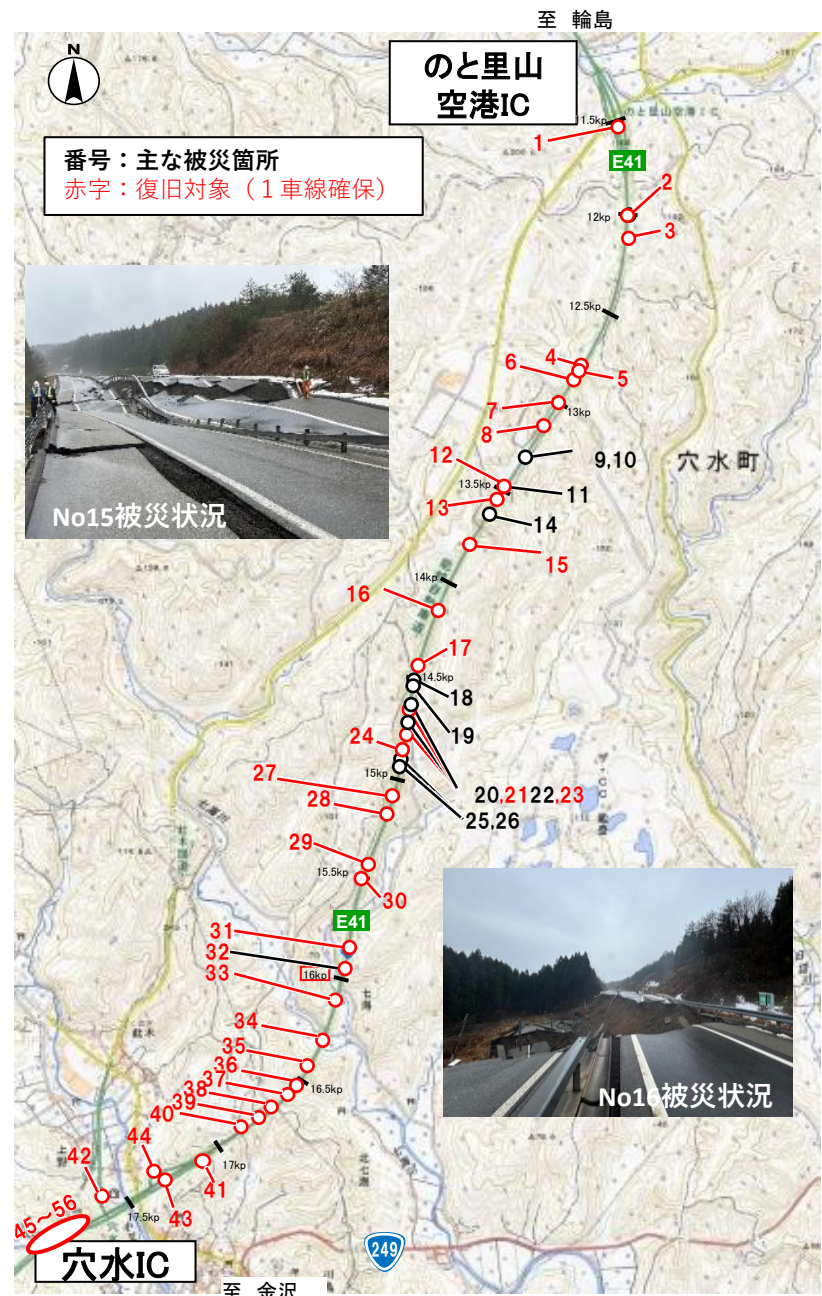

**緊急復旧作業中 (1車線確保)
(13箇所完/46箇所)**

No.6段差復旧状況



No.15碎石埋戻し状況




No.16 法面切土



No.56 段差擦り付け



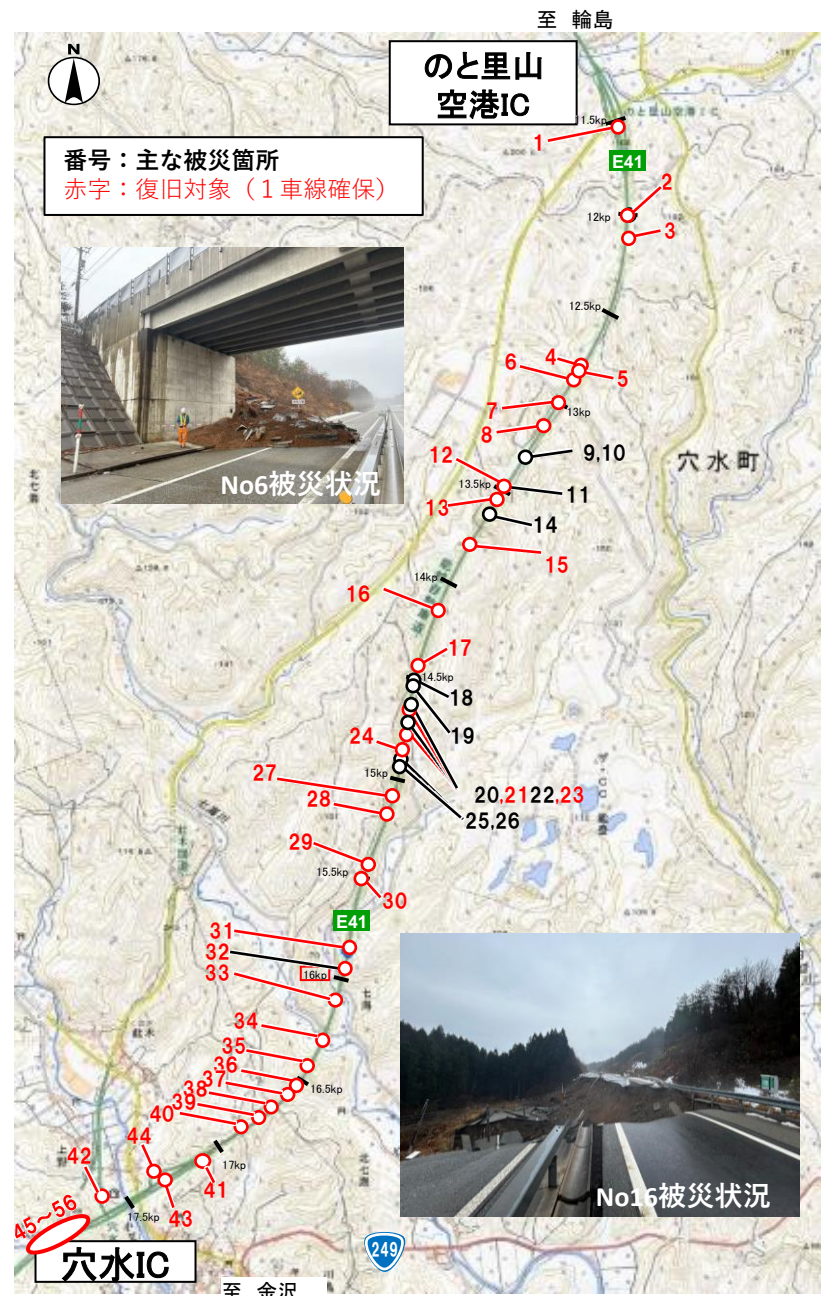

緊急復旧作業中 (1車線確保)
(13箇所完/46箇所)

No.6 土嚢設置



No.16 切土状況





緊急復旧作業中 (1車線確保)

No.6 土嚢設置




No.16 切土状況



No.36 ガードレール撤去




緊急復旧作業中 (1車線確保)

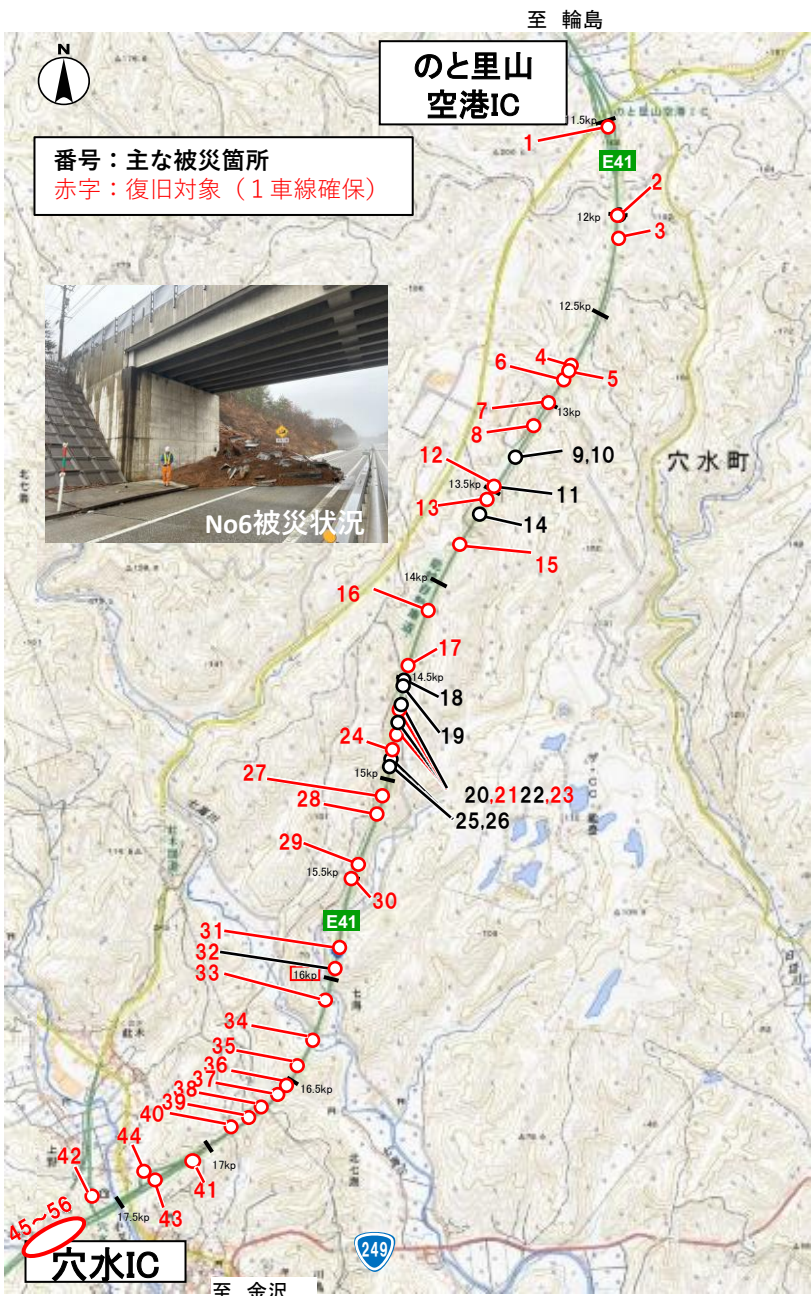

No.6 掘削・土嚢設置状況



緊急復旧作業中 (1車線確保)

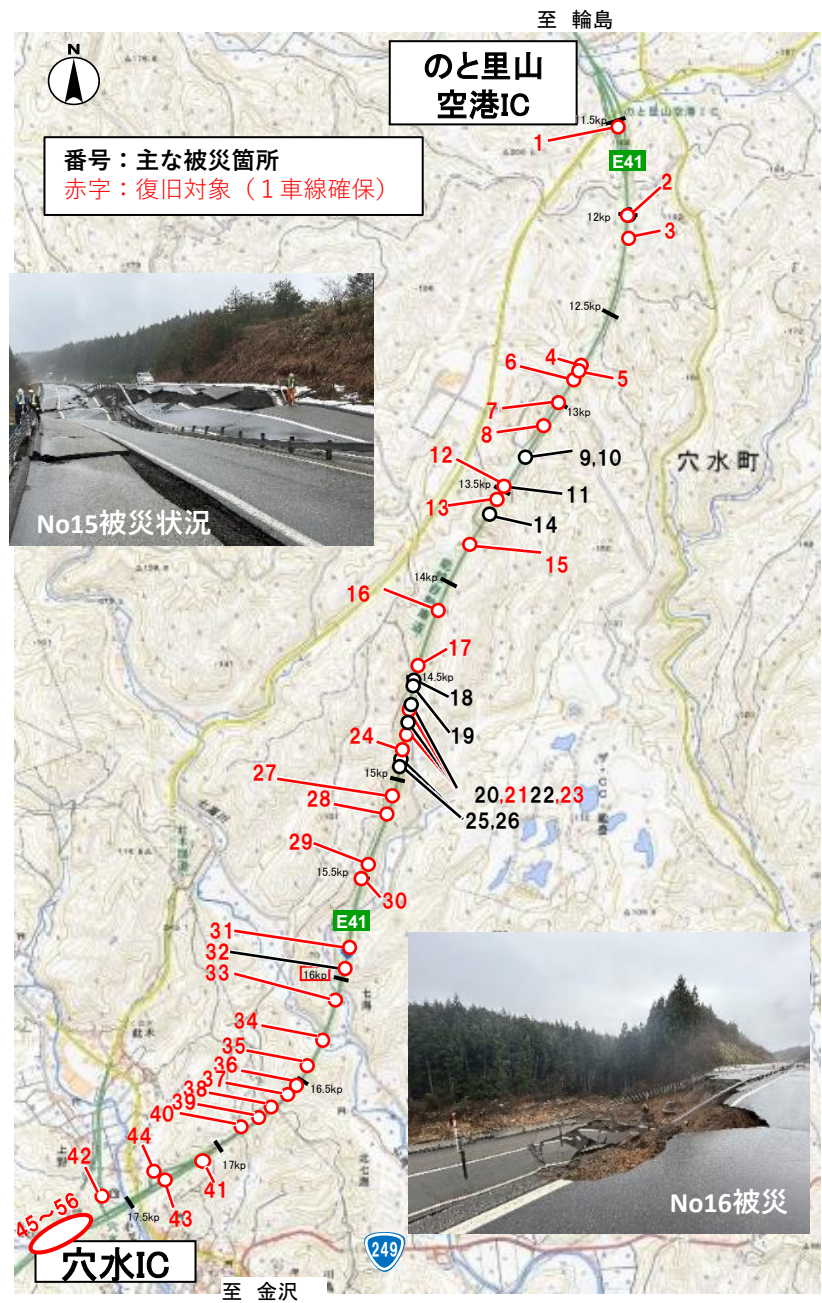

No.15 砕石充填状況




R6.1.11撮影

No.16 砕石充填状況



R6.1.11撮影

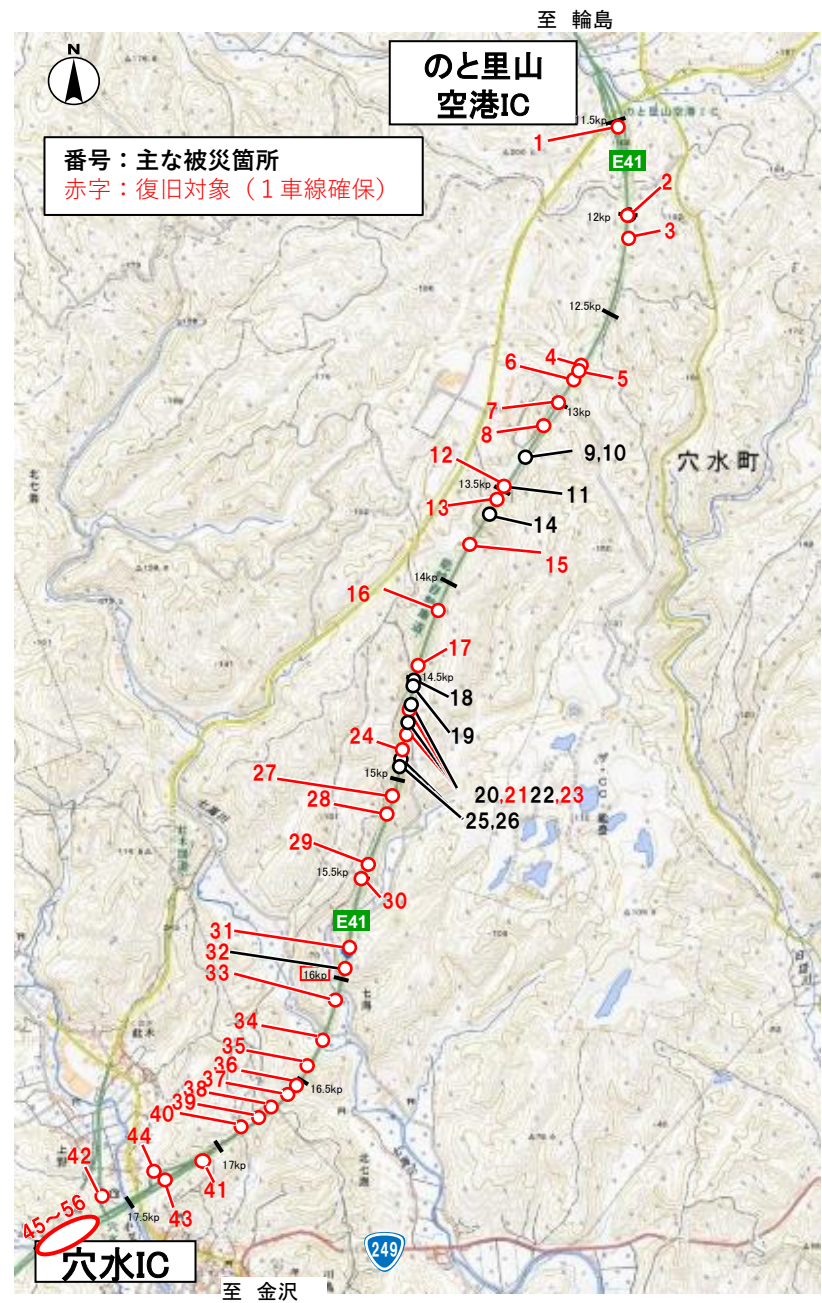

緊急復旧作業中 (1車線確保)

No.35～42 碎石充填

