


# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

2月1日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

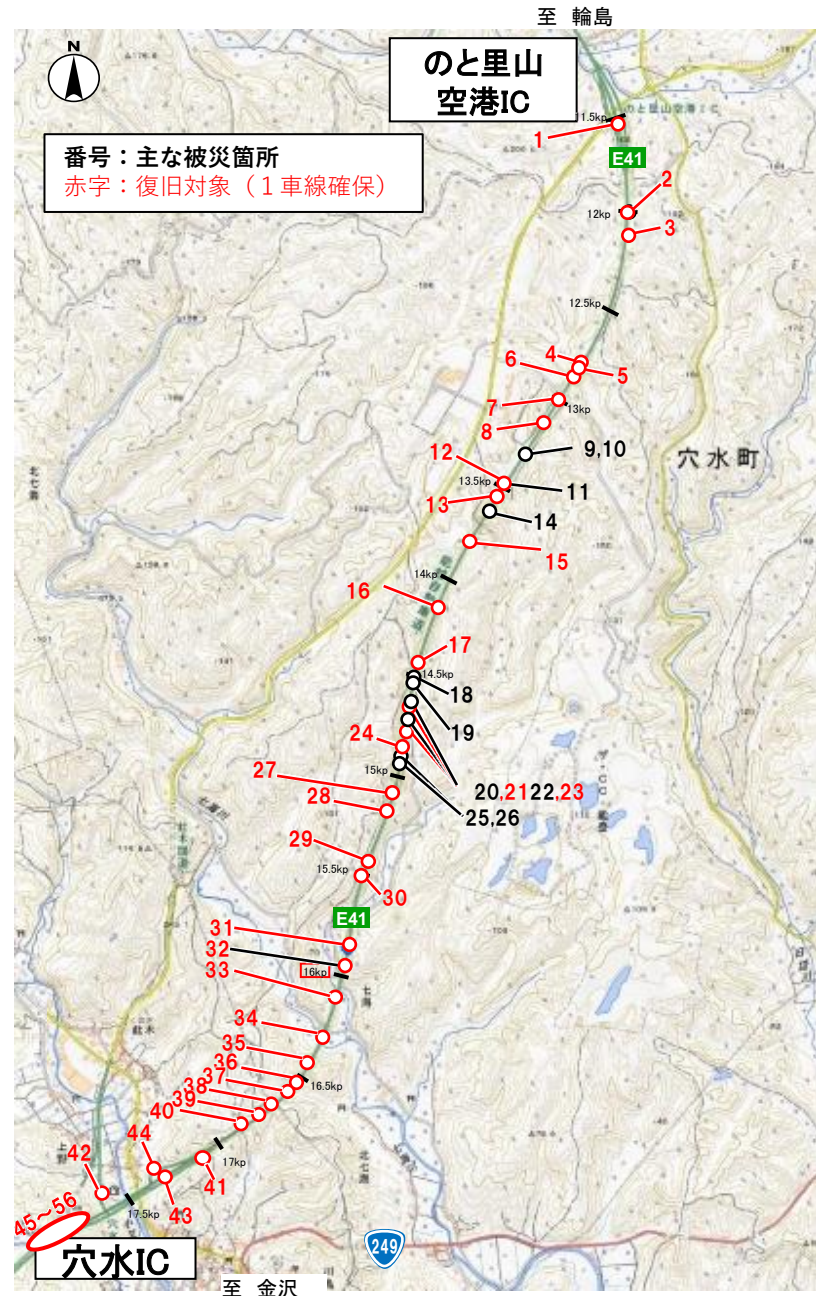

緊急復旧完了 (1車線確保)

No15付近 1車線復旧完了



No16付近 1車線復旧完了





# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月31日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)  
46箇所完了 (舗装以外) / 46箇所  
※引き続き舗装施工中

## No32 舗装状況





# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月30日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(46箇所 舗装以外完了 / 46箇所)  
※引き続き舗装施工中

## No32 舗装状況



R6.1.30 撮影



R6.1.30 撮影



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月29日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（46箇所 舗装以外完了 / 46箇所）  
※引き続き舗装施工中

## No41～42 舗装状況





# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月28日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（46箇所 舗装以外完了 / 46箇所）  
※引き続き舗装施工中

## No17～29 舗装状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月27日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

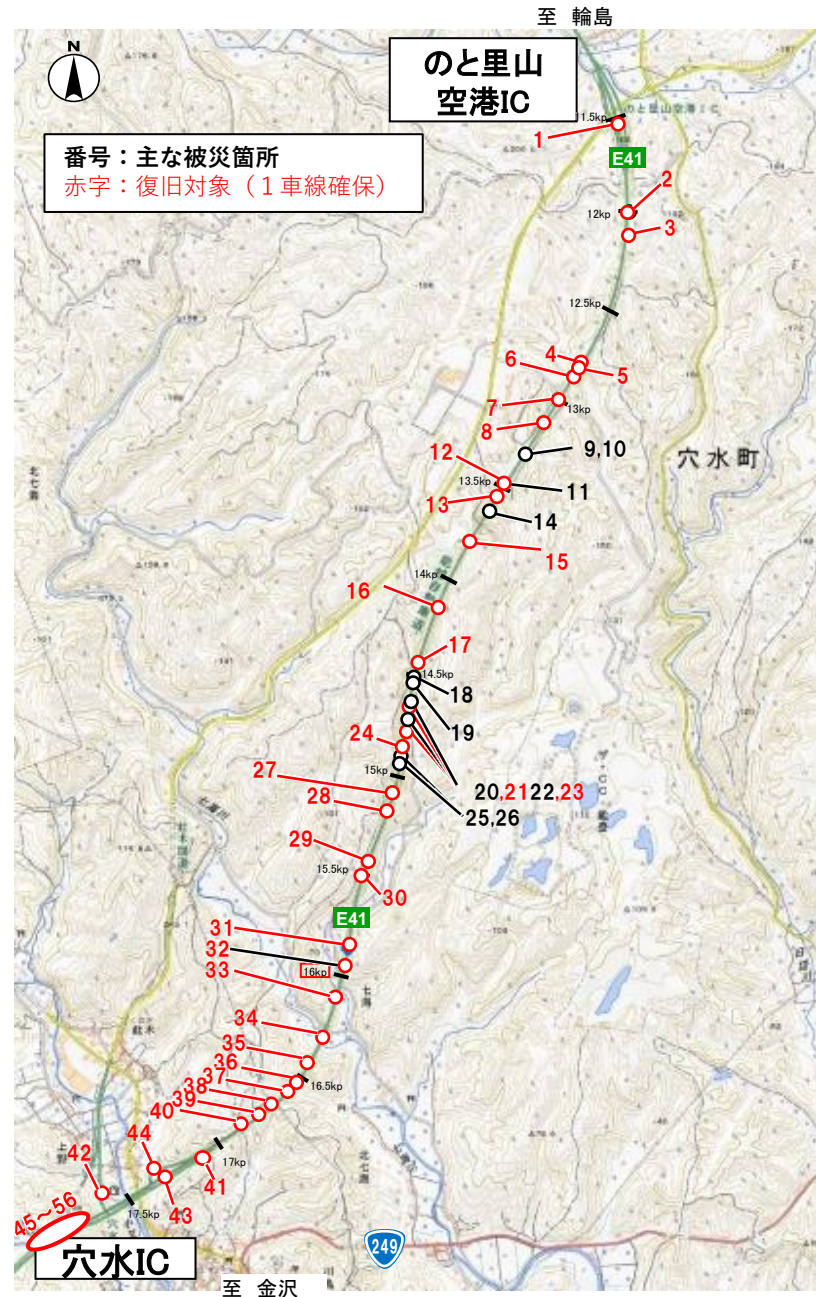

緊急復旧作業中（1車線確保）  
（46箇所 舗装以外完了 / 46箇所）  
※引き続き舗装施工中

## No17～29 舗装・段差復旧状況




R6.1.27撮影



R6.1.27撮影



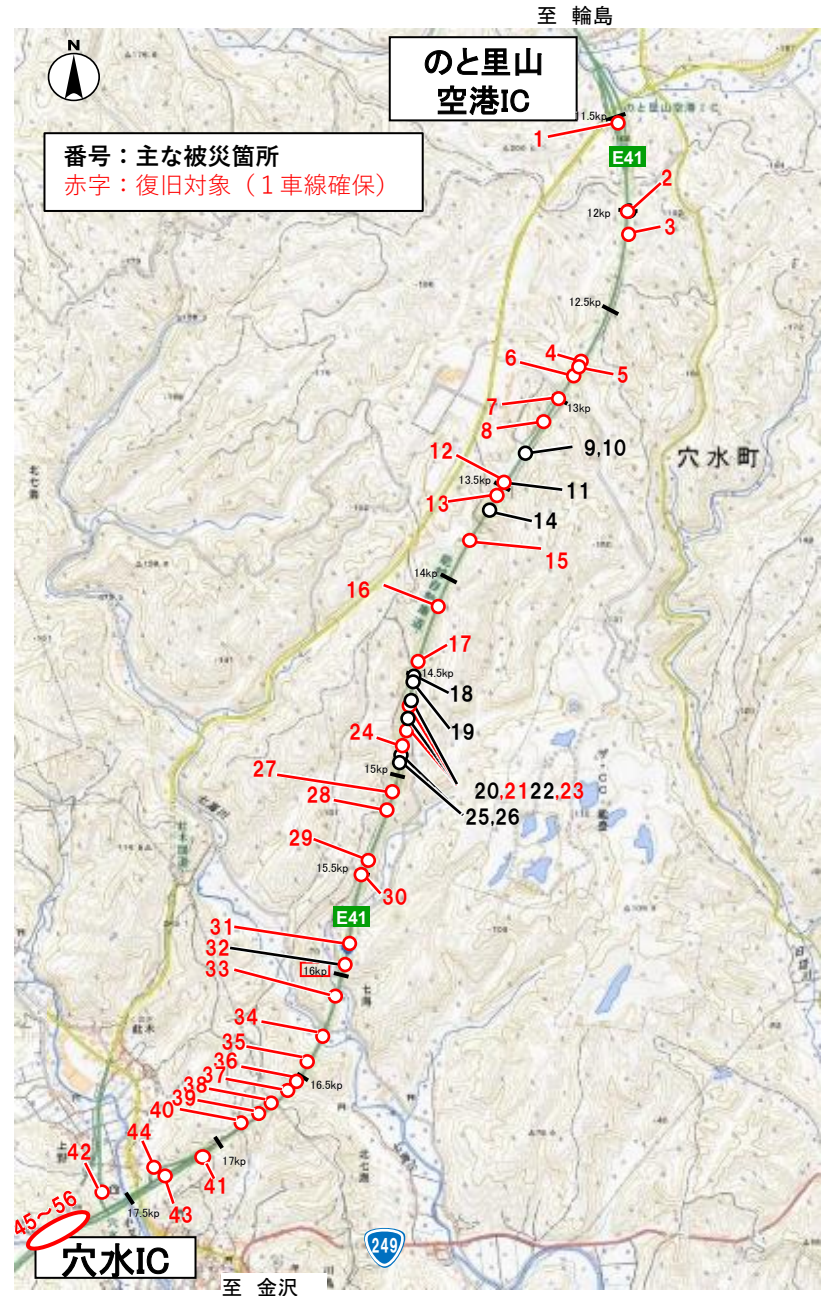


緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(46箇所 舗装以外完了 / 46箇所)  
※引き続き舗装施工中

### No15 舗装・段差復旧状況






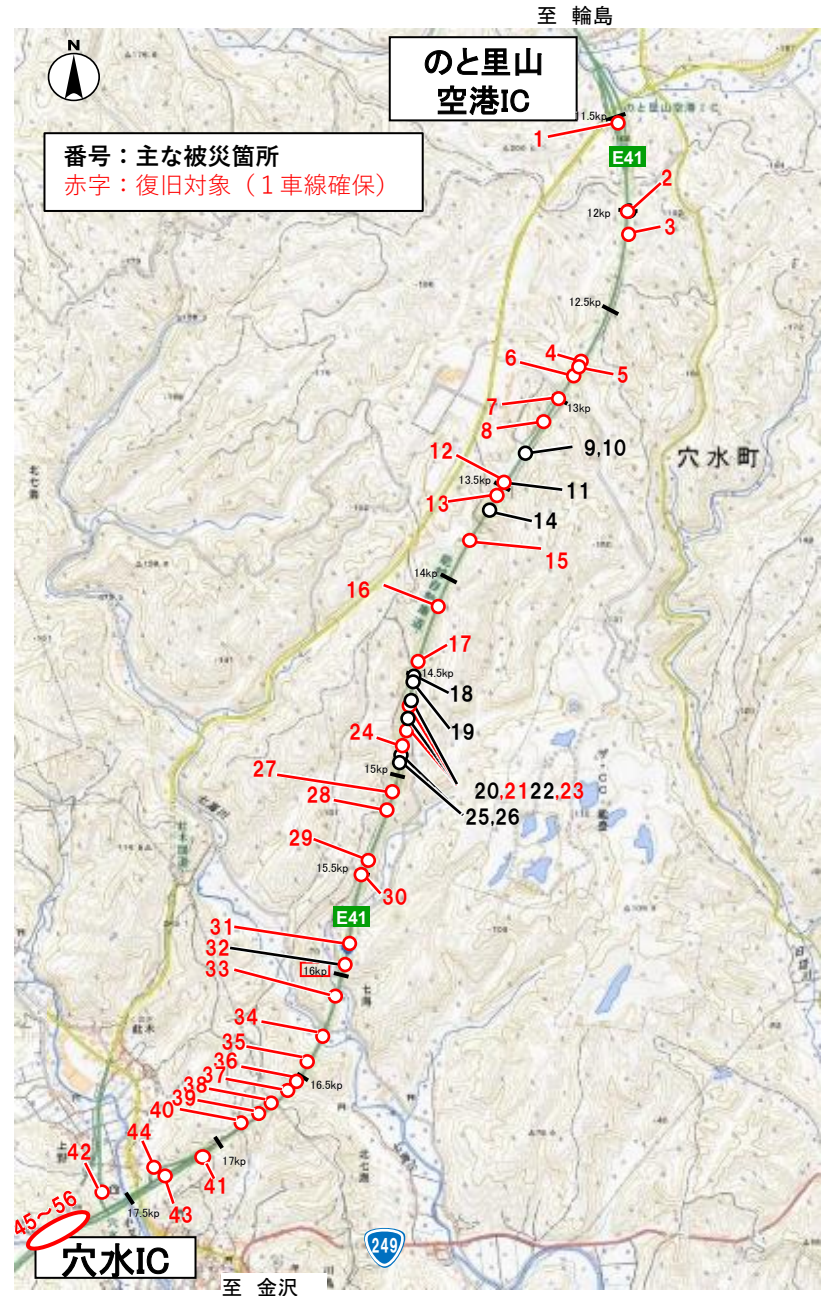


緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(46箇所 舗装以外完了 / 46箇所)  
※引き続き舗装施工中

### 復旧箇所の除雪状況

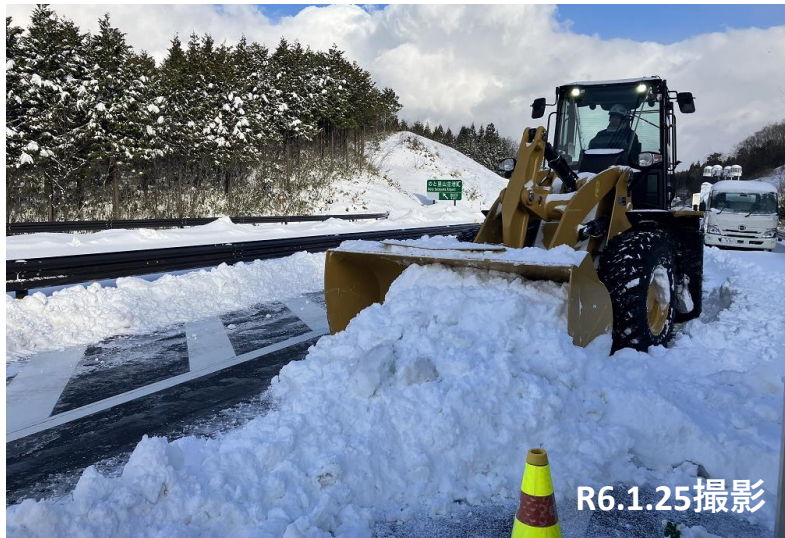



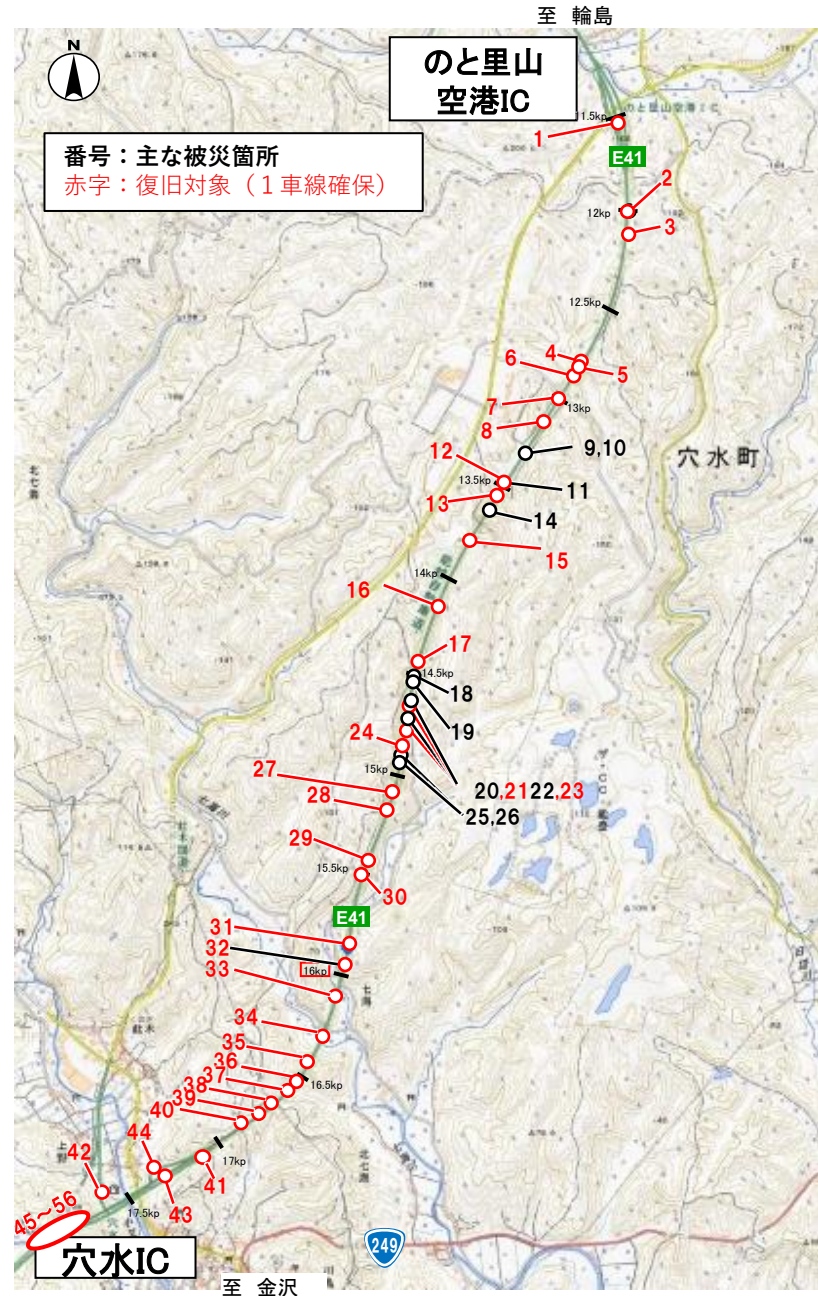

緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(46箇所 舗装以外完了 / 46箇所)  
※引き続き舗装施工中

### No41～42 舗装・段差復旧状況








緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(39箇所完/46箇所)

### No41～42 段差復旧状況





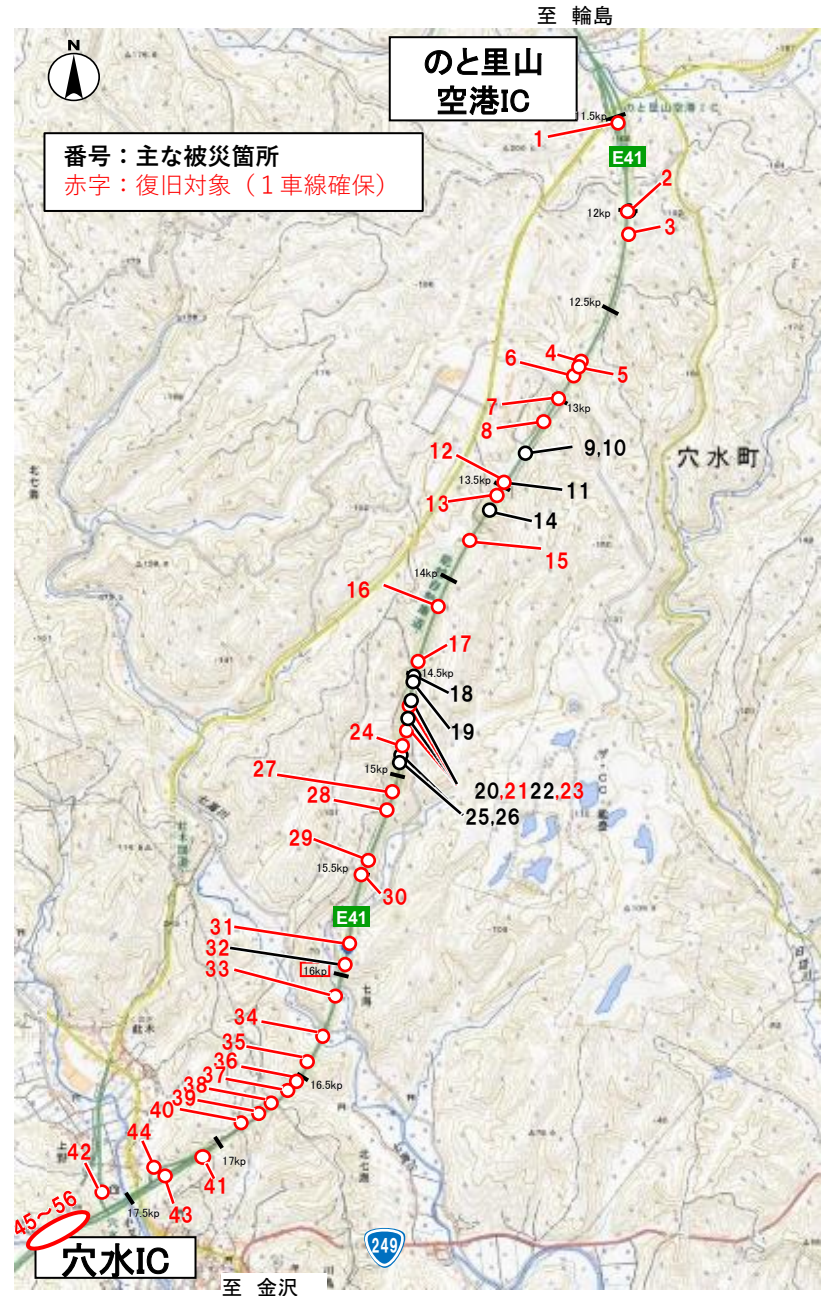

緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(39箇所完/46箇所)

### No41～42 段差復旧状況



R6.1.21撮影




R6.1.21撮影




緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(36箇所完/46箇所)

### No41～42 段差復旧状況

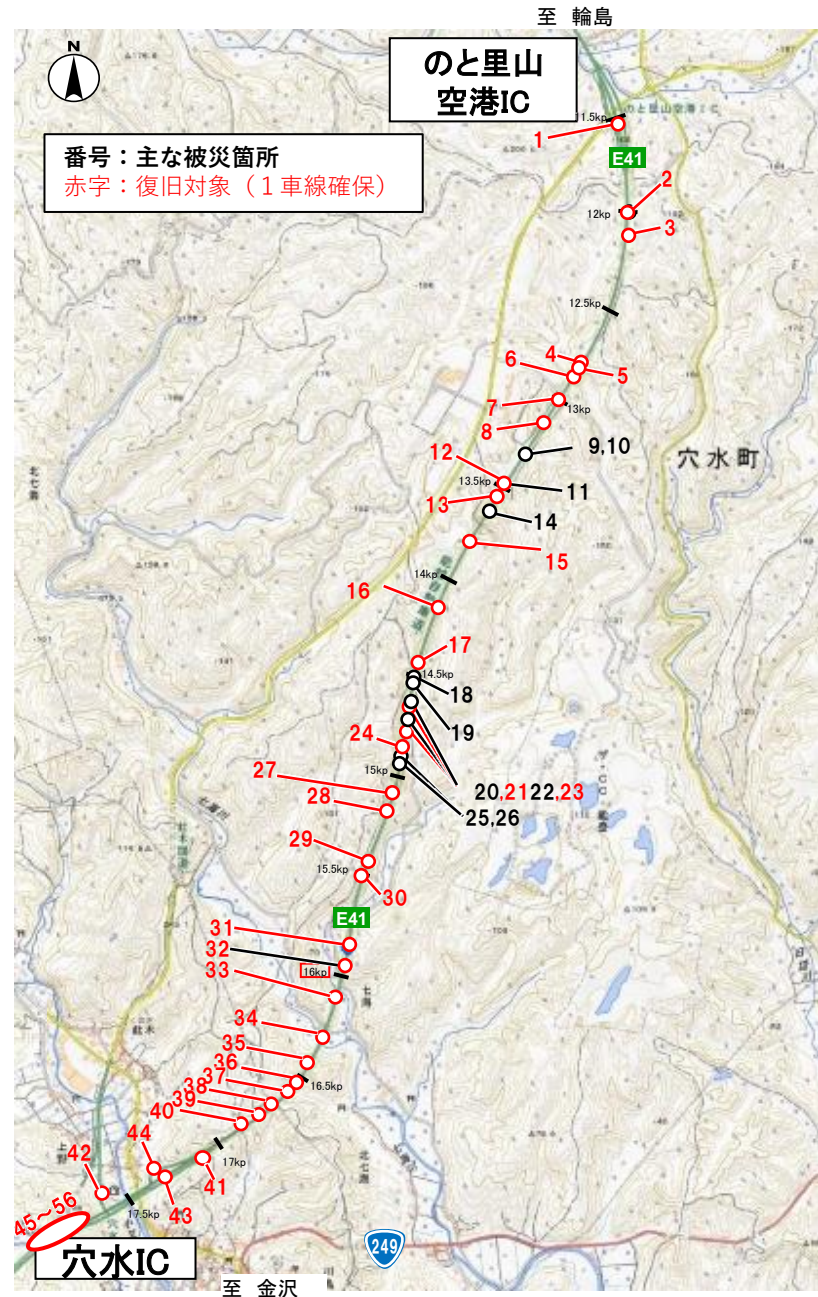



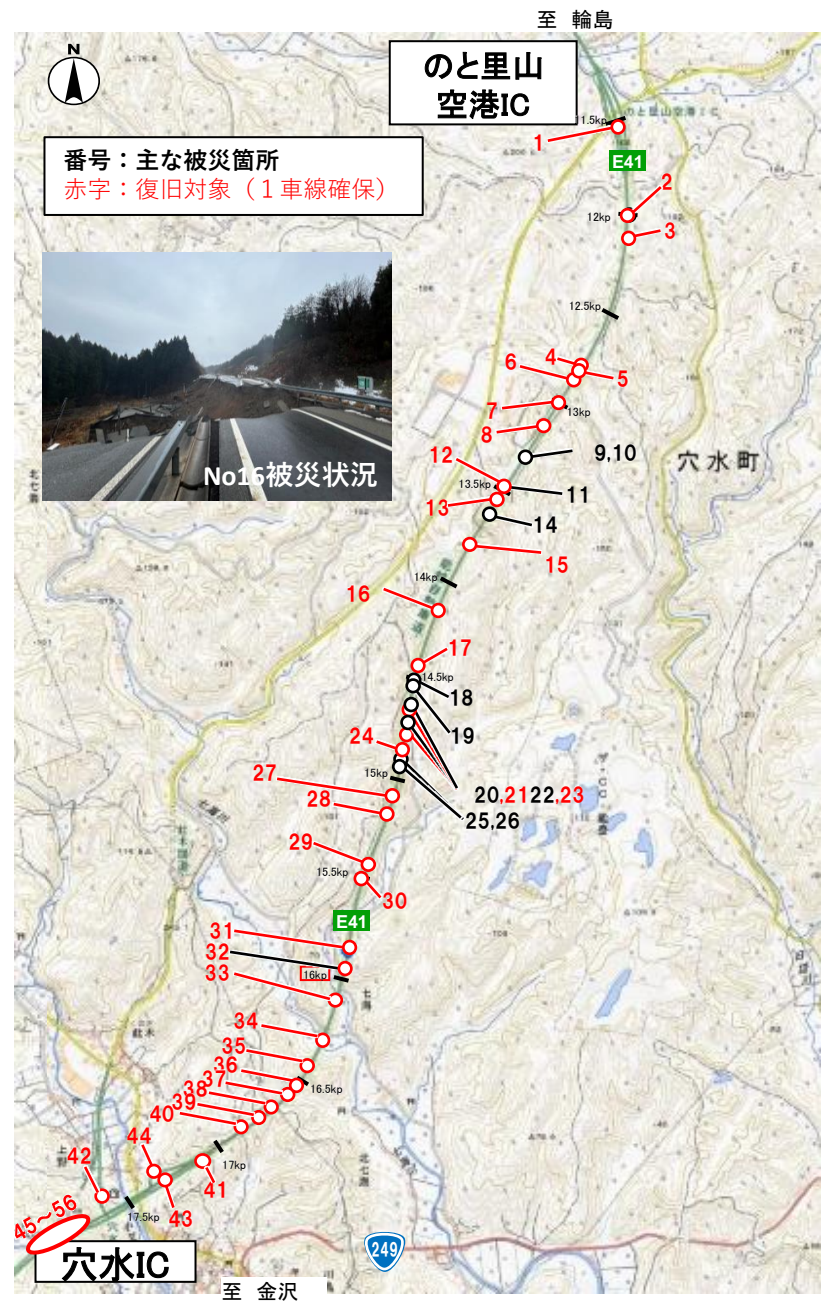

緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(22箇所完/46箇所)

### No.6 段差復旧状況



R6.1.19撮影

### No.16 迂回路造成




工事名 能越道啓開工事	
工種	測点 14.1kp付近
R6.1.19	
施工状況	

午後5:01  
令和6年1月19日

R6.1.19撮影



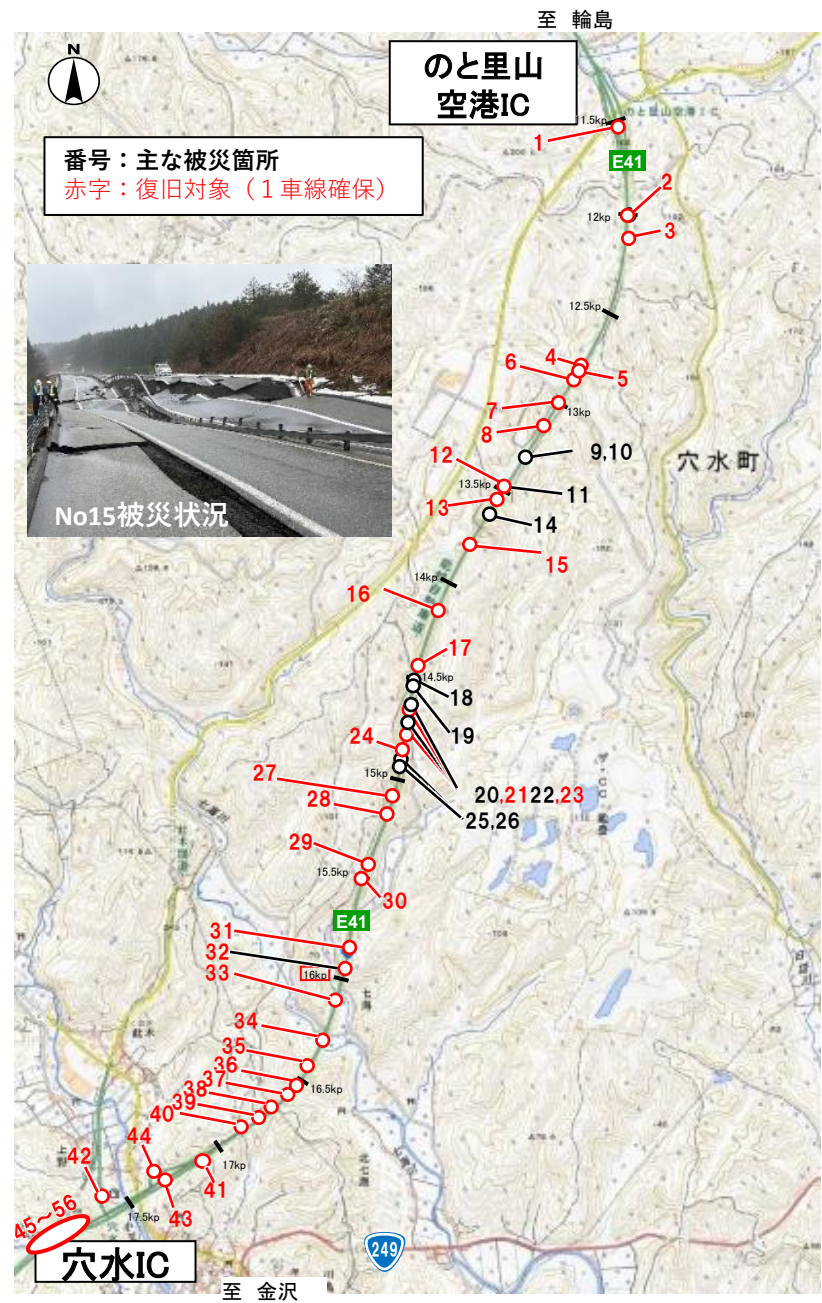

緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(20箇所完 / 46箇所)

### No.6 段差復旧状況



R6.1.18撮影

### No.15 法面切土




工事名 能越道啓開工事  
工種 測点13.7付近  
R6.1.18  
施工状況

**R6.1.18撮影**

清水建設株式会社 令和6年1月18日



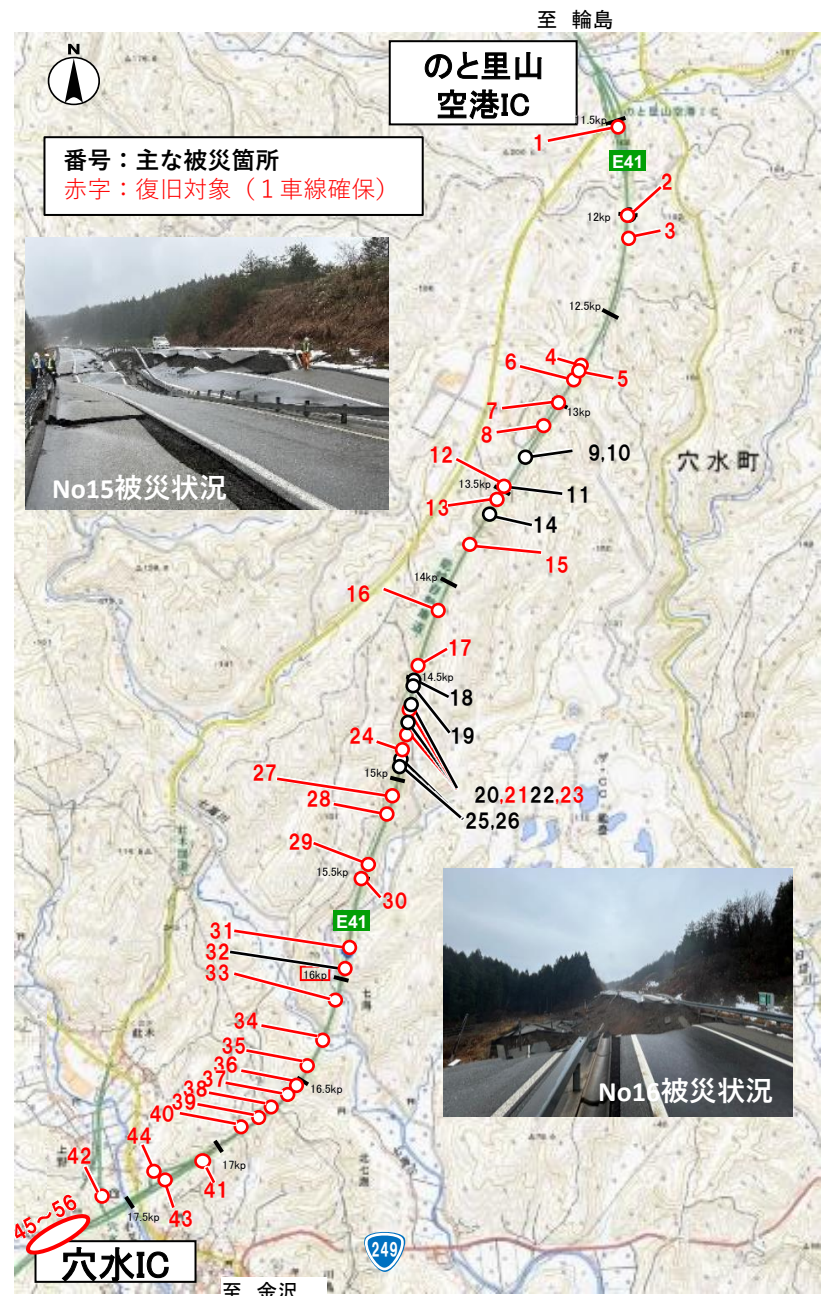

緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(13箇所完/46箇所)

No.6 段差復旧状況



No.15 碎石埋戻し状況



No.16 法面切土状況



No.51 段差擦り付け







緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(13箇所完/46箇所)

No.6 路面亀裂、段差復旧状況




No.16 法面切土



No.51 段差擦り付け





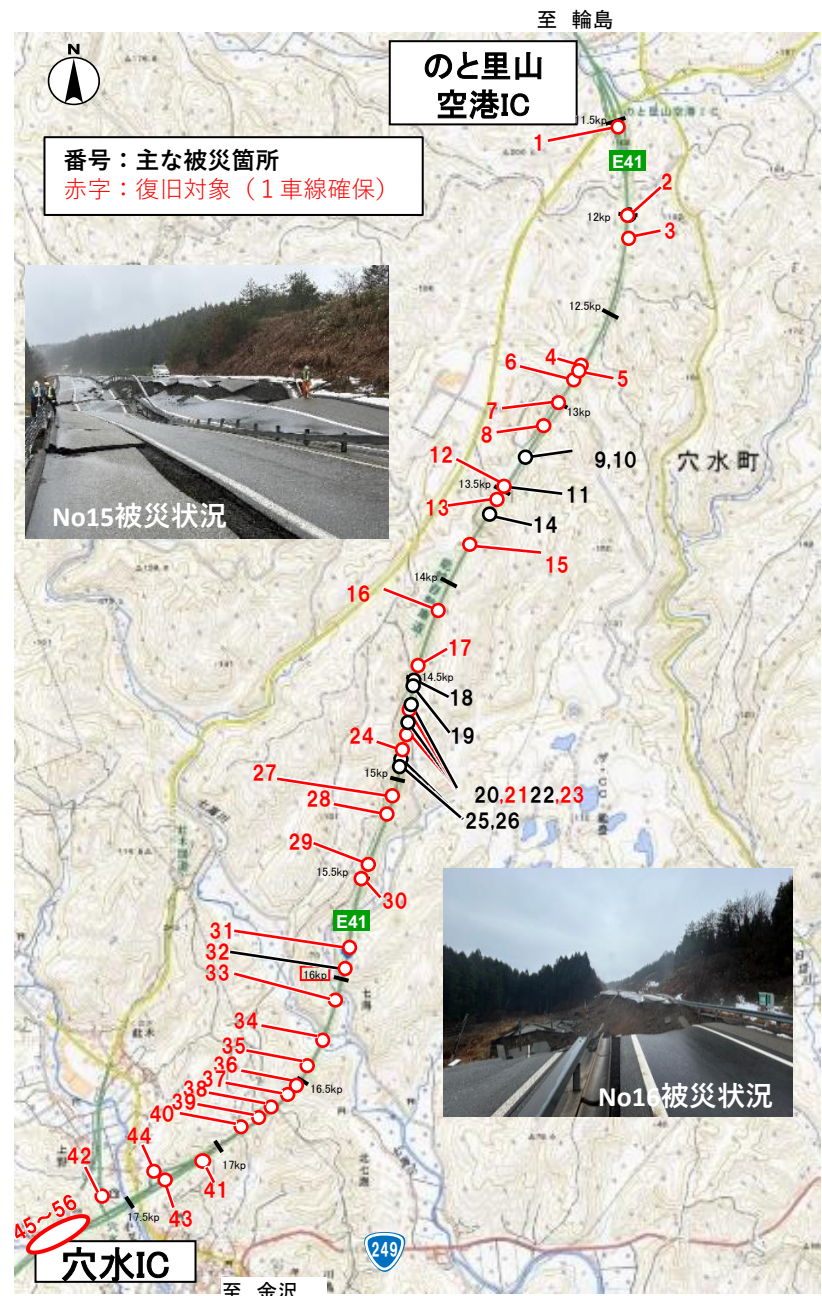

**緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(13箇所完/46箇所)**

**No.6段差復旧状況**



**No.15碎石埋戻し状況**



**No.16 法面切土**



**No.56 段差擦り付け**




No15被災状況

No16被災状況

R6.1.15撮影

R6.1.15撮影



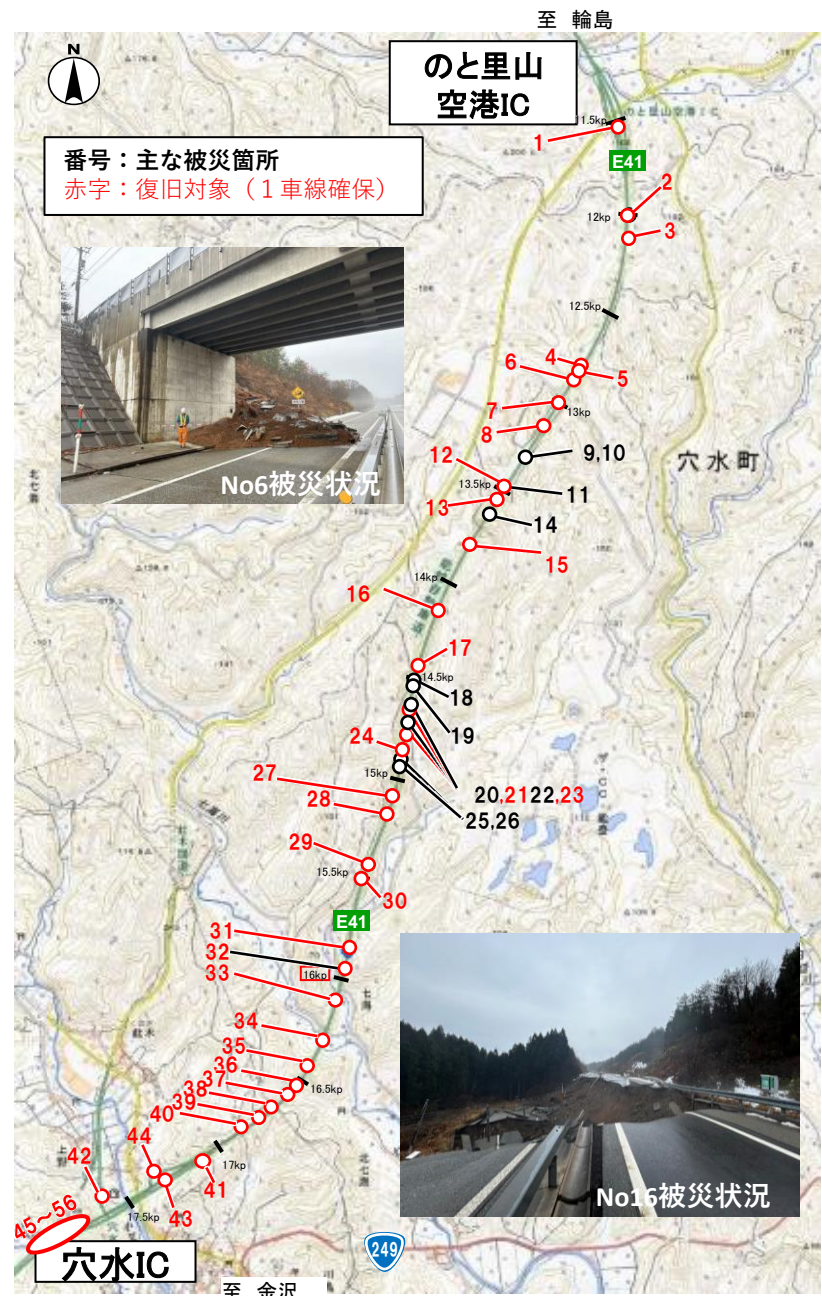

緊急復旧作業中（1車線確保）  
（13箇所完／46箇所）

### No.6 土嚢設置



### No.16 切土状況







### 緊急復旧作業中 (1車線確保)

#### No.6 土嚢設置



#### No.16 切土状況




#### No.36 ガードレール撤去





緊急復旧作業中 (1車線確保)

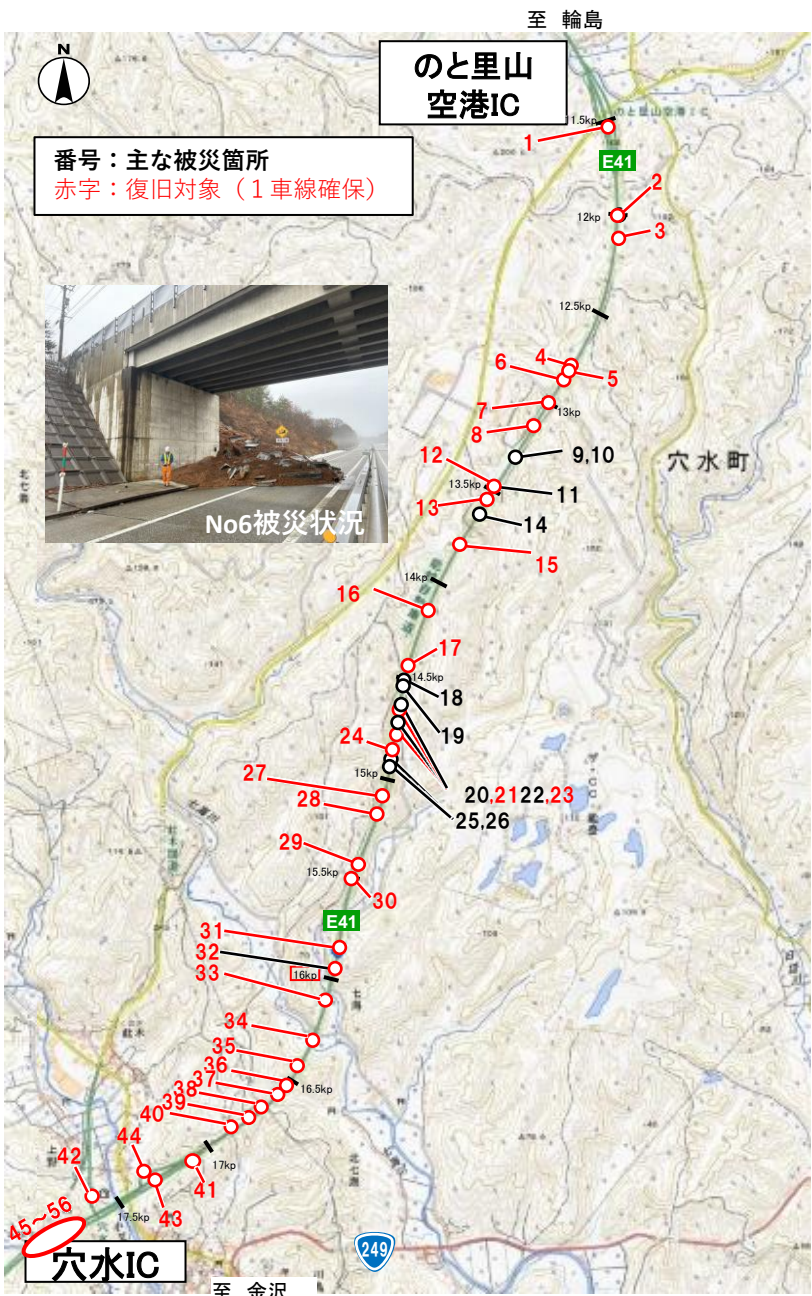


### No.6 掘削・土嚢設置状況





緊急復旧作業中 (1車線確保)

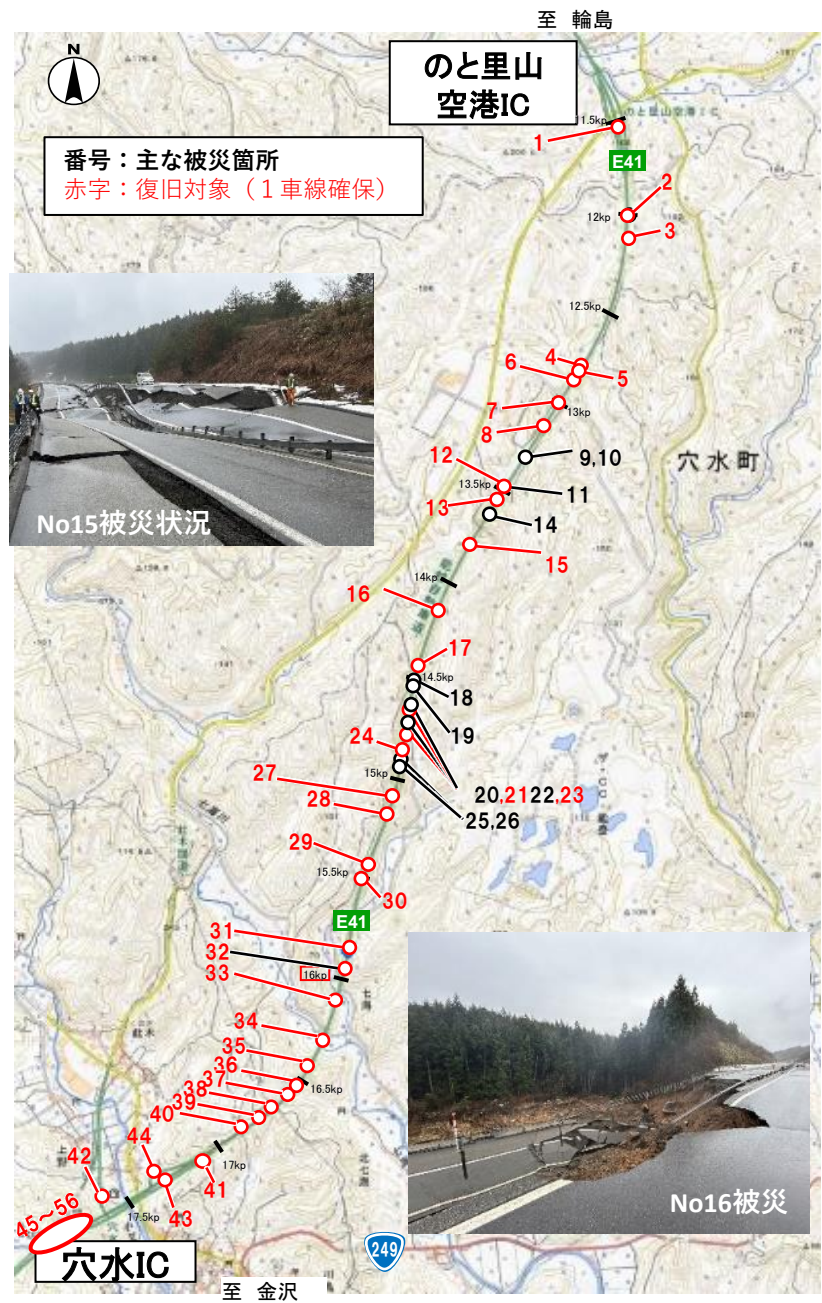


### No.15 砕石充填状況



### No.16 砕石充填状況





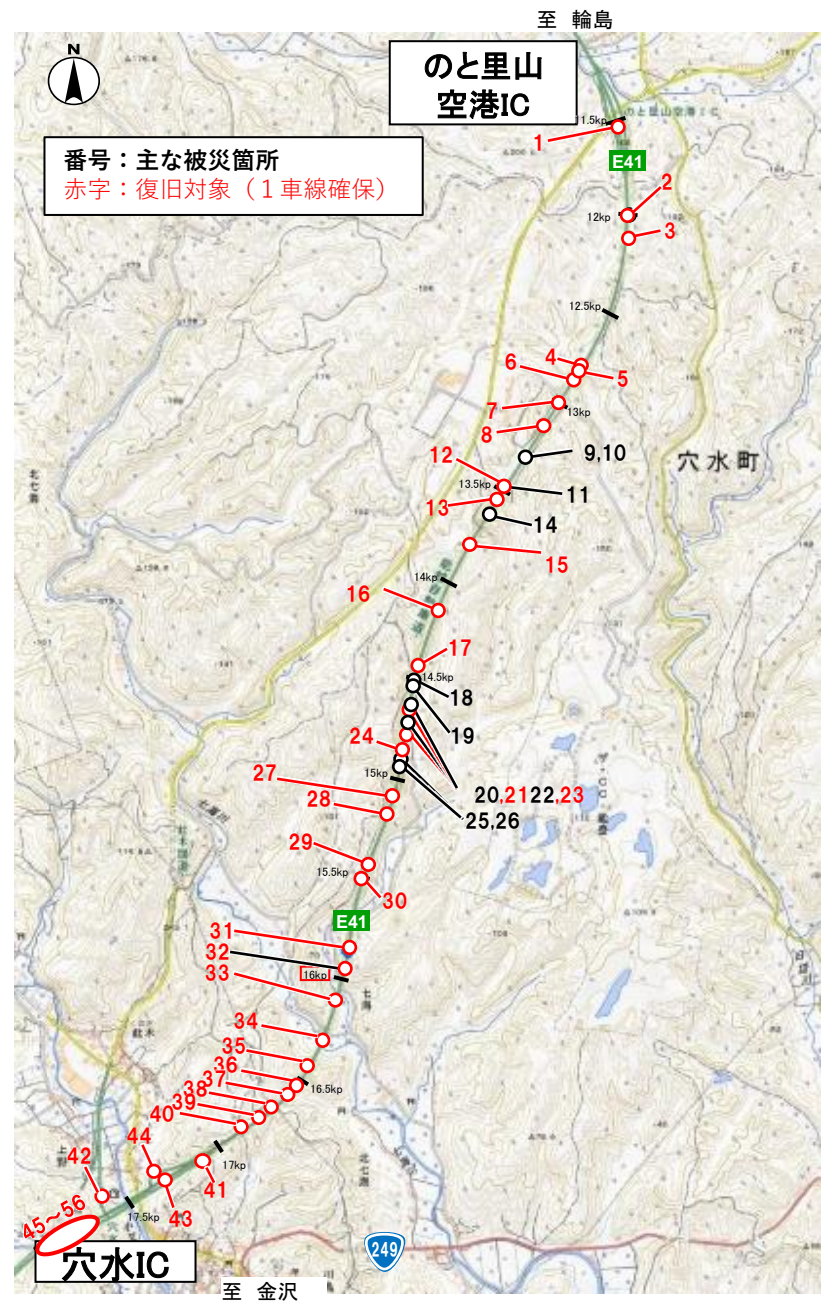

緊急復旧作業中 (1車線確保)

### No.35～42 碎石充填

