


令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

3月1日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

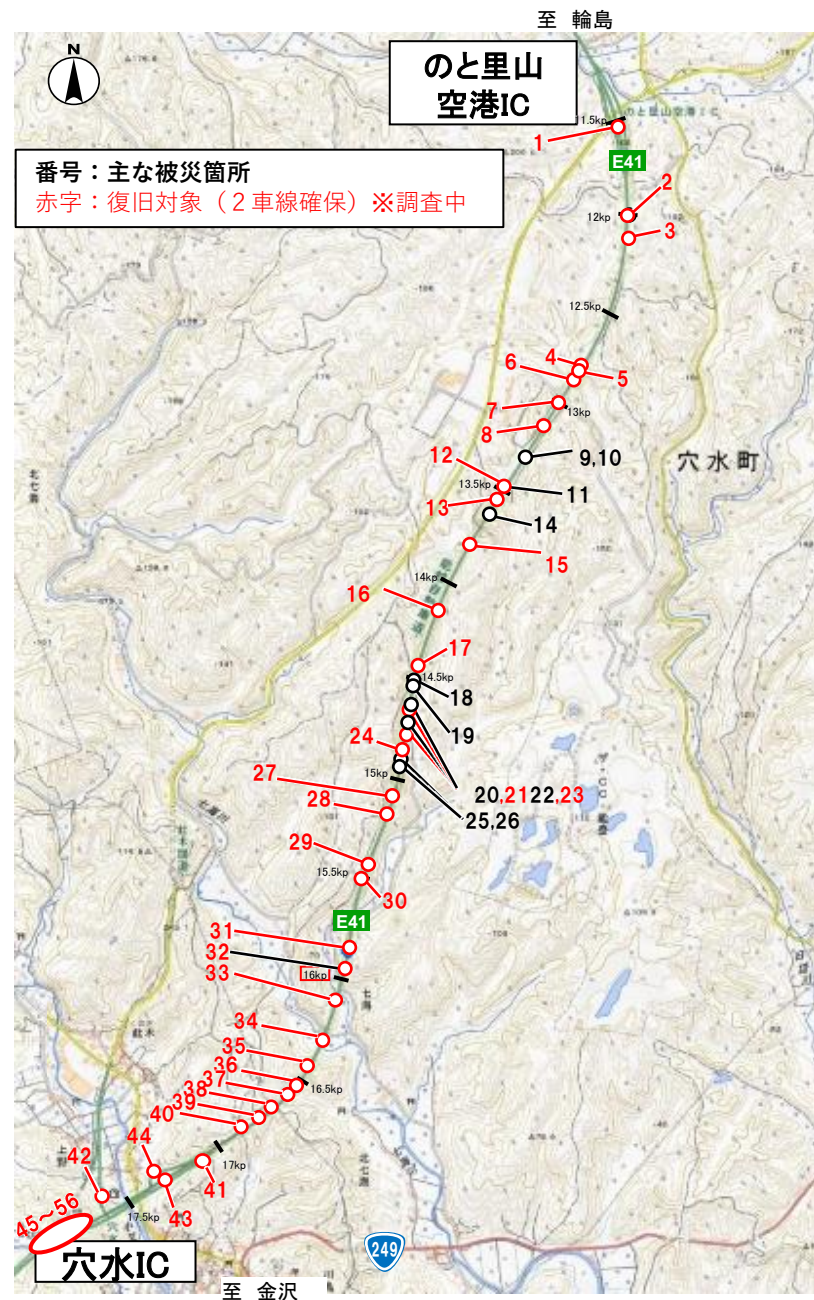

緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.37付近 重機走路整備状況




No.42付近 車線切替状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

2月28日現在

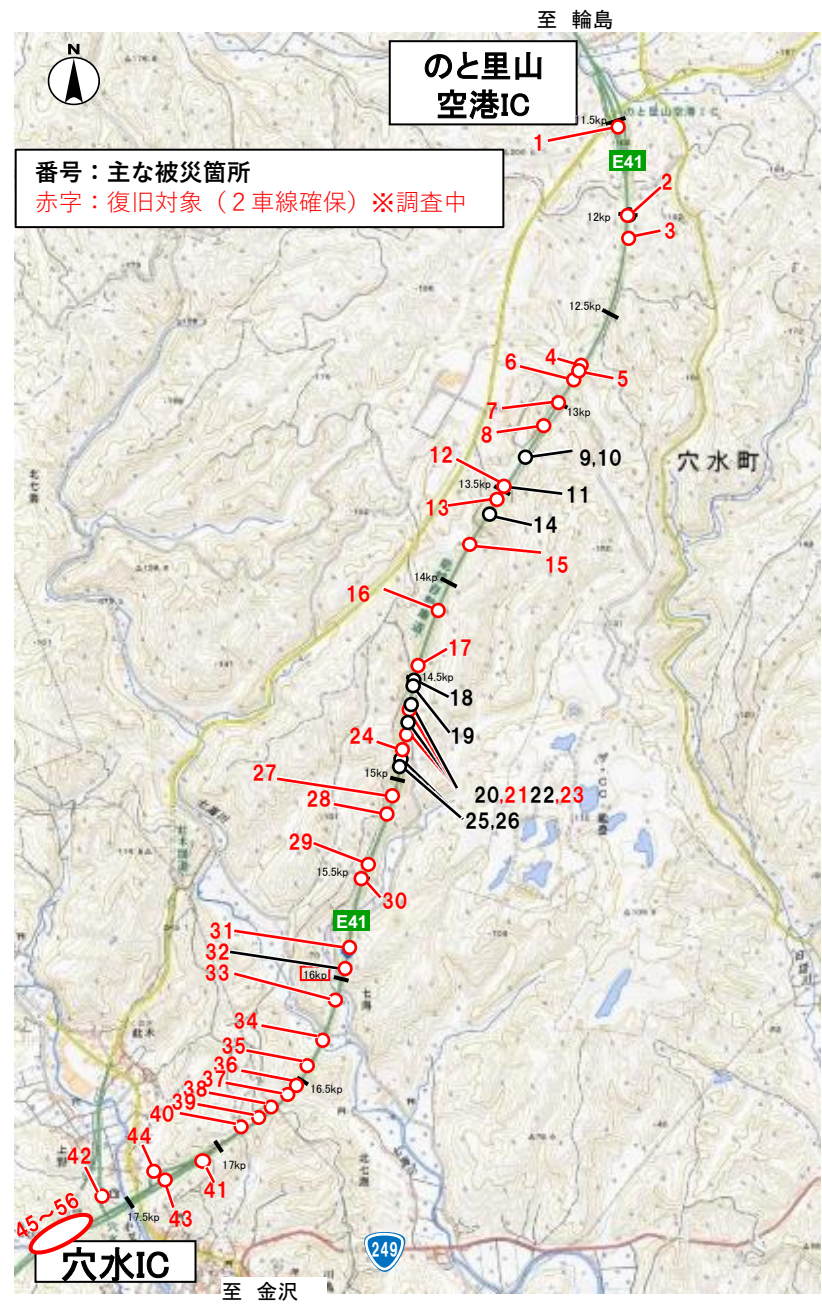

緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.37付近 重機走路整備状況




R6.2.27撮影

No.42付近 転圧状況



R6.2.26撮影

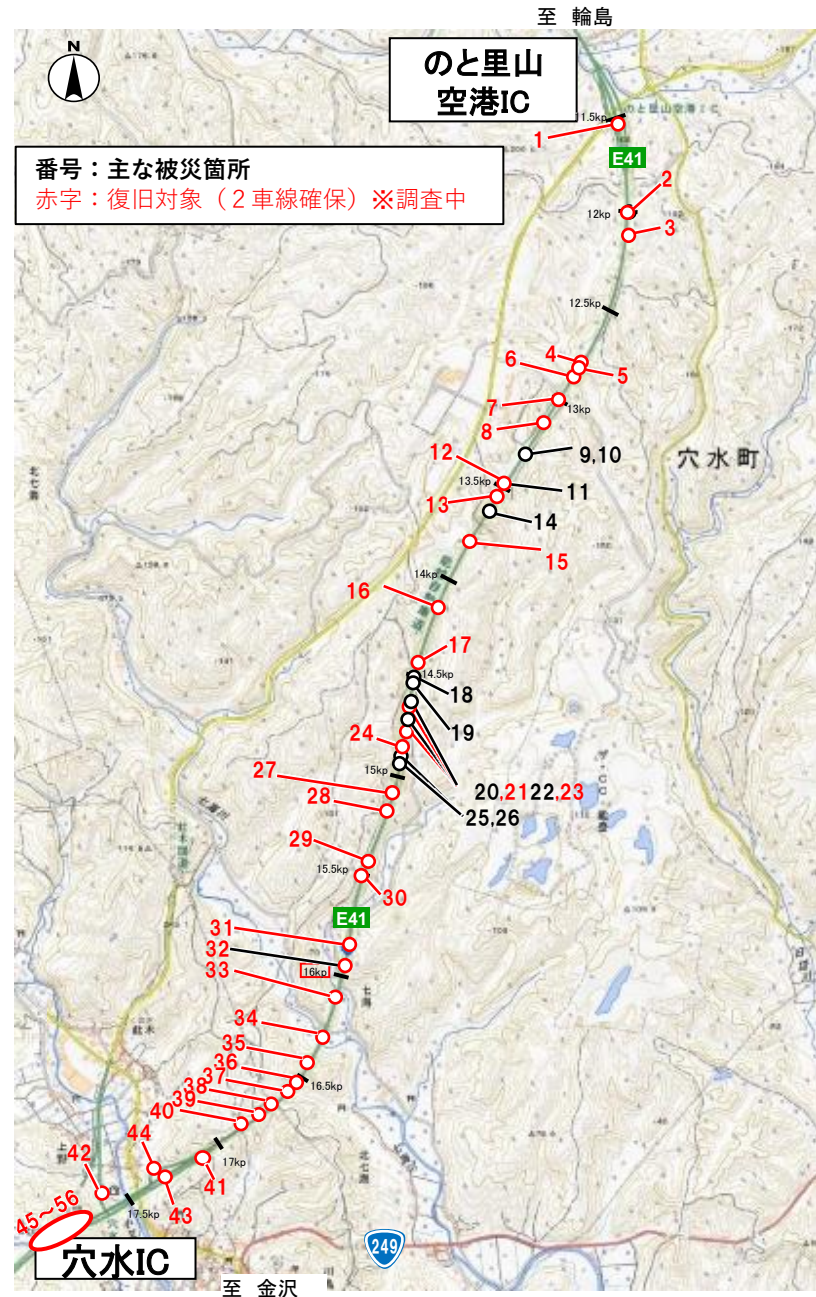

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.33付近 構造物撤去状況




No.44付近 碎石敷均し状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

2月21日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

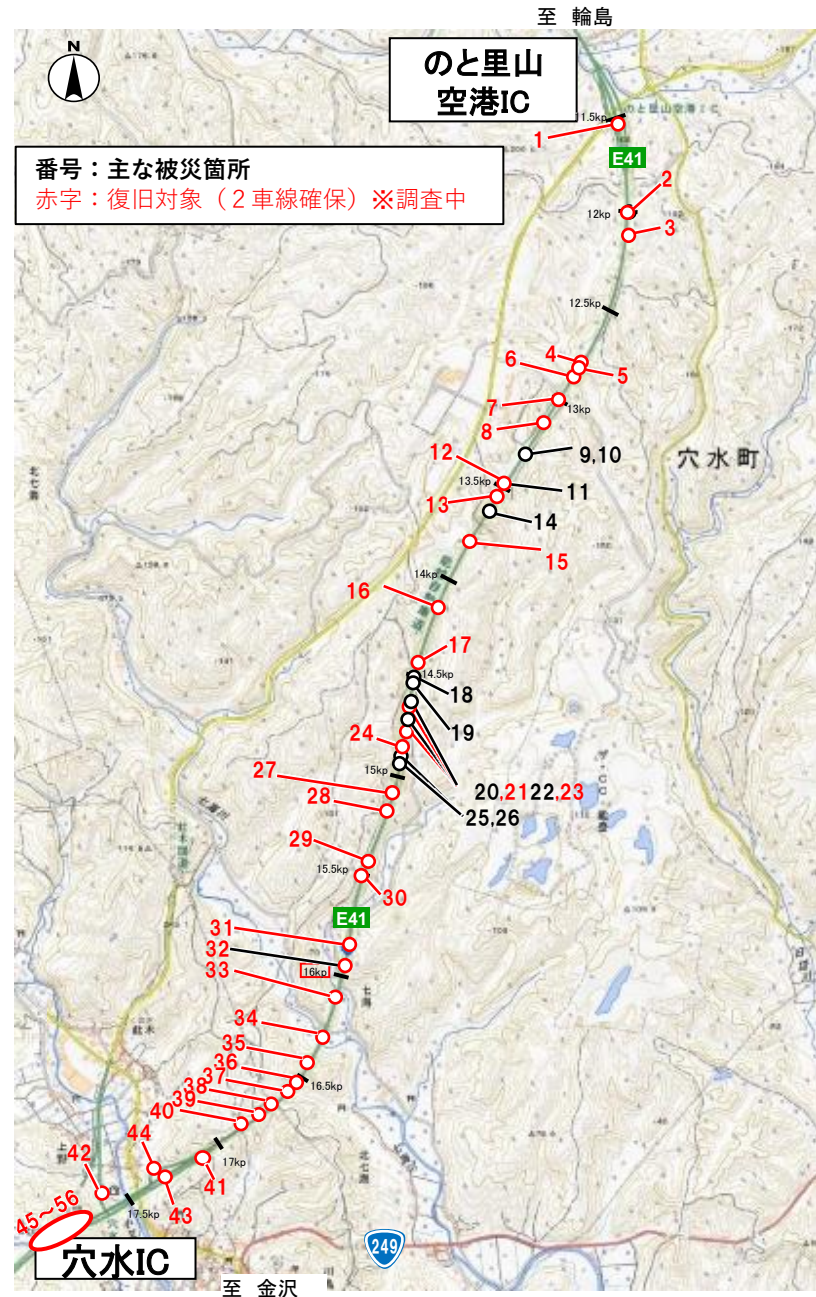

緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.37付近 砕石埋戻し・土嚢設置状況



No.28付近 舗装撤去・砕石埋戻し状況




令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

2月19日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

緊急復旧作業中 (2車線確保)

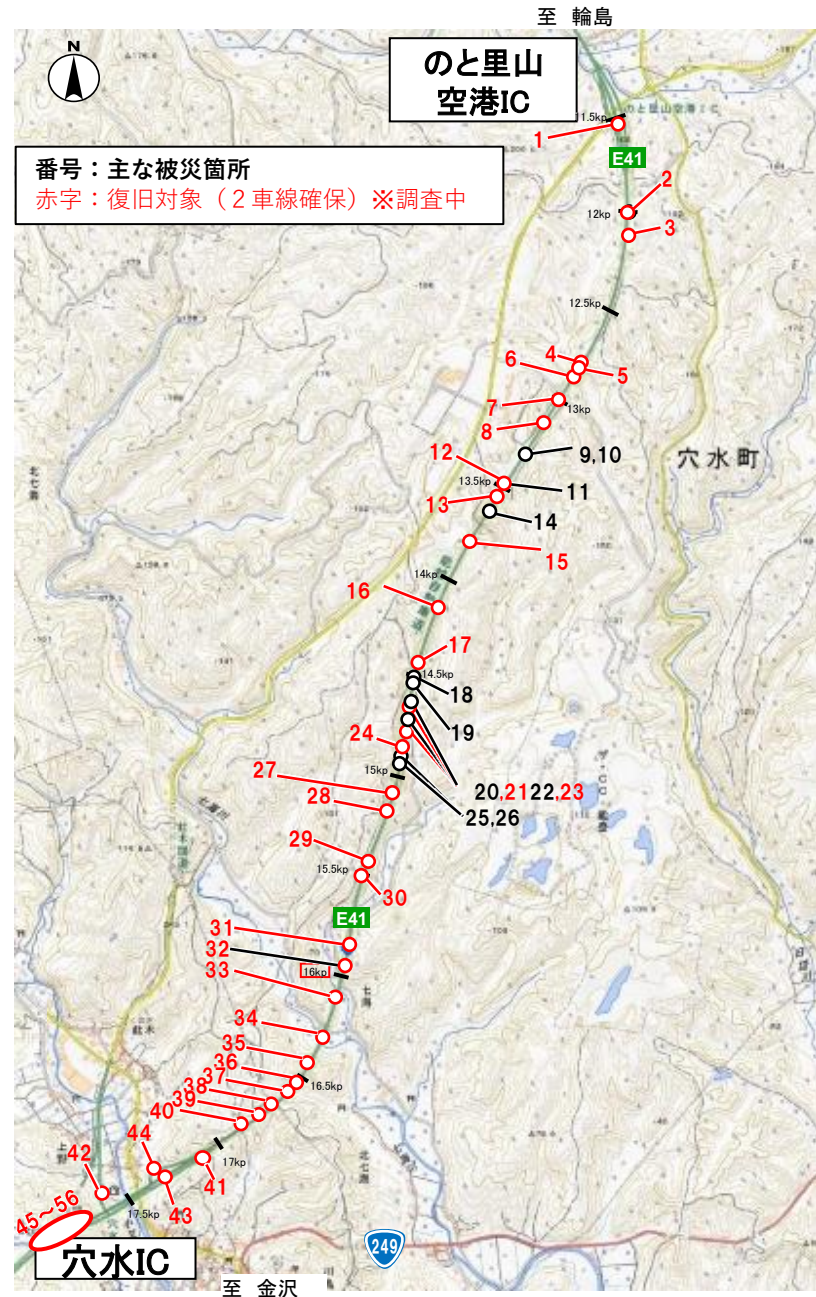


No.56 砕石埋戻し状況



No.37付近 重機足場造成状況



緊急復旧作業中 (2車線確保)

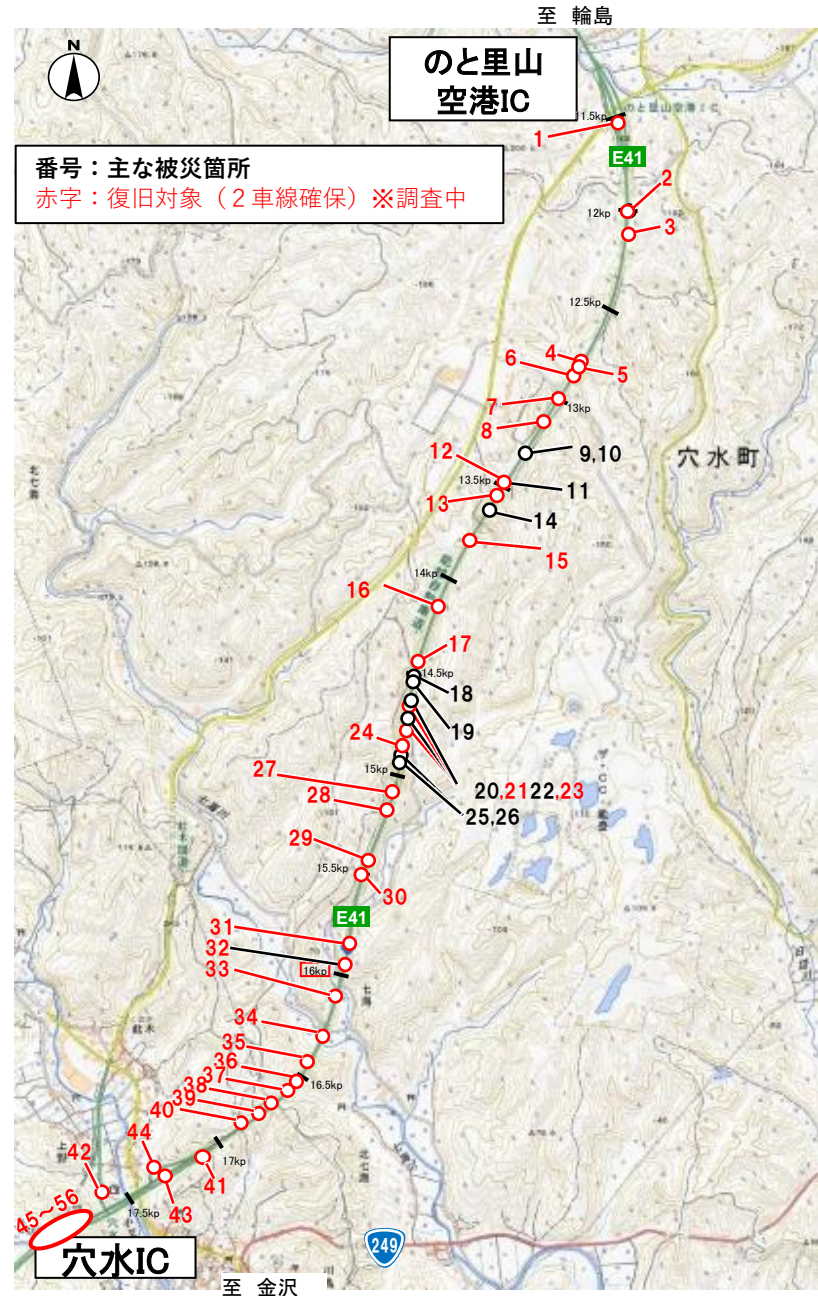

No.40 砕石敷均し状況




No.56 舗装撤去・砕石埋戻し



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

2月13日現在

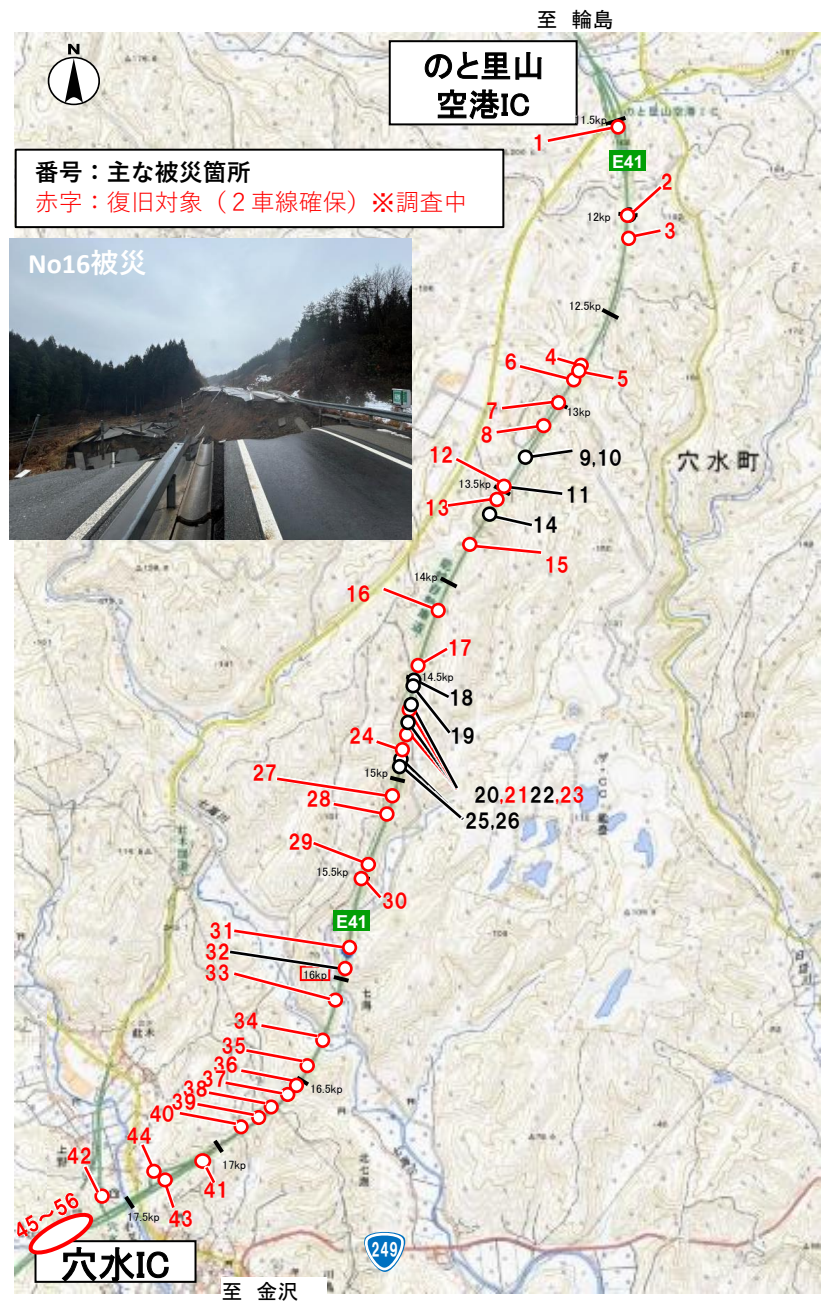

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.16付近 ボーリング調査状況



No.40 舗装撤去状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

2月9日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.16 GR集積・がら撤去状況




R6.2.8撮影

No.42付近 大型土嚢設置状況



R6.2.8撮影

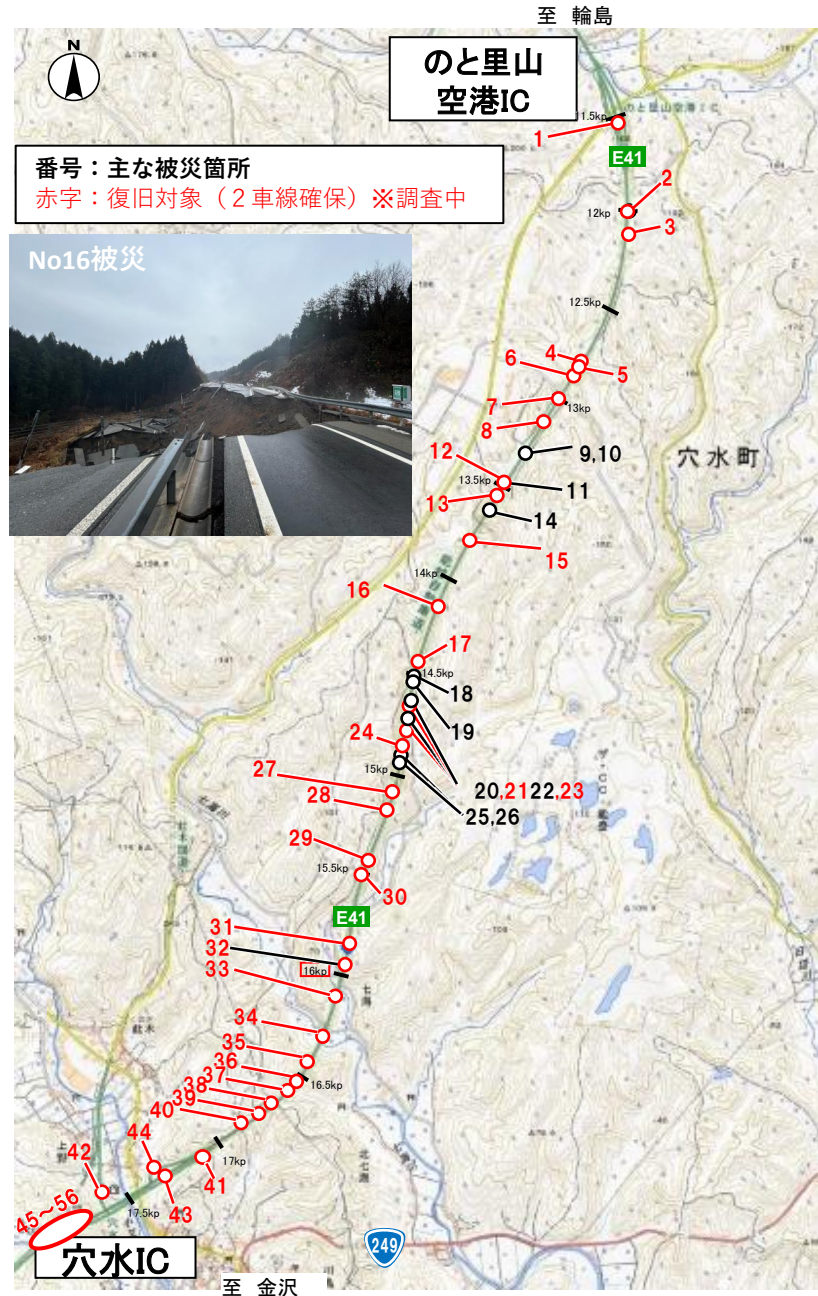


令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

2月7日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

緊急復旧作業中 (2車線確保)

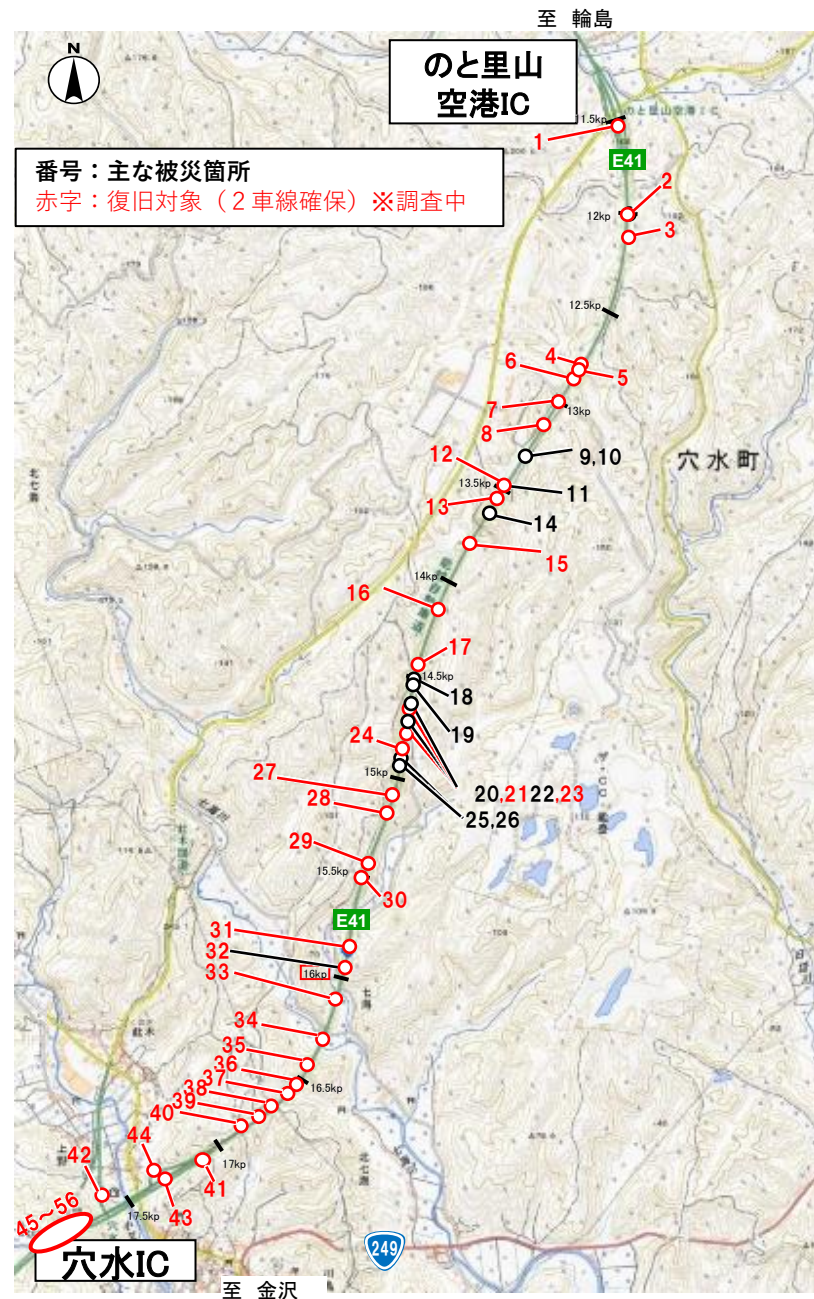

No.42付近 舗装撤去状況




令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

2月5日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

緊急復旧作業中 (2車線確保)

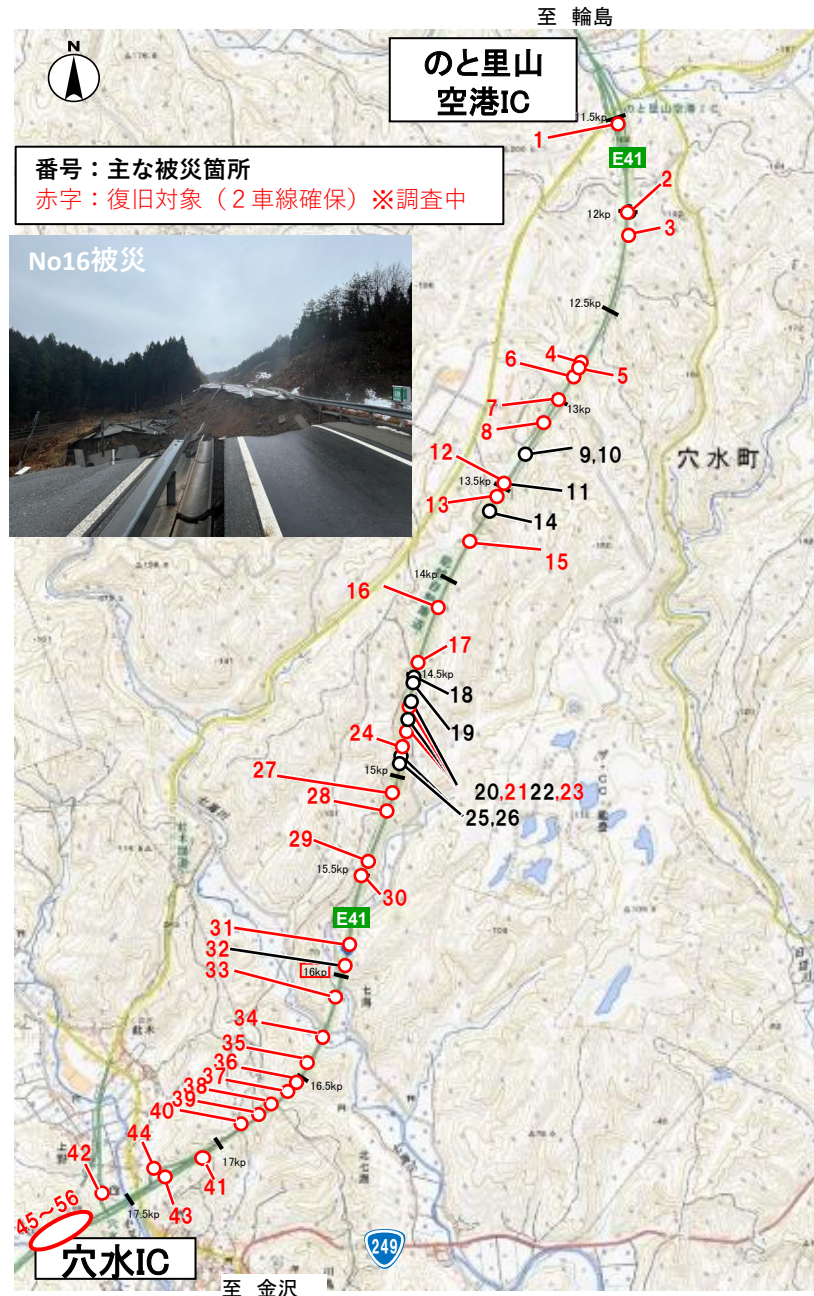


No.16 調査・整地状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

2月2日現在

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

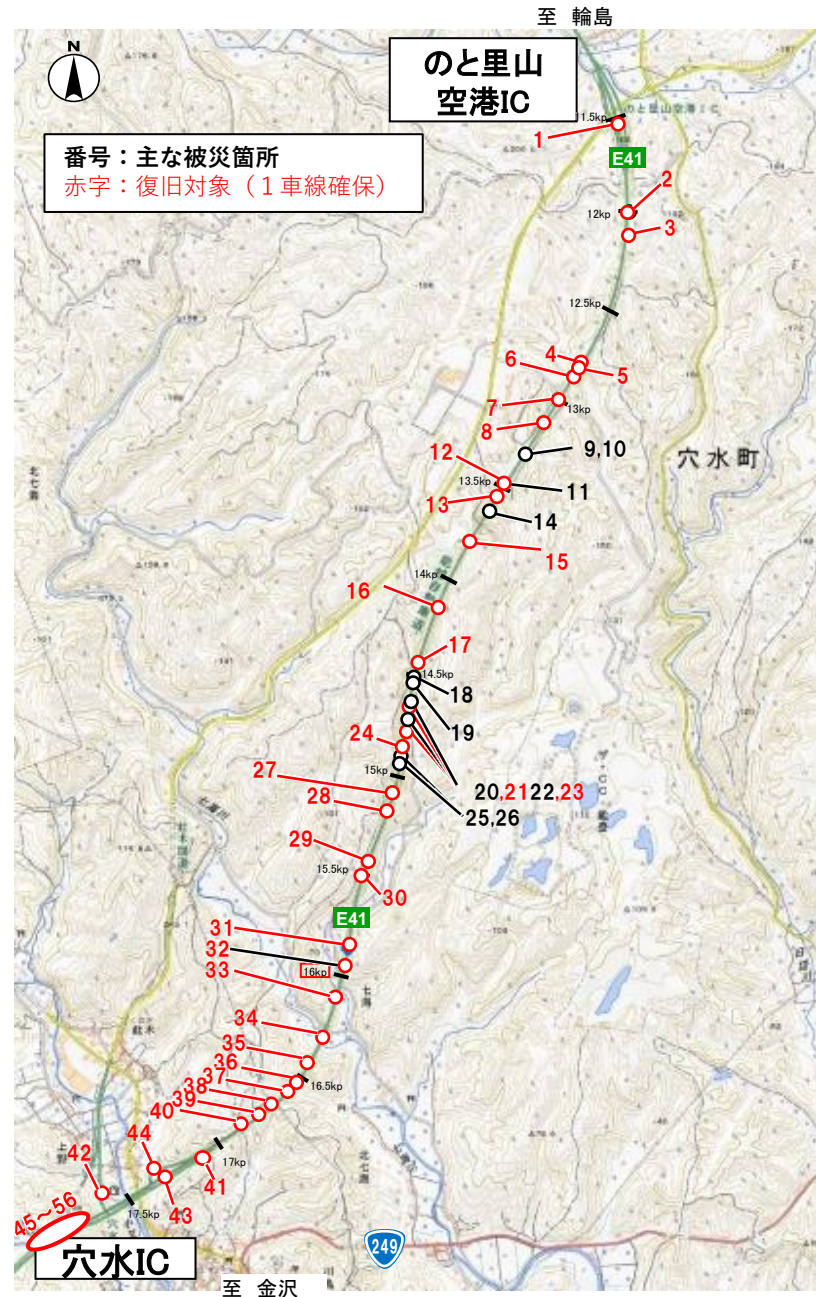

緊急復旧完了（1車線確保）
令和6年2月2日～通行止め解除（一方通行）

No15付近 1車線復旧完了



No16付近 1車線復旧完了



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月31日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)
46箇所完了 (舗装以外) / 46箇所
※引き続き舗装施工中

No32 舗装状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月30日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所舗装以外完了／46箇所）
※引き続き舗装施工中

No32 舗装状況



R6.1.30 撮影



R6.1.30 撮影



緊急復旧作業中 (1車線確保)
(46箇所 舗装以外完了 / 46箇所)
※引き続き舗装施工中

No41～42 舗装状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月28日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所 舗装以外完了 / 46箇所）
※引き続き舗装施工中

No17～29 舗装状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月27日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所 舗装以外完了 / 46箇所）
※引き続き舗装施工中

No17～29 舗装・段差復旧状況



R6.1.27撮影



R6.1.27撮影

令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月26日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所 舗装以外完了 / 46箇所）
※引き続き舗装施工中

No15 舗装・段差復旧状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月25日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所 舗装以外完了 / 46箇所）
※引き続き舗装施工中

復旧箇所の除雪状況



R6.1.25撮影



R6.1.25撮影

令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月23日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所 舗装以外完了 / 46箇所）
※引き続き舗装施工中

No41～42 舗装・段差復旧状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月22日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）
（39箇所完／46箇所）

No41～42 段差復旧状況



R6.1.22撮影




R6.1.22撮影

令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月21日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

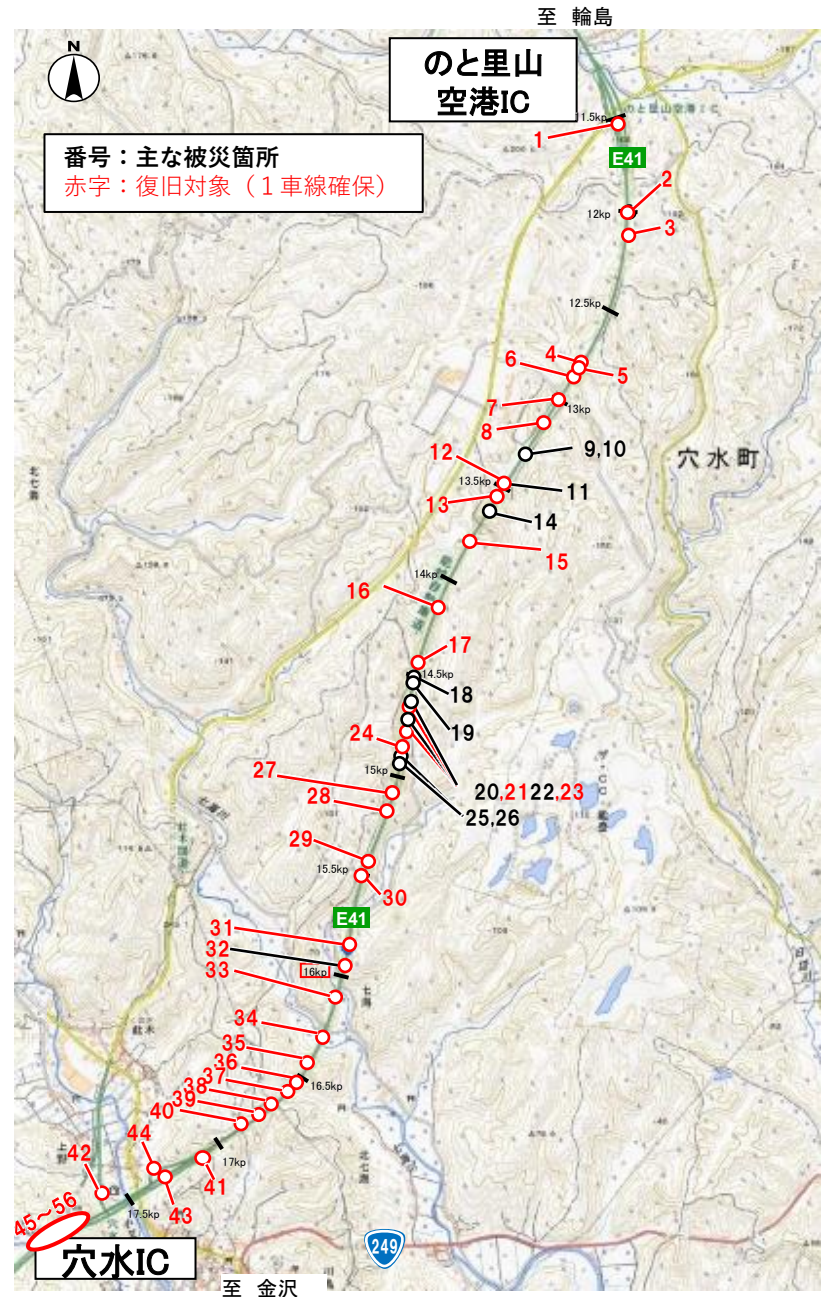

緊急復旧作業中 (1車線確保)
(39箇所完/46箇所)

No41～42 段差復旧状況



R6.1.21撮影




R6.1.21撮影

令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月19日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

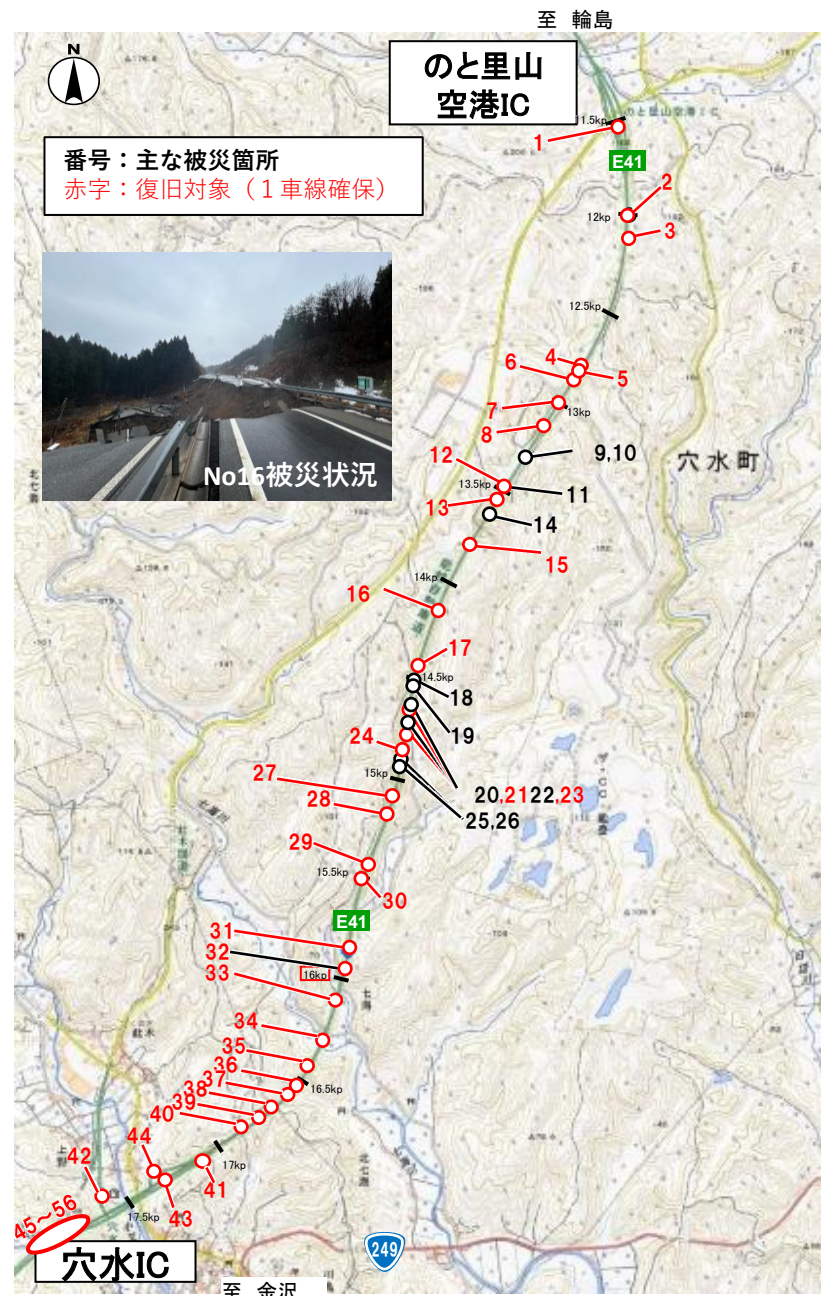

緊急復旧作業中 (1車線確保)
(22箇所完/46箇所)

No.6 段差復旧状況




No.16 迂回路造成



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月18日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

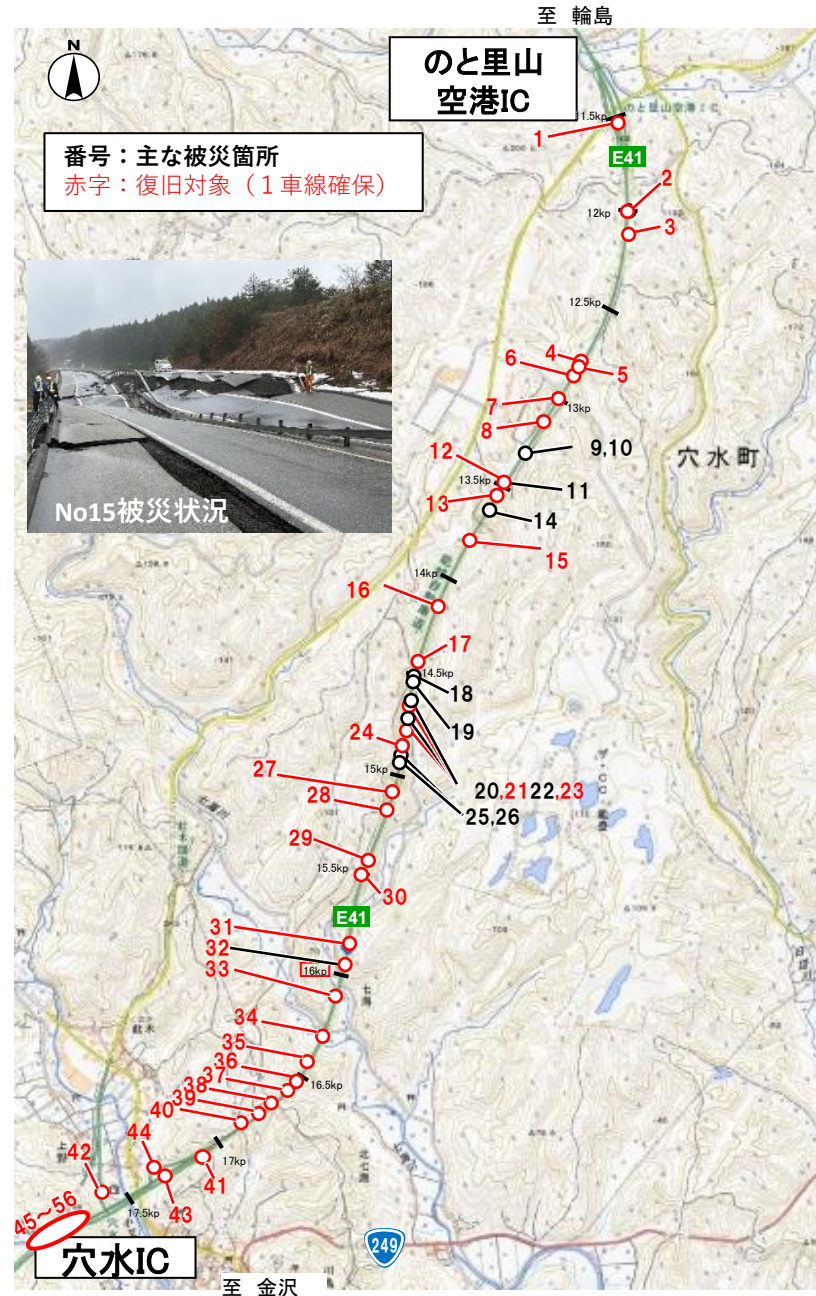

緊急復旧作業中 (1車線確保)
(20箇所完/46箇所)

No.6 段差復旧状況




No.15 法面切土



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月17日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

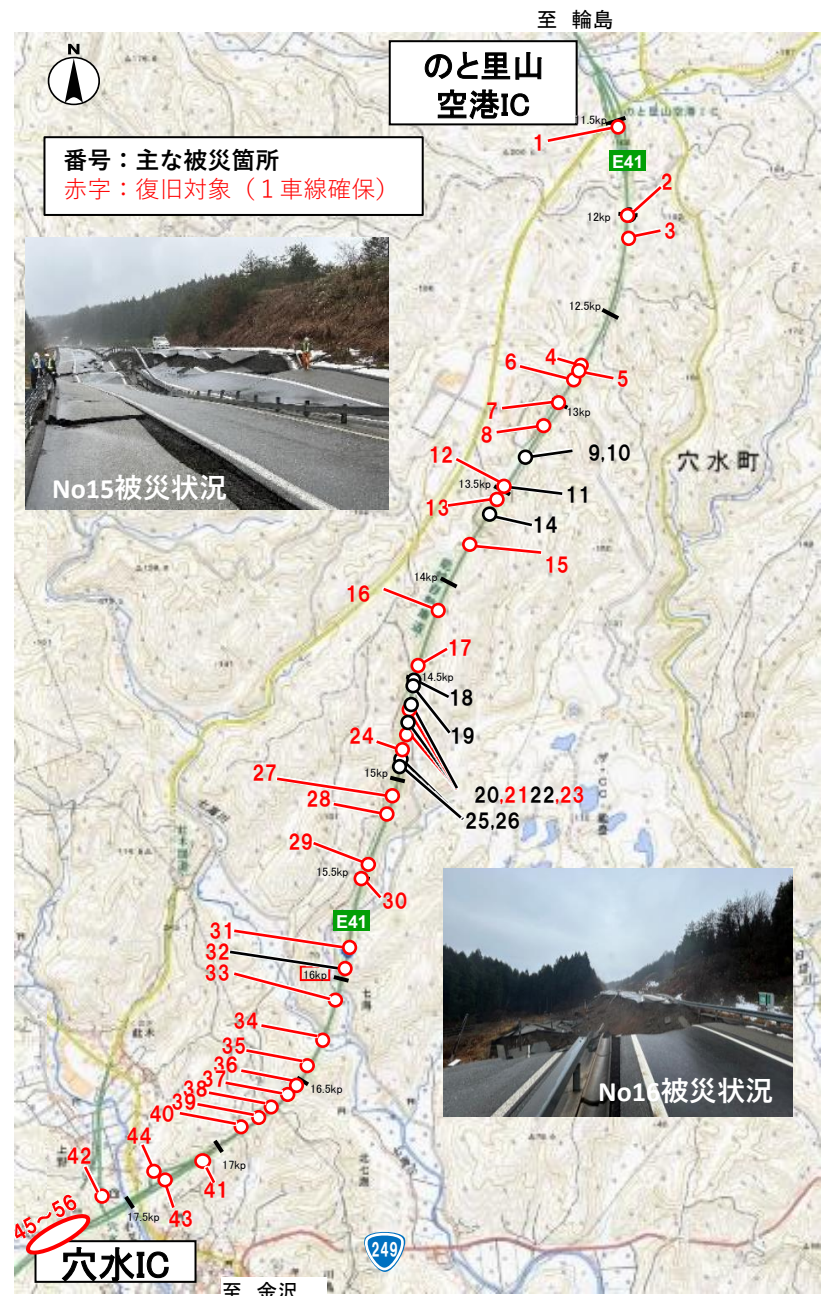

緊急復旧作業中 (1車線確保)
(13箇所完/46箇所)

No.6 段差復旧状況



No.15 碎石埋戻し状況



No.16 法面切土状況



No.51 段差擦り付け



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月16日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)
(13箇所完/46箇所)

No.6 路面亀裂、段差復旧状況



No.16 法面切土



No.51 段差擦り付け



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月15日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



No.6段差復旧状況



緊急復旧作業中（1車線確保）
（13箇所完／46箇所）

No.15碎石埋戻し状況



No.16 法面切土




No.56 段差擦り付け



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月14日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

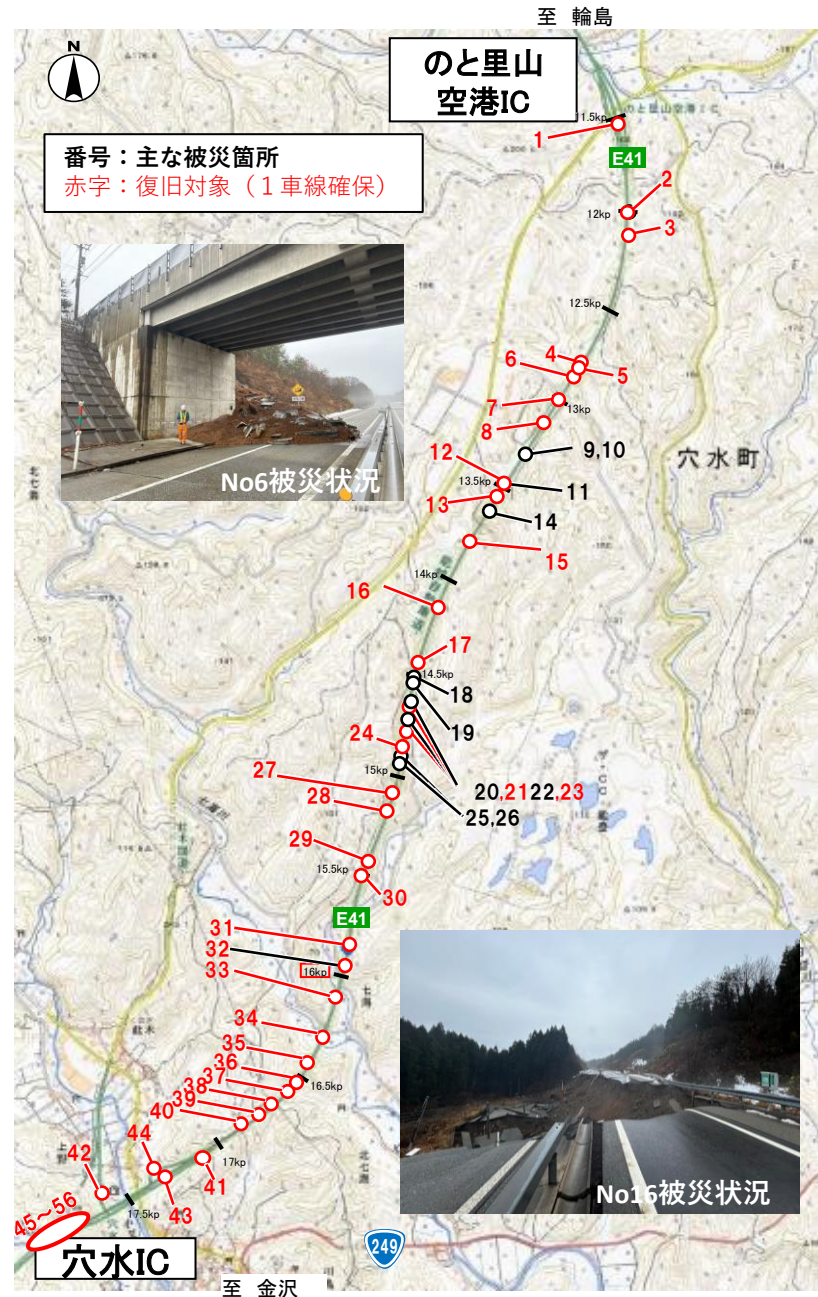

緊急復旧作業中 (1車線確保)
(13箇所完/46箇所)

No.6 土嚢設置




No.16 切土状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月13日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

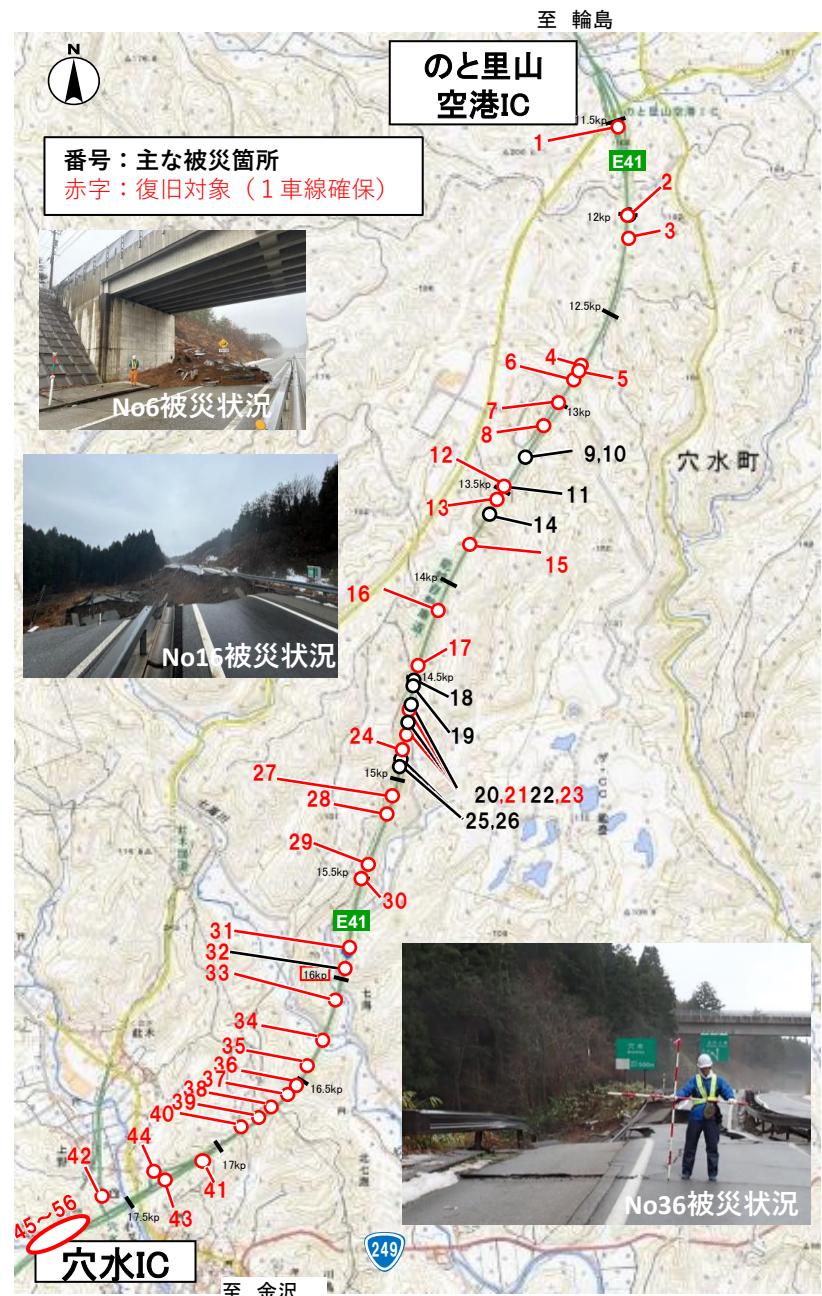

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (1車線確保)



No.6被災状況



No.15被災状況



No.36被災状況

緊急復旧作業中 (1車線確保)

No.6 土嚢設置



R6.1.13撮影

No.16 切土状況



工事名 能越道啓閉工事
工種 測点14kp付近
R6.1.13
切土状況

R6.1.13撮影

No.36 ガードレール撤去



工事名 (仮称) 令和6年能登半島地震災害復旧工事
工種 災害復旧工測点穴水
kp.16.5付近
落盤流出防止
ガードレール基礎、水路、As舗装撤去


R6.1.13撮影

令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月12日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

緊急復旧作業中 (1車線確保)

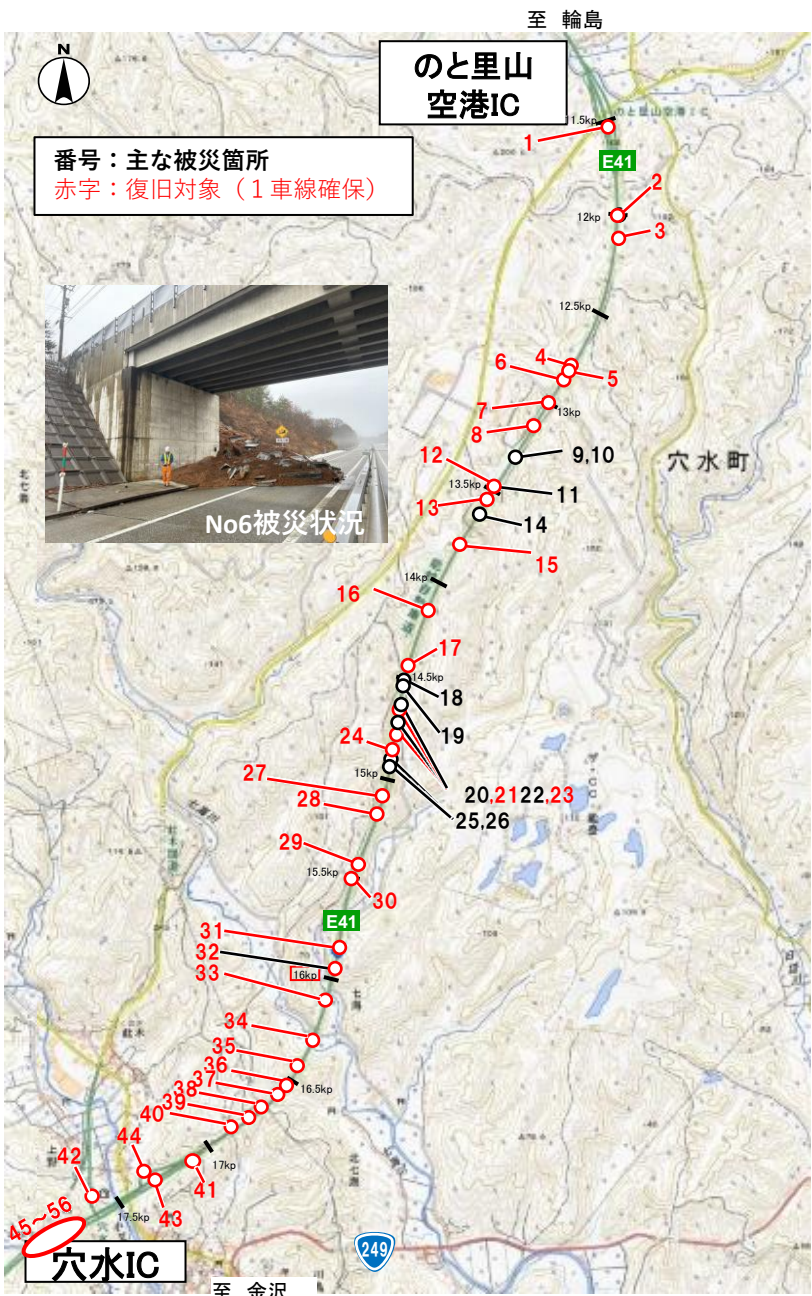

No.6 掘削・土嚢設置状況




令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月11日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

緊急復旧作業中 (1車線確保)

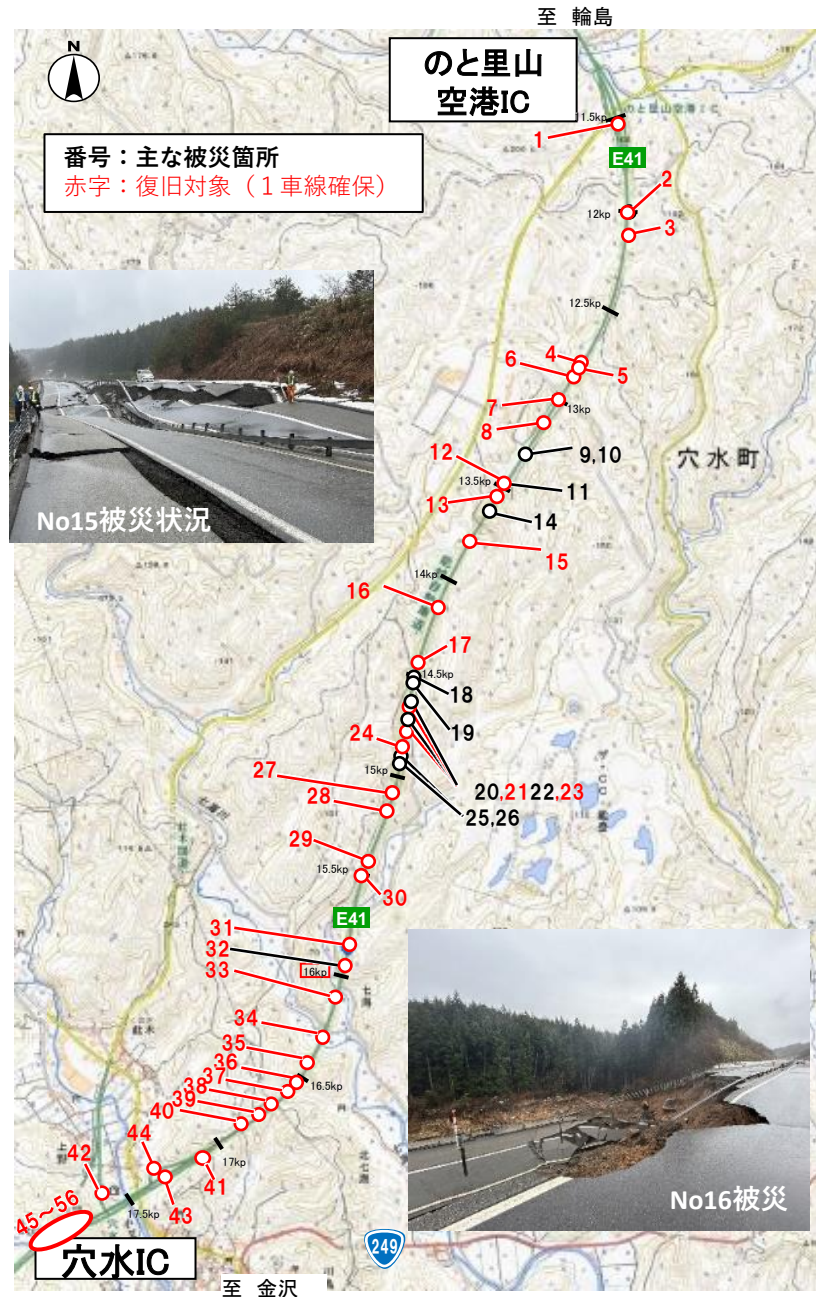

No.15 砕石充填状況



No.16 砕石充填状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月10日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

緊急復旧作業中 (1車線確保)

No.35～42 碎石充填

