

令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

5月20日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）



No.44付近 側溝設置状況



No.28付近 乳剤散布状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

5月13日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.18付近 路盤工状況



No.16 切土準備工状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））


5月7日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.11 路盤工状況



No.44付近 鋼矢板打設状況

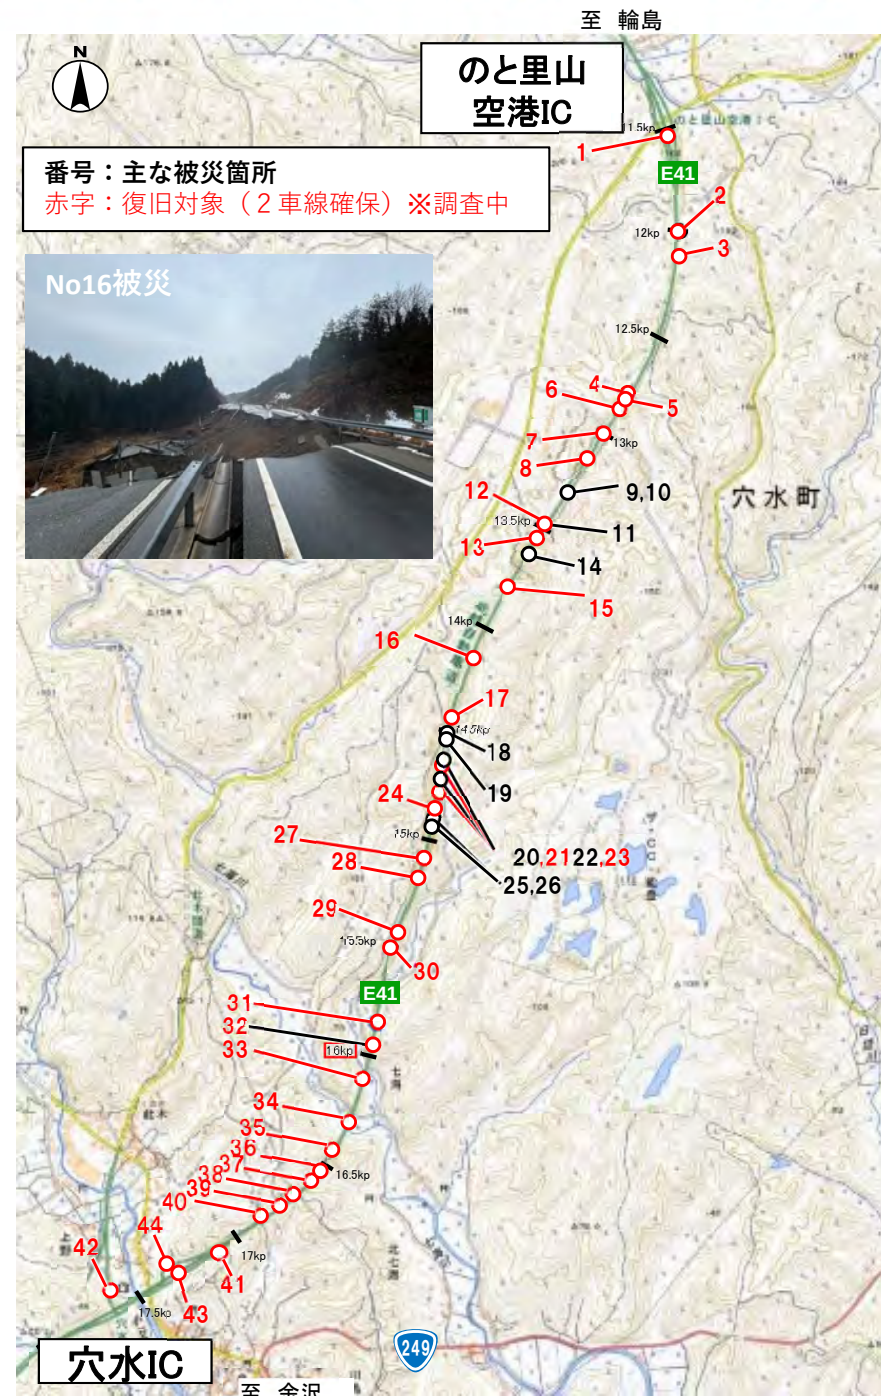


令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

4月30日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

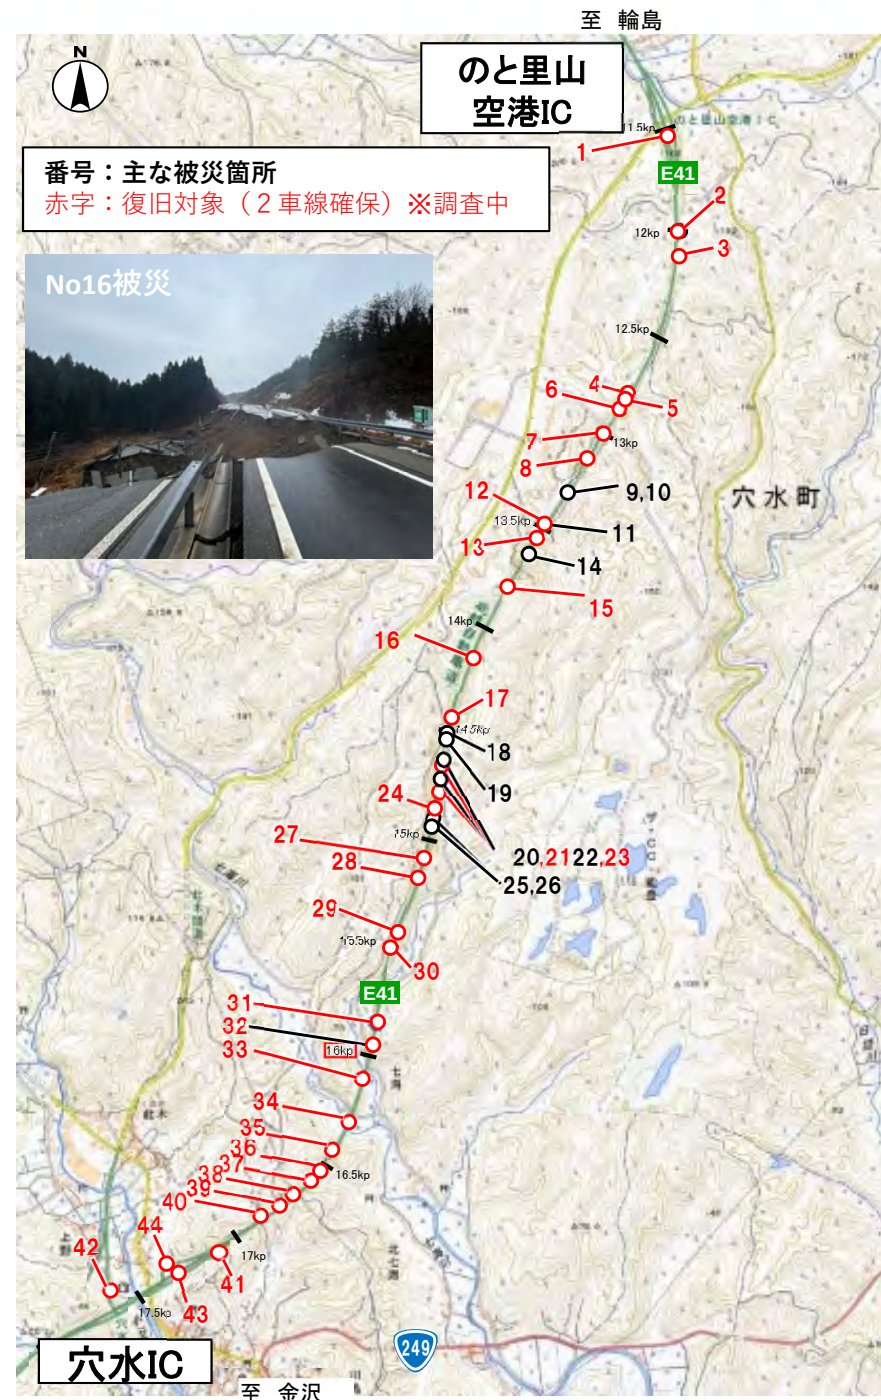

No.15付近 仮栈橋Gr設置状況



No.44付近 鋼矢板打設状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））


4月22日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.15付近 路床改良状況



No.44付近 鋼矢板打設状況

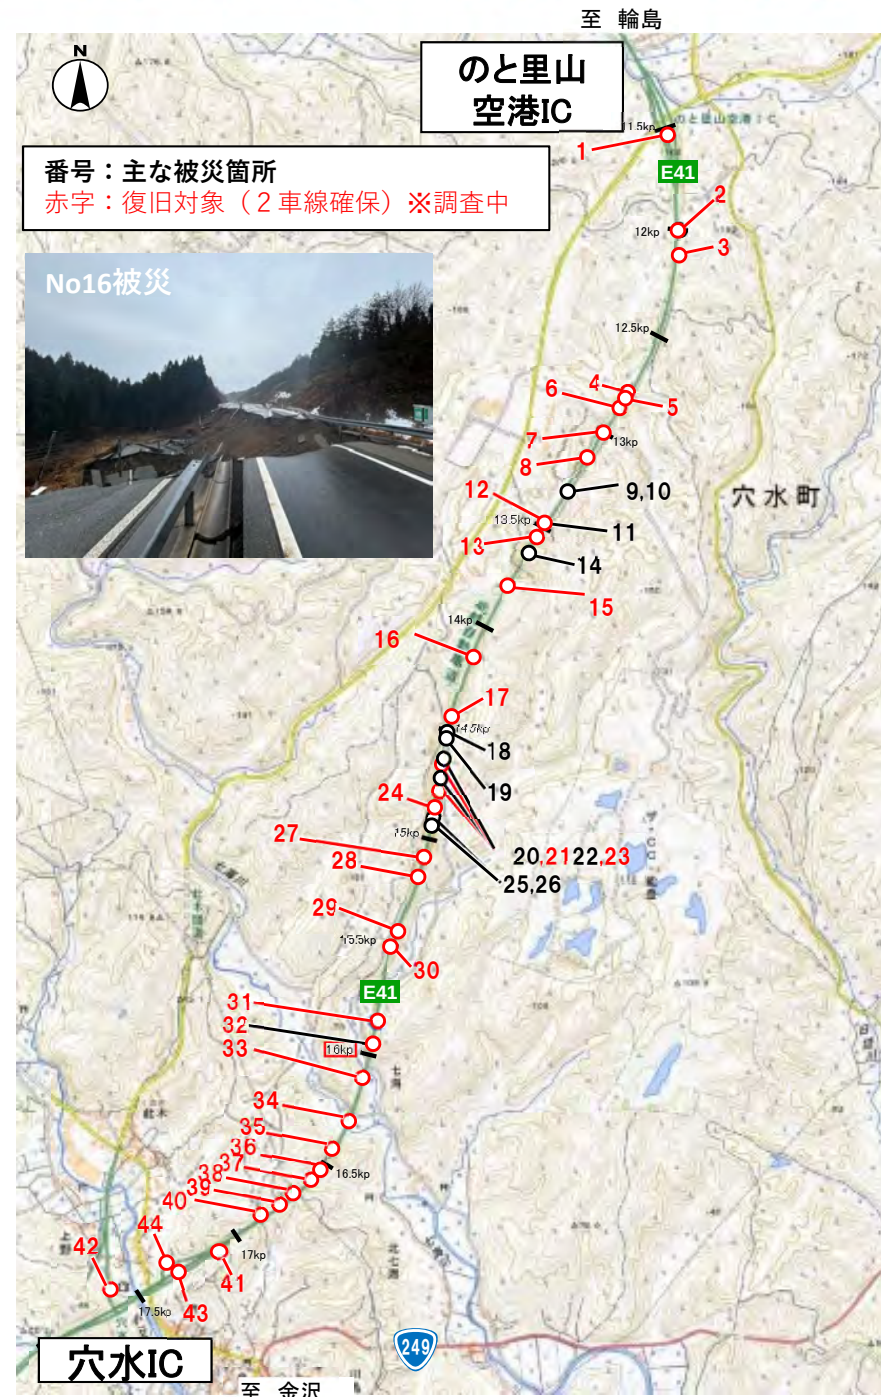


令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

4月15日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

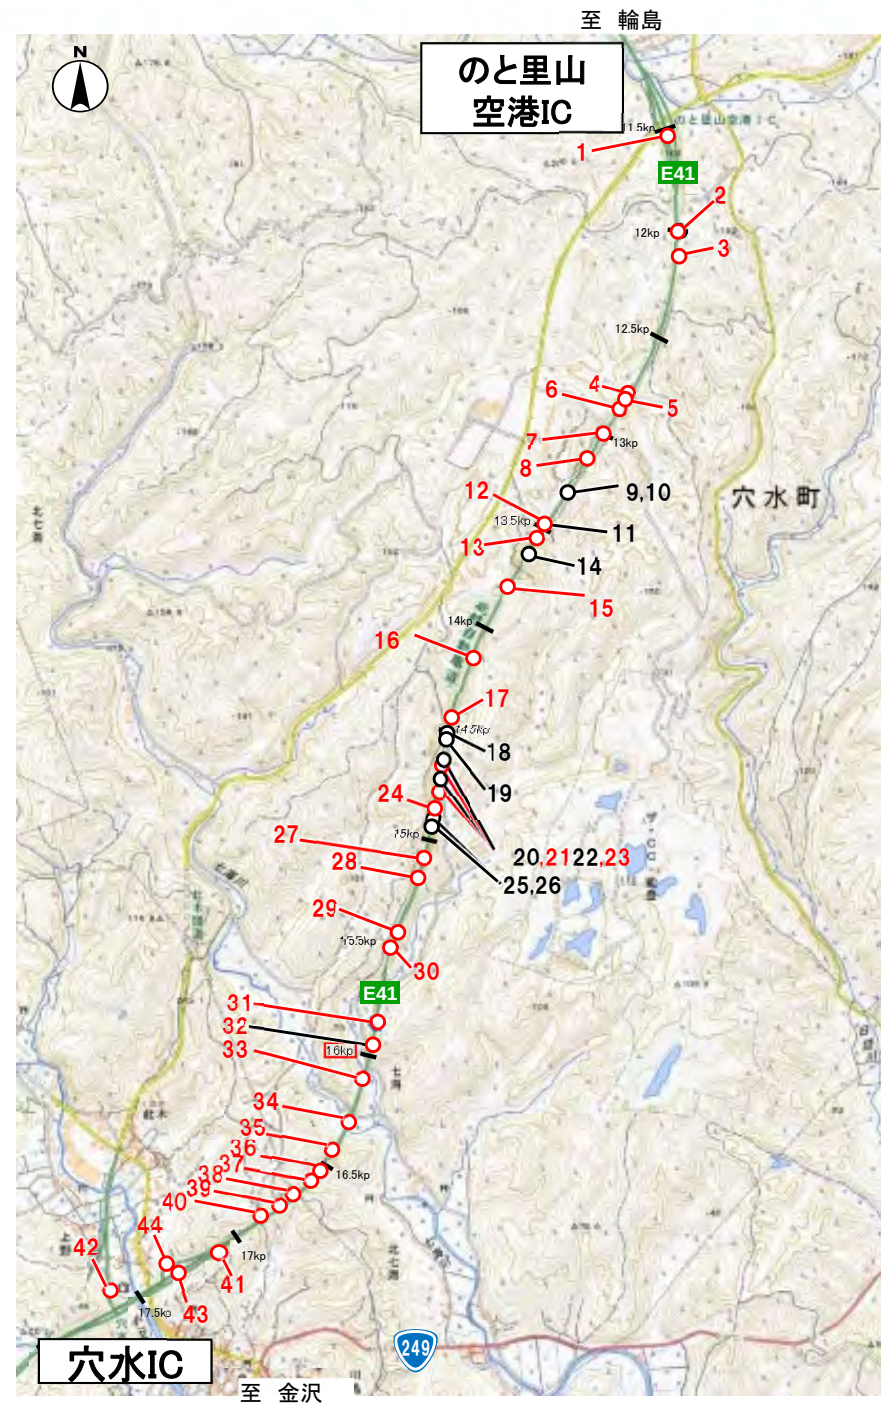

No.16付近 仮栈橋設置状況



No.44付近 法面切土掘削状況




令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

4月8日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

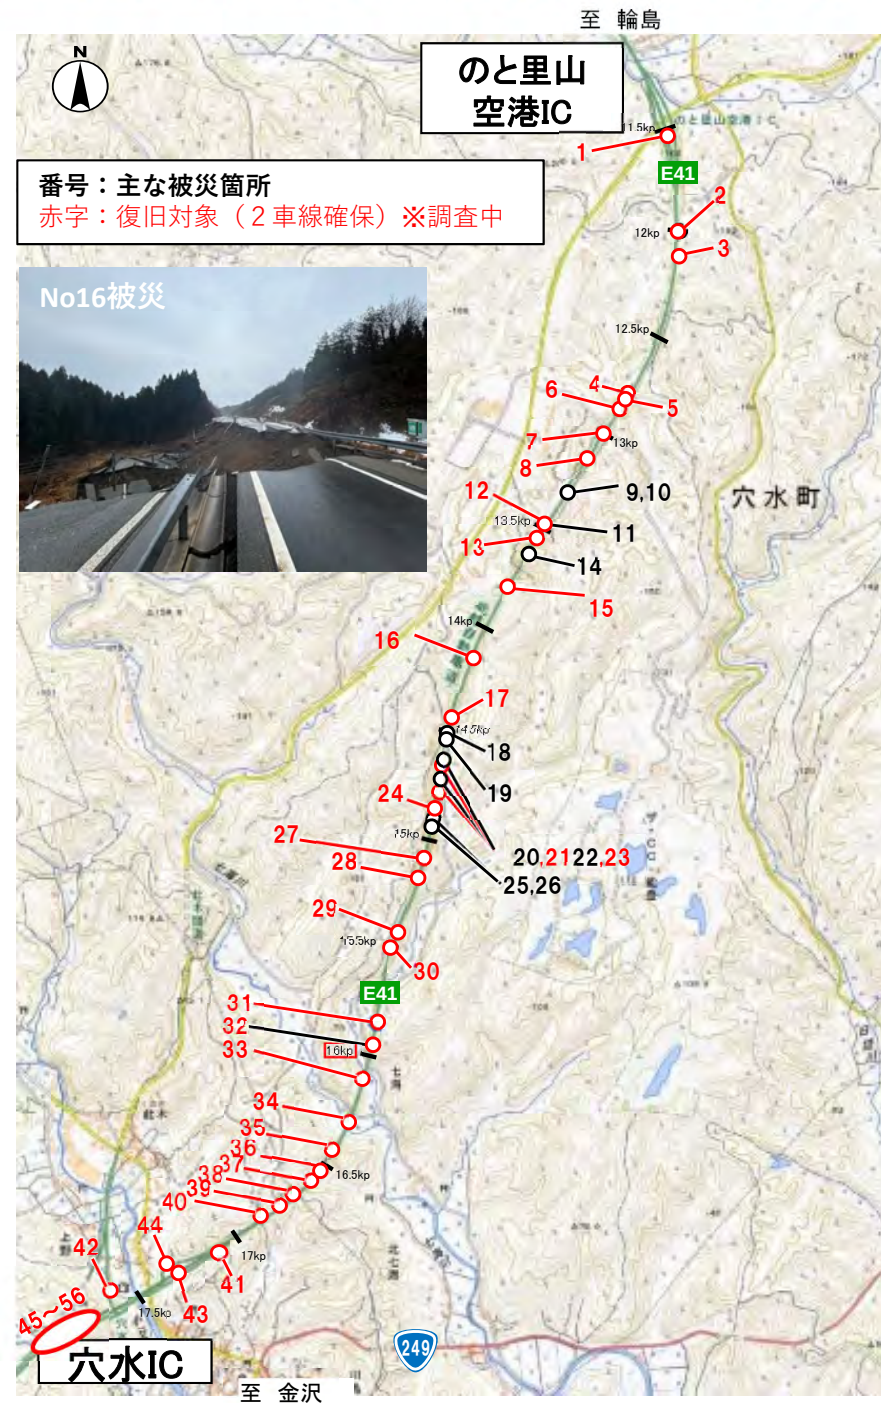

No.16付近 仮栈橋設置状況




No.37付近 碎石敷均・転圧状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

3月25日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

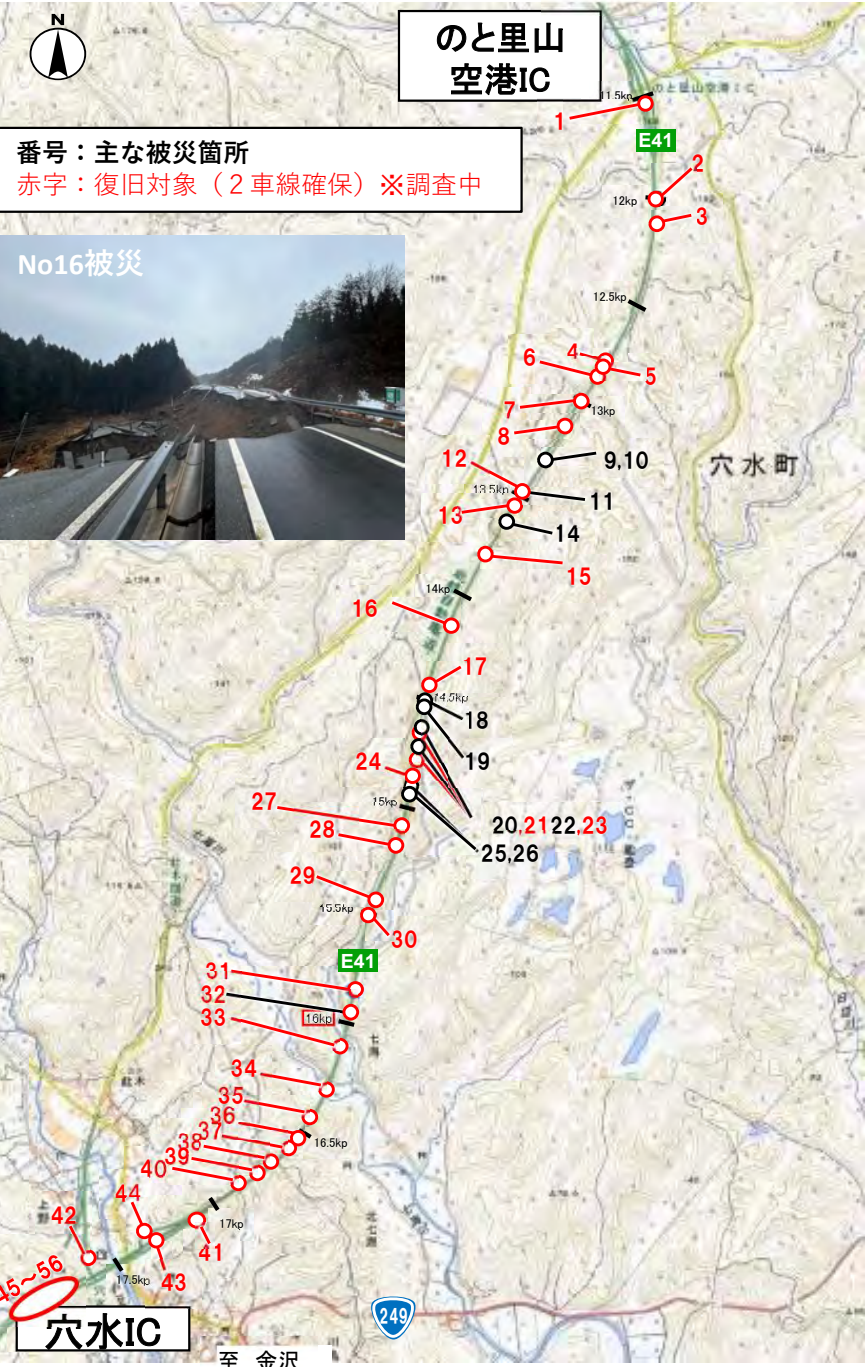

No.16付近 仮栈橋取付け状況




No.51 大型土嚢設置、碎石投入・転圧状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

3月18日現在

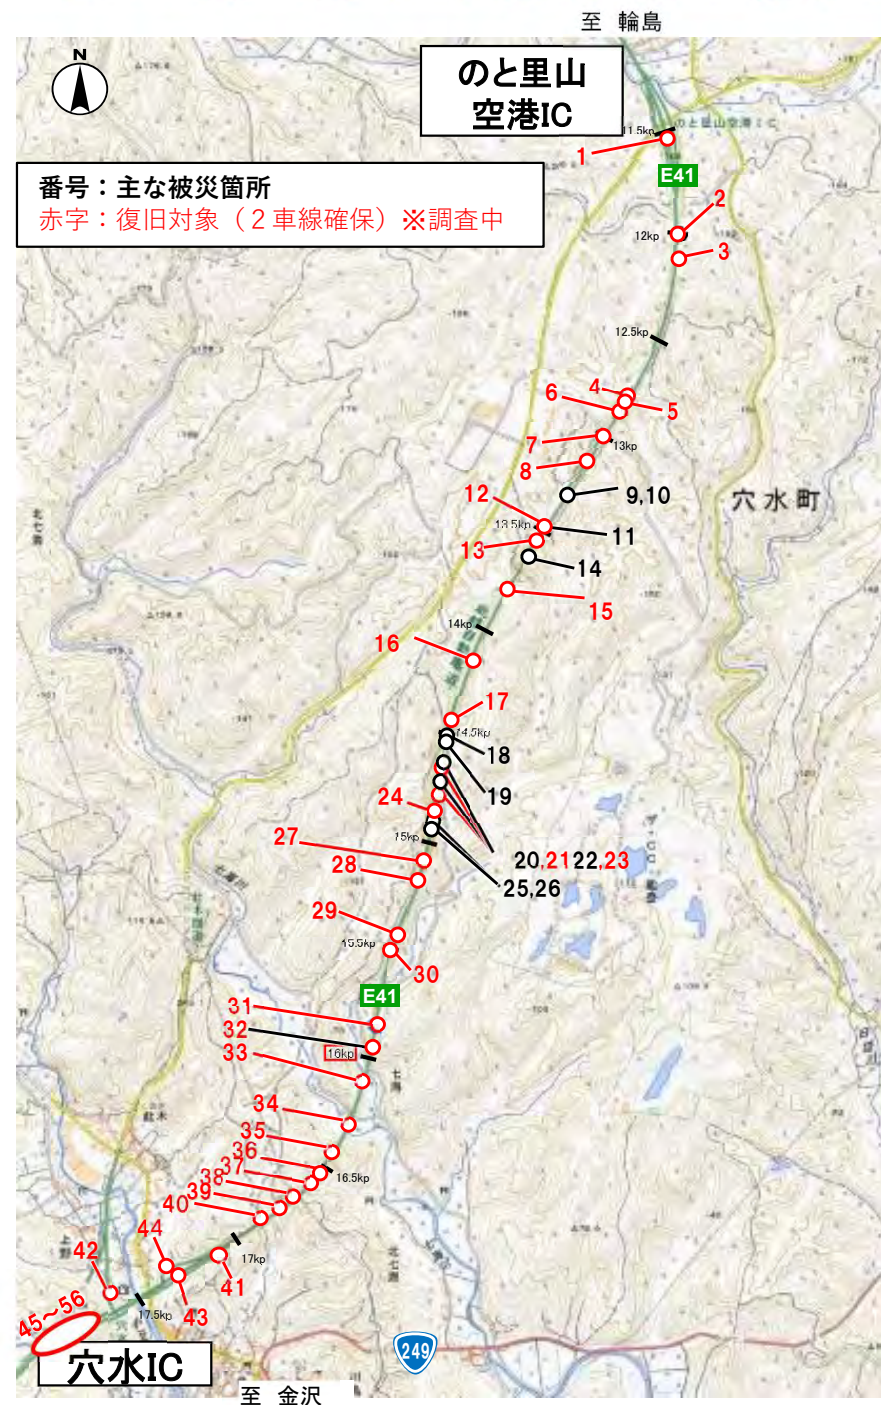

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.16付近 仮栈橋摺り付け土工状況




No.37大型土嚢設置、碎石投入状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

3月15日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

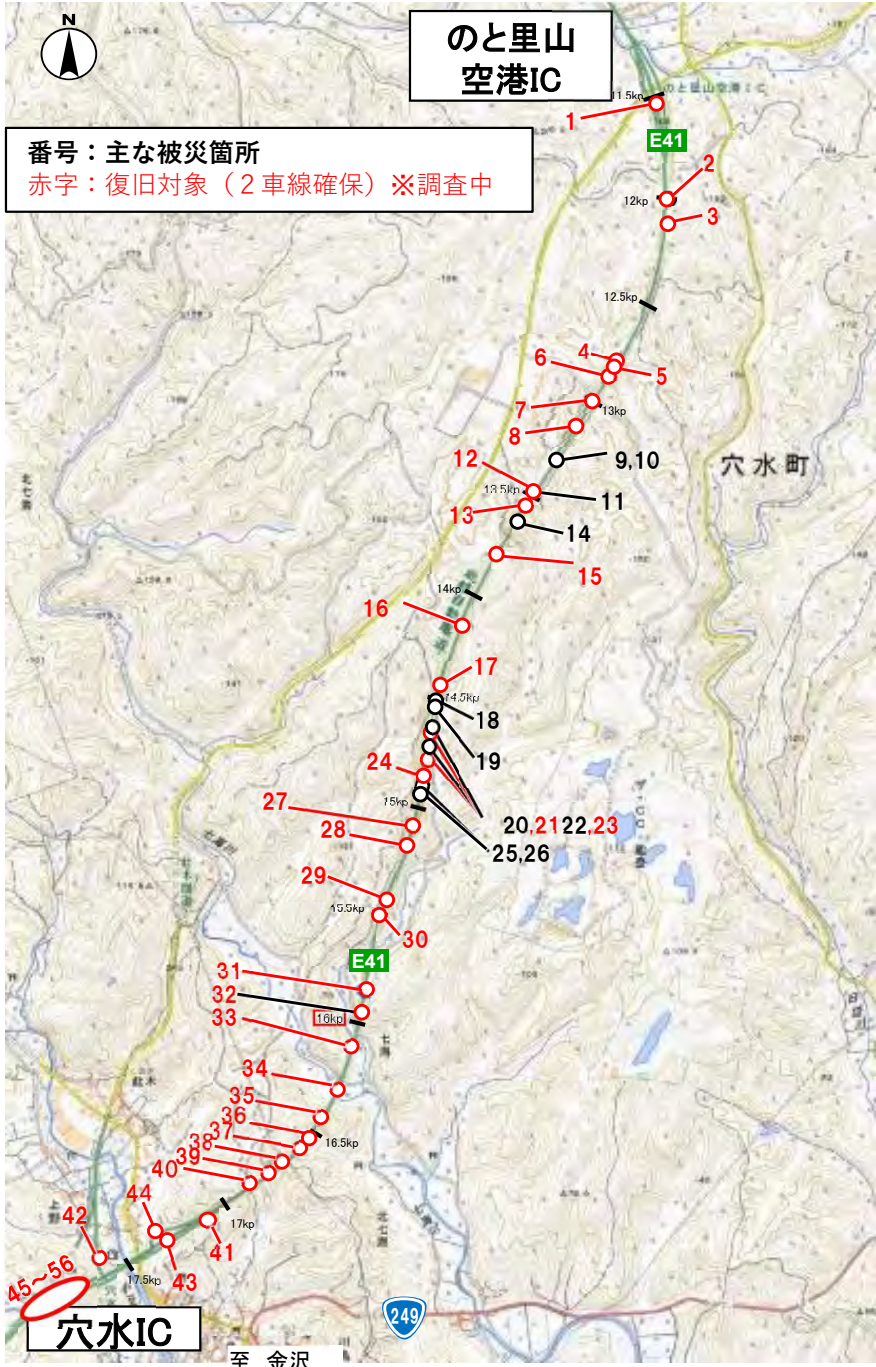

No.37 大型土のう設置・砕石投入状況



No.40付近 舗装撤去状況




令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

3月13日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

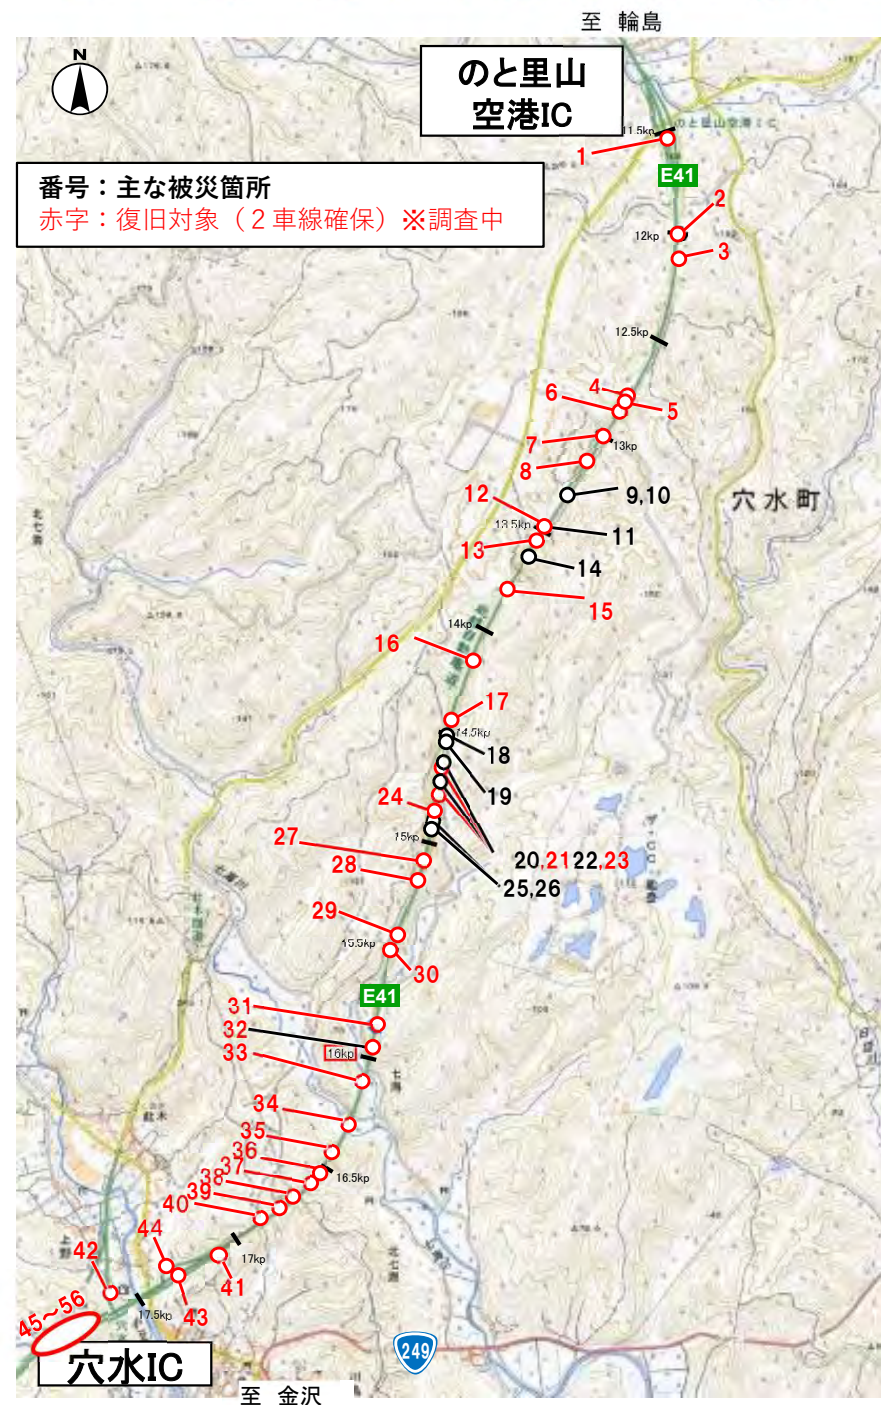

No.17 路盤材敷均し状況




No.51付近 崩落箇所埋戻し状況




令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

3月11日現在

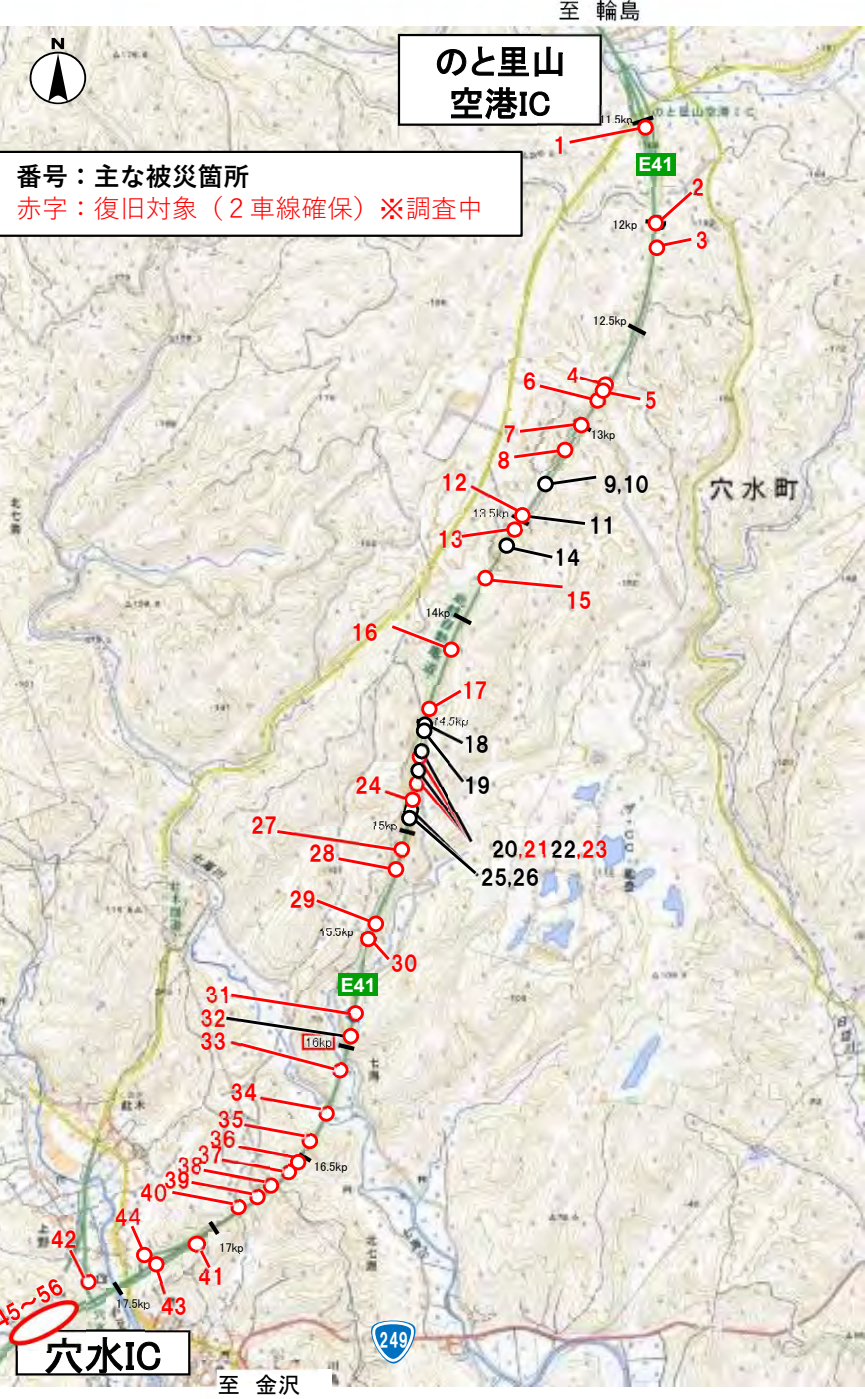

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.33付近排水用塩ビ管設置部乳剤散布状況

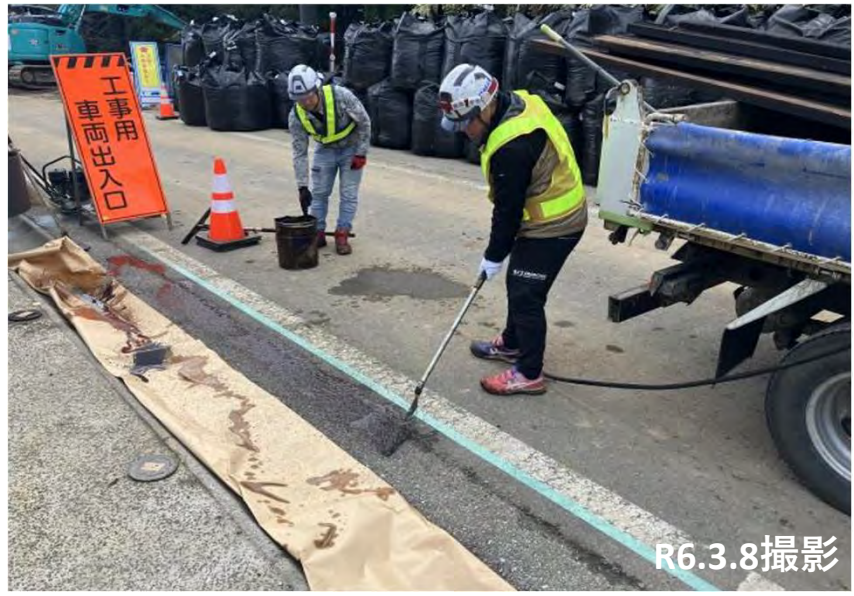

No.38付近 地盤改良状況




令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

3月8日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

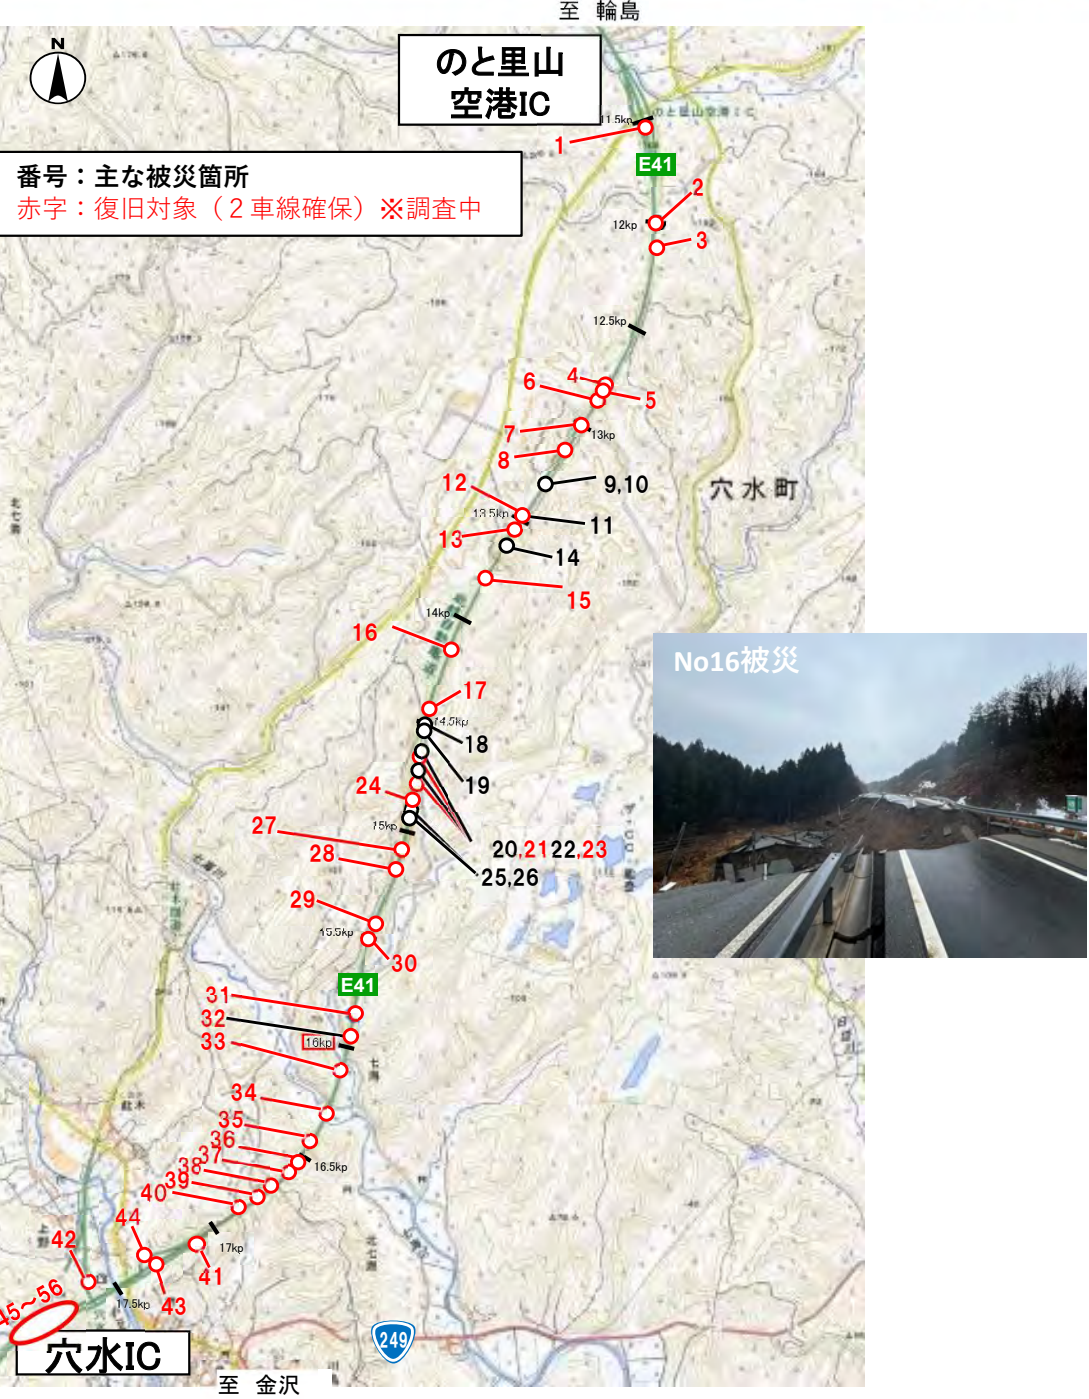

No.16付近 仮栈橋準備状況




No.43付近 舗装転圧状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

3月6日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

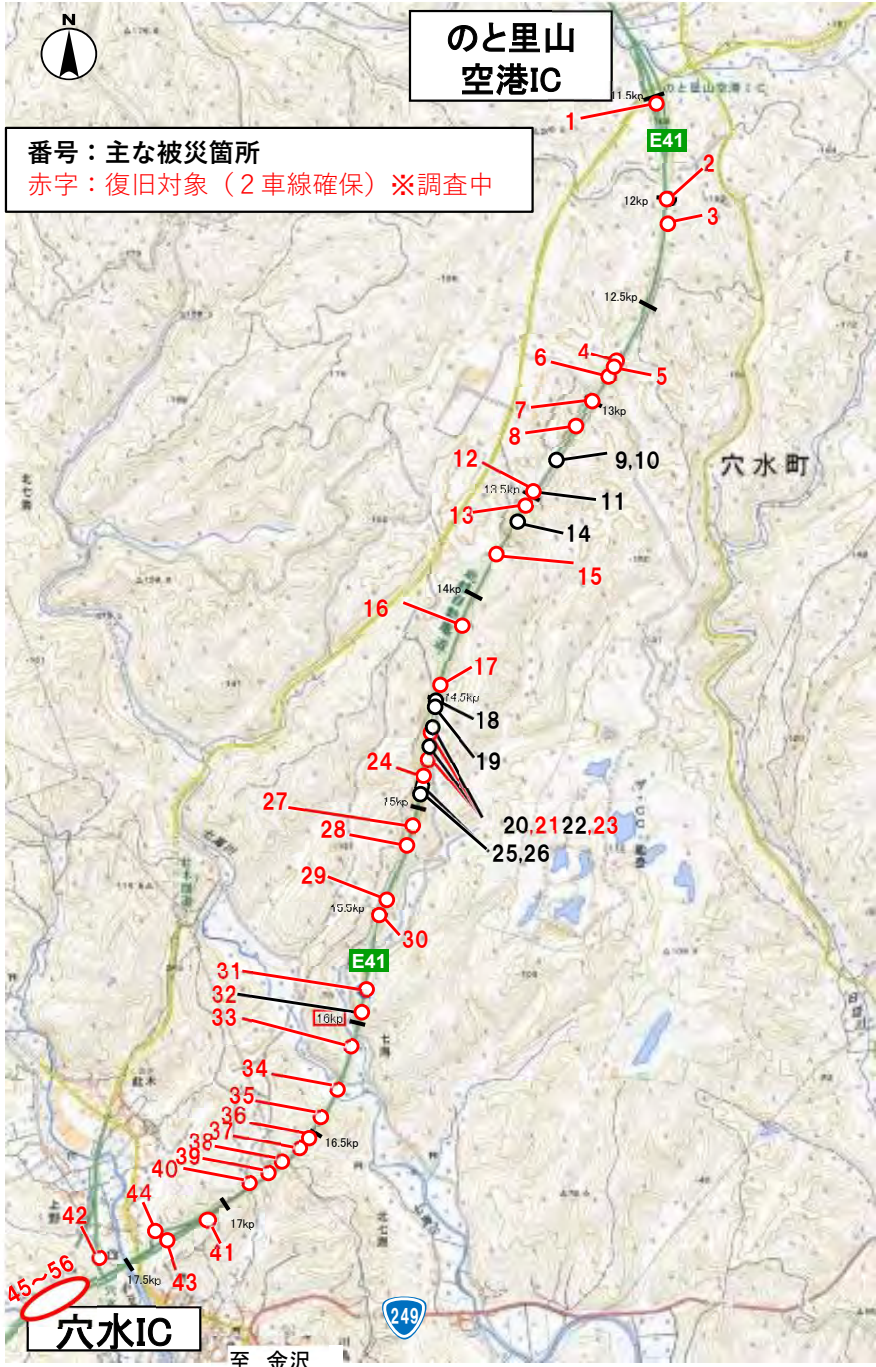

No.41付近 路盤仕上げ状況



No.51上りオフランプ 基盤改良状況




令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

3月4日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

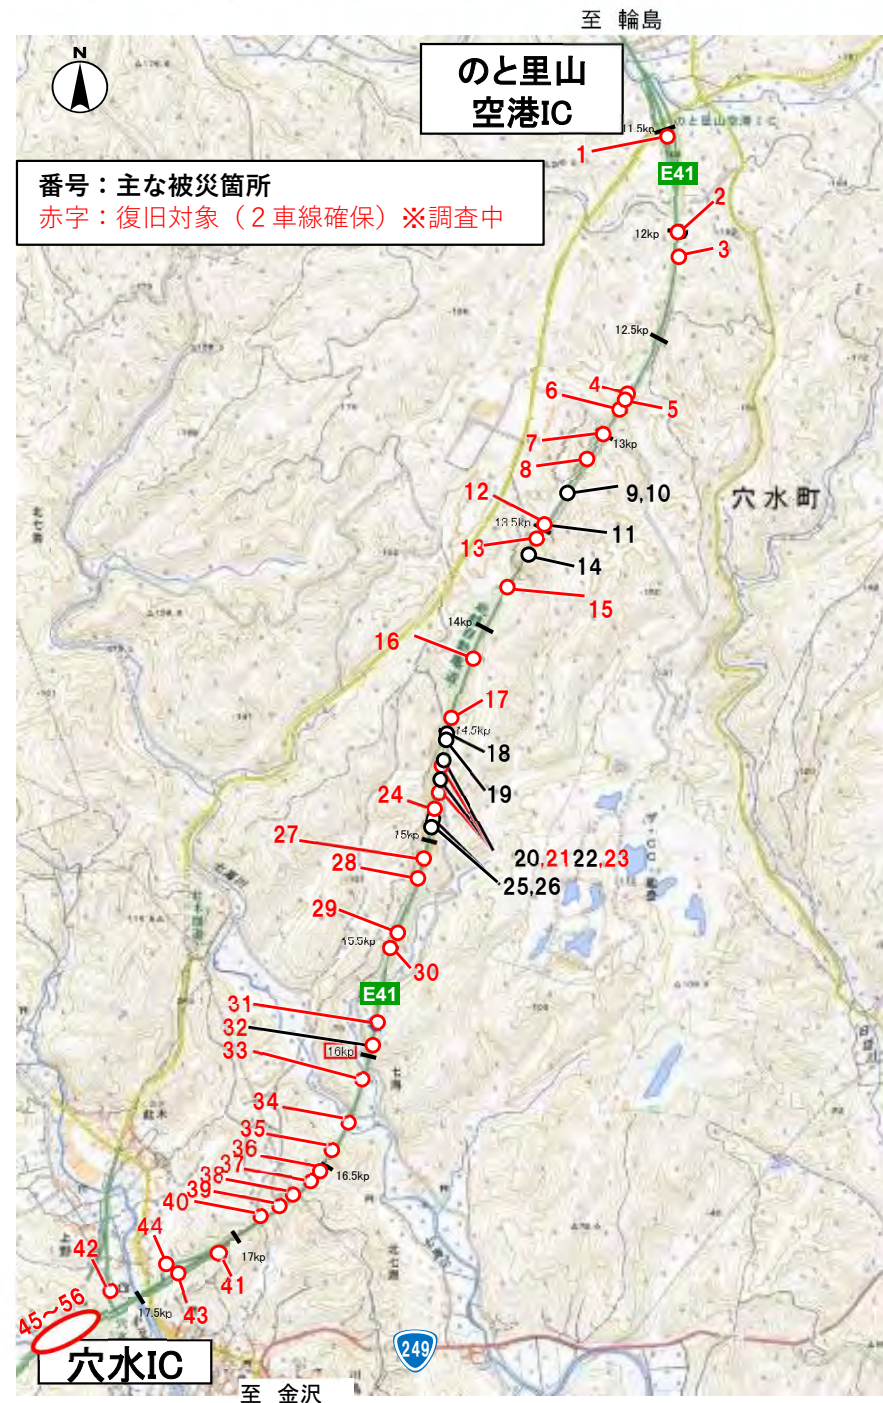

No.37付近 重機走路整備状況



No.44付近 路盤不陸整正転圧状況




令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

3月1日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

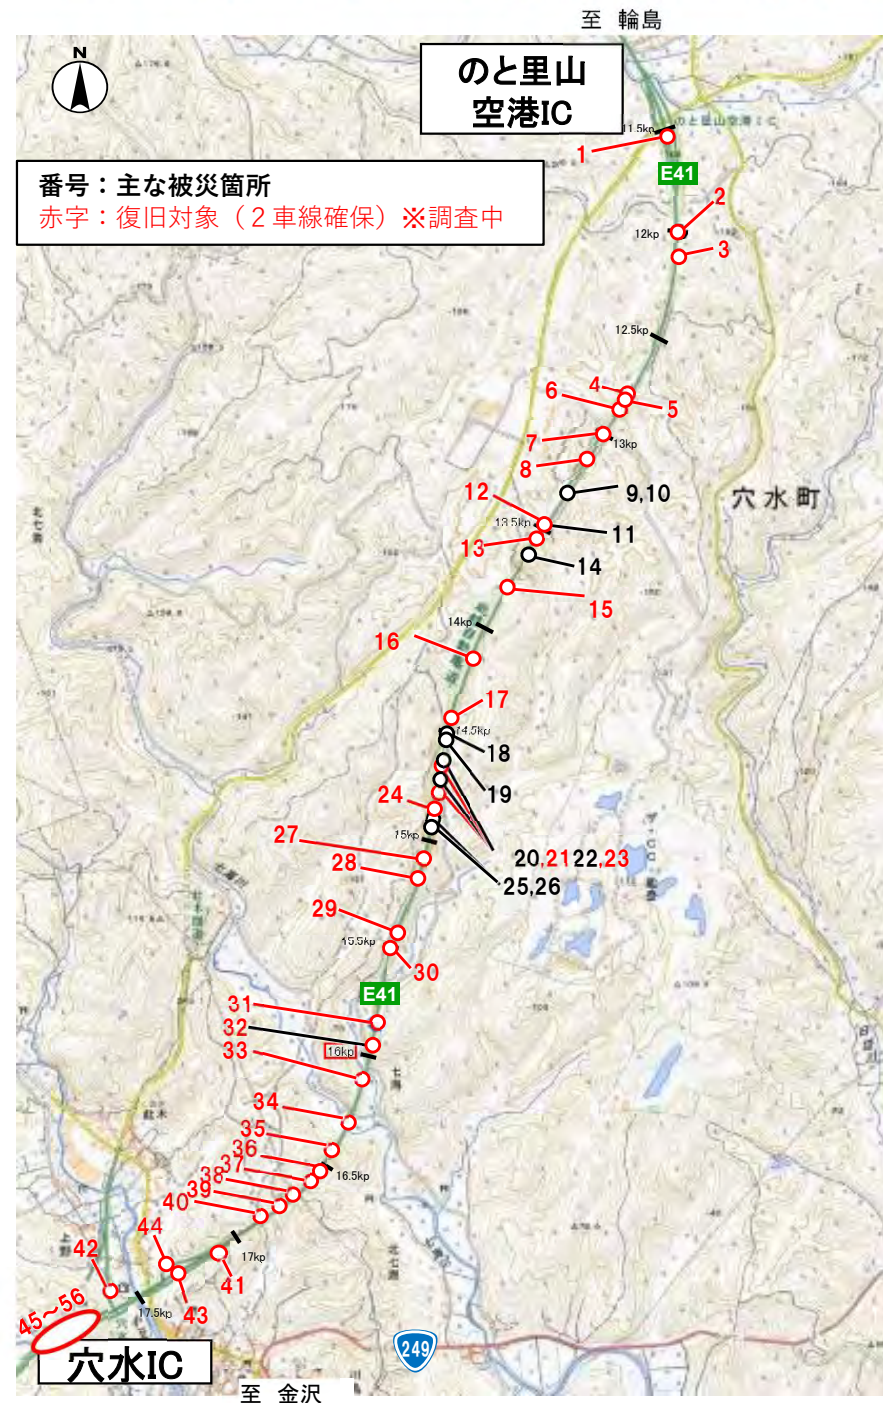

No.37付近 重機走路整備状況




No.42付近 車線切替状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

2月28日現在

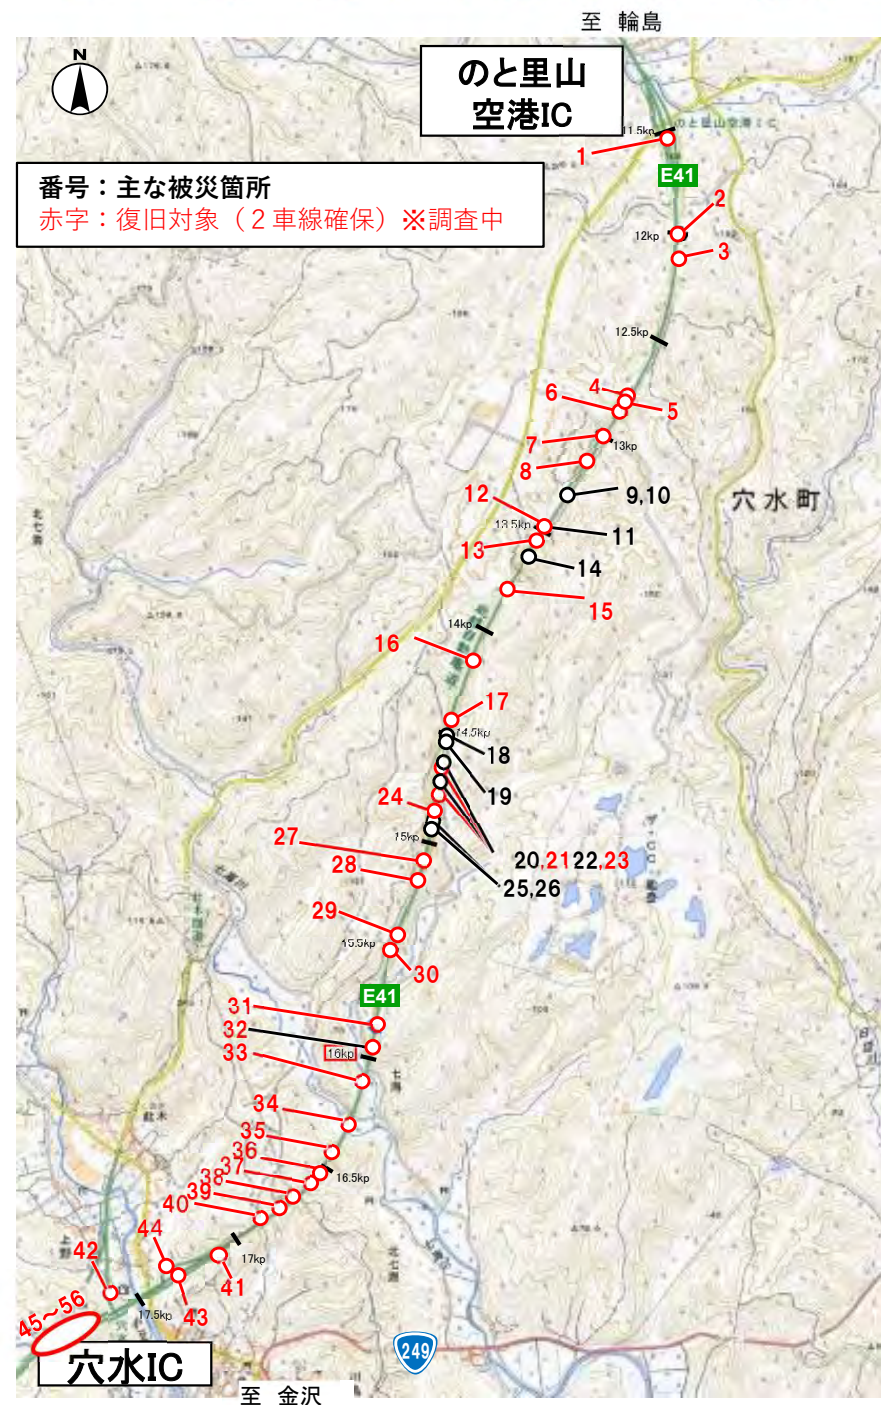

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.37付近 重機走路整備状況




No.42付近 転圧状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

2月26日現在

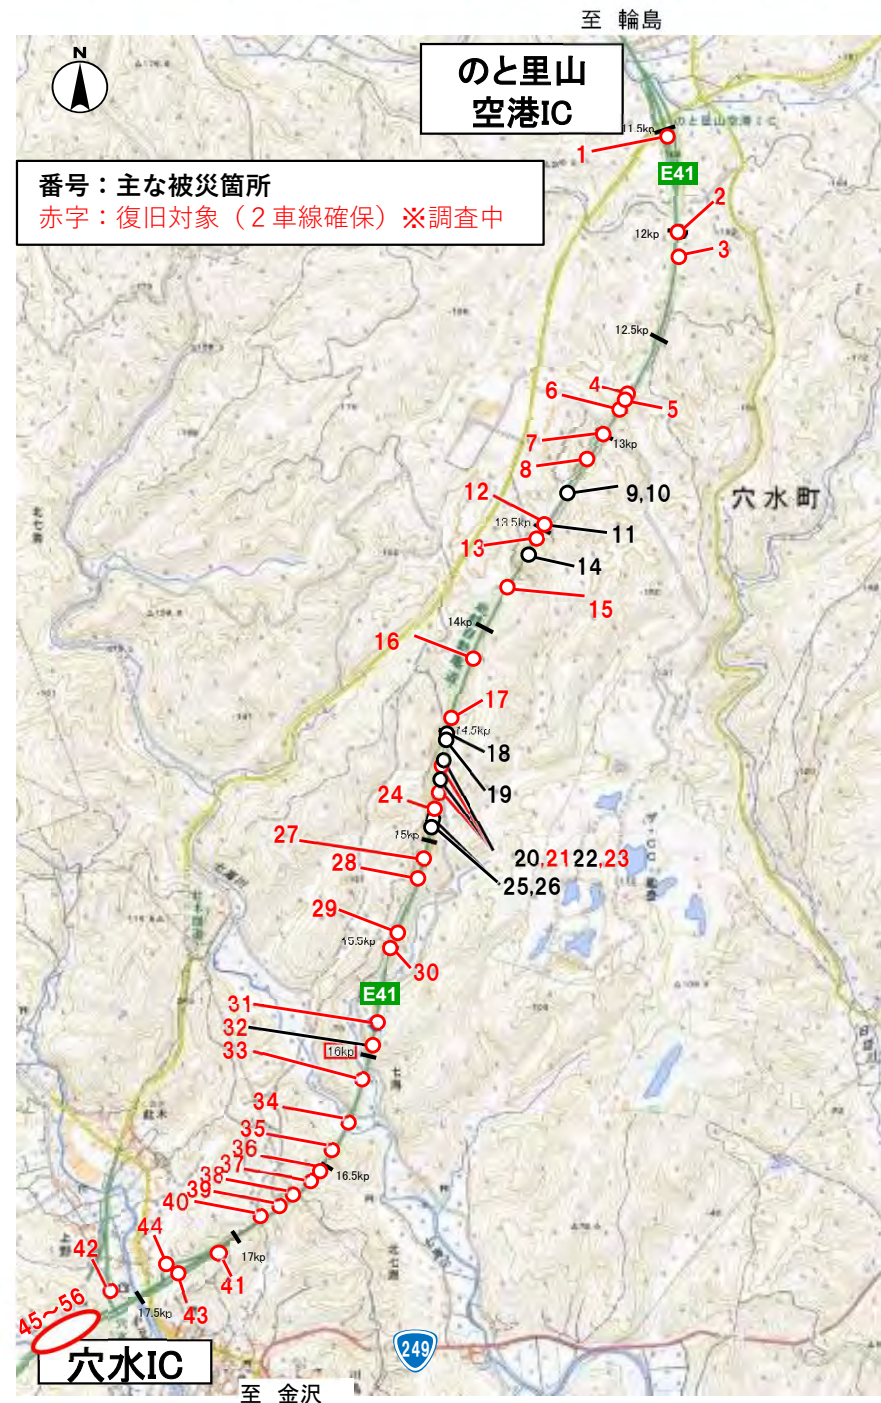

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.33付近 構造物撤去状況



No.44付近 砕石敷均し状況




令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

2月21日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

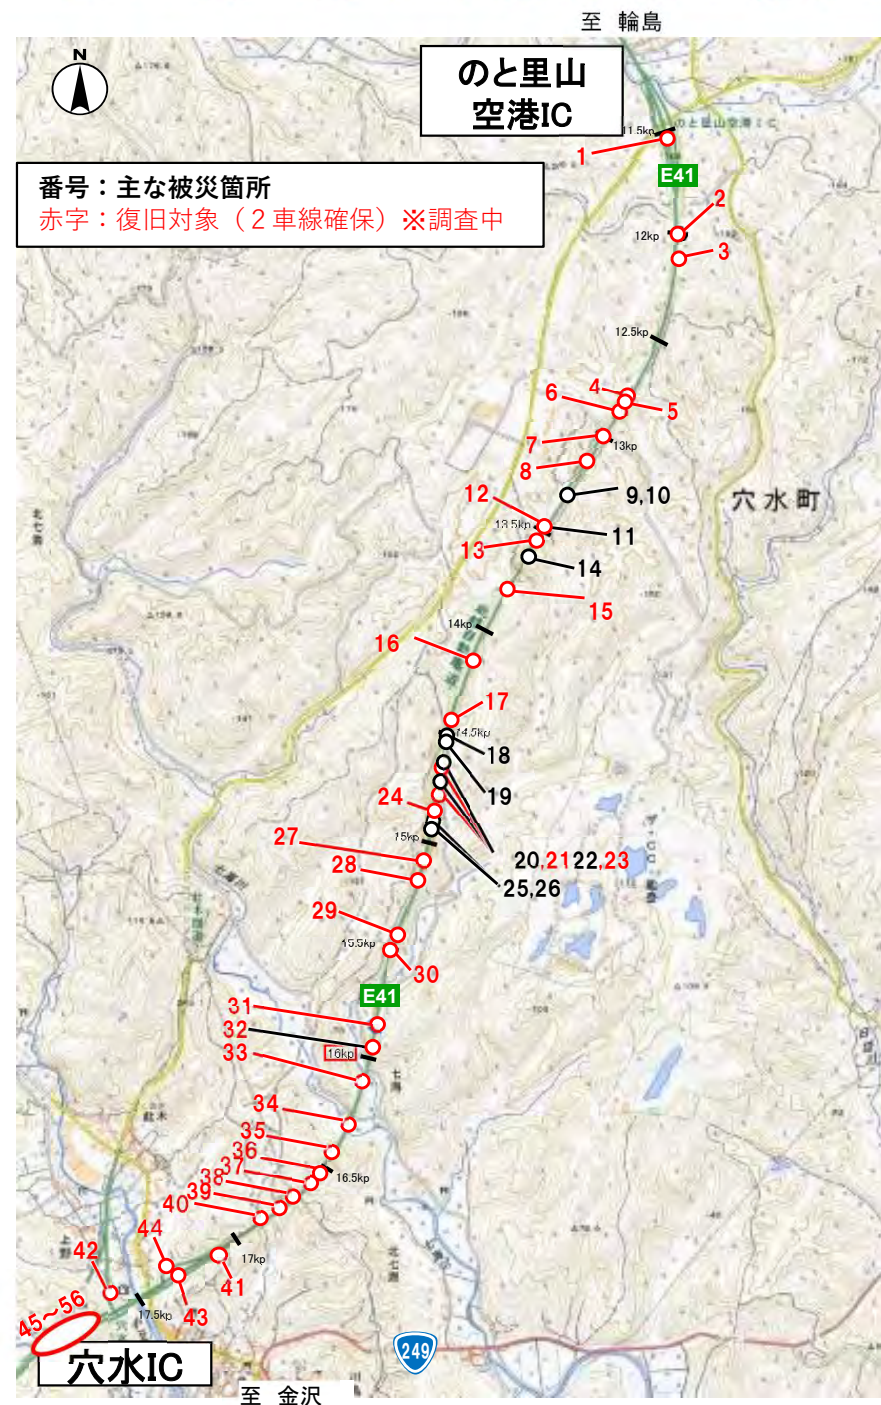

No.37付近 砕石埋戻し・土嚢設置状況



No.28付近 舗装撤去・砕石埋戻し状況




令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

2月19日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

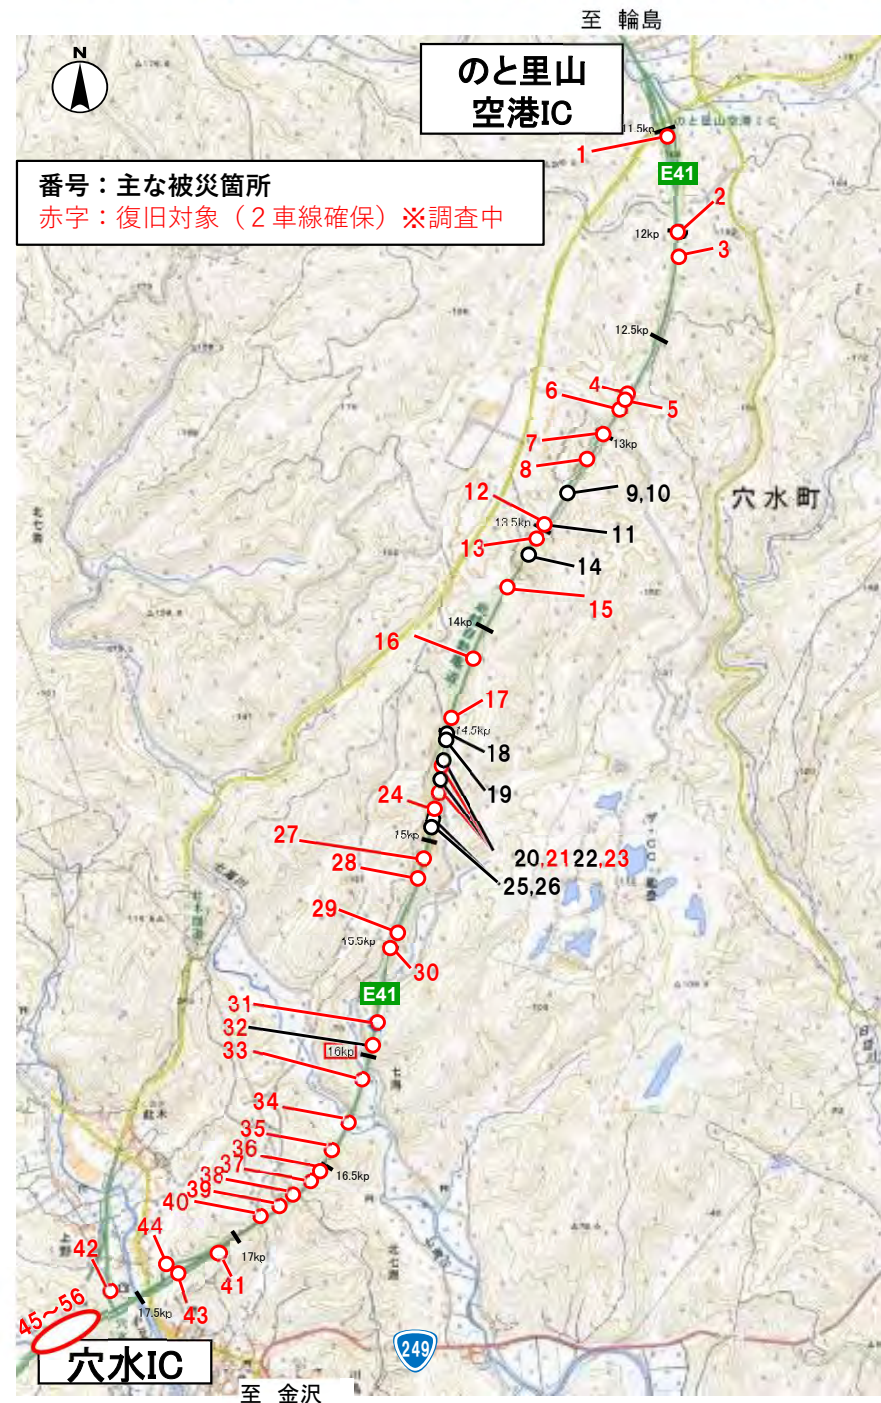

No.56 碎石埋戻し状況



No.37付近 重機足場造成状況




令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

2月15日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

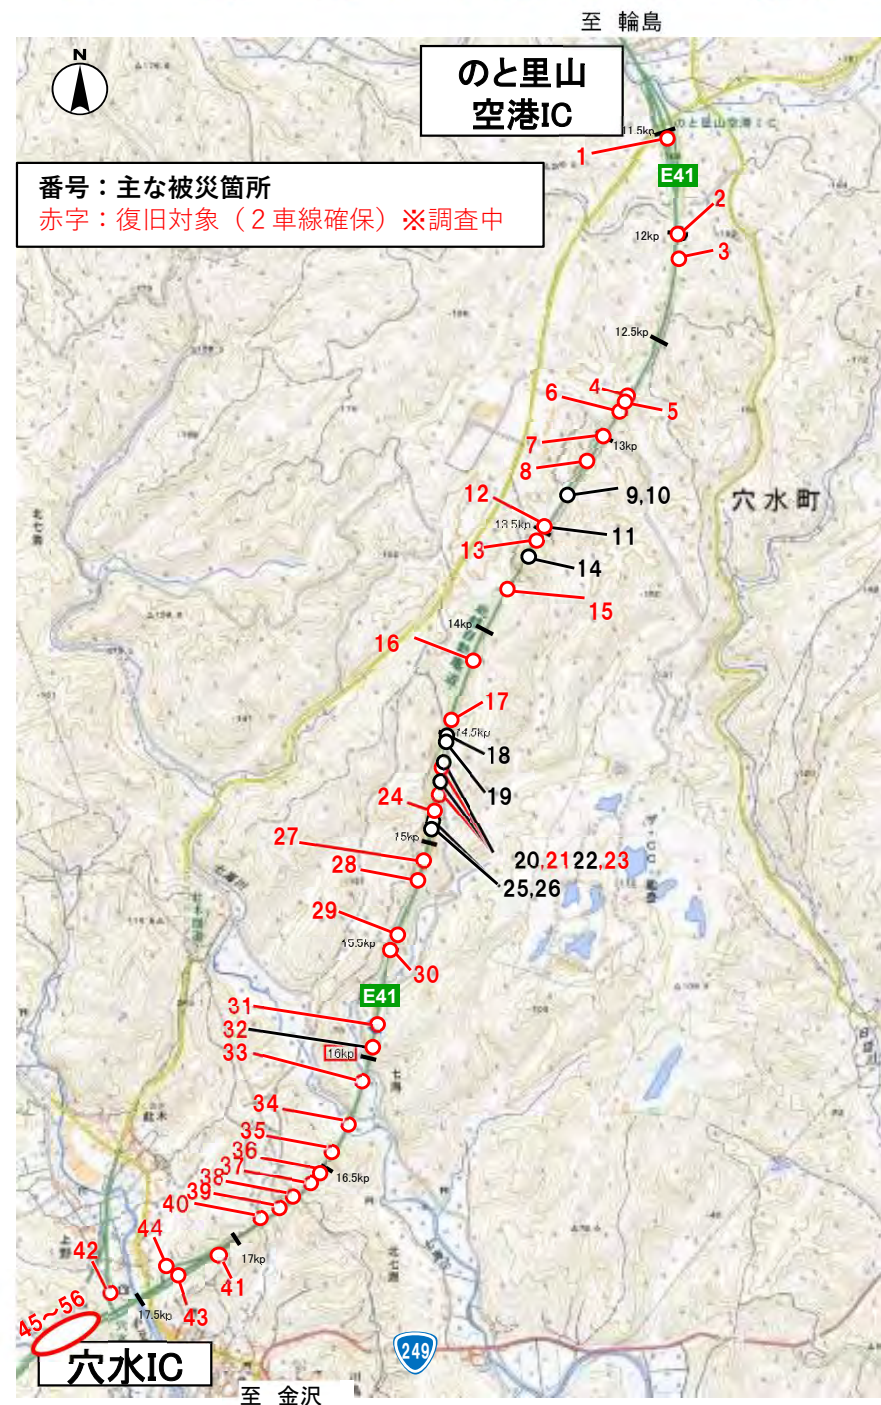

No.40 砕石敷均し状況




No.56 舗装撤去・砕石埋戻し



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

2月13日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

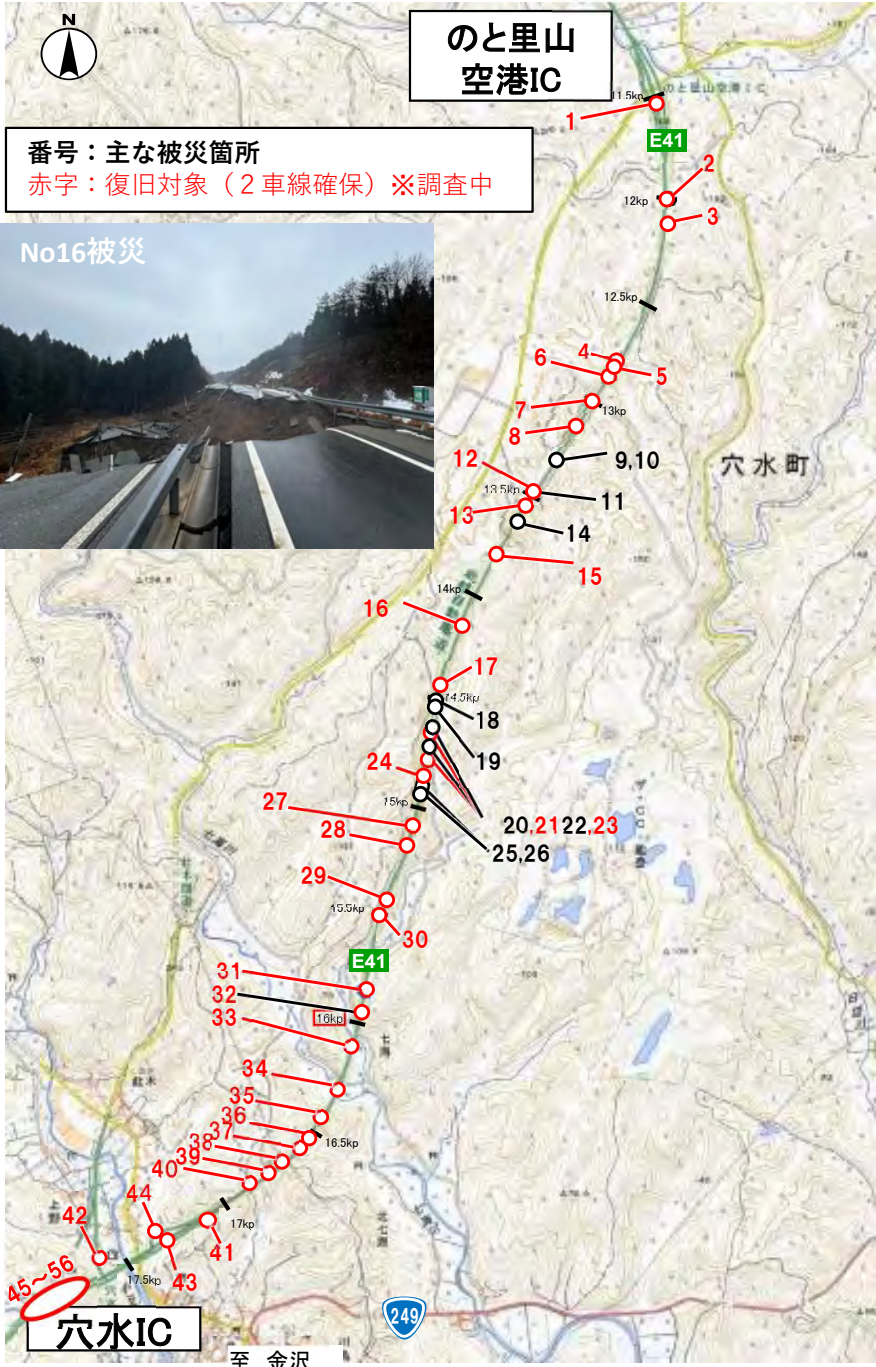

No.16付近 ボーリング調査状況



No.40 舗装撤去状況




令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

2月9日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

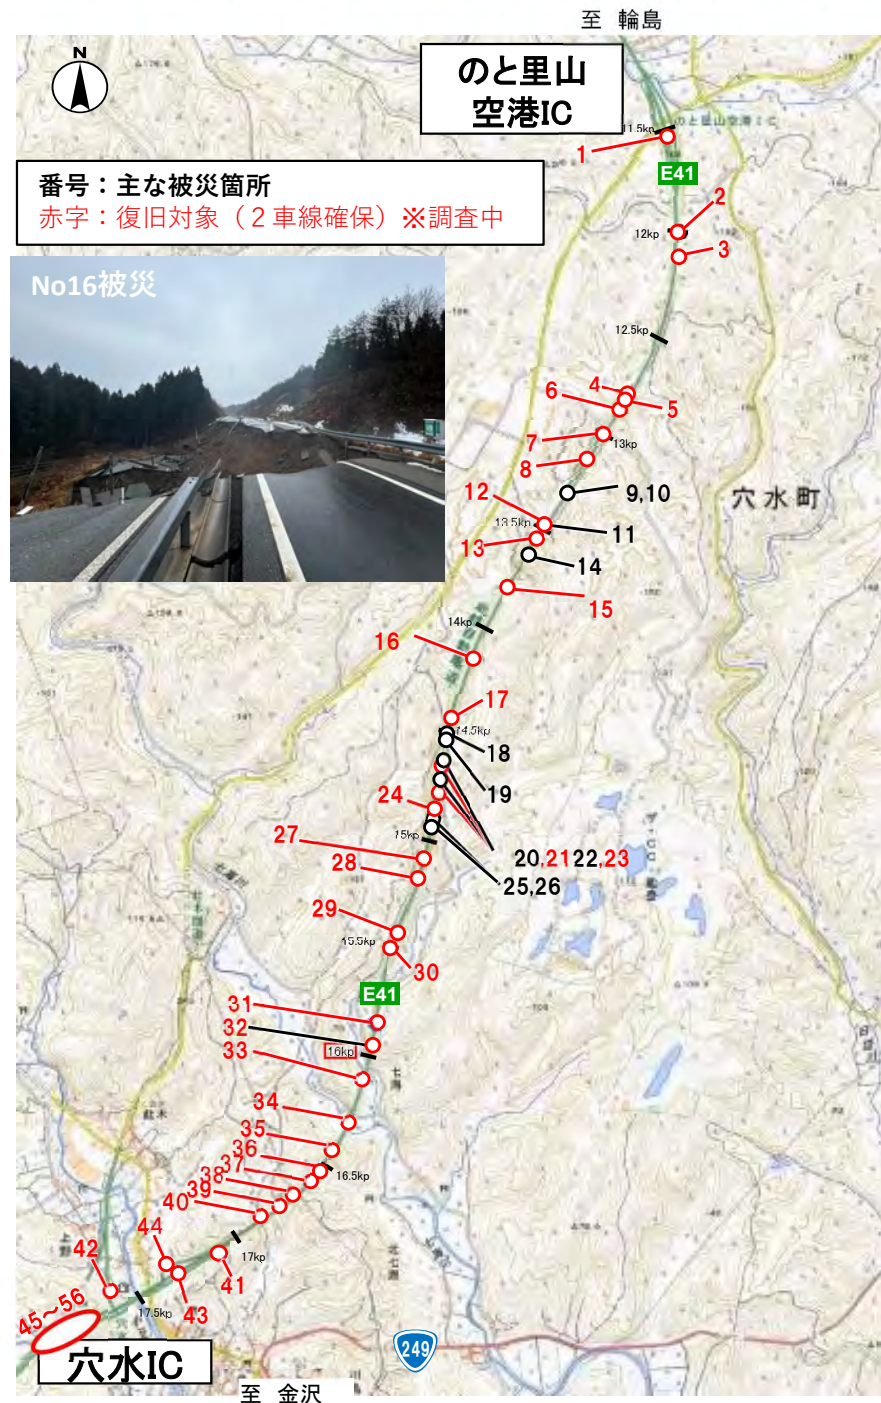

No.16 GR集積・がら撤去状況




No.42付近 大型土嚢設置状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

2月7日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

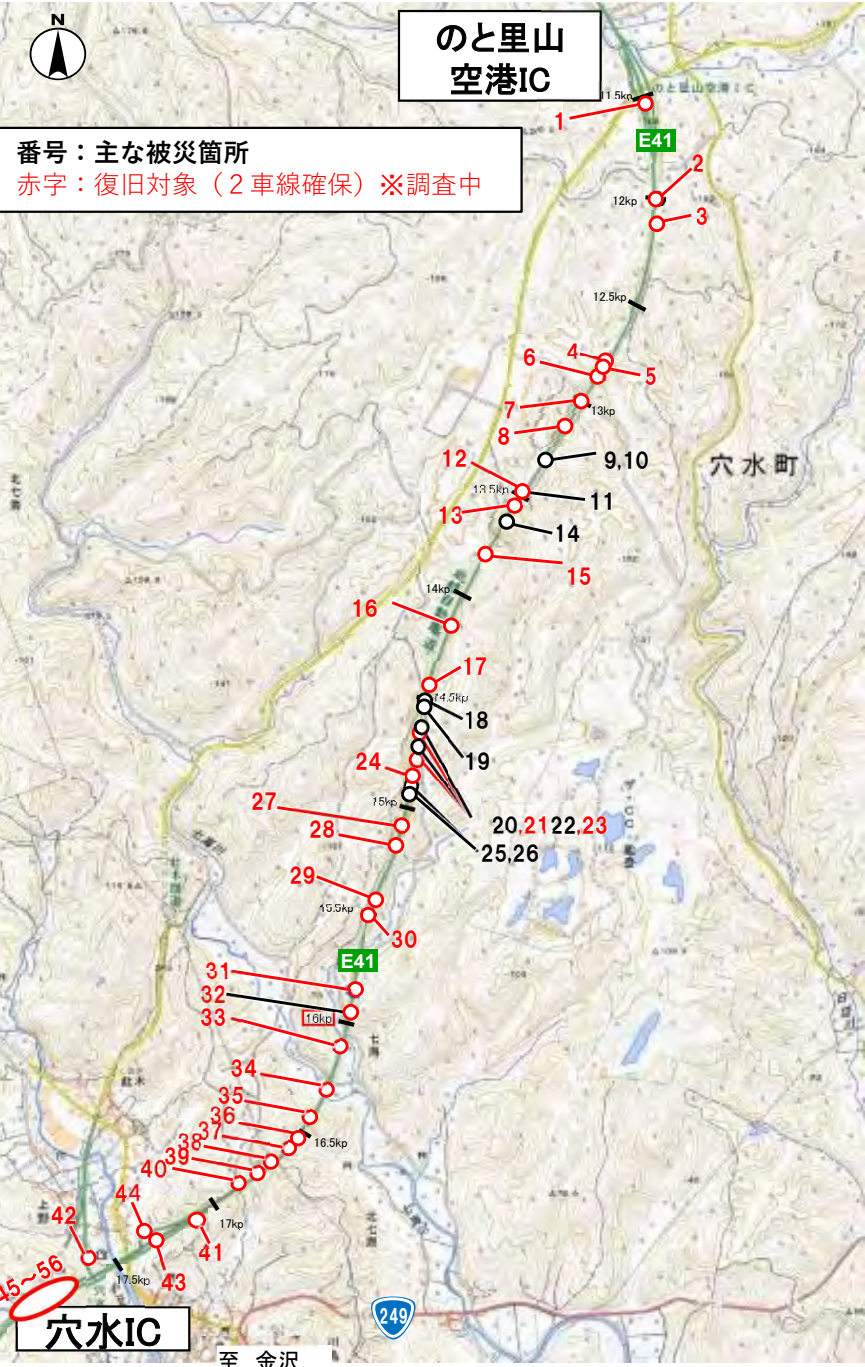


No.42付近 舗装撤去状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

2月5日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

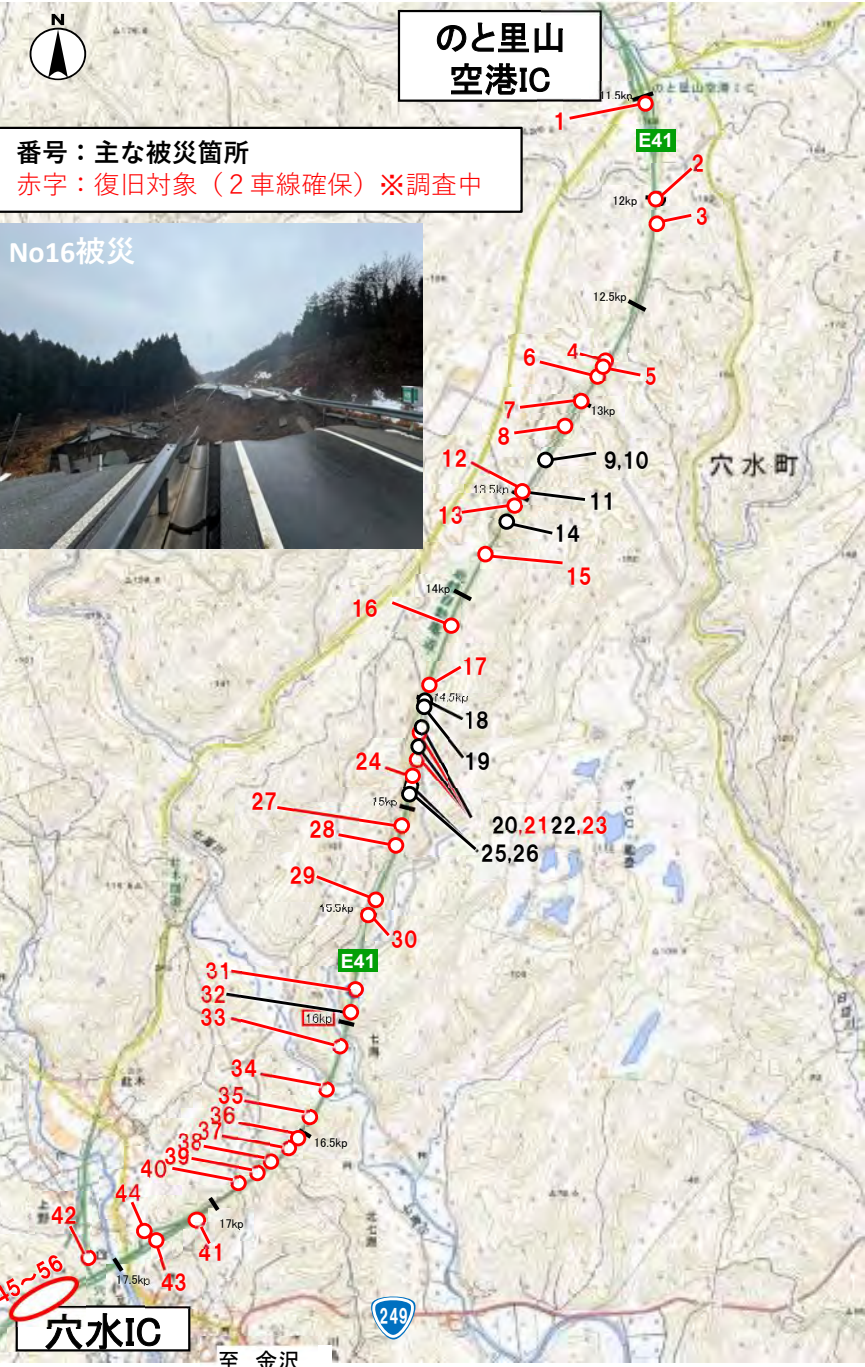


No.16 調査・整地状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

2月2日現在

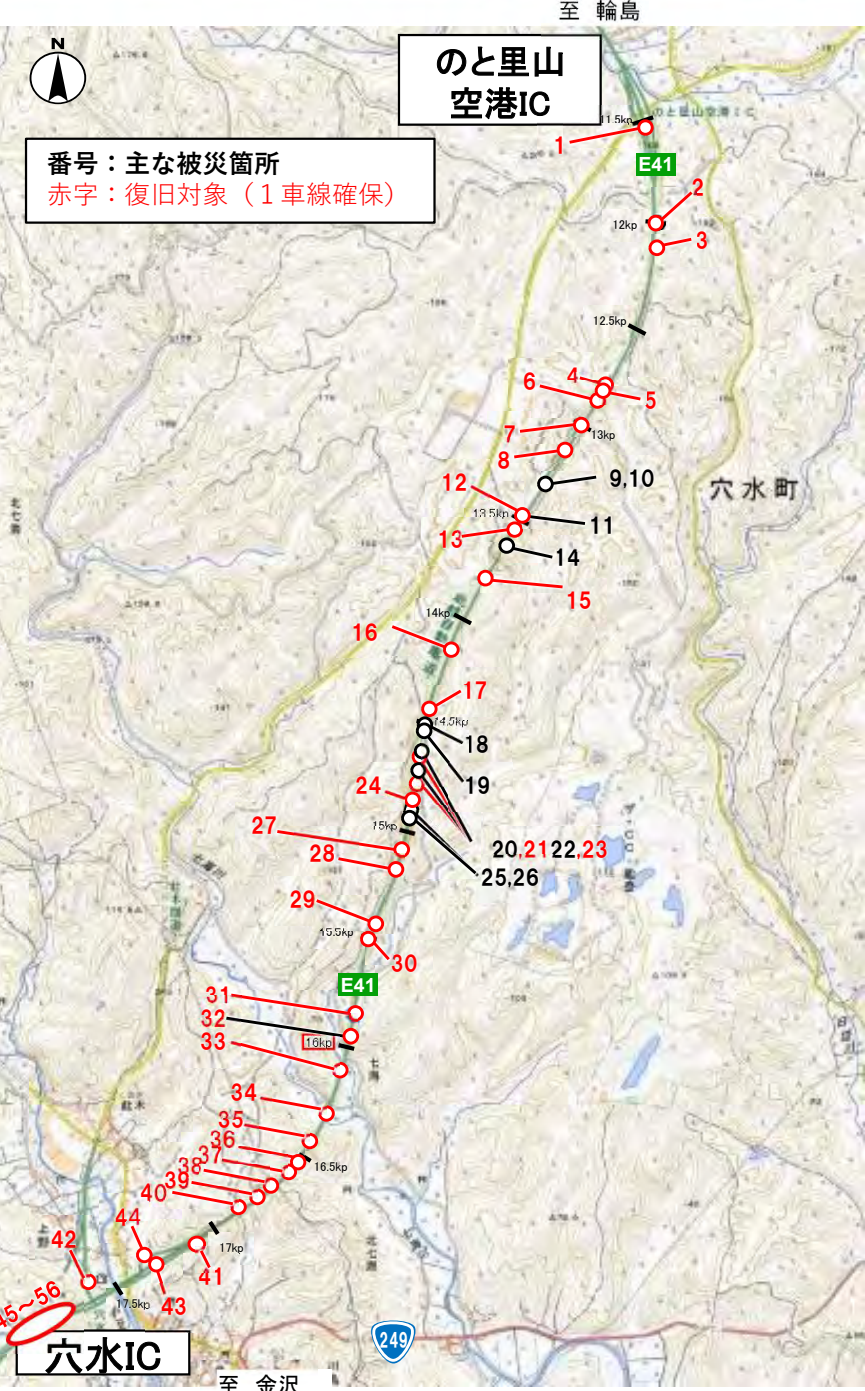

緊急復旧完了（1車線確保）
令和6年2月2日～通行止め解除（一方通行）

No15付近 1車線復旧完了




No16付近 1車線復旧完了



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月31日現在

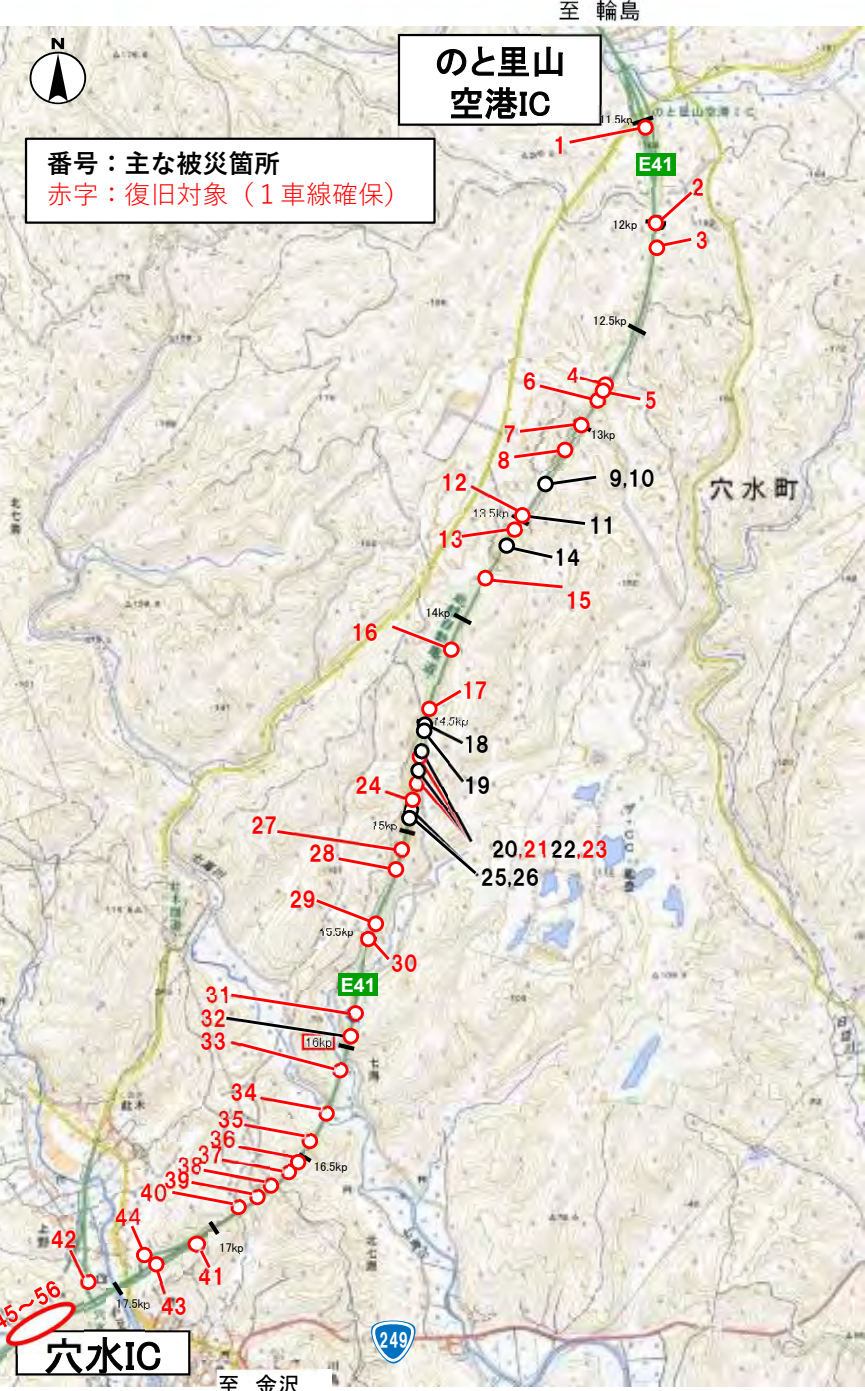


緊急復旧作業中（1車線確保）
46箇所完了（舗装以外）／46箇所
※引き続き舗装施工中

No32 舗装状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月30日現在

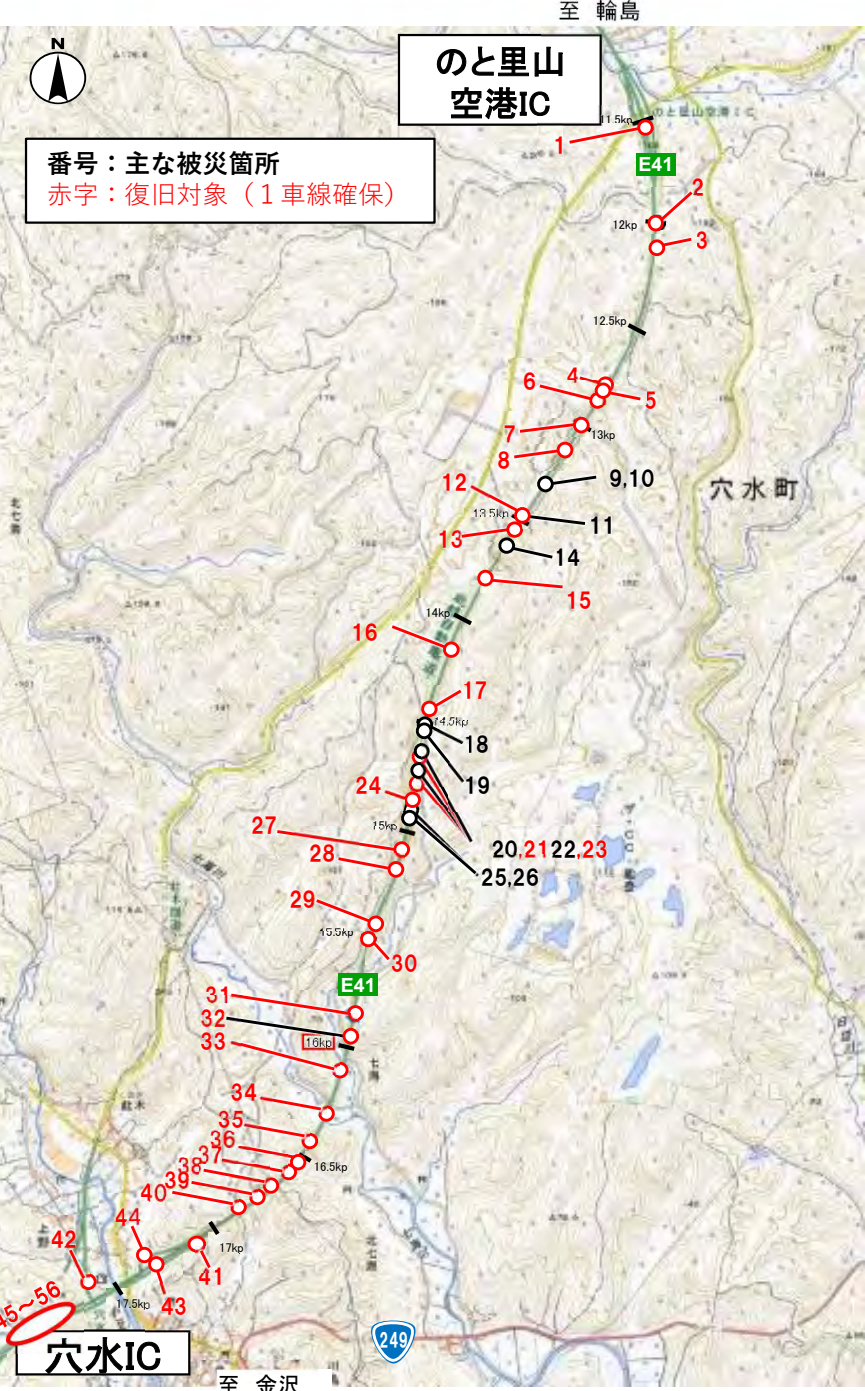


緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所舗装以外完了／46箇所）
※引き続き舗装施工中

No32 舗装状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月29日現在

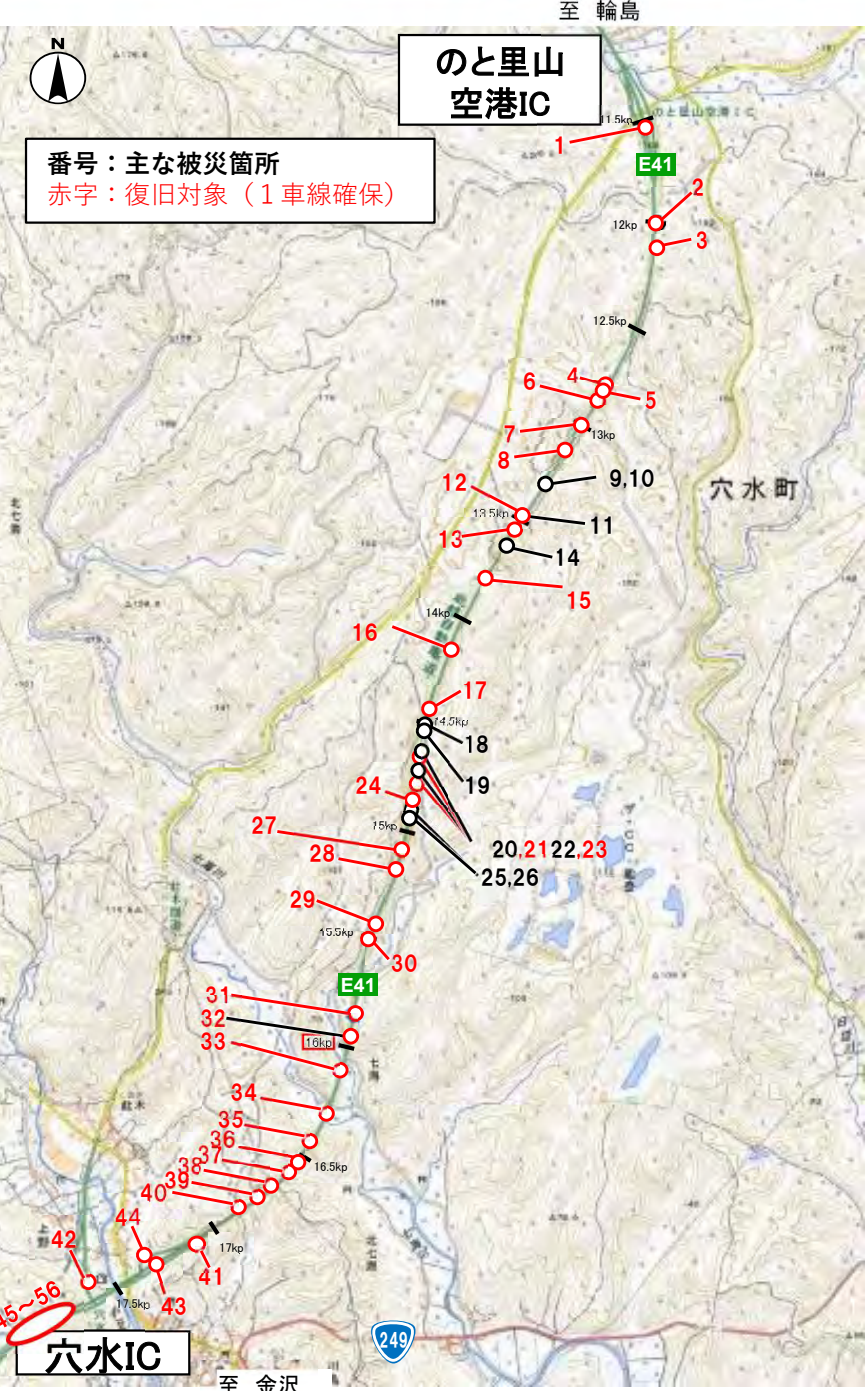

緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所舗装以外完了／46箇所）
※引き続き舗装施工中


No41～42 舗装状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月28日現在

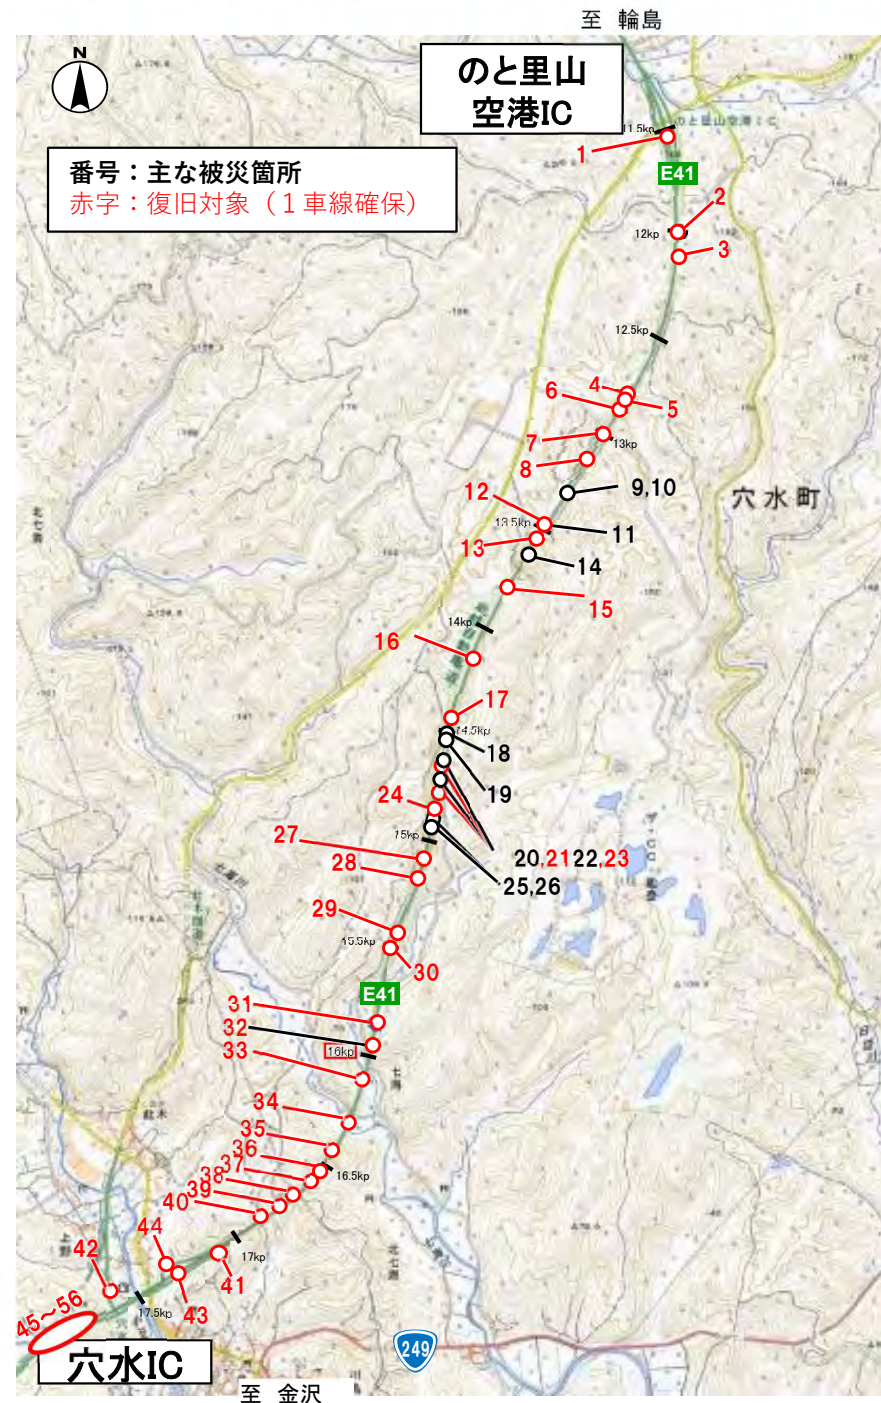

緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所 舗装以外完了／46箇所）
※引き続き舗装施工中


No17～29 舗装状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月27日現在

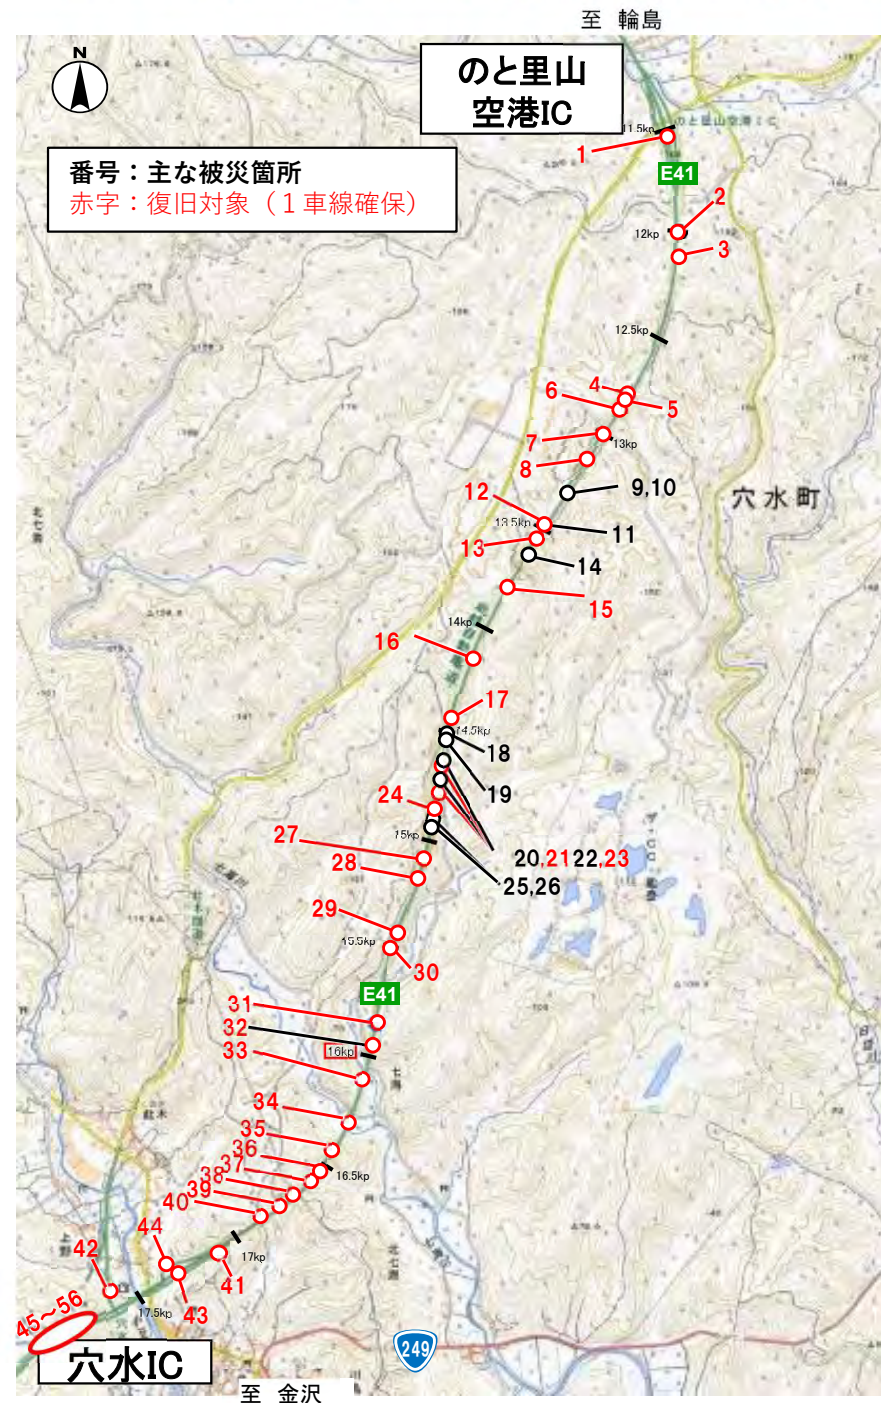

緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所 舗装以外完了／46箇所）
※引き続き舗装施工中


No17～29 舗装・段差復旧状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月26日現在

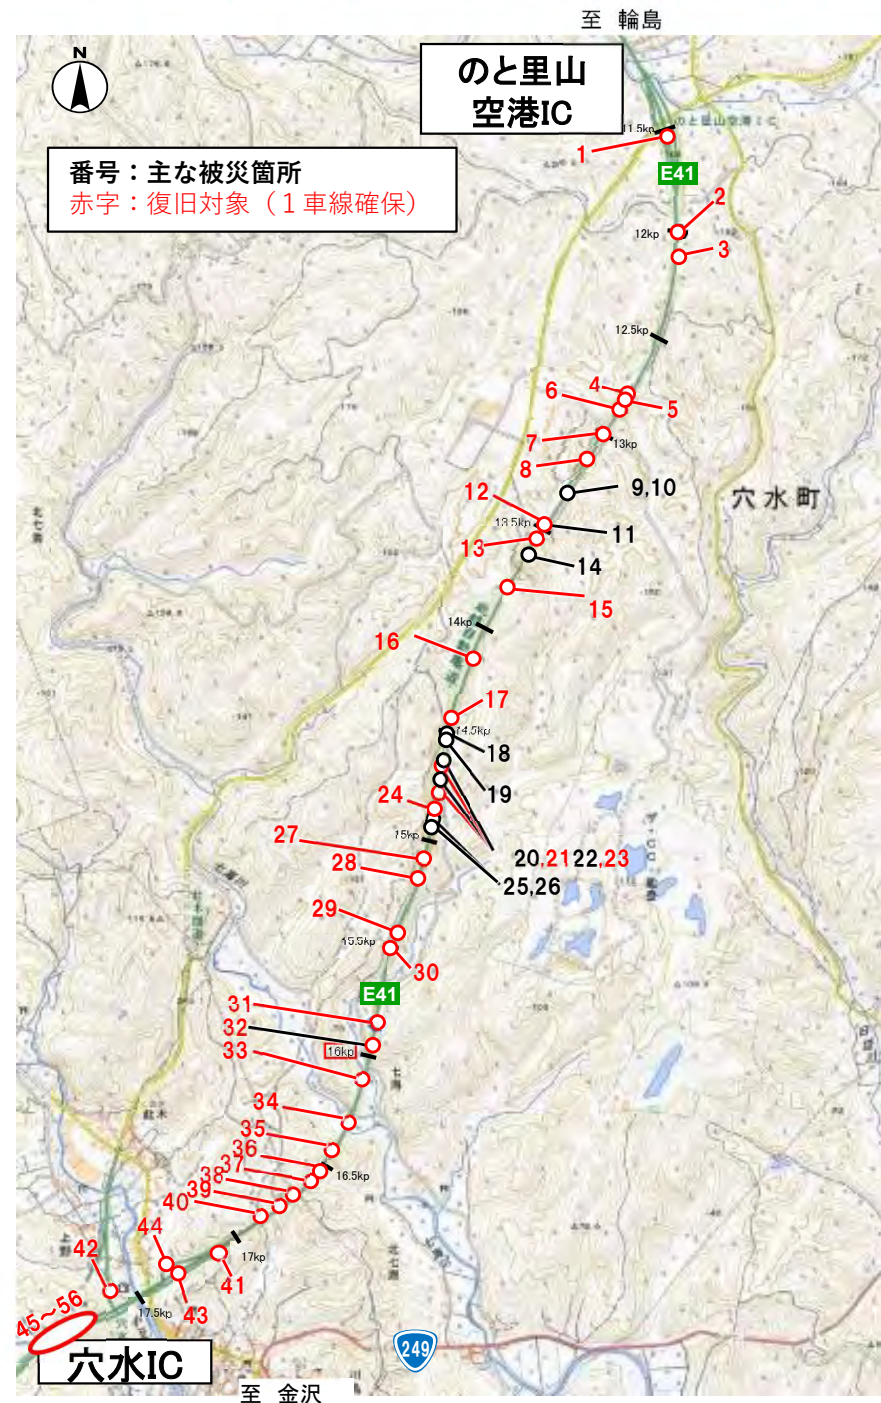


緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所 舗装以外完了／46箇所）
※引き続き舗装施工中

No15 舗装・段差復旧状況




令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月25日現在

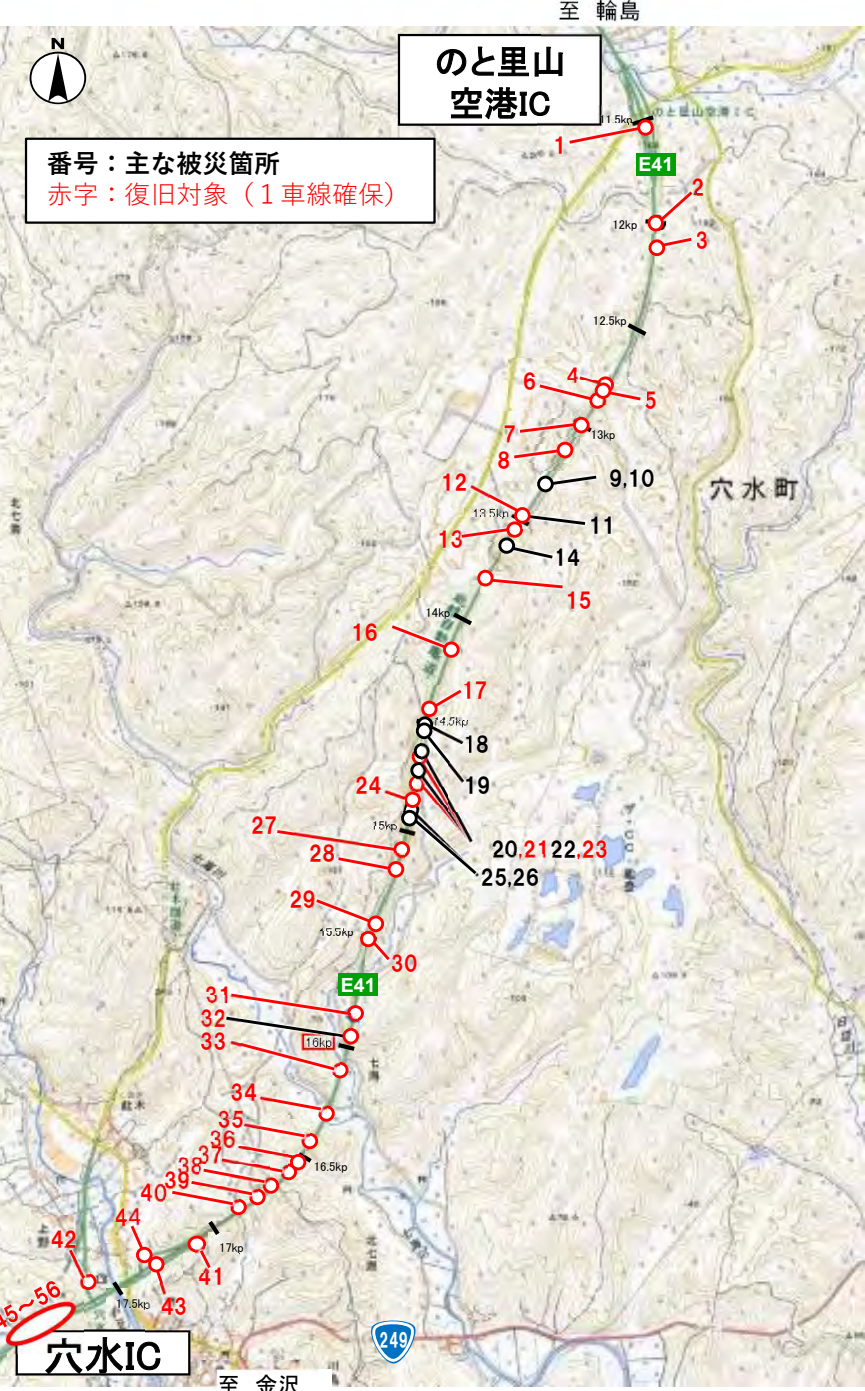

緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所 舗装以外完了／46箇所）
※引き続き舗装施工中


復旧箇所の除雪状況

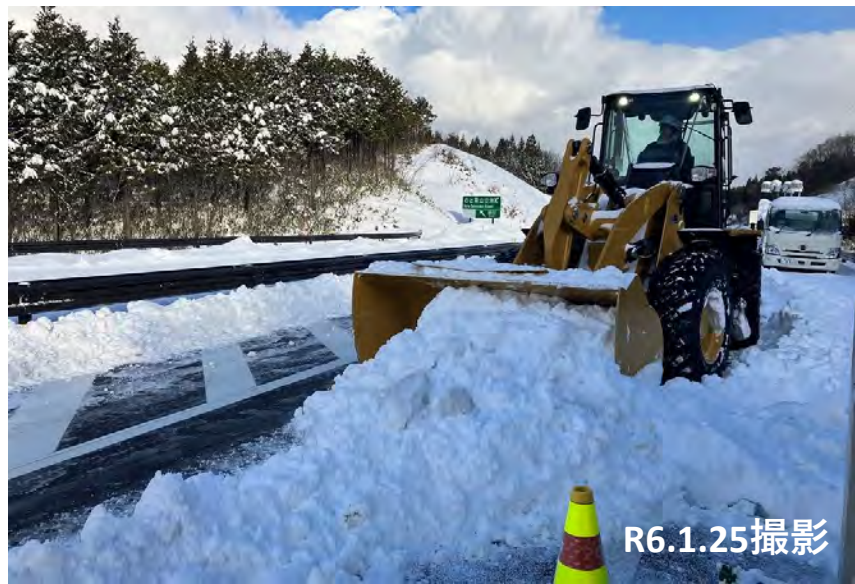

令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月23日現在

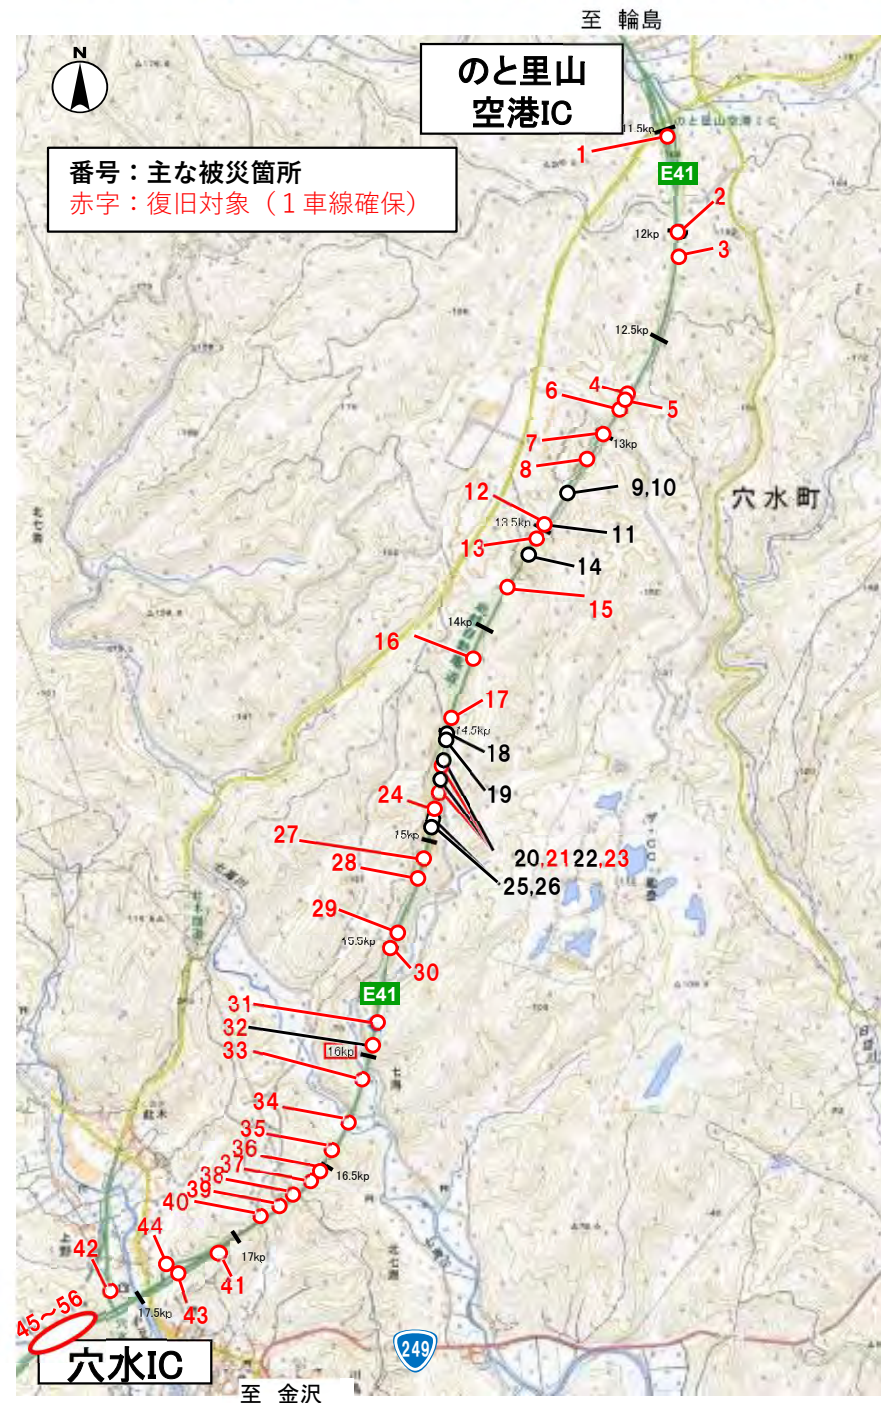

緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所 舗装以外完了／46箇所）
※引き続き舗装施工中


No41～42 舗装・段差復旧状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月22日現在

緊急復旧作業中（1車線確保）
（39箇所完／46箇所）

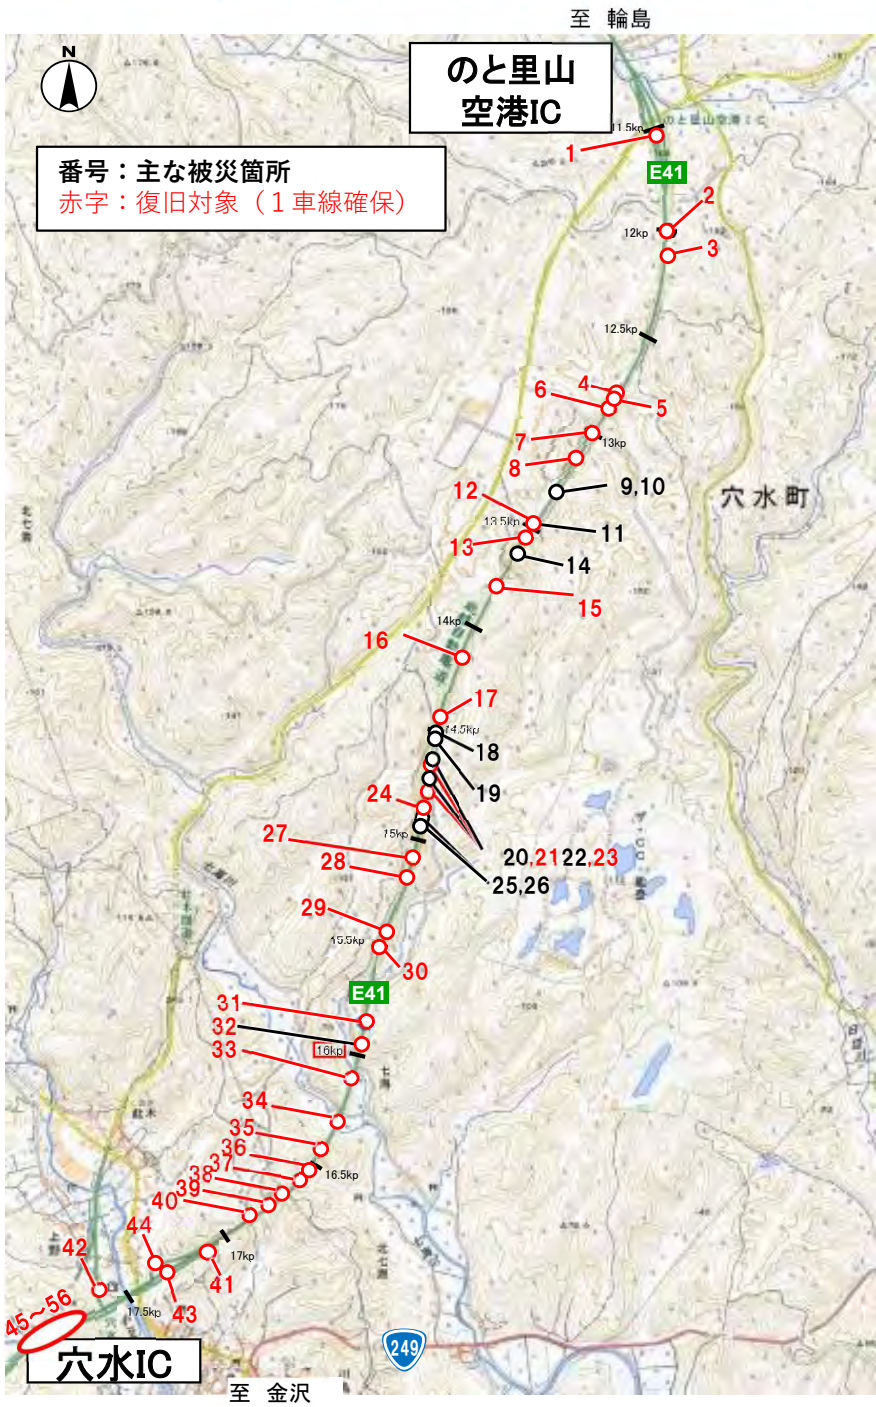


No41～42 段差復旧状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月21日現在

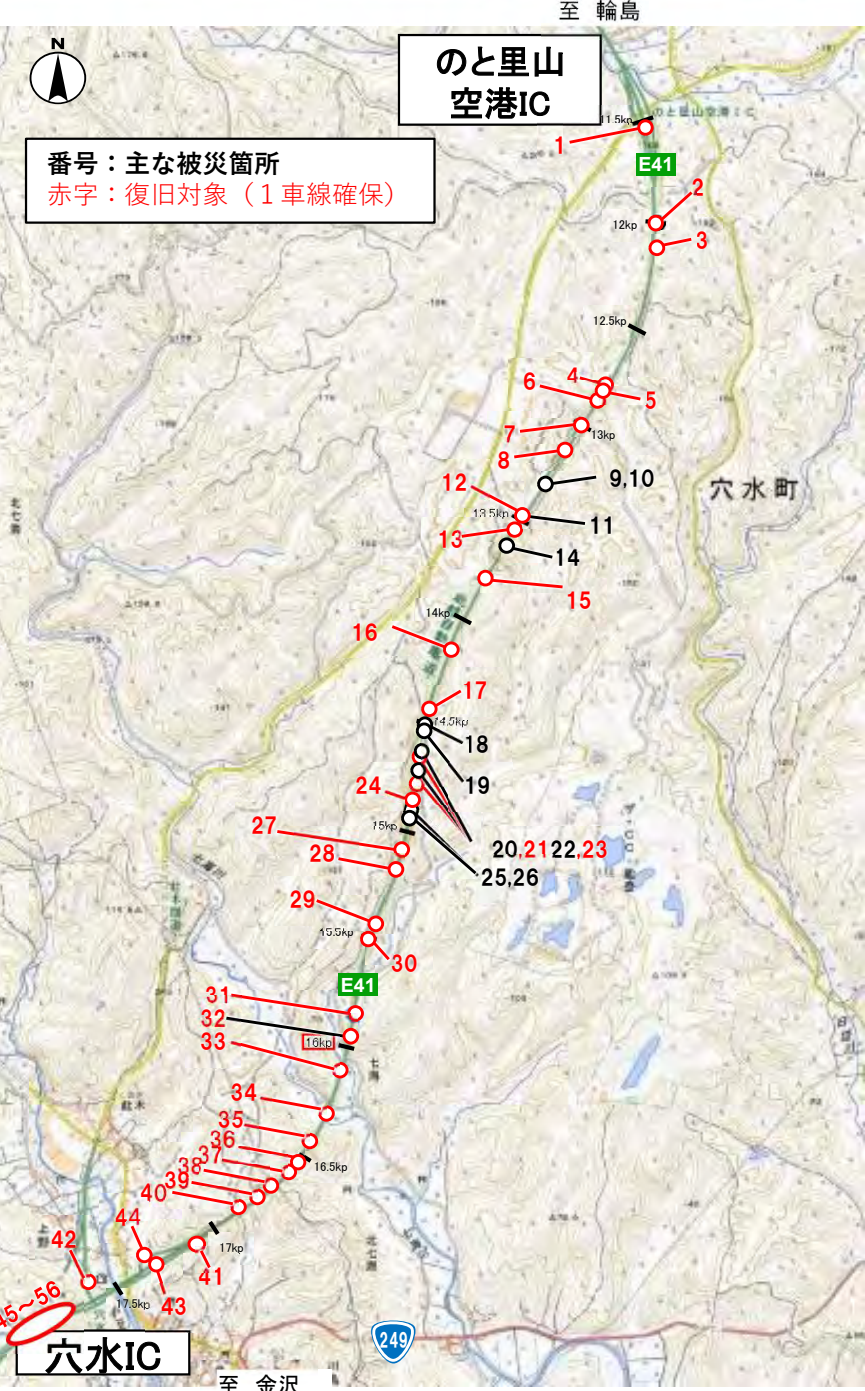

緊急復旧作業中（1車線確保）
（39箇所完／46箇所）

No41～42 段差復旧状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））


1月20日現在

緊急復旧作業中（1車線確保）
（36箇所完／46箇所）

No41～42 段差復旧状況



R6.1.20撮影

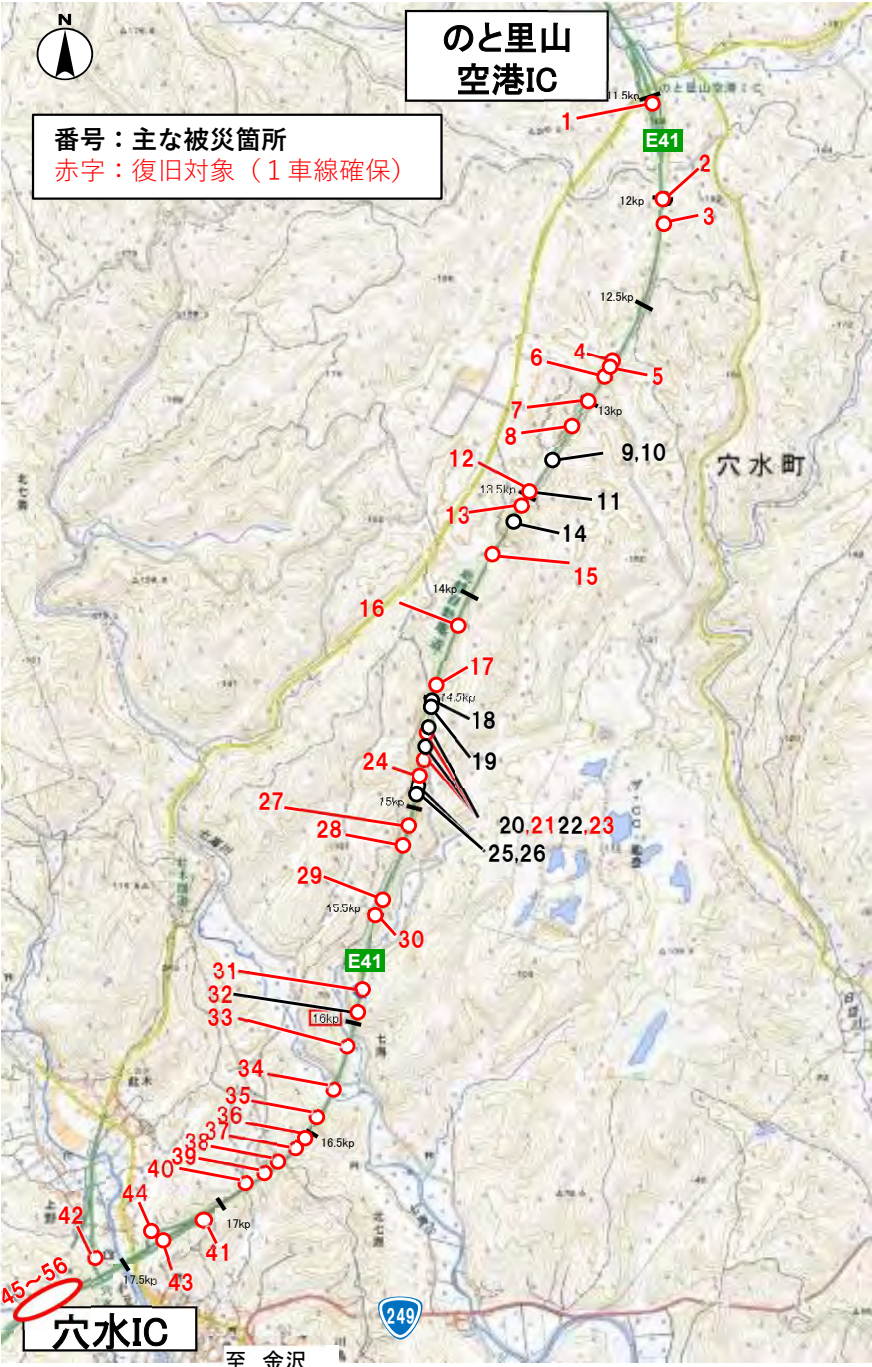

令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月19日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）
（22箇所完／46箇所）

No.6 段差復旧状況



No.16 迂回路造成



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月18日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）
（20箇所完／46箇所）

No.6 段差復旧状況



No.15 法面切土



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月17日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）
（13箇所完／46箇所）

No.6 段差復旧状況



No.15 碎石埋戻し状況



No.16 法面切土状況



No.51 段差擦り付け



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月16日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）
（13箇所完／46箇所）

No.6 路面亀裂、段差復旧状況



No.16 法面切土



No.51 段差擦り付け



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月15日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）
（13箇所完／46箇所）

No.6段差復旧状況



No.15碎石埋戻し状況



No.16 法面切土




No.56 段差擦り付け



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月14日現在

緊急復旧作業中（1車線確保）
（13箇所完／46箇所）

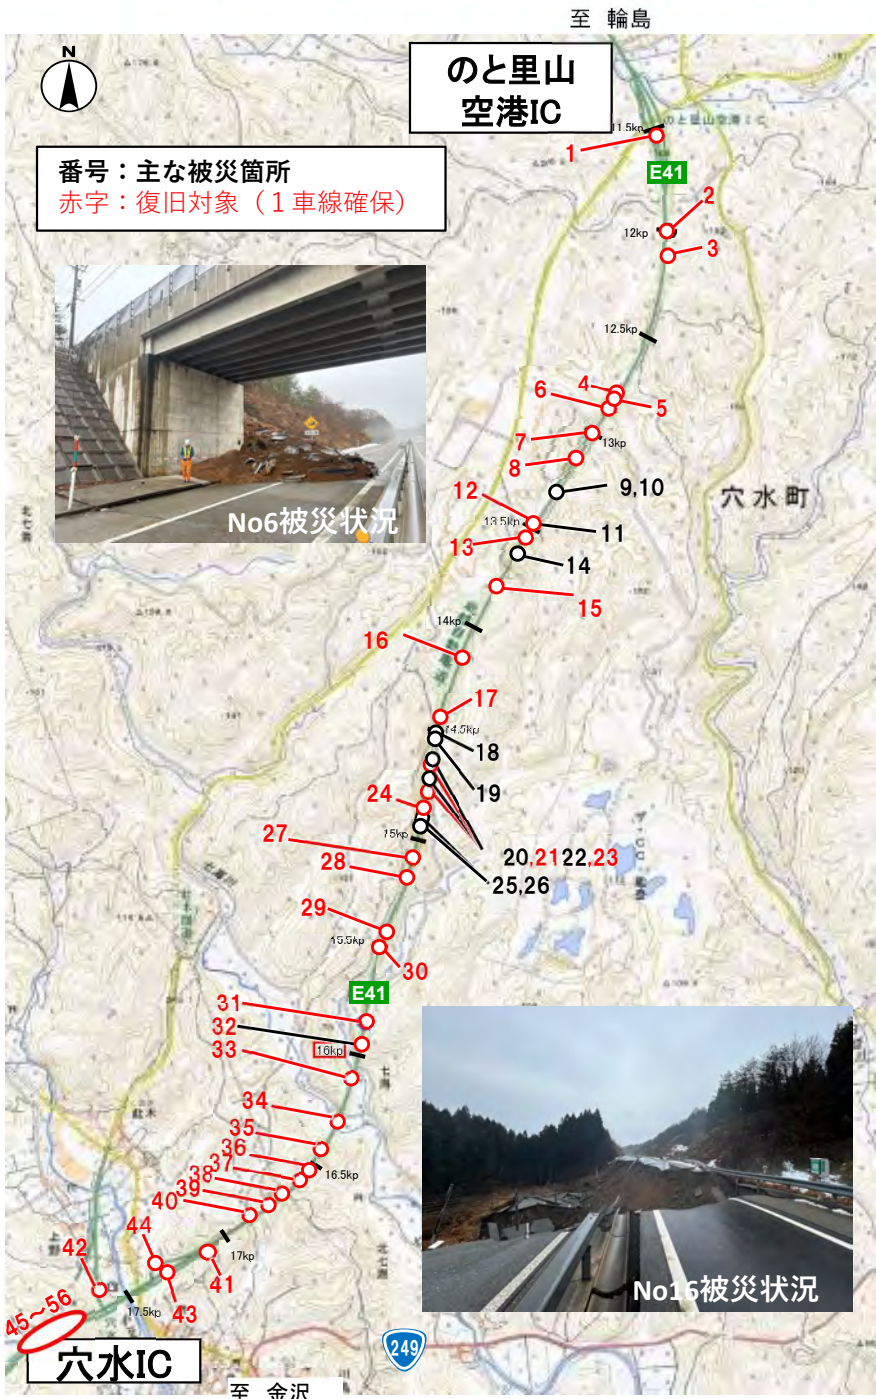

No.6 土嚢設置



No.16 切土状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月13日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）

No.6 土嚢設置



No.16 切土状況




No.36 ガードレール撤去



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月12日現在

緊急復旧作業中（1車線確保）

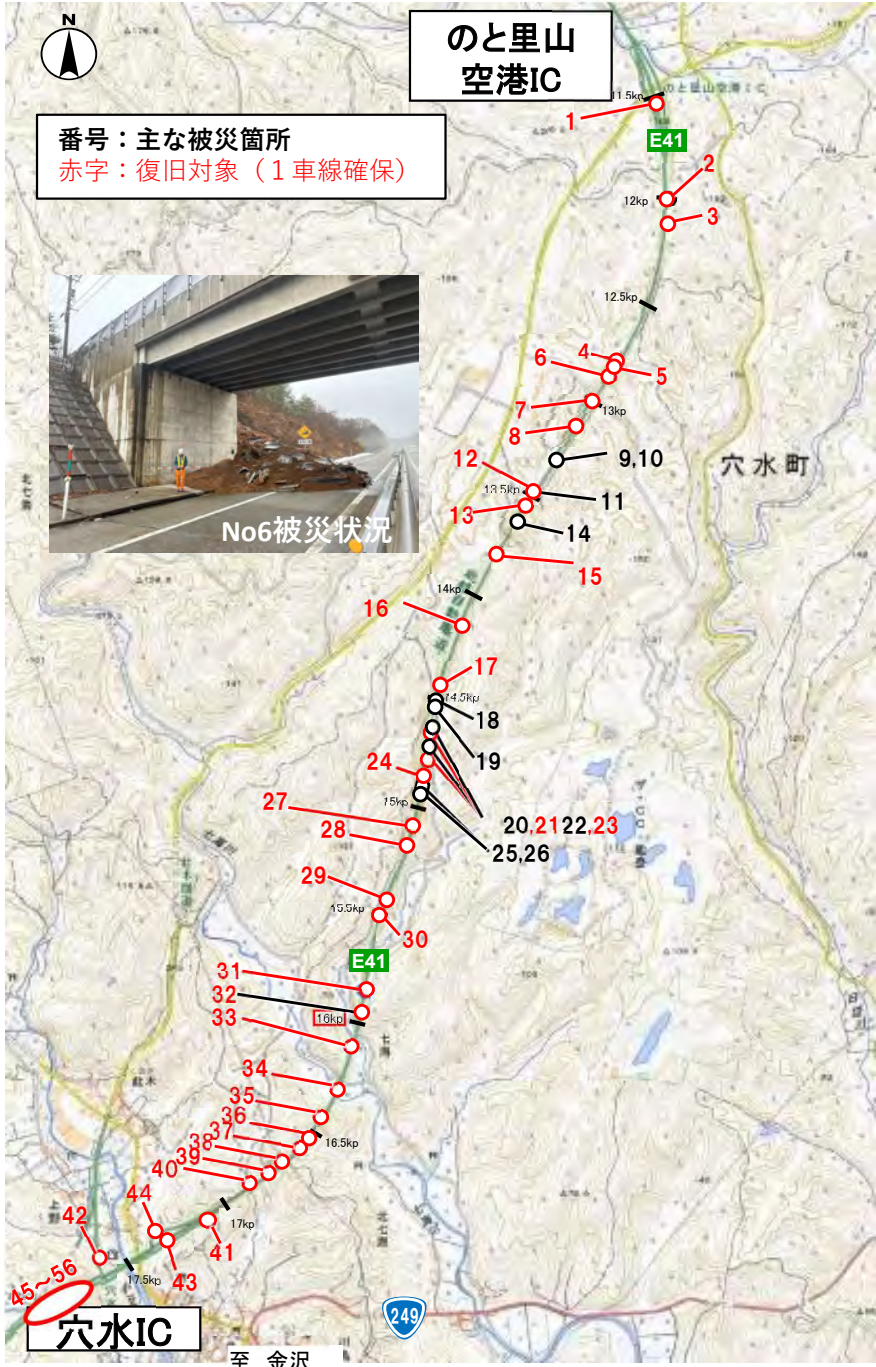

No.6 掘削・土嚢設置状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月11日現在

緊急復旧作業中（1車線確保）



No.15 碎石充填状況




No.16 碎石充填状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月10日現在

緊急復旧作業中（1車線確保）

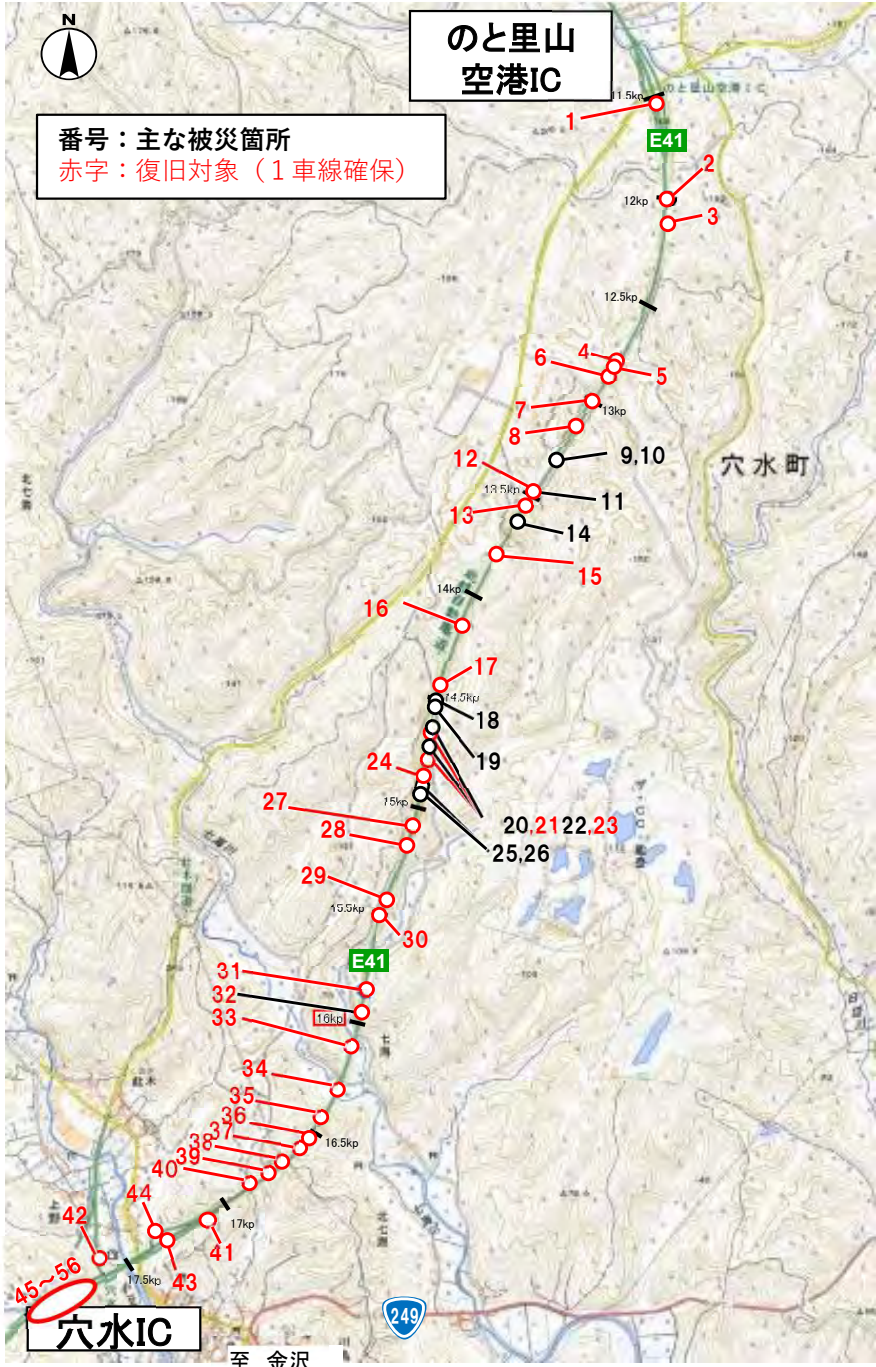

No.35～42 碎石充填

