
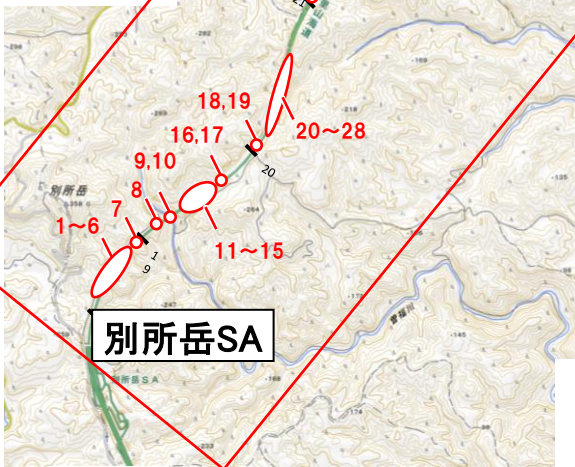
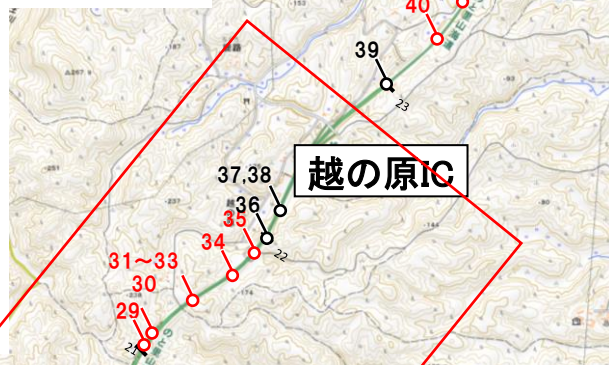


# 令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

## 越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月15日現在

番号：主な被災箇所  
赤字：復旧対象 (1車線確保)

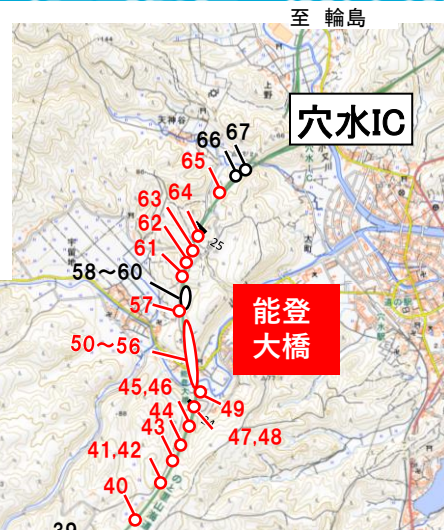

緊急復旧完了 (1車線確保)  
令和6年2月15日～通行止め解除  
(一方通行・緊急車両等のみ通行可)

### 1車線通行状況






# 令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

## 越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月15日現在

番号：主な被災箇所  
赤字：復旧対象 (1車線確保)

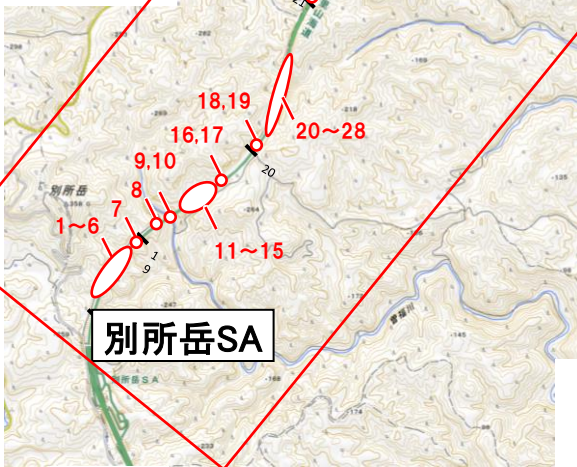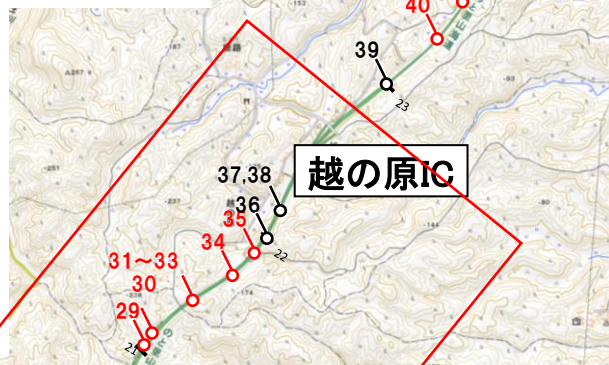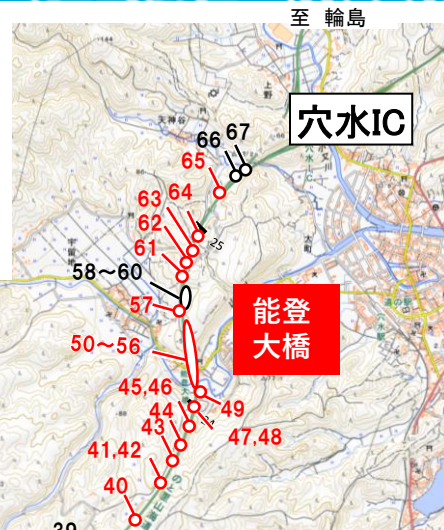

至 金沢

緊急復旧完了 (1車線確保)  
令和6年2月15日～通行止め解除  
(一方通行・緊急車両等のみ通行可)

No.7付近 1車線復旧完了



No.29付近 1車線復旧完了




# 令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

## 越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月13日現在

番号：主な被災箇所  
赤字：復旧対象 (1車線確保)

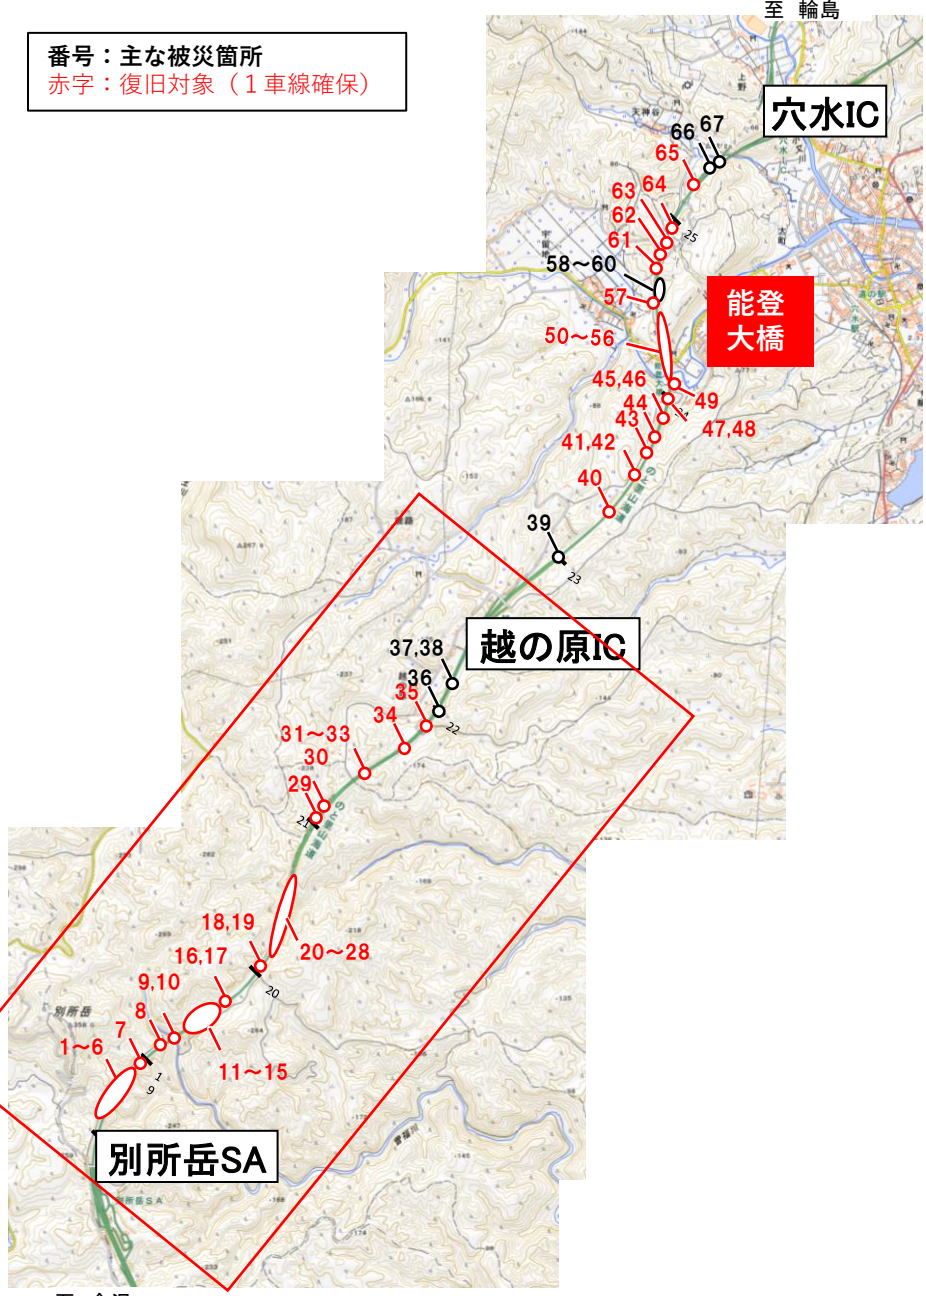

緊急復旧作業中 (1車線確保)  
38箇所完了 (舗装以外) / 38箇所

No.24付近 路肩路盤整備状況



R6.2.11撮影

No.29 路盤整備およびAs舗装完了




R6.2.10撮影

# 令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

## 越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月9日現在

番号：主な被災箇所  
赤字：復旧対象 (1車線確保)

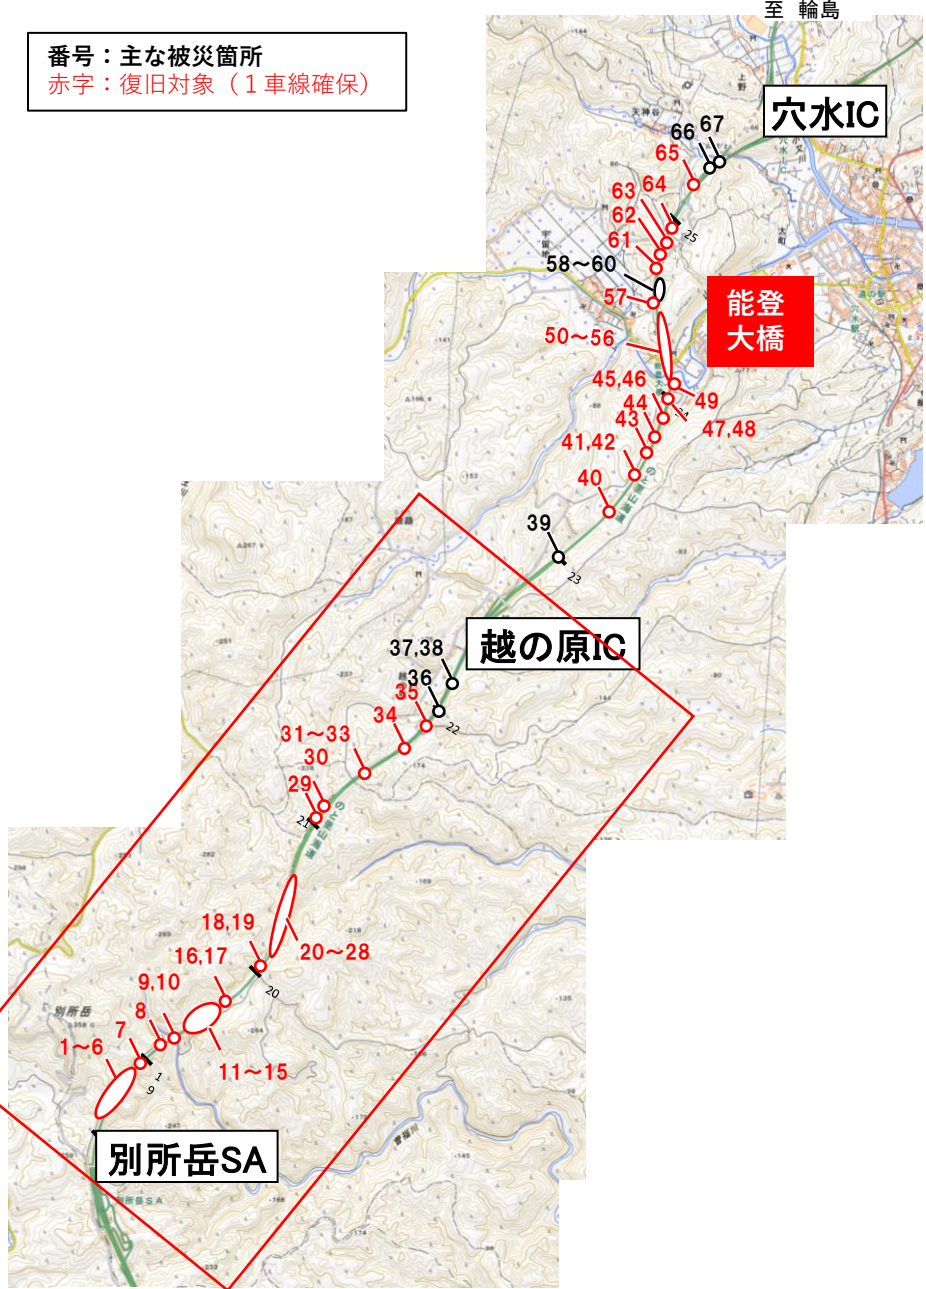

緊急復旧作業中 (1車線確保)  
29箇所完了 (舗装以外) / 38箇所

No.34付近 舗装状況



R6.2.7撮影

No.4付近 亀裂・段差補修状況




R6.2.8撮影

# 令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

## 越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)



2月7日現在

番号：主な被災箇所  
赤字：復旧対象 (1車線確保)

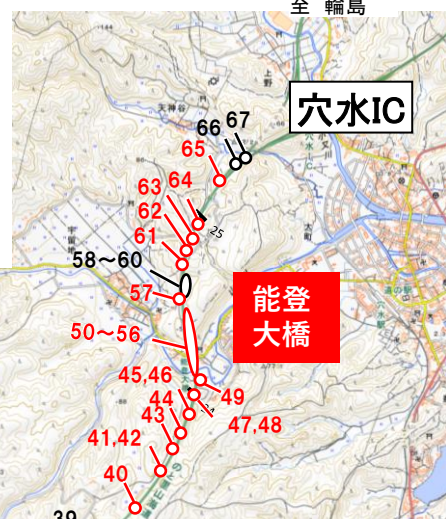

緊急復旧作業中 (1車線確保)  
29箇所完了 (舗装以外) / 38箇所

No.29～30付近 舗装施工状況

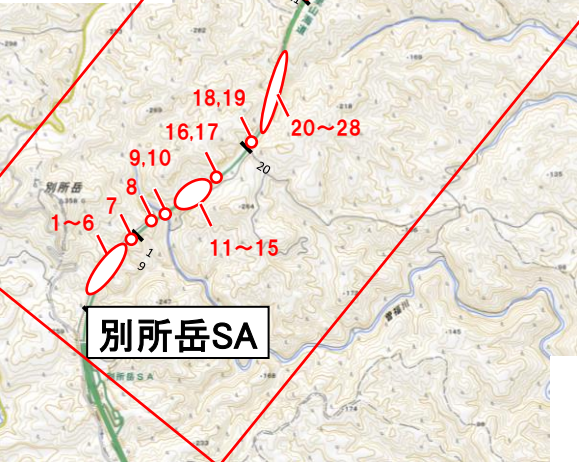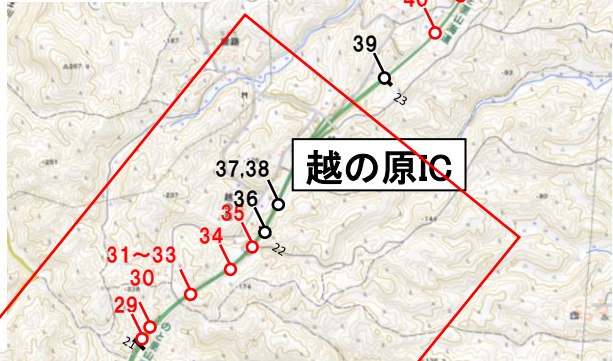


# 令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

## 越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月5日現在

番号：主な被災箇所  
赤字：復旧対象 (1車線確保)

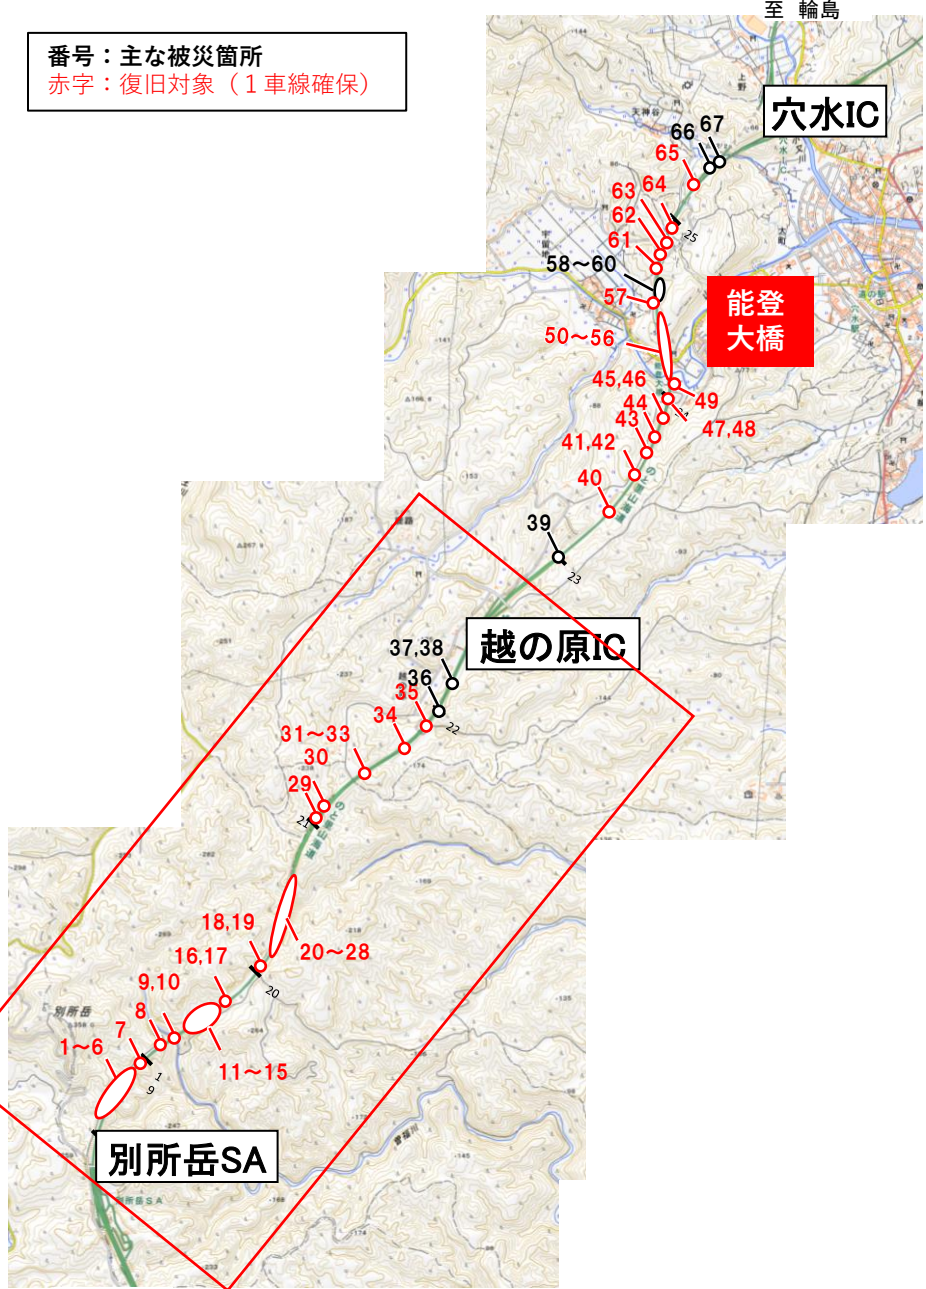

緊急復旧作業中 (1車線確保)  
29箇所完了 (舗装以外) / 38箇所

No.7付近 路盤施工状況






# 令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

## 越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月1日現在

番号：主な被災箇所  
赤字：復旧対象 (1車線確保)

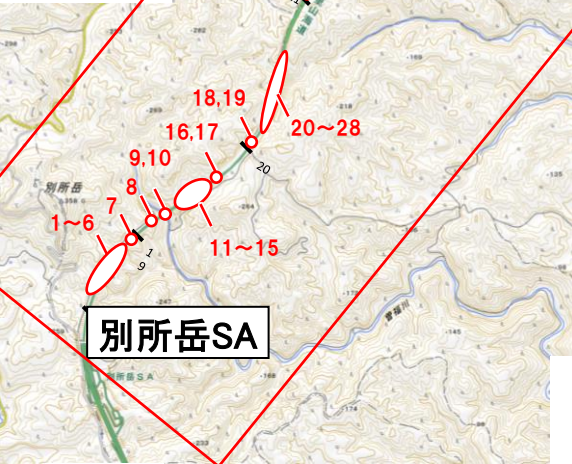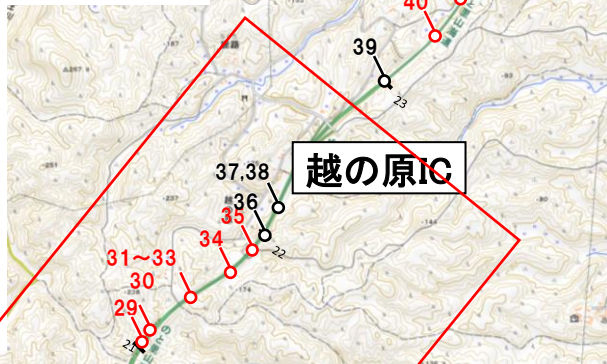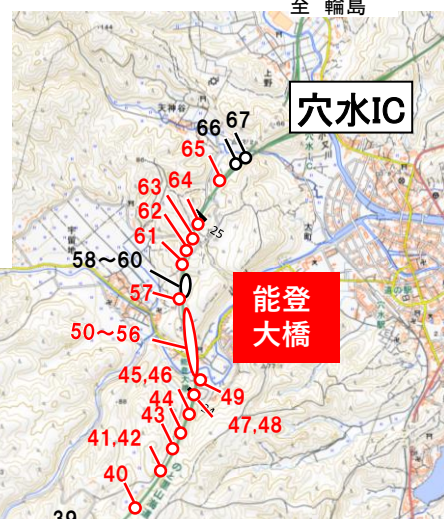

至 金沢

緊急復旧作業中 (1車線確保)  
29箇所完了 (舗装以外) / 38箇所

### No.30路盤転圧状況




# 令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

## 越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

1月31日現在

番号：主な被災箇所  
赤字：復旧対象 (1車線確保)

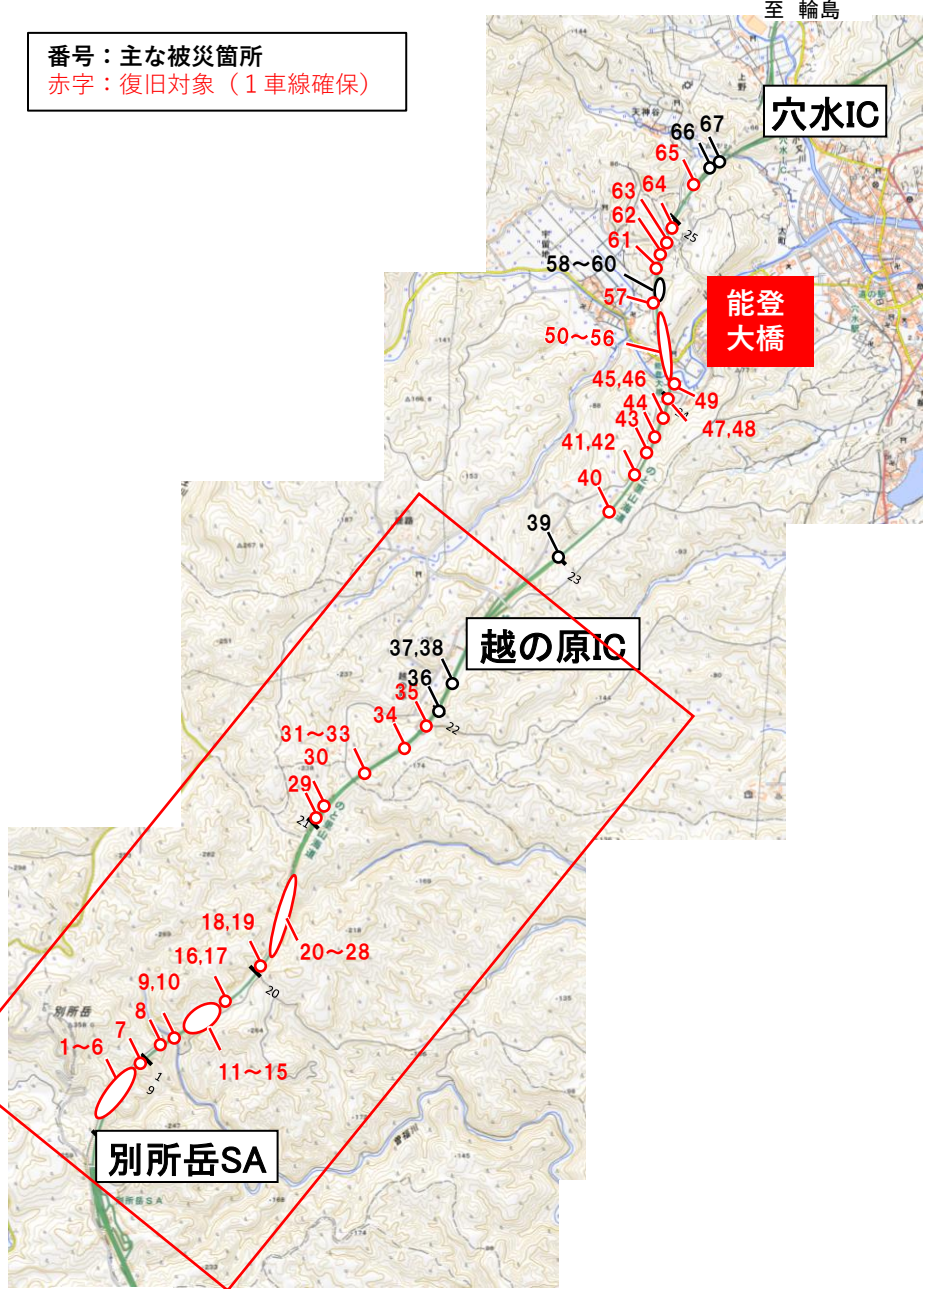

緊急復旧作業中 (1車線確保)  
29箇所完了 (舗装以外) / 38箇所

### No.16 碎石敷設状況





# 令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

## 越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)



1月30日現在

番号：主な被災箇所  
赤字：復旧対象 (1車線確保)



緊急復旧作業中 (1車線確保)  
29箇所完了 (舗装以外) / 38箇所

### No.16掘削状況

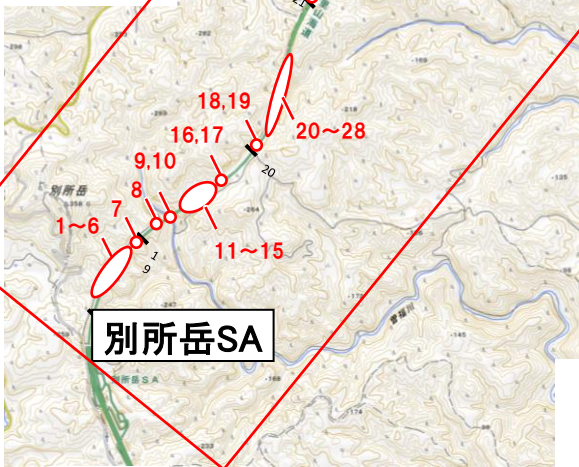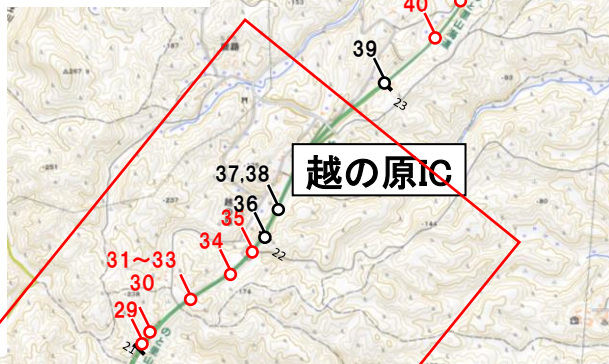

# 令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

## 越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)



1月29日現在

番号：主な被災箇所  
赤字：復旧対象 (1車線確保)



緊急復旧作業中 (1車線確保)  
29箇所完了 (舗装以外) / 38箇所

### No.7～30土砂撤去状況

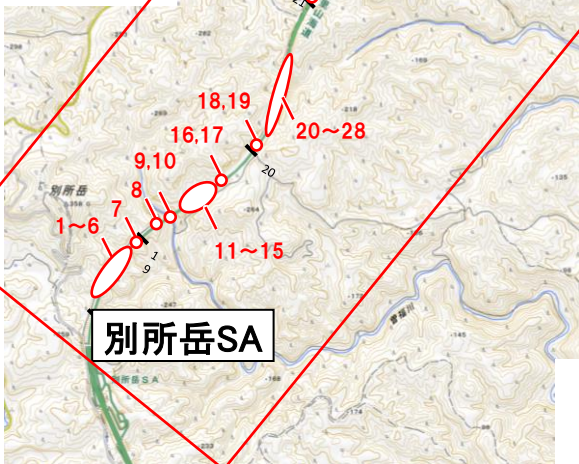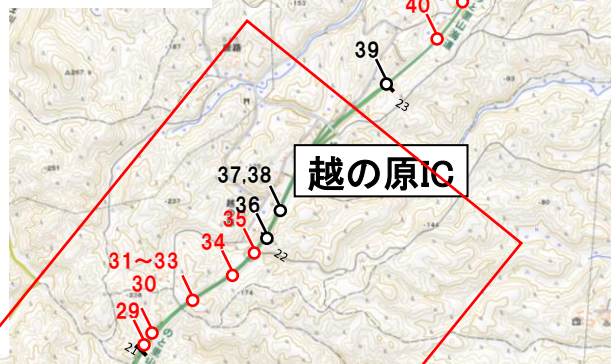

至 金沢

# 令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

## 越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)



1月28日現在

番号：主な被災箇所  
赤字：復旧対象 (1車線確保)



緊急復旧作業中 (1車線確保)  
29箇所完了 (舗装以外) / 38箇所

### No.29崩落土砂撤去状況

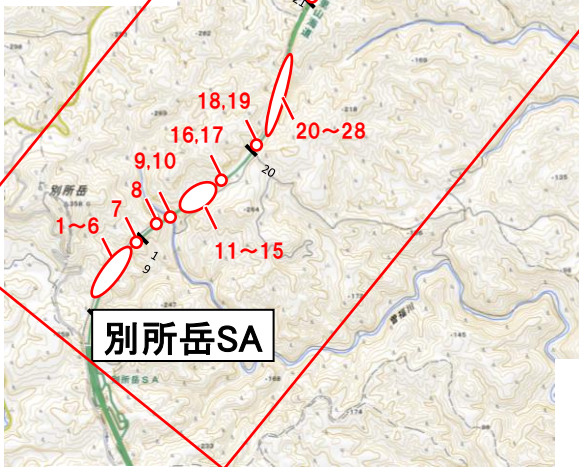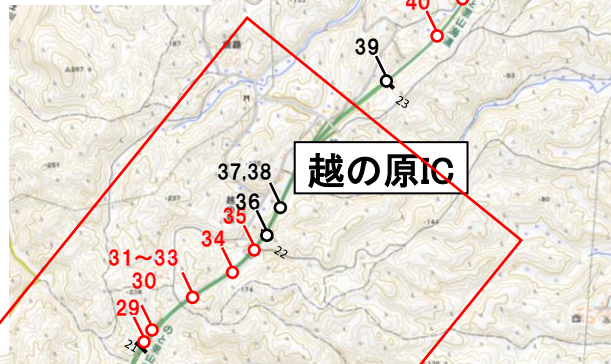

至 金沢
