


# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

**緊急復旧完了（2車線確保）  
令和6年2月27日～対面通行**



No.3付近 復旧状況

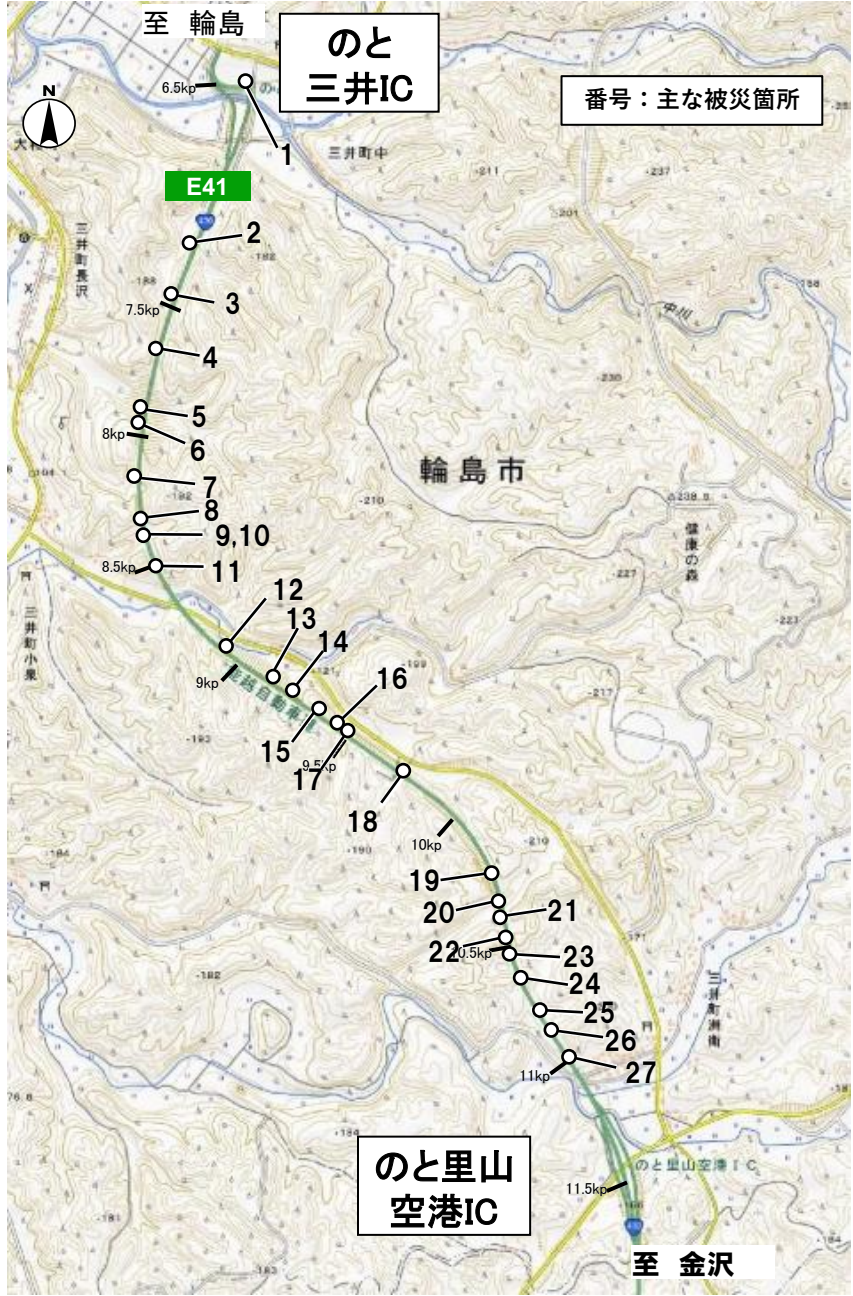

No.7付近 復旧状況



2車線確保状況


2車線確保状況



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと三井IC～のと里山空港IC (担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株))

2月21日現在

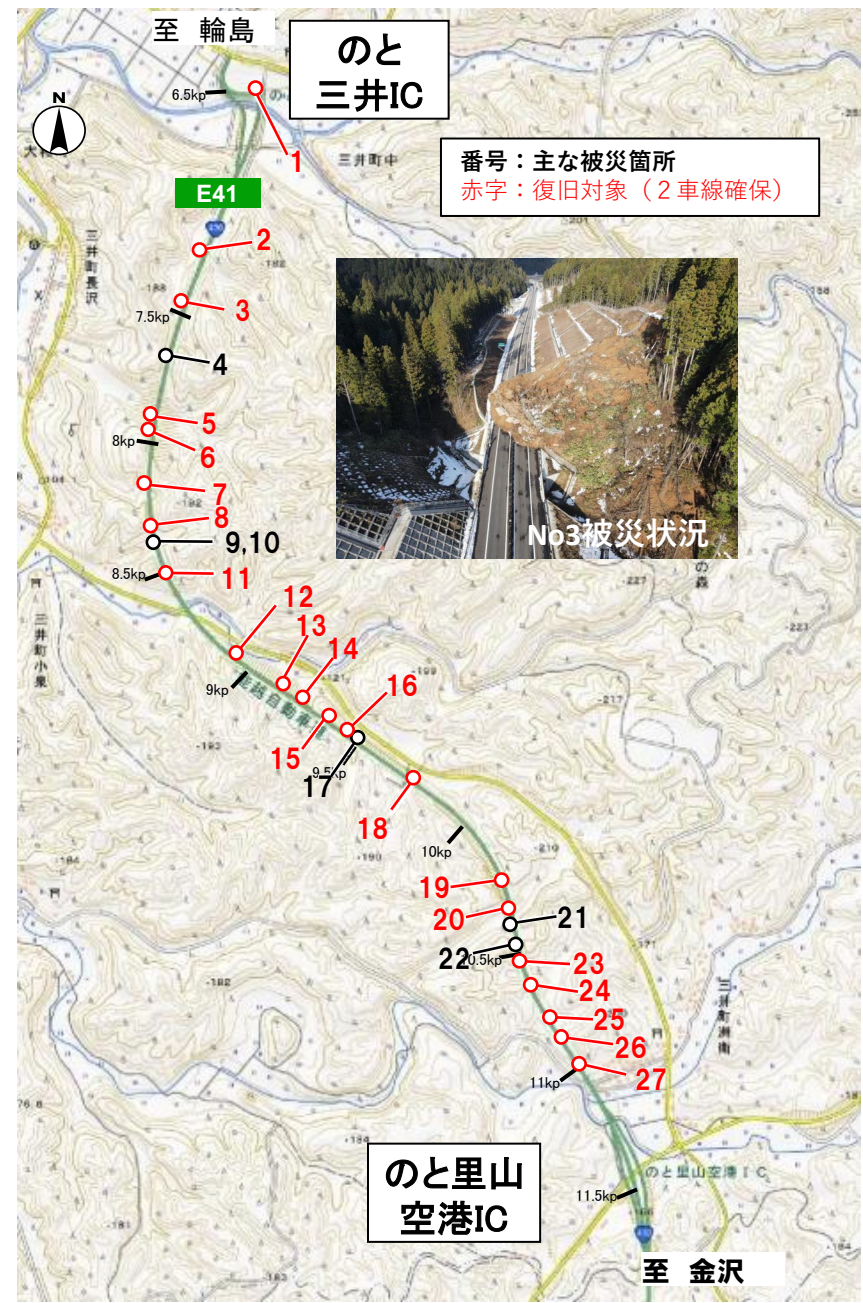

緊急復旧作業中（2車線確保）  
26箇所完了（舗装以外）／27箇所

No.3付近 ライン引き施工完了




No.1付近 看板設置状況





# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

2月19日現在

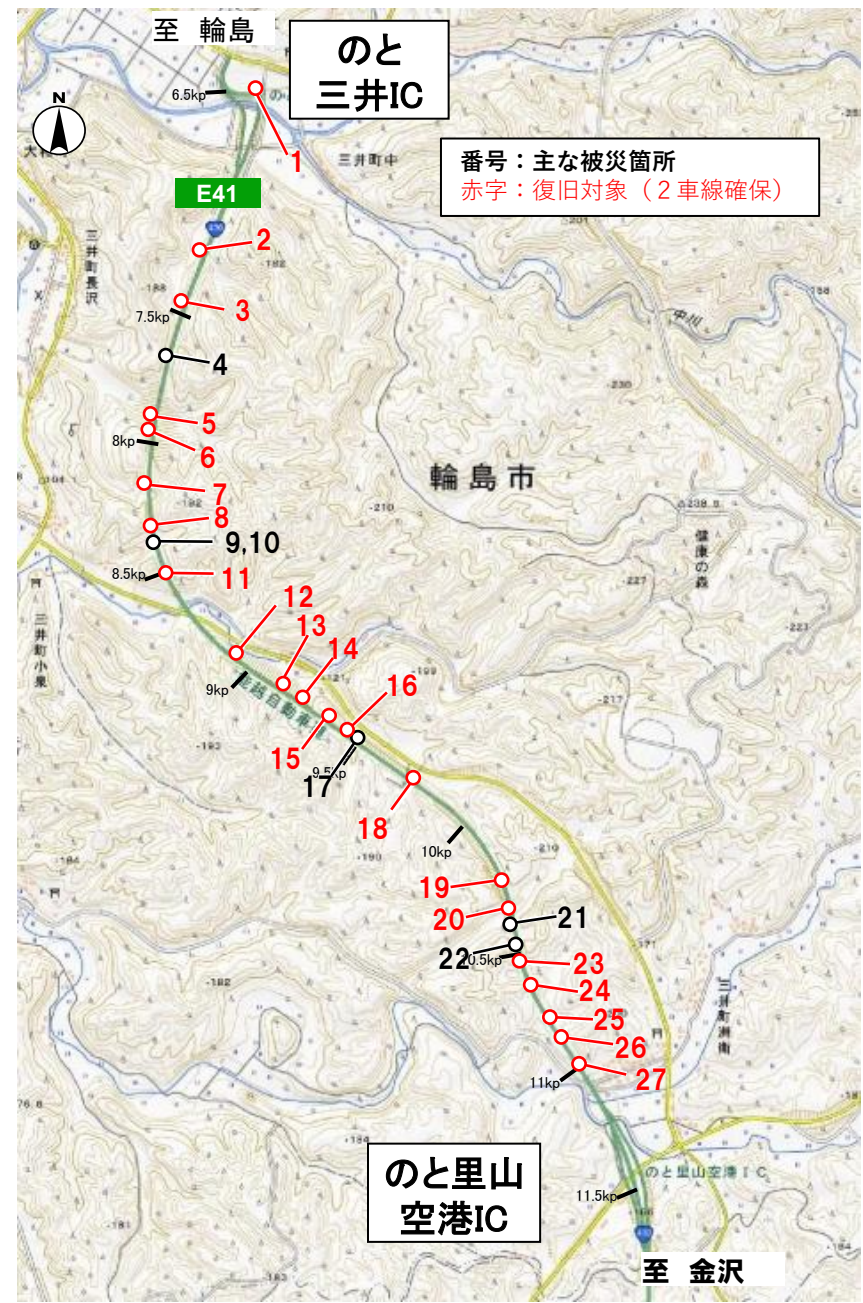

緊急復旧作業中（2車線確保）  
24箇所完了（舗装以外）／27箇所

No.1付近 路面清掃完了



No.1付近 加熱合剤施工状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

2月15日現在

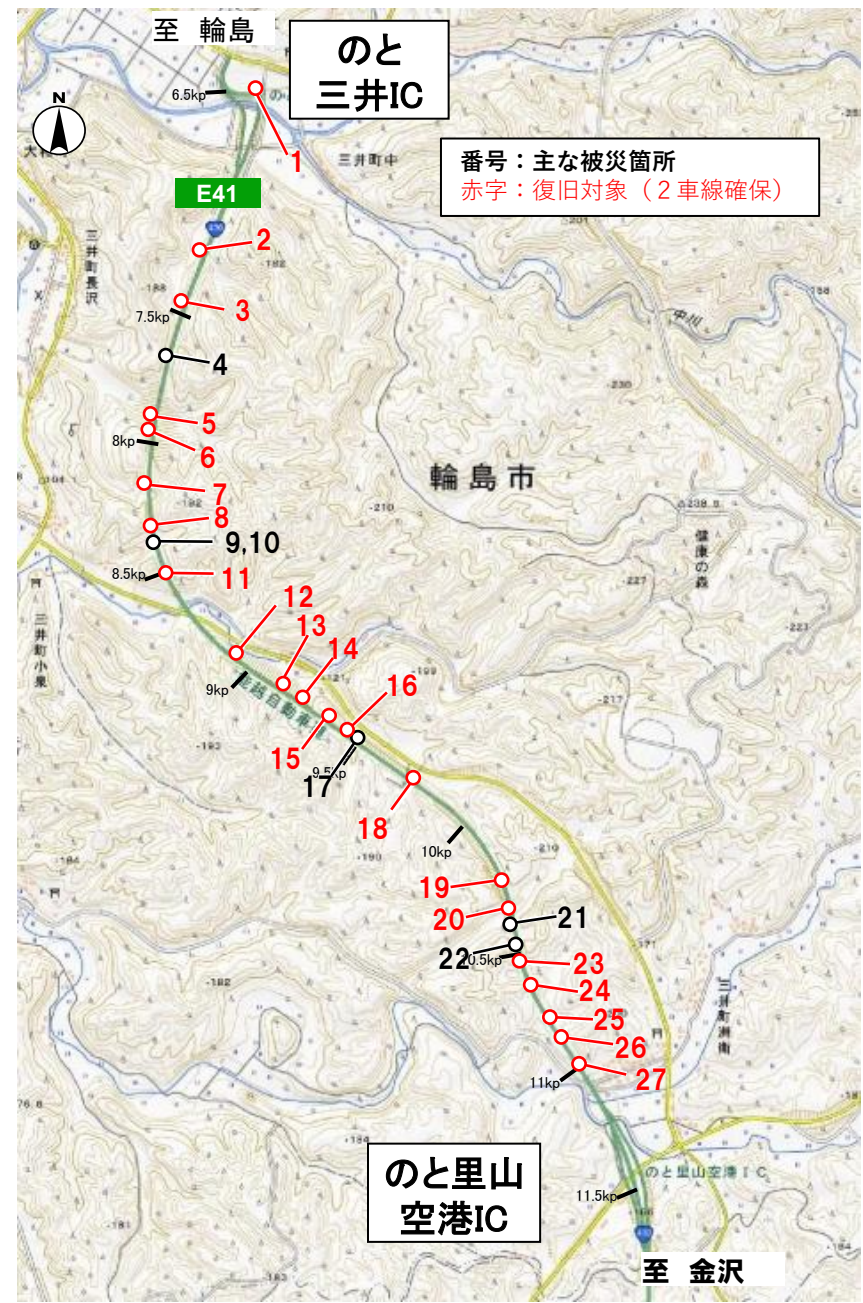

緊急復旧作業中（2車線確保）  
24箇所完了（舗装以外）／27箇所

### No.1 法面清掃状況




### No.3 鋼矢板設置状況





緊急復旧作業中（2車線確保）  
 24箇所完了（舗装以外）／27箇所

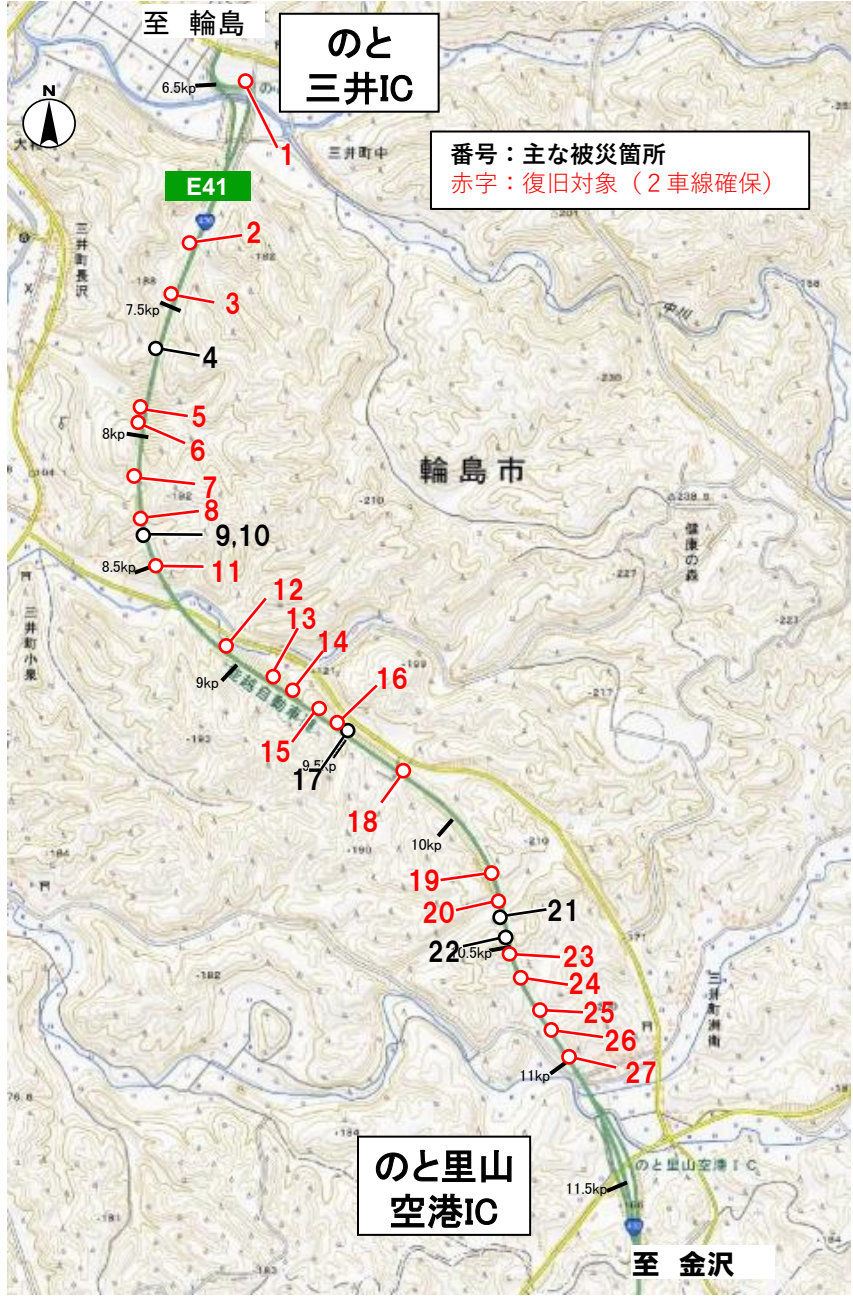


No.3 鋼矢板設置状況





# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

2月9日現在

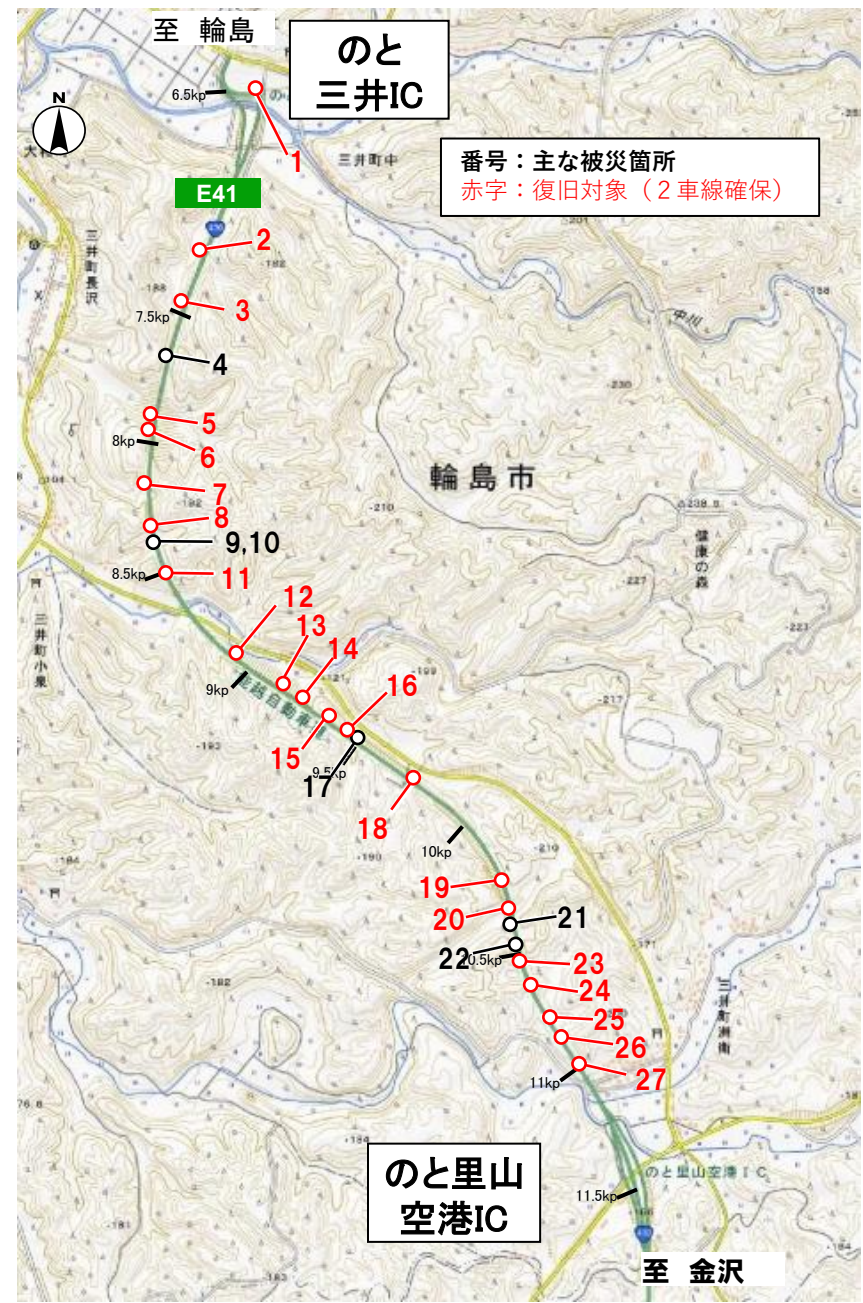

緊急復旧作業中（2車線確保）  
24箇所完了（舗装以外）／27箇所

No.6付近 段差舗装完了






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

2月7日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）  
23箇所完了（舗装以外）／27箇所

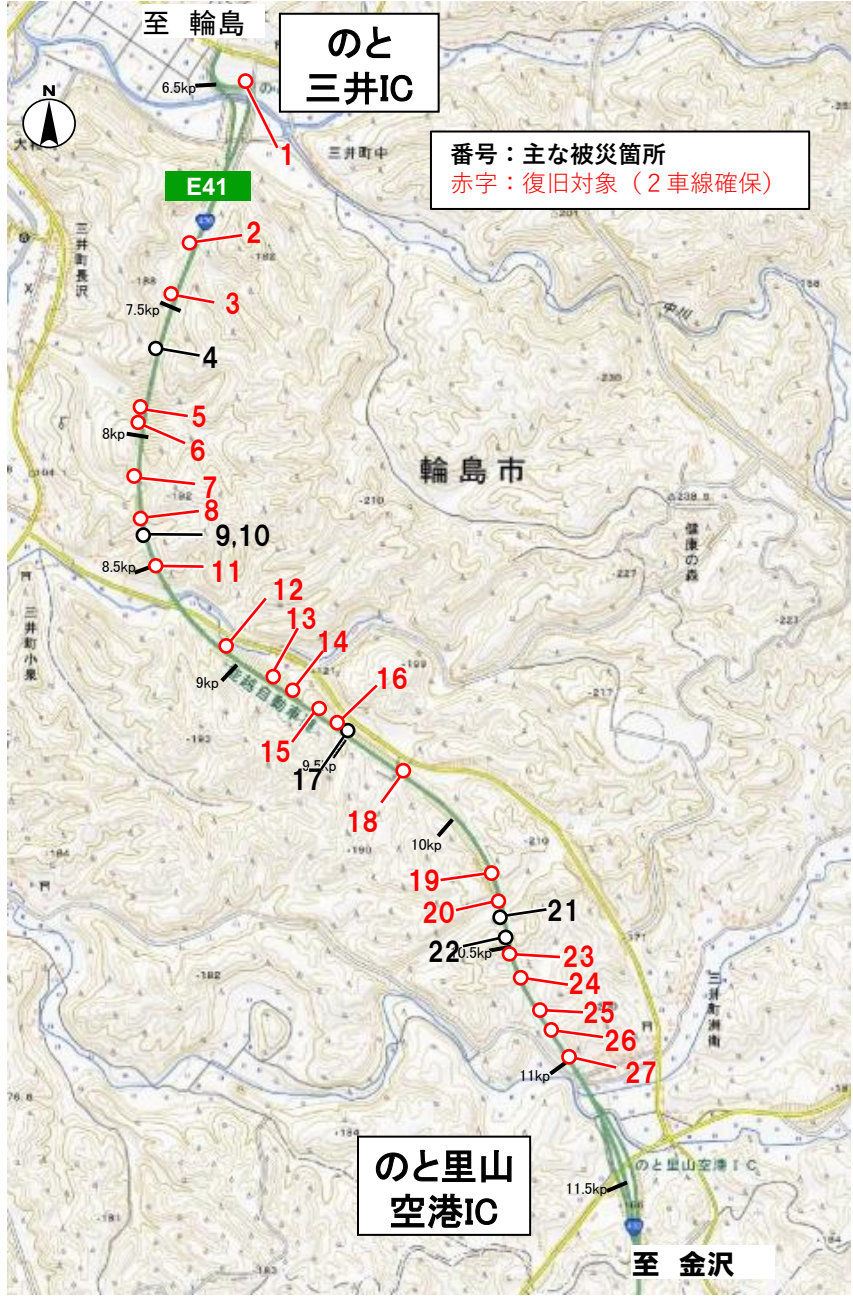

No.18 クラック・段差補修完了










# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

2月1日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）  
9箇所完了（舗装以外）／27箇所

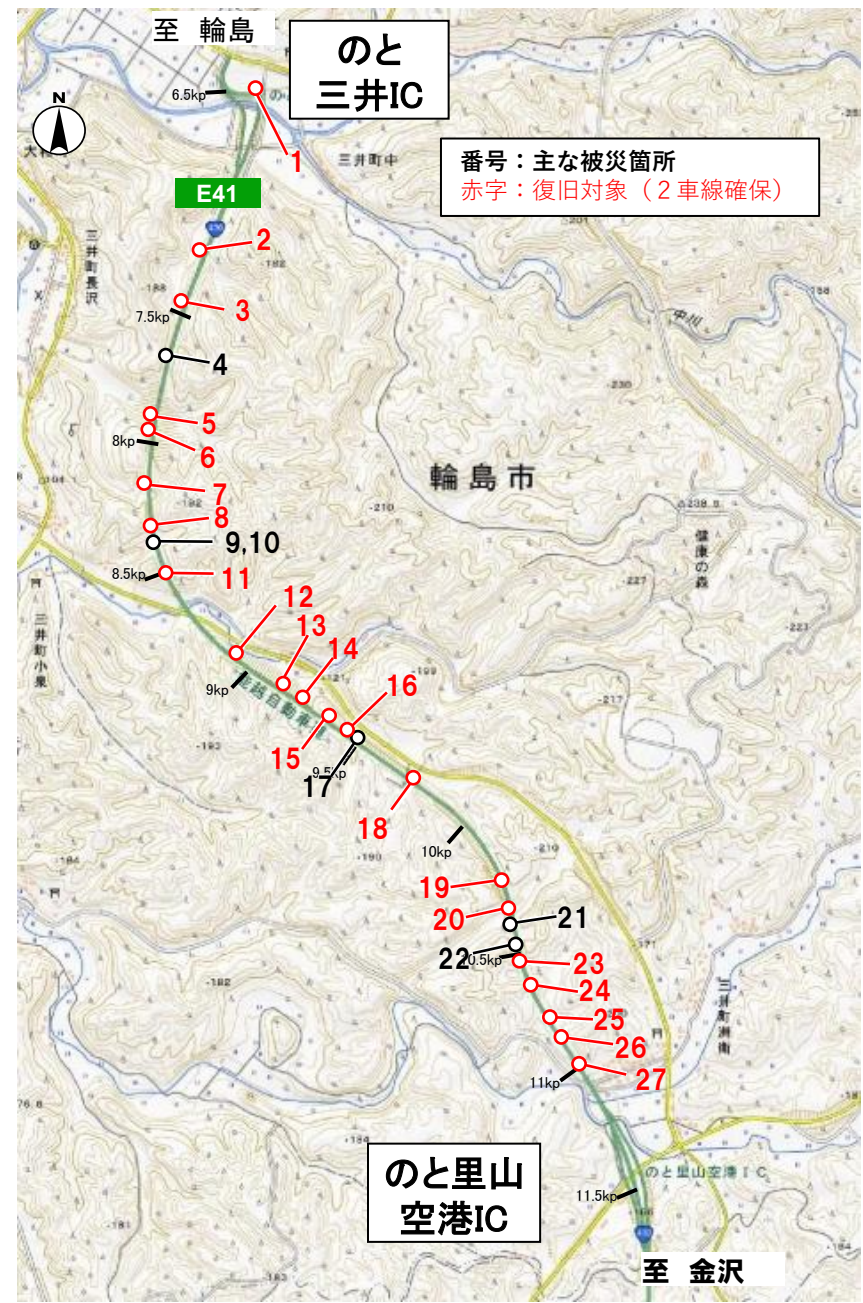

## No.23 クラック・段差部補修状況




## No1付近 安全施設設置状況





緊急復旧作業中 (2車線確保)  
9箇所完了 (舗装以外) / 27箇所

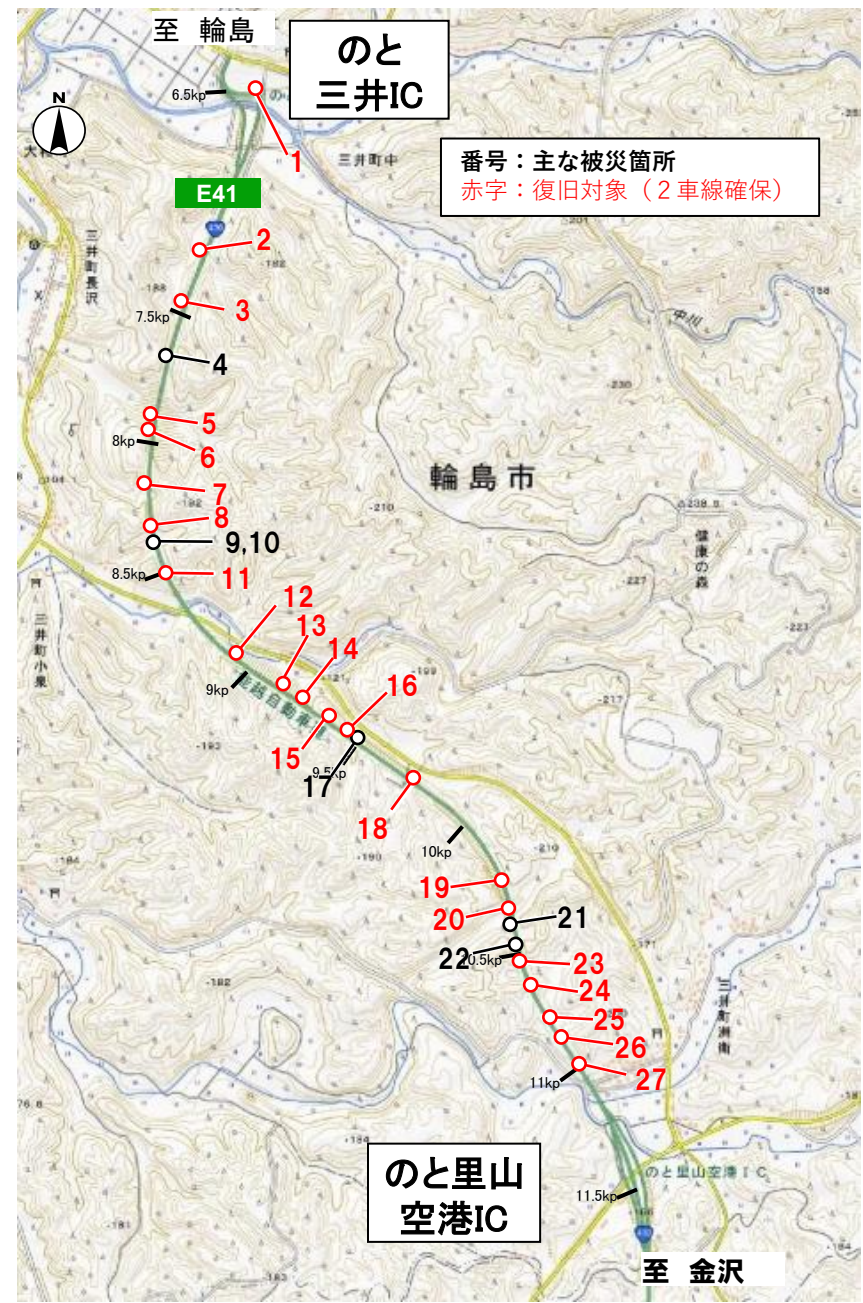

No.3 崩落土撤去状況



R6.1.31撮影


No.18 クラック補修状況



R6.1.31撮影



緊急復旧作業中（2車線確保）

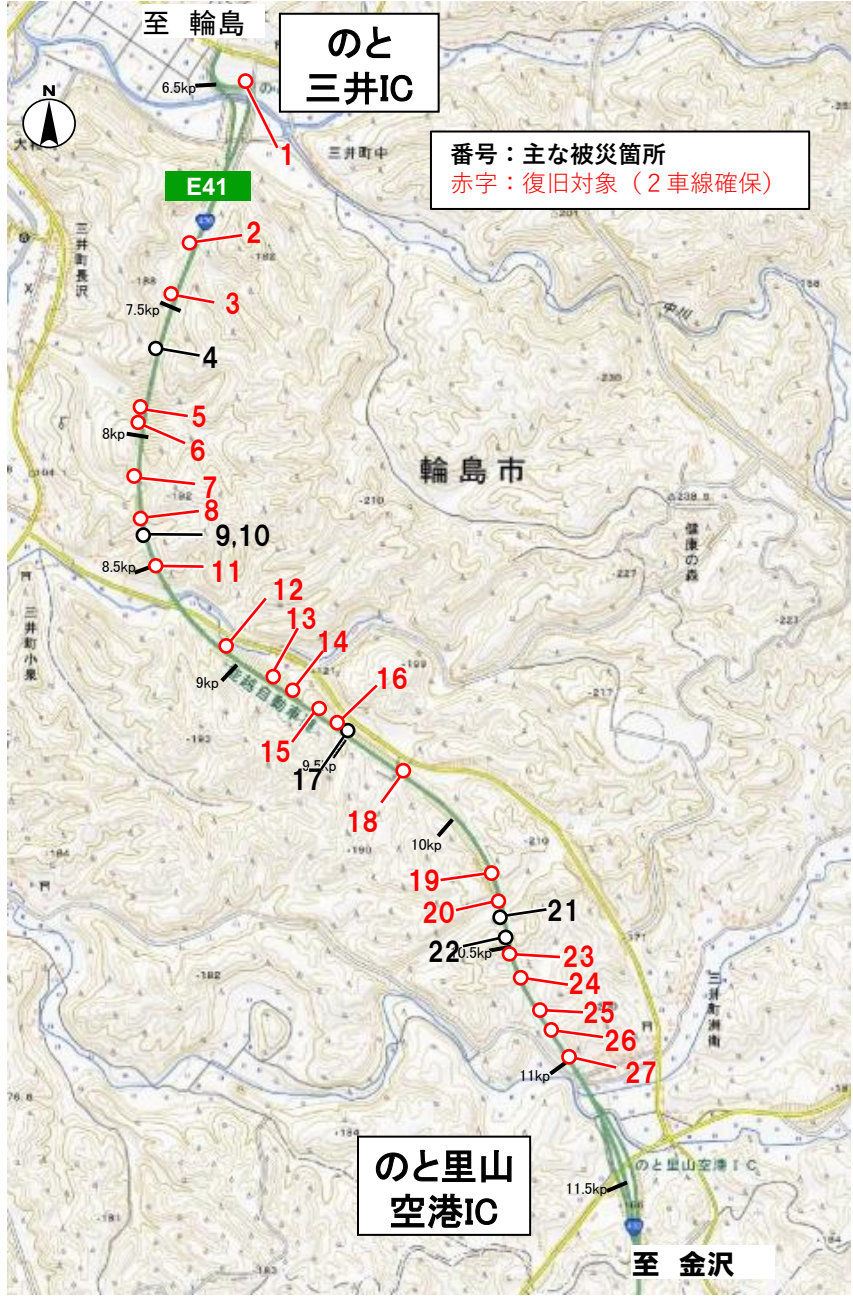

No.3 土砂掘削及び積込状況




No.18 クラック補修状況





緊急復旧作業中（2車線確保）

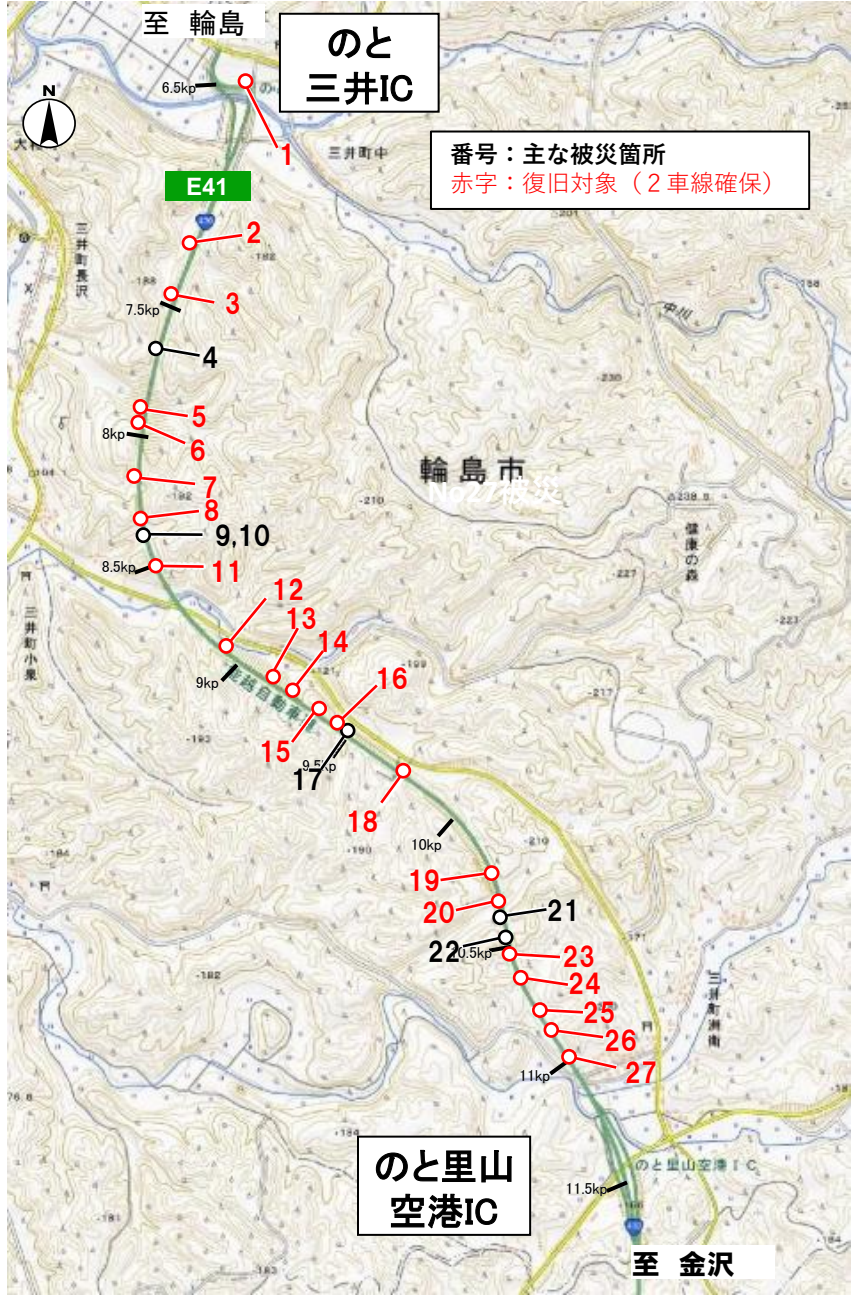

No.3 土砂掘削及び積込状況




No.14 段差補修状況





緊急復旧作業中 (2車線確保)

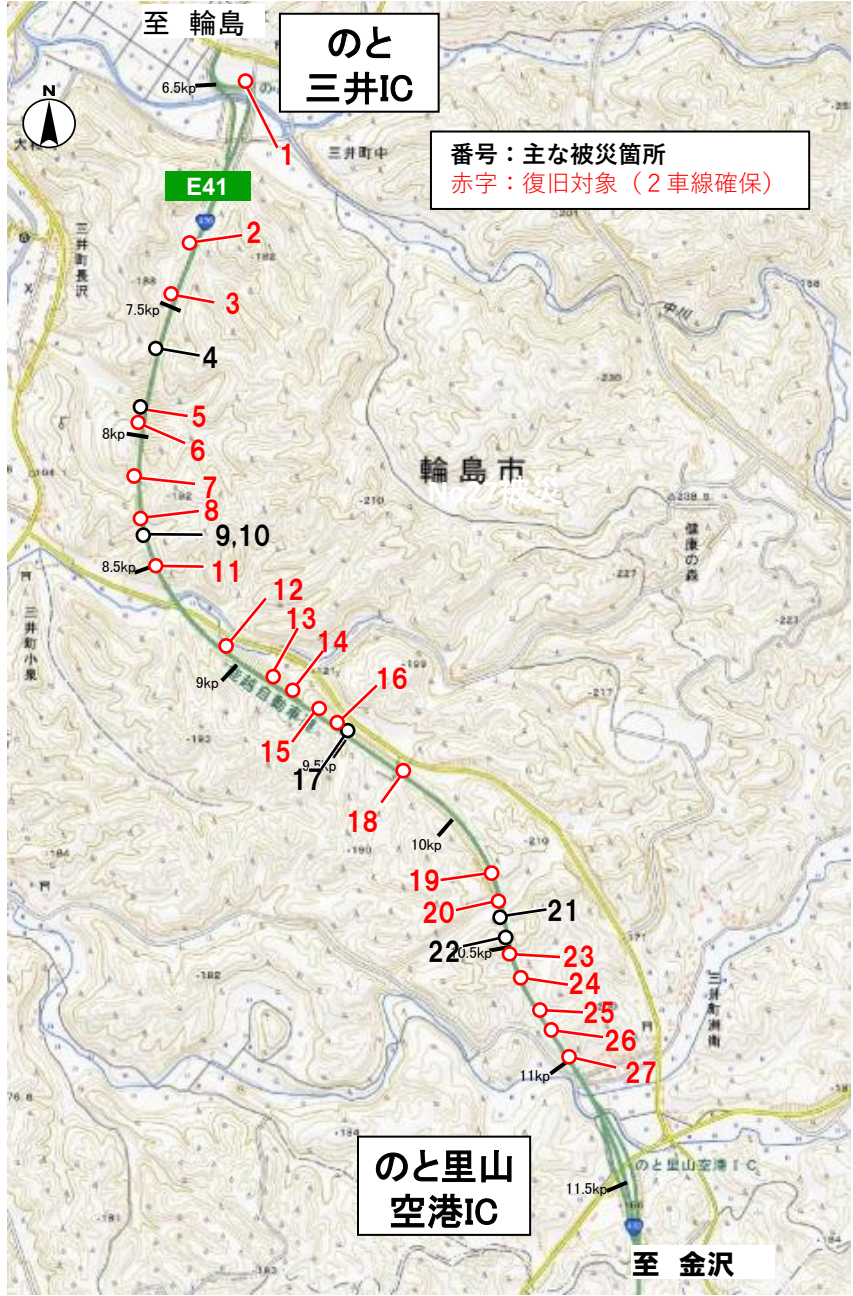

### No.27 段差補修状況




### No.3土砂積込運搬状況





緊急復旧作業中 (2車線確保)

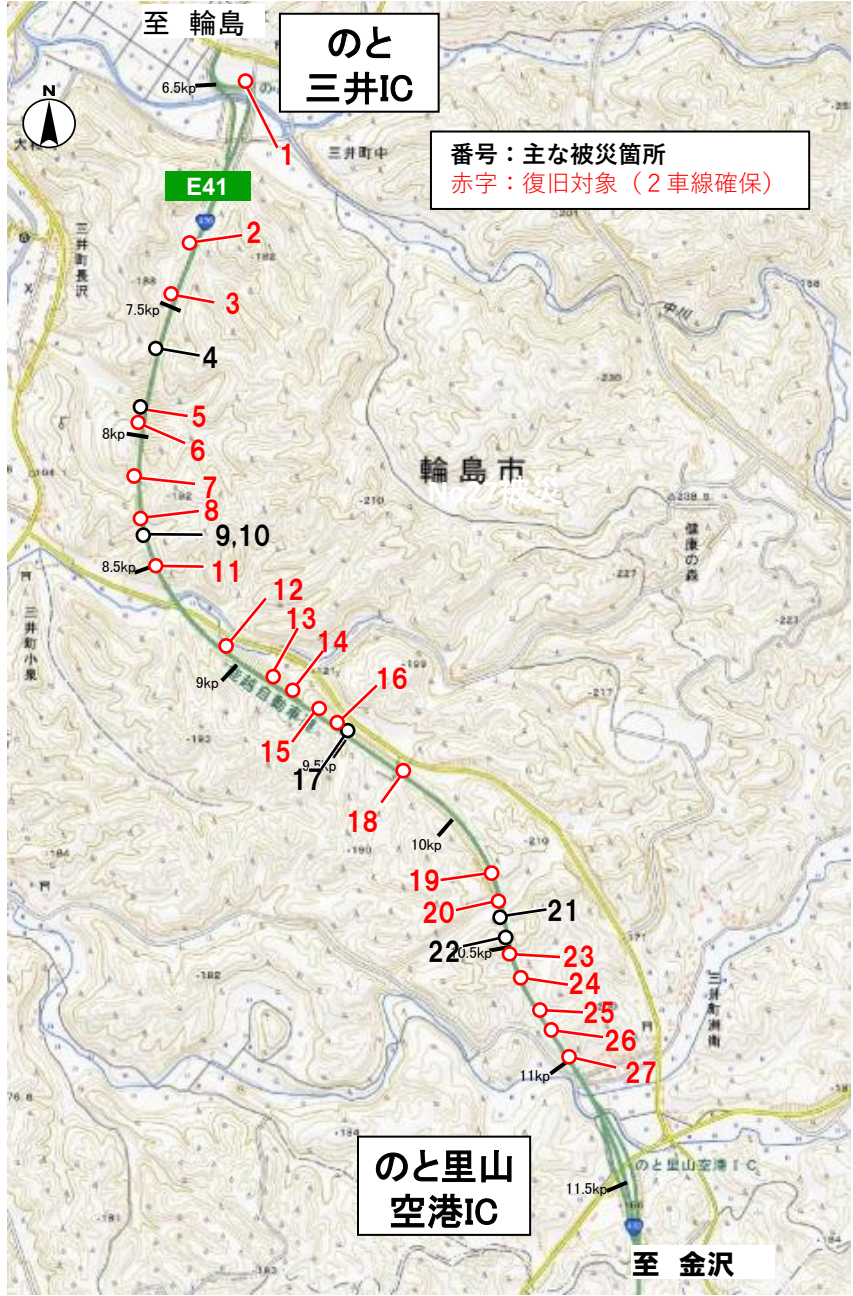

No.26 段差補修状況




No.3土砂積込運搬状況





緊急復旧作業中 (2車線確保)

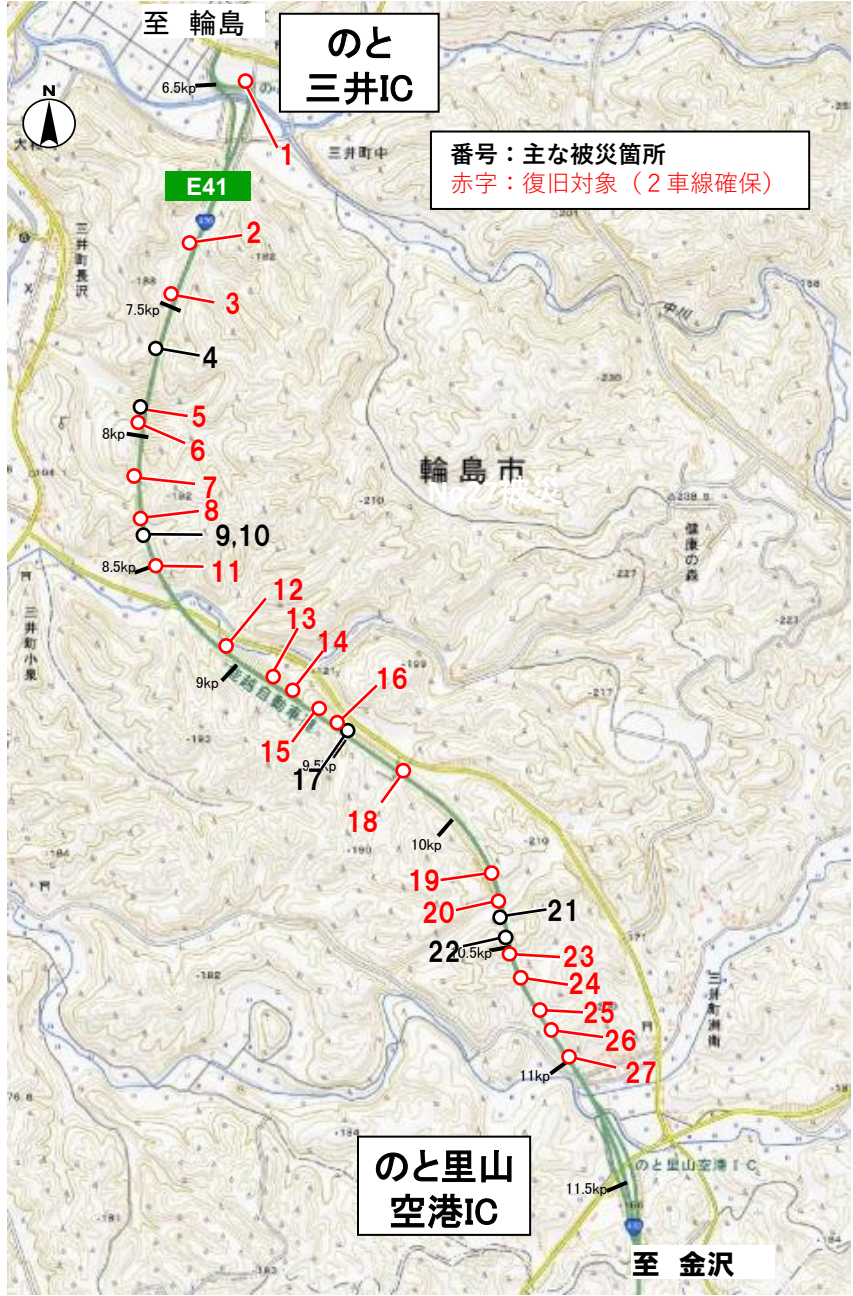

No.7 路面補修状況



No.3 土砂積込運搬状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月23日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

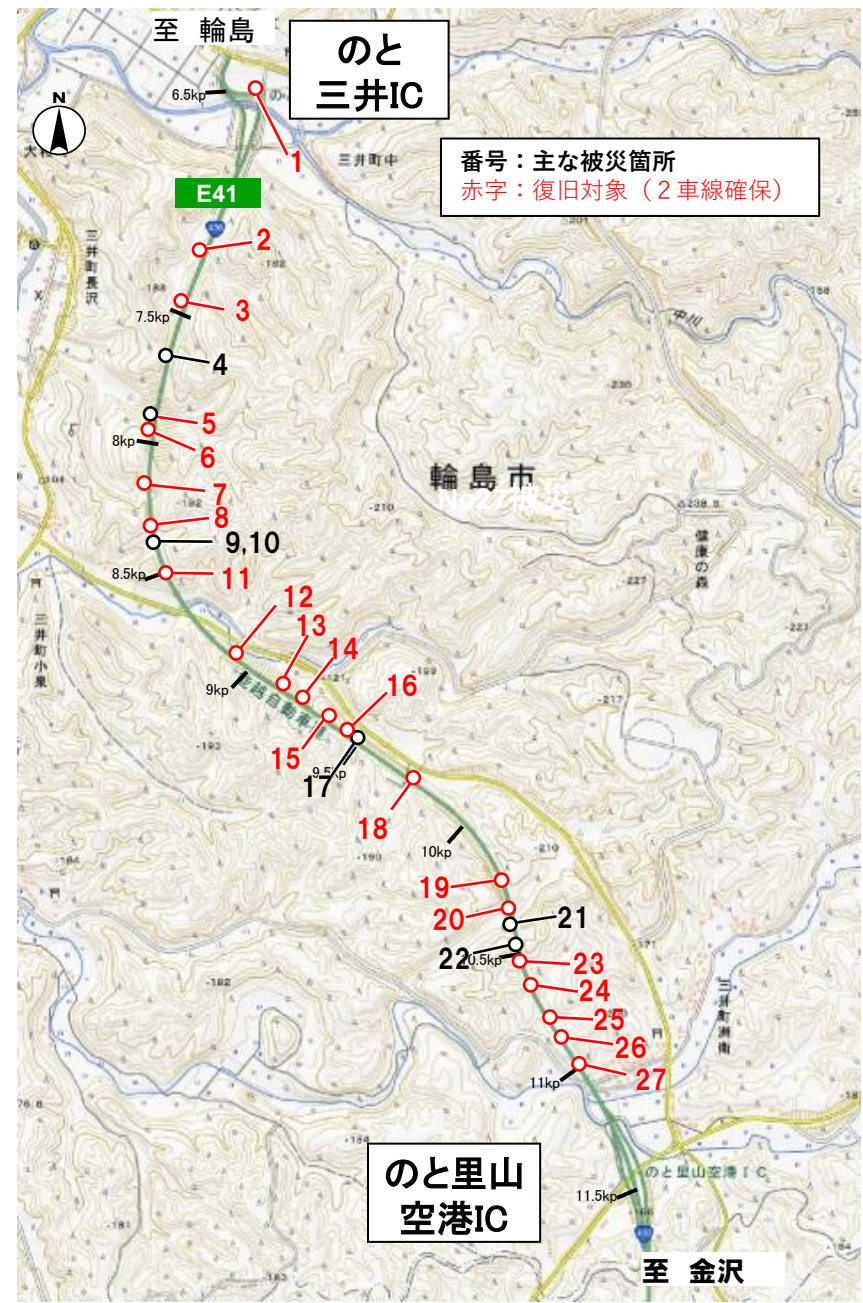


## No.16 亀裂補修





緊急復旧作業中 (2車線確保)

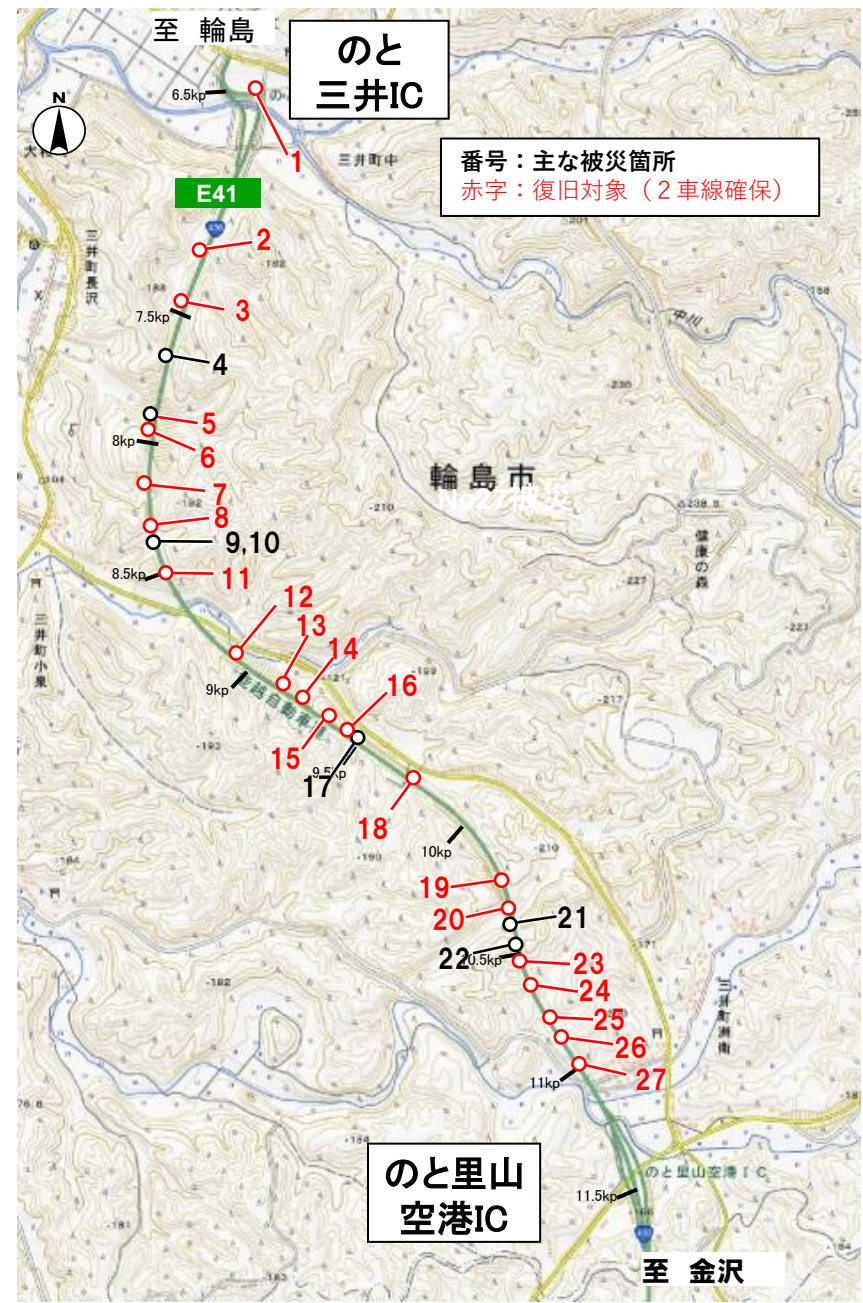


No.23 亀裂・段差補修





緊急復旧作業中（2車線確保）

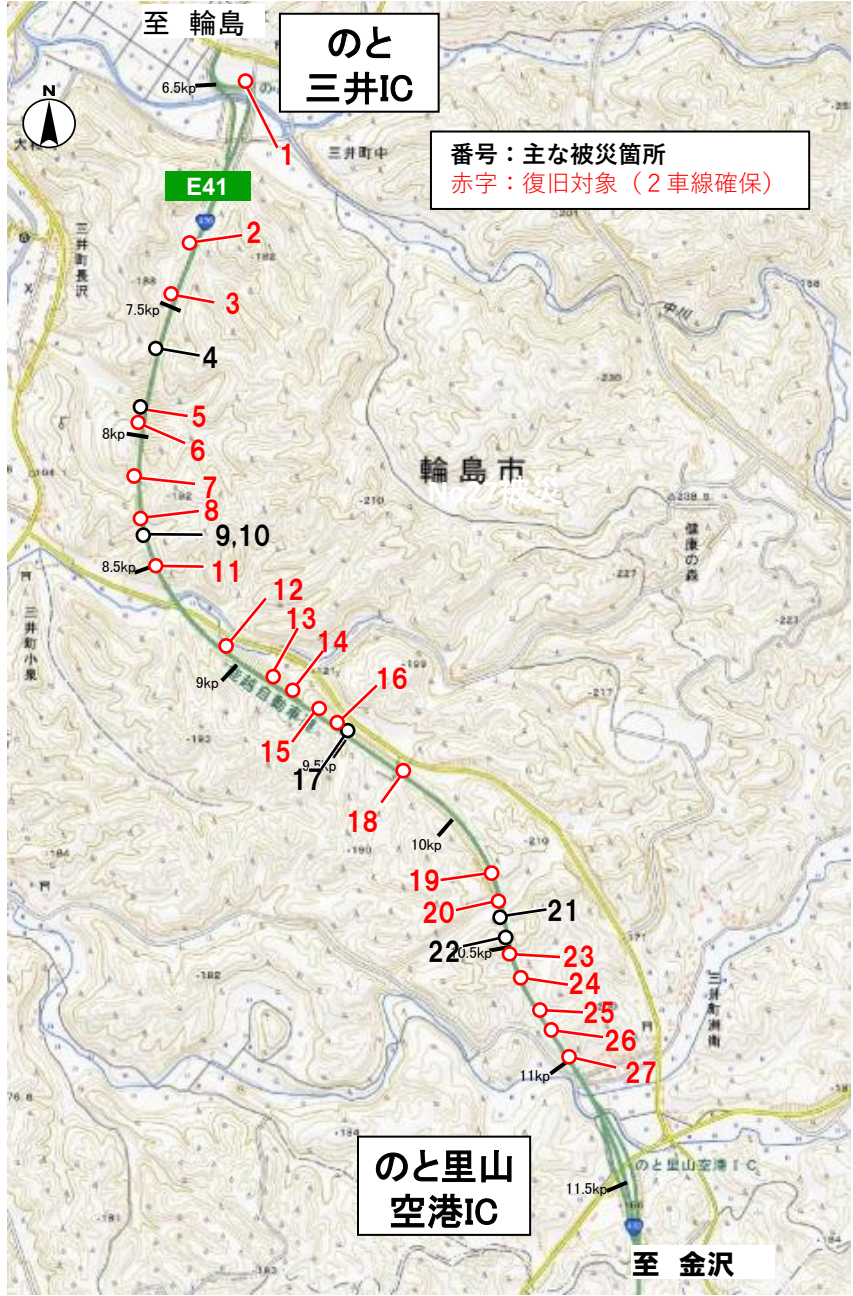


## No.19 亀裂・段差補修





# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月18日現在

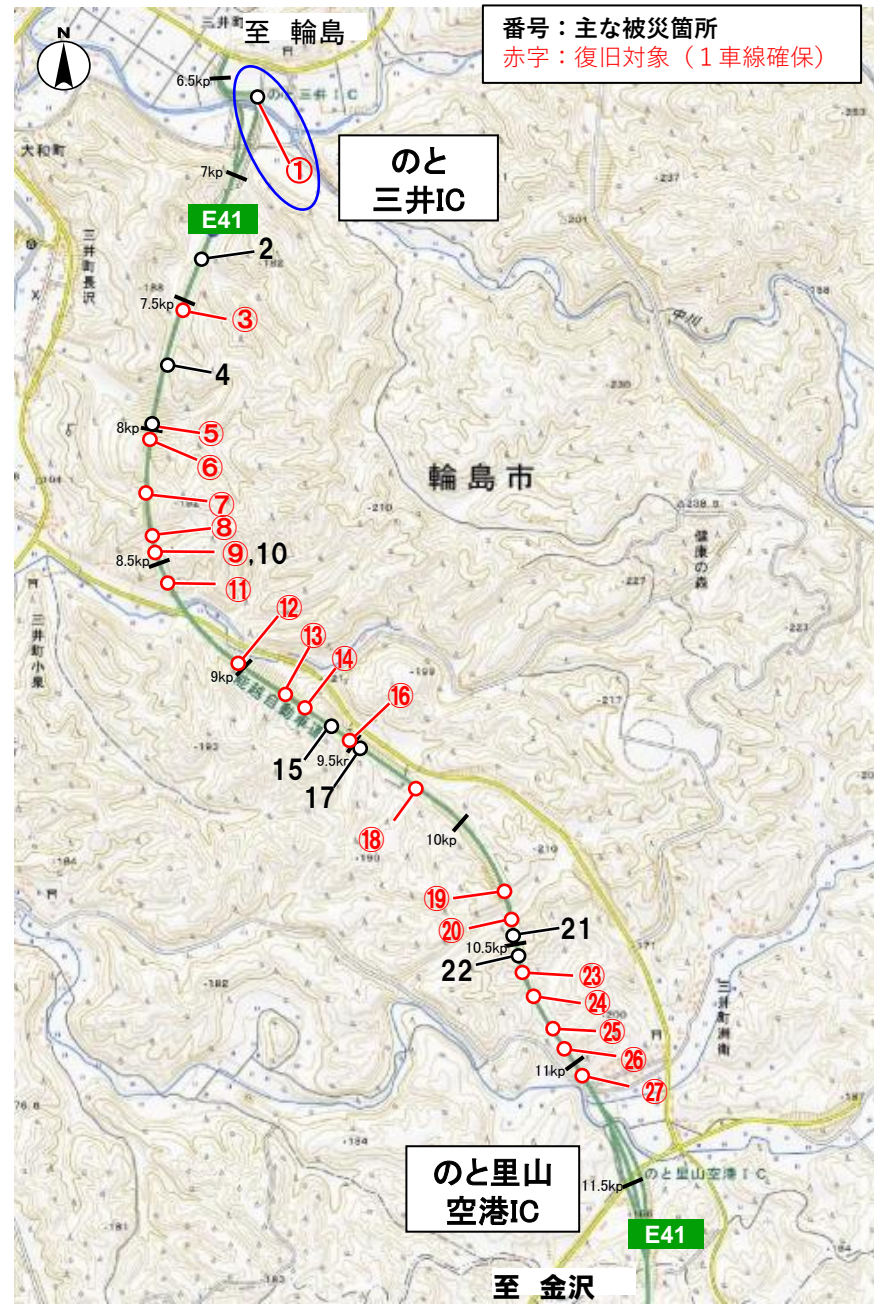

緊急復旧完了（1車線確保）  
令和6年1月18日～通行止め解除（一方通行）

## No1. 段差補修（完了）






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月18日現在

緊急復旧完了（1車線確保）  
令和6年1月18日～通行止め解除（一方通行）

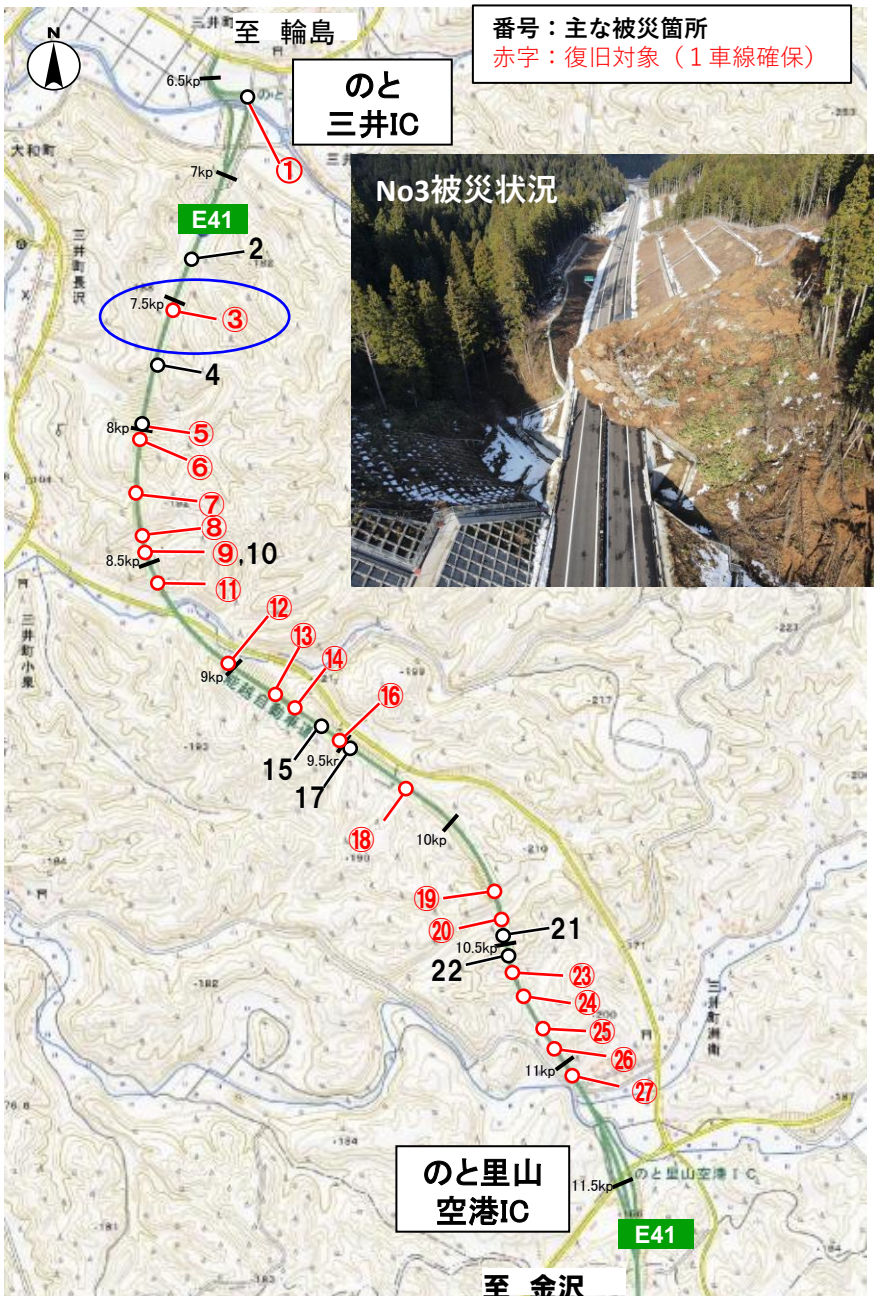

## No3. 土砂撤去（完了）





# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月18日現在

緊急復旧完了（1車線確保）  
令和6年1月18日～通行止め解除（一方通行）



## No.7亀裂・段差補修（完了）






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月18日現在

緊急復旧完了（1車線確保）  
令和6年1月18日～通行止め解除（一方通行）

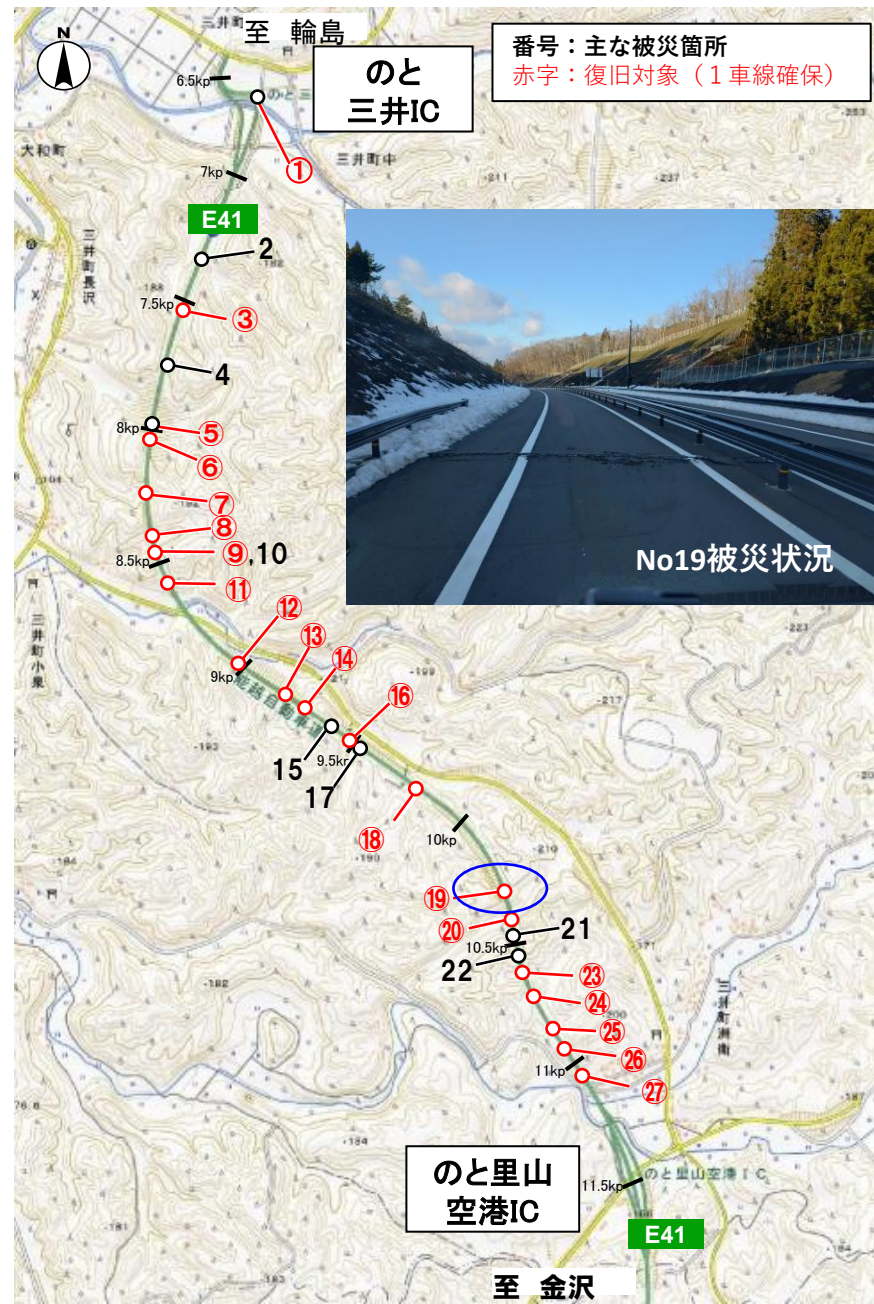

## No.19亀裂・段差補修（完了）




工事件名	令和6年能登半島地震 能越自動車道緊急復旧工事P-C4
工事場所	10.36kp上り
施工状況	施工完了状況
被災復旧対応 舗装工事 石材施工完了	
	2024/01/14

R6.1.14撮影



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC (担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株))

1月18日現在

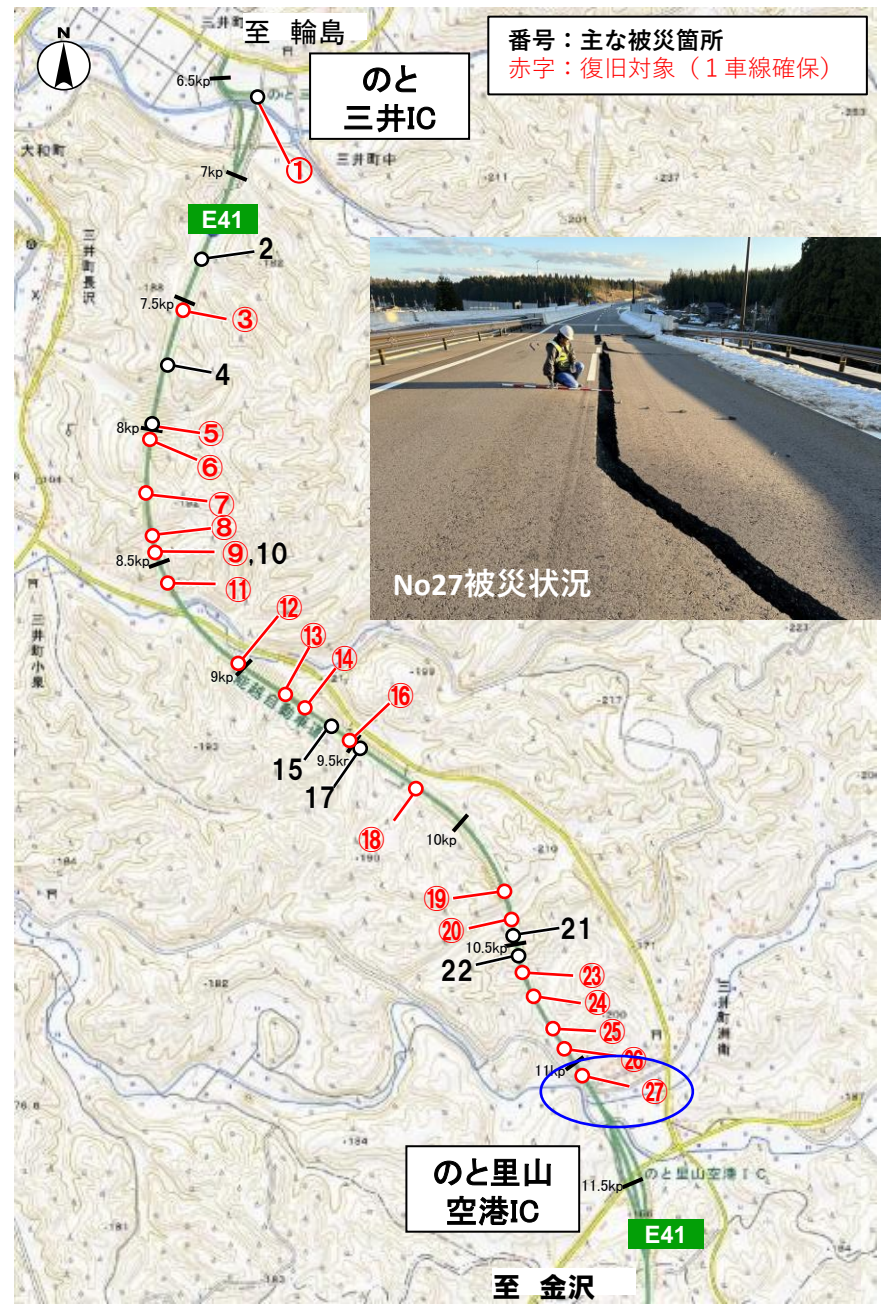

緊急復旧完了 (1車線確保)  
令和6年1月18日～通行止め解除 (一方通行)

## No.27亀裂・段差補修 (完了)

