


令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

4月22日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

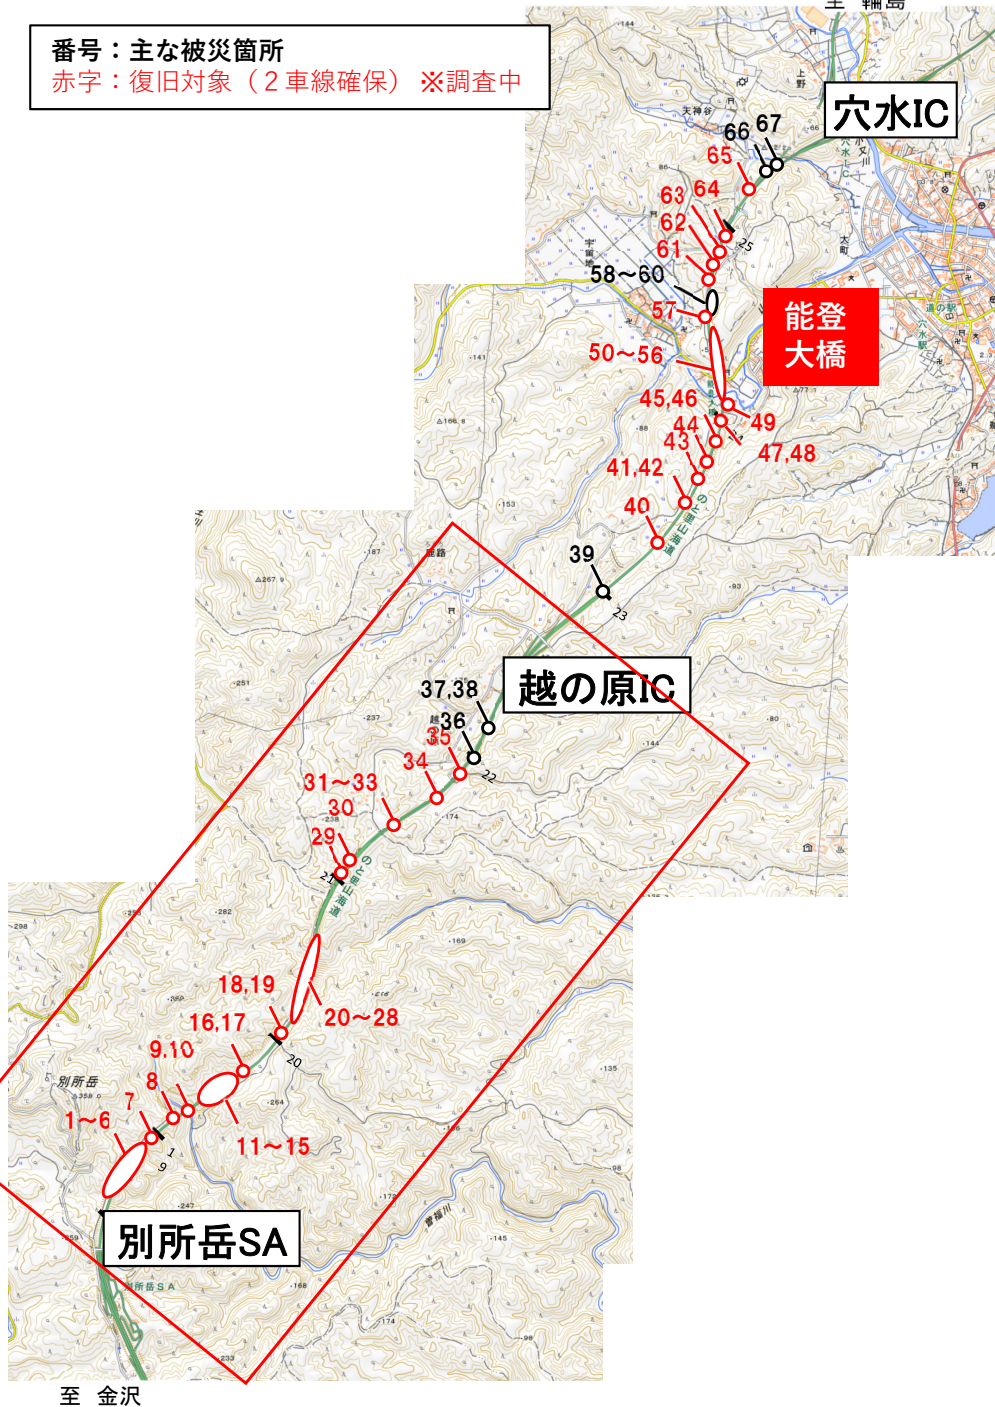

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.29付近 舗装状況



No.29付近 舗装状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

4月15日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

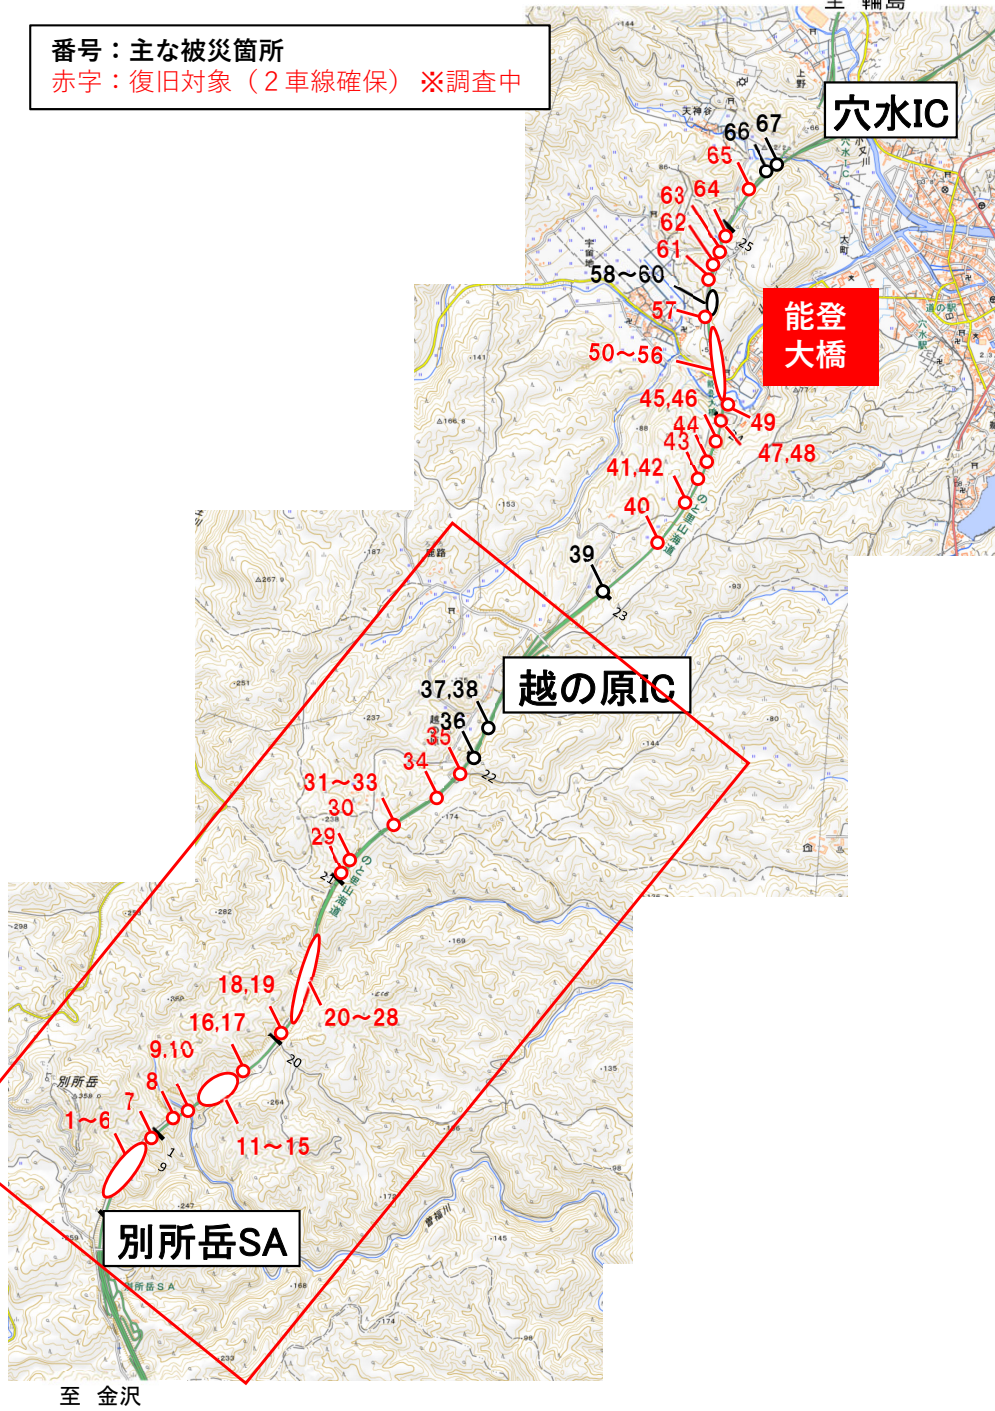

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.13付近 乳剤散布状況



R6.4.13撮影

No.24付近 路盤工状況



R6.4.13撮影


令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

4月8日現在

番号：主な被災箇所

赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

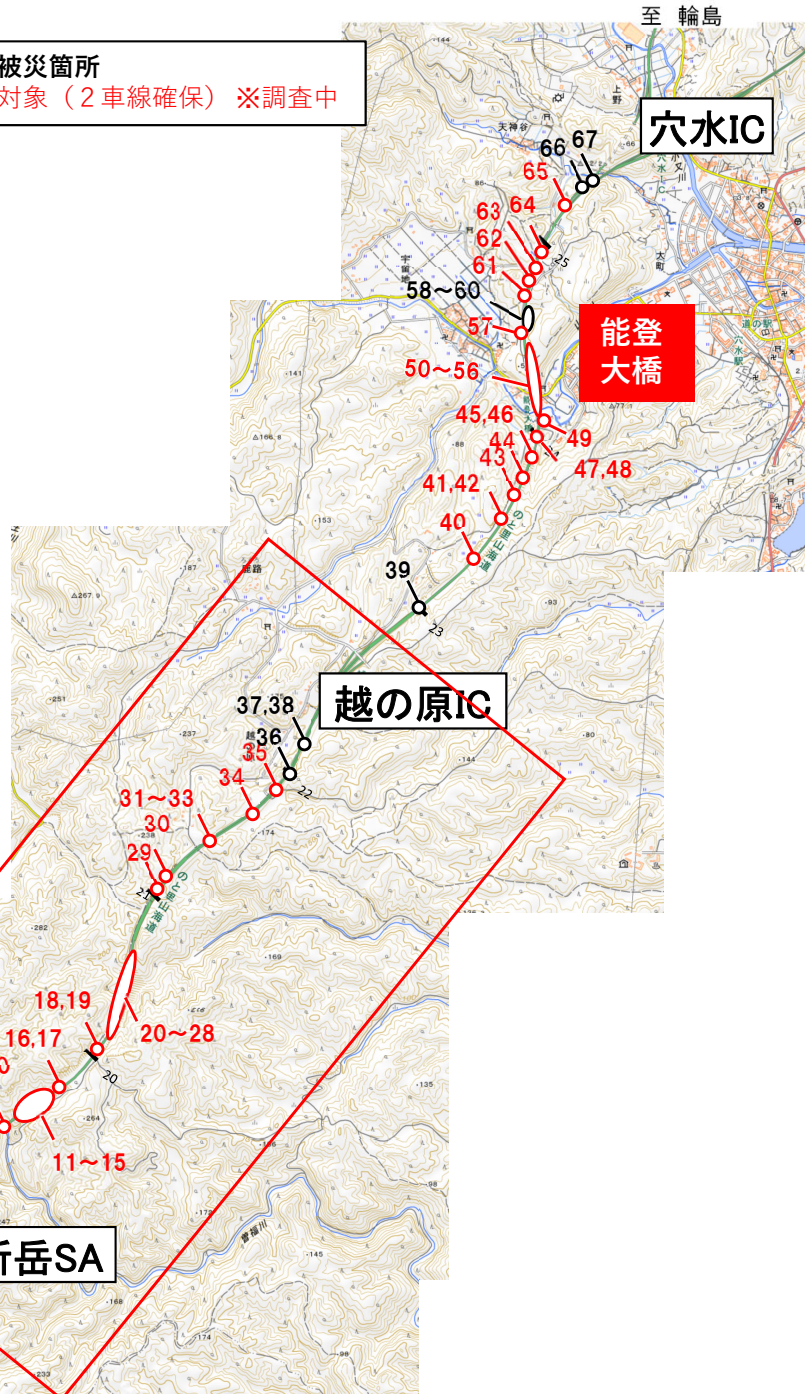

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.38付近 アスファルト舗装 乳剤散布状況




No.37付近 路盤完了状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

3月25日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

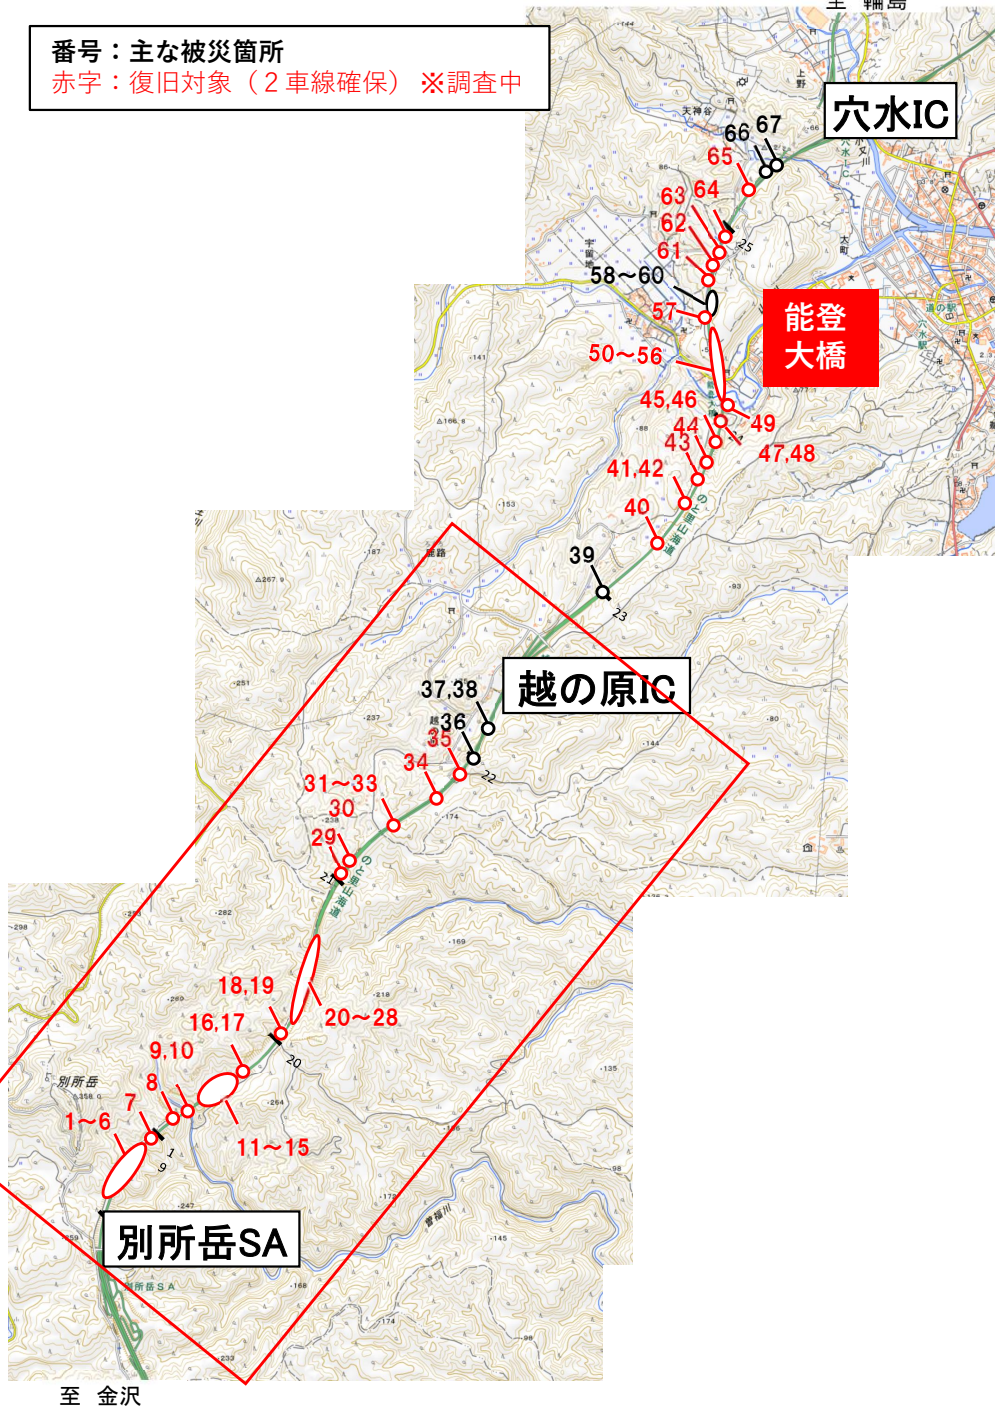

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.1 砕石敷均し・転圧状況



No.30 砕石敷均し・転圧状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)


3月18日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

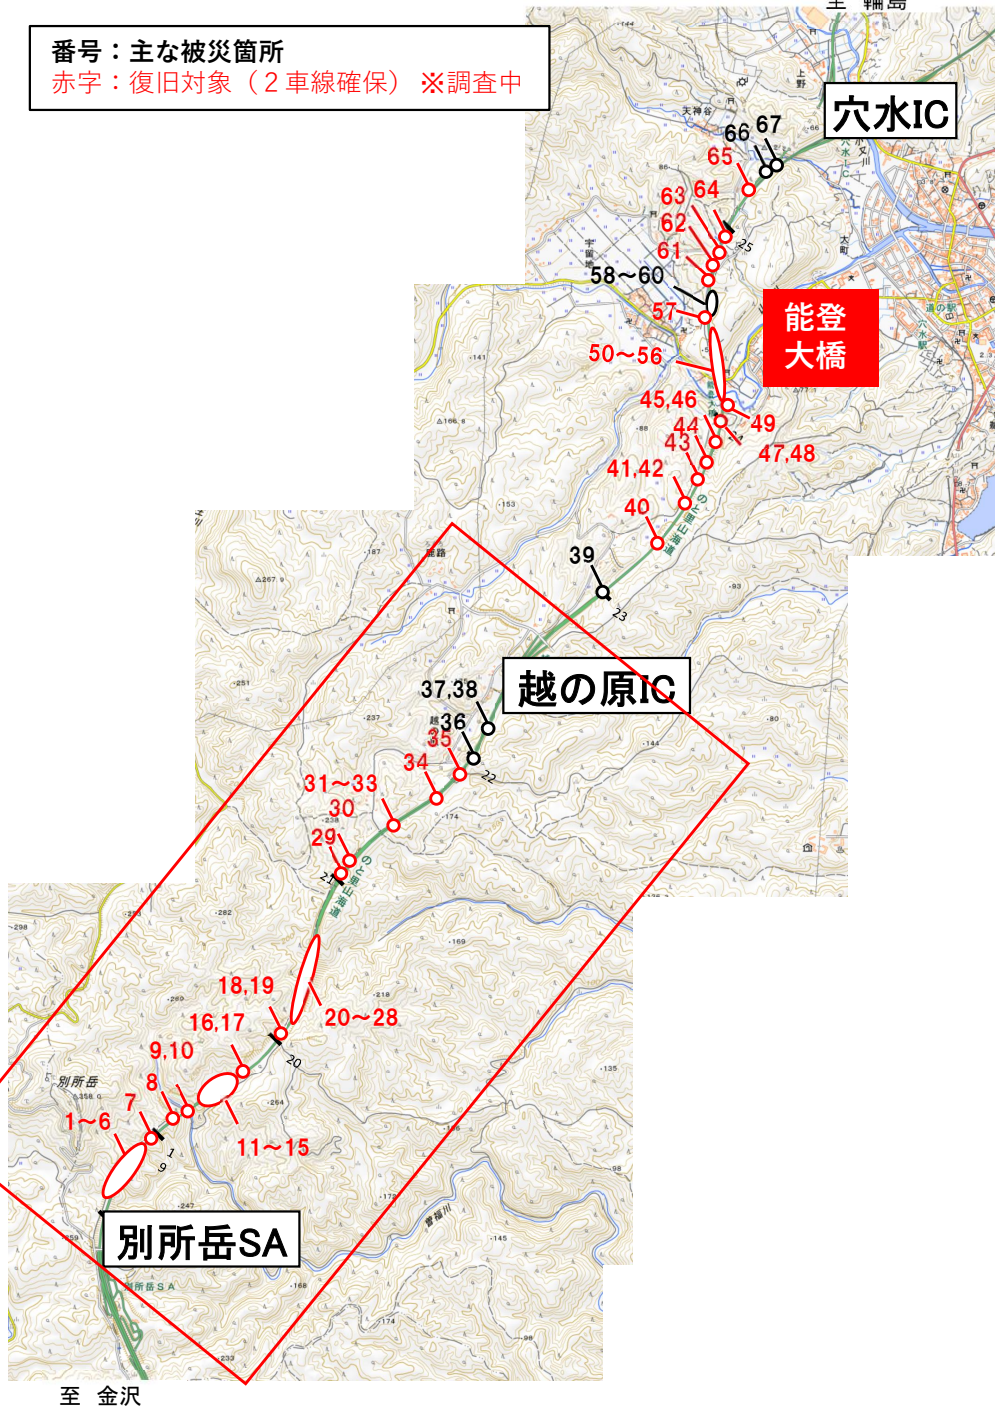

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.5路盤材敷均し、転圧状況

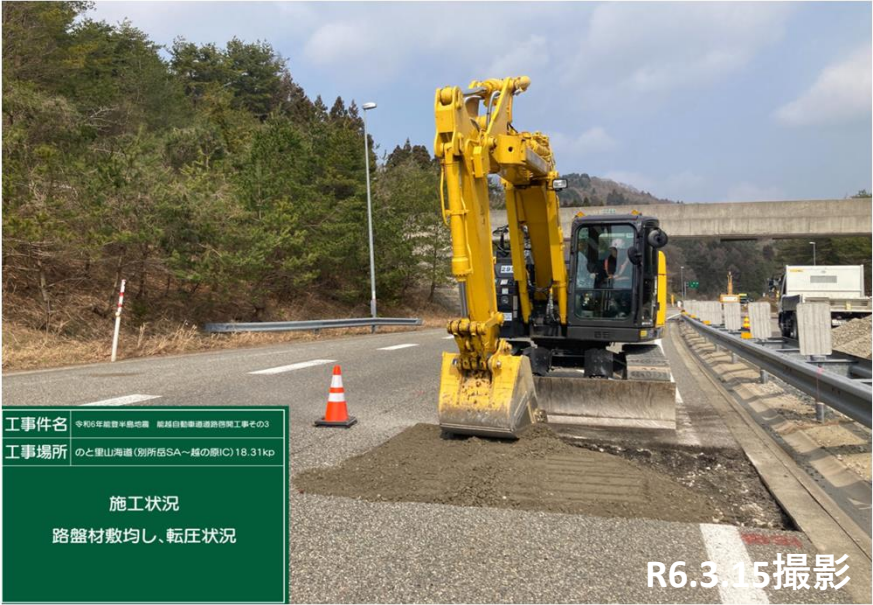


令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

3月15日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

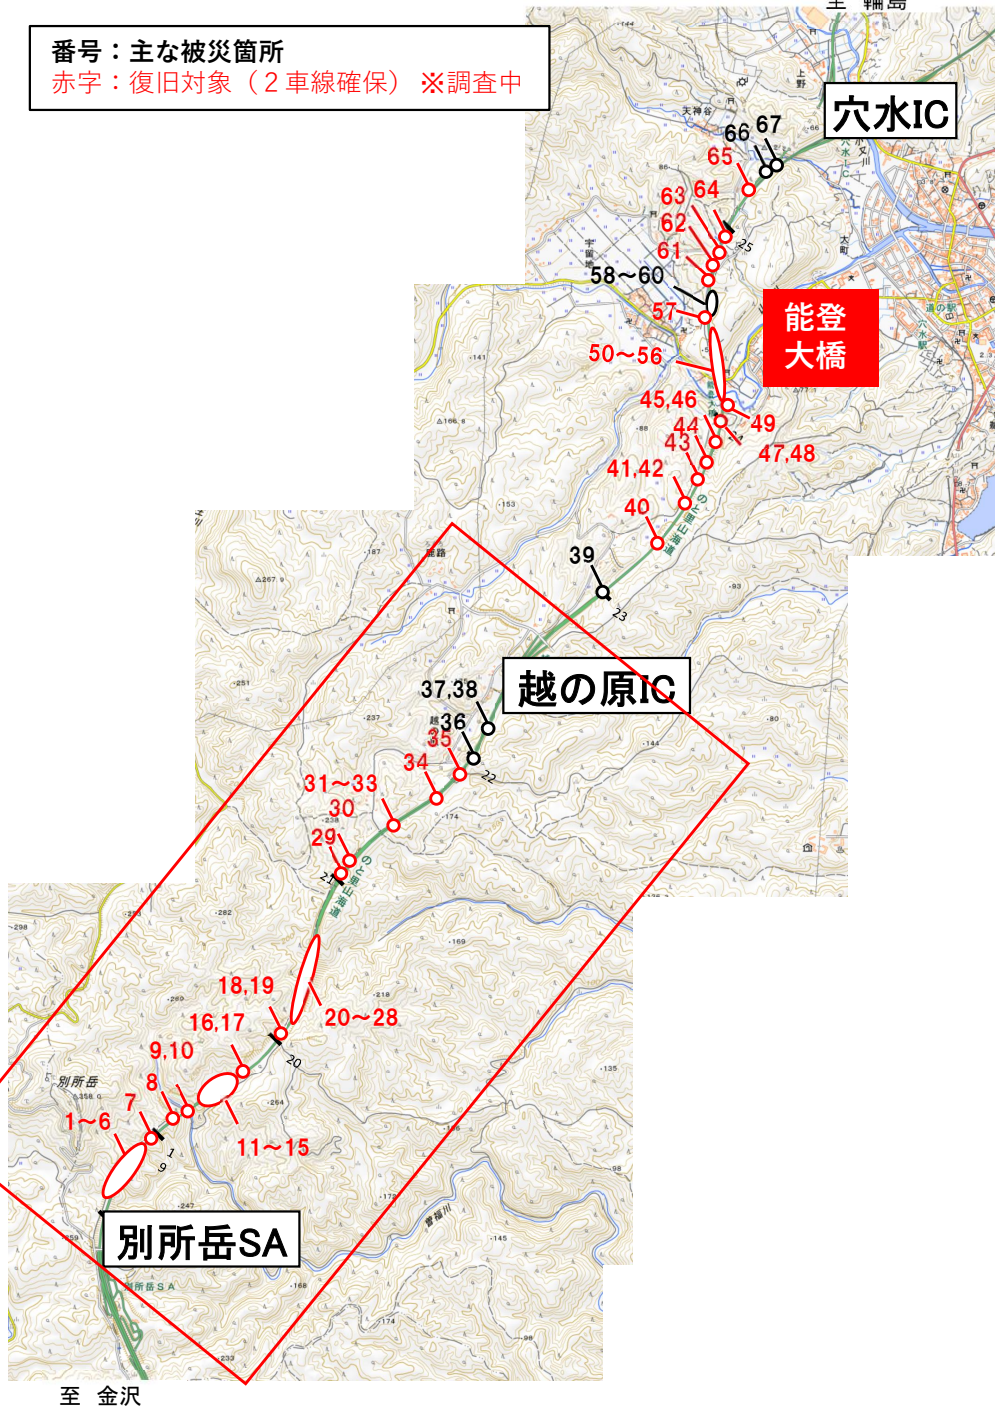

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.1 路盤材敷均し状況



工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道道路復旧工事その3
工事場所	のと里山海道(別所岳SA～越の原IC) 18.20kp
施工状況	
路盤材敷均し・転圧	

No.29 改良土敷き均し状況




工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道道路復旧工事その3
工事場所	のと里山海道(別所岳SA～越の原IC) k.p. 21.2
改良土敷き均し状況	

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

3月13日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

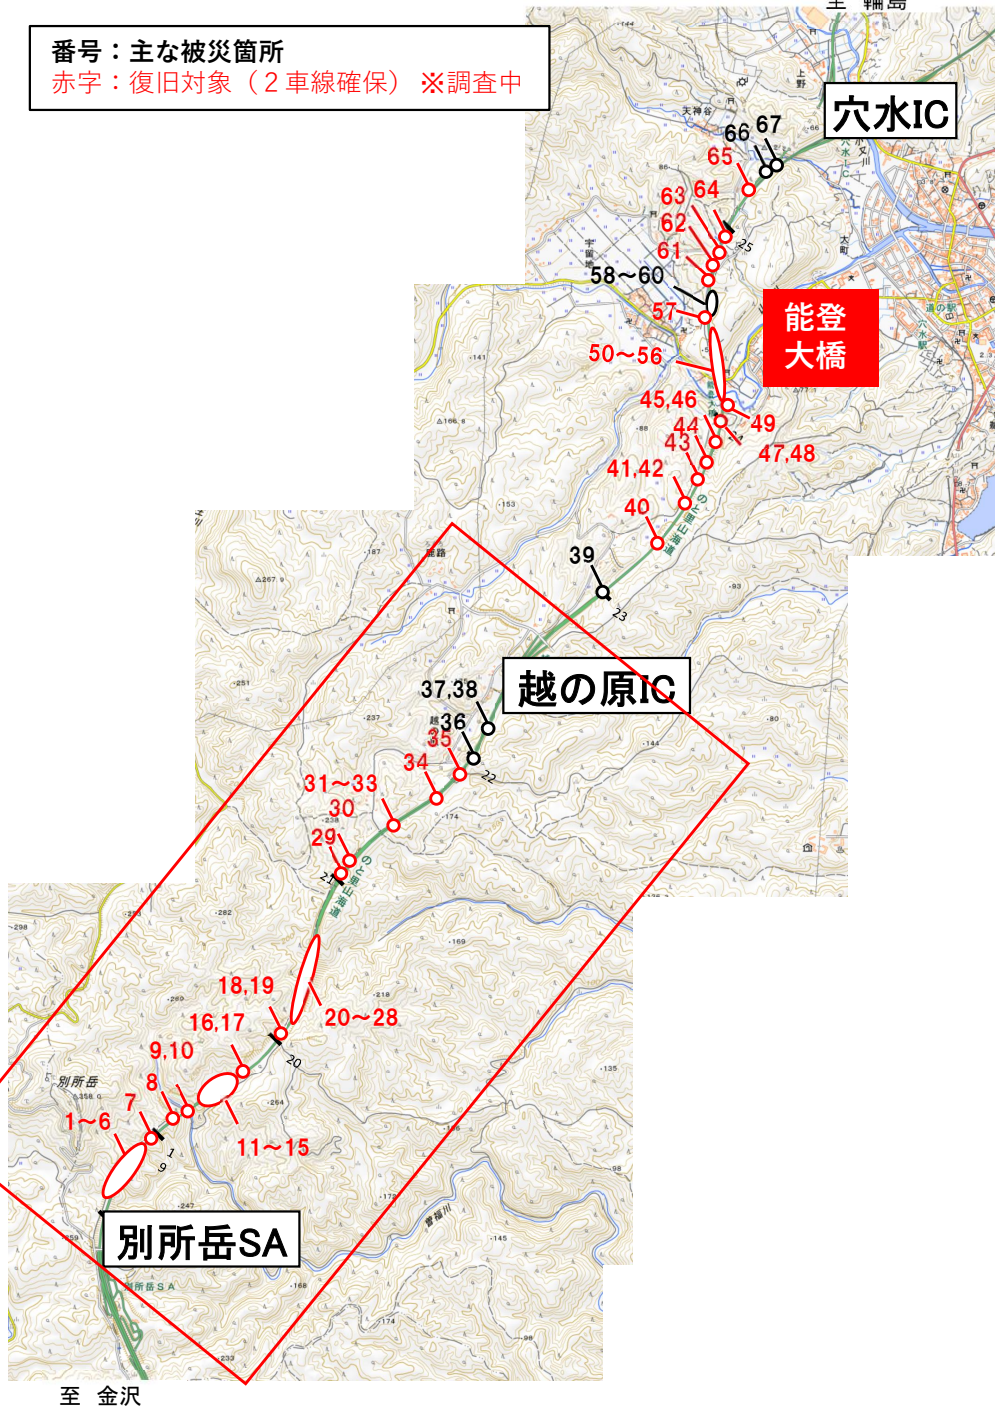

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.30 法面仕上げ状況



No.30付近 舗装撤去状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

3月11日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

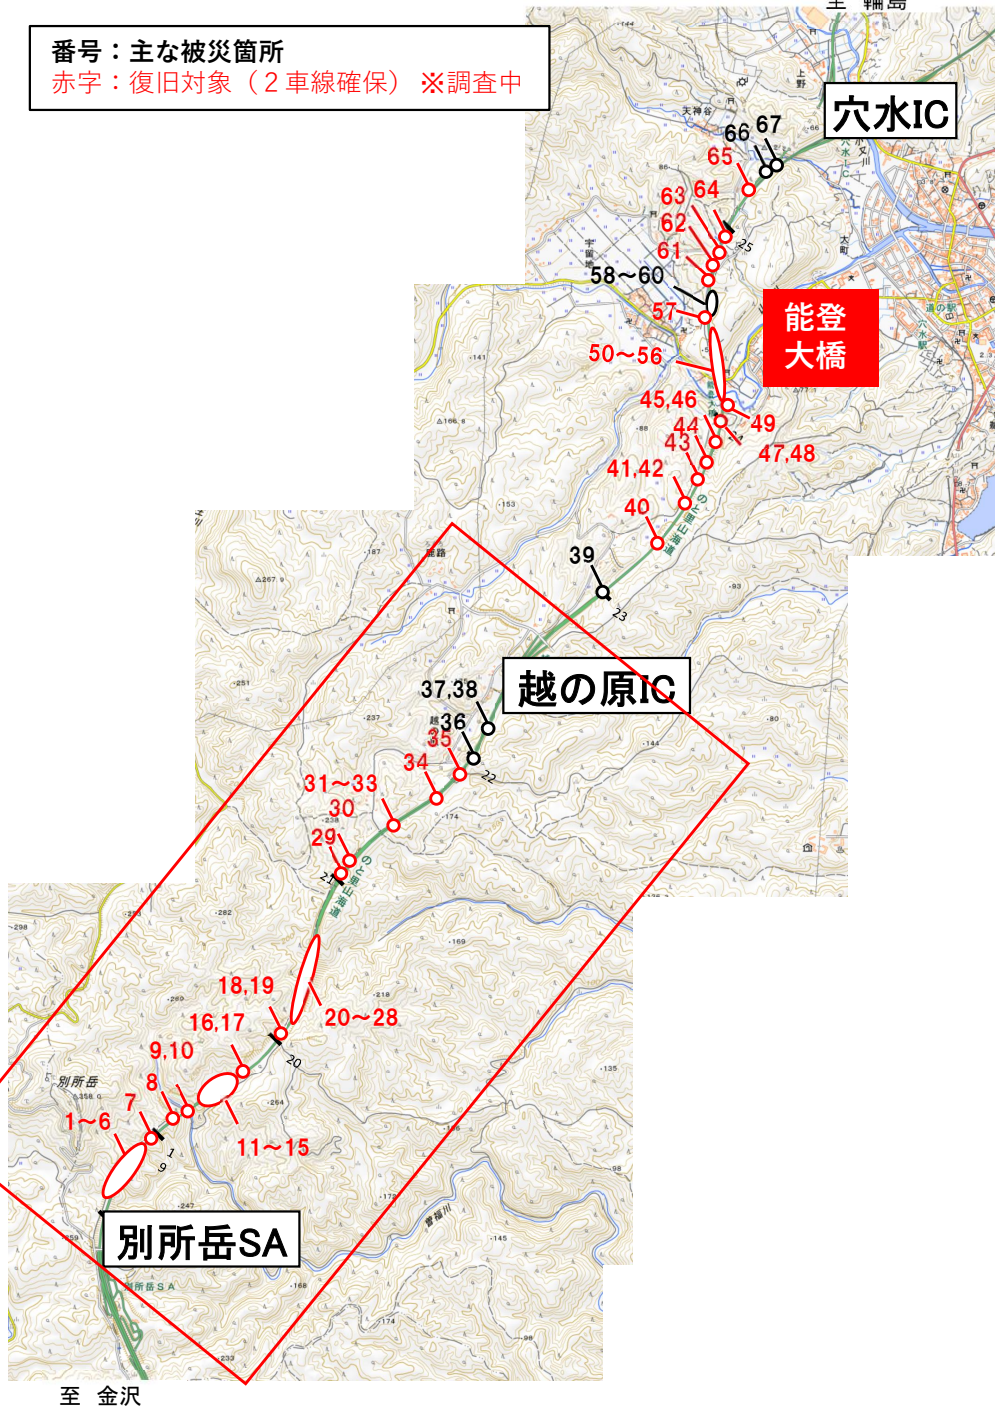

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.38 路盤材敷均し転圧状況



工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道道路復旧工事その3
工事場所	のと里山海道(別所岳SA～越の原IC)22.23～22.27km
施工状況	路盤材敷均し、転圧

R6.3.9撮影

No.33 砕石敷均し・転圧状況



工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道道路復旧工事その3
工事場所	のと里山海道(別所岳SA～越の原IC)21.41～21.48
施工状況	砕石敷均し、転圧


R6.3.8撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

3月8日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

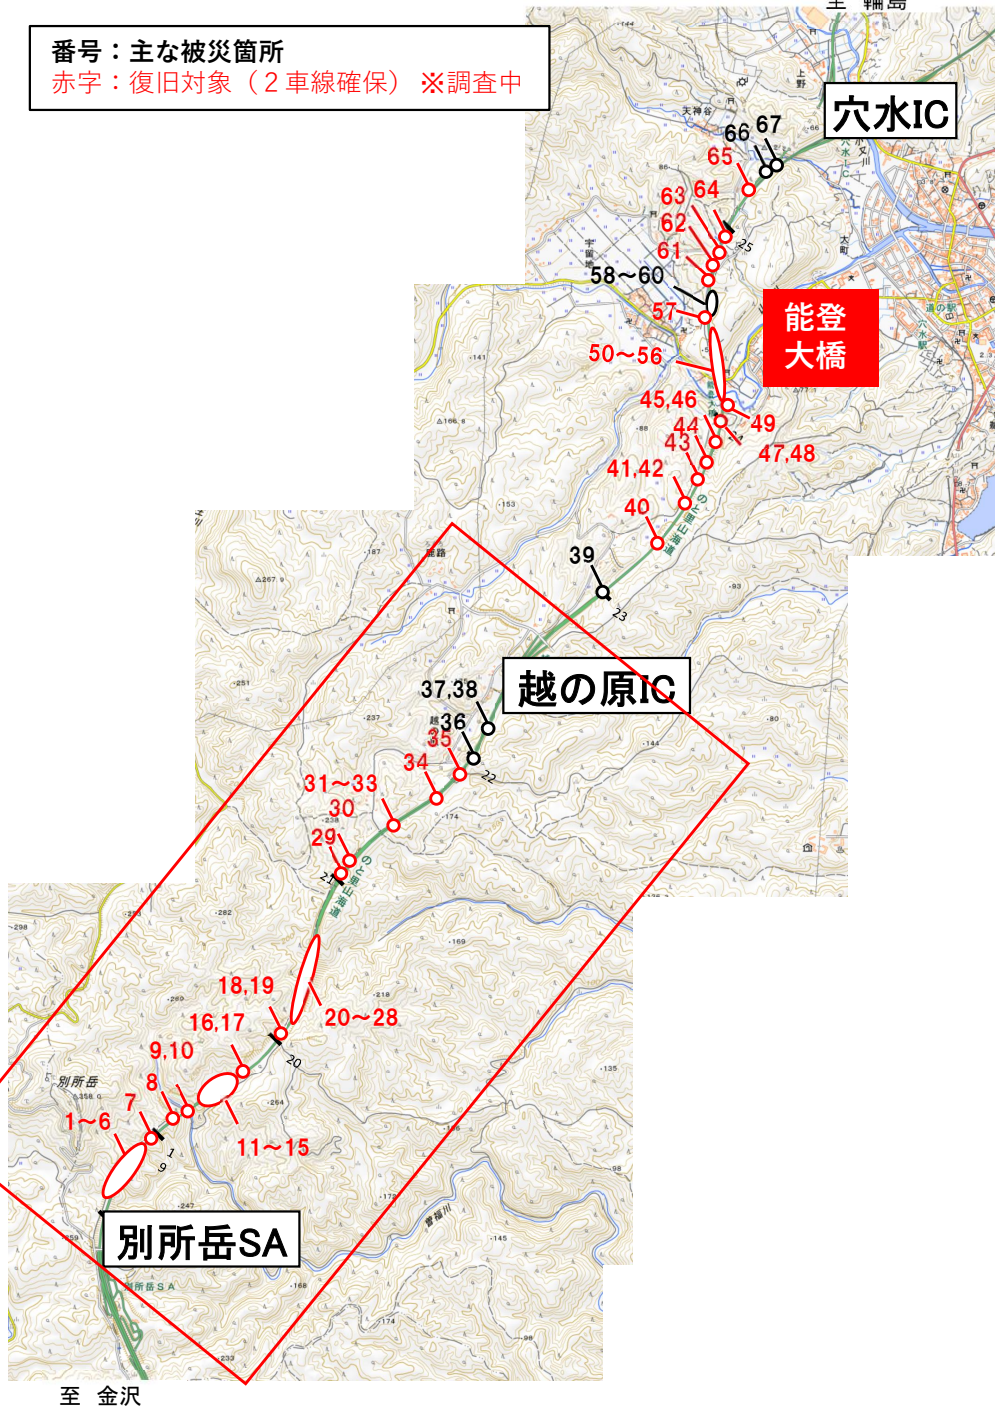

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.30 碎石敷均し転圧状況



工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道道路復旧工事その3
工事場所	のと里山海道(別所岳SA～越の原IC)K.21.21-21.22
施工状況	
碎石敷均し、転圧	
(株)大林組 2024.03.07	

No.34 碎石敷均し・転圧状況




工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道道路復旧工事その3
工事場所	のと里山海道(別所岳SA～越の原IC)K.21.21-21.74
施工状況	
碎石敷均し、転圧	
(株)大林組 2024.03.06	

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

3月6日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

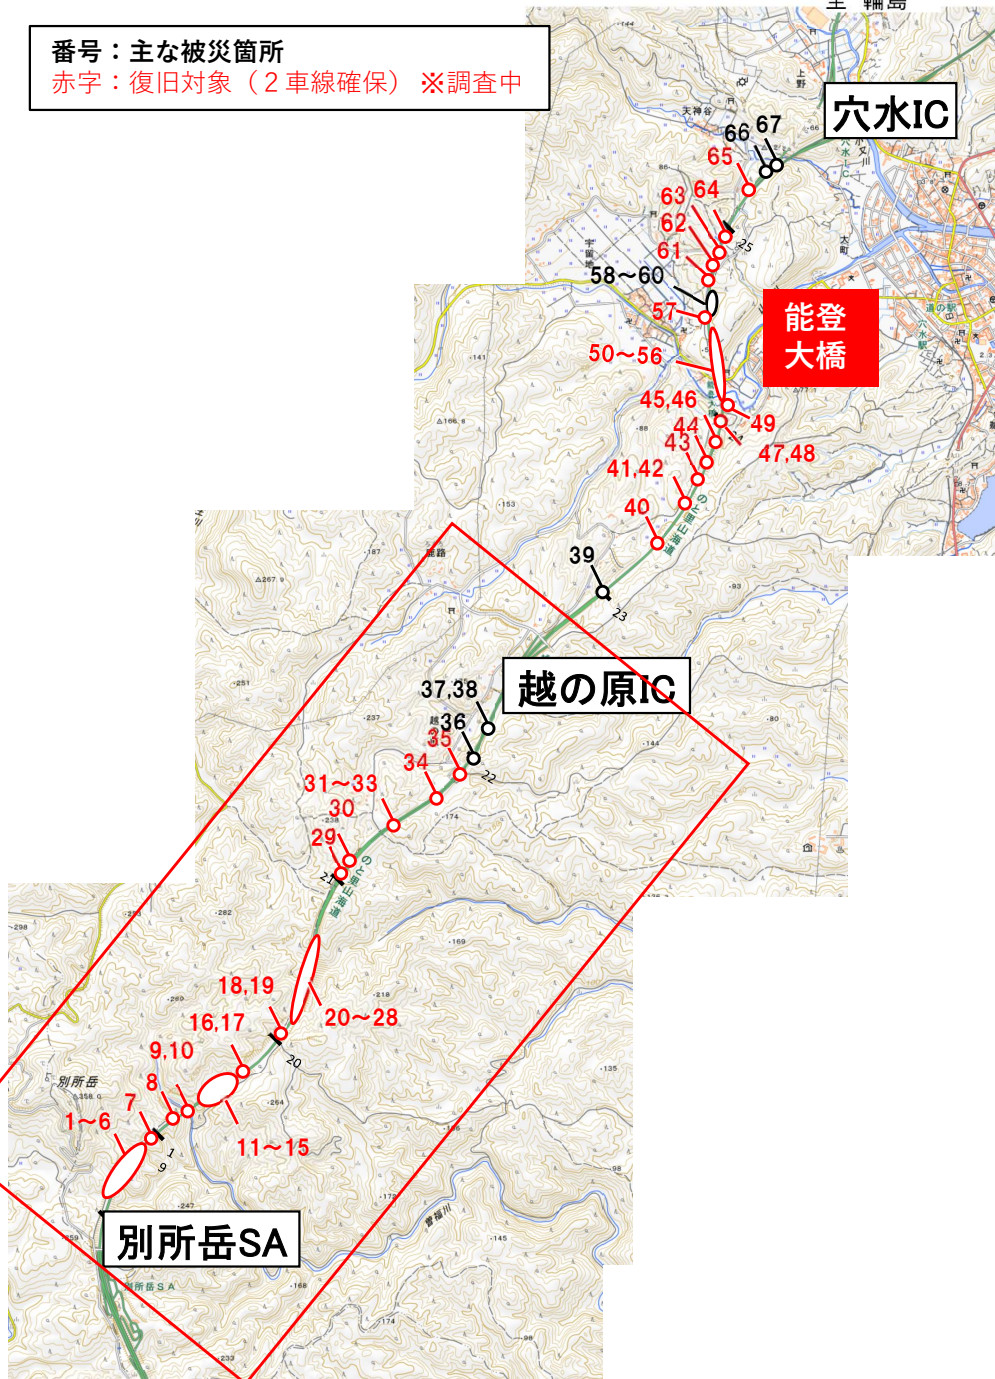

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.35 路盤整形状況



No.38 舗装撤去状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

3月4日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

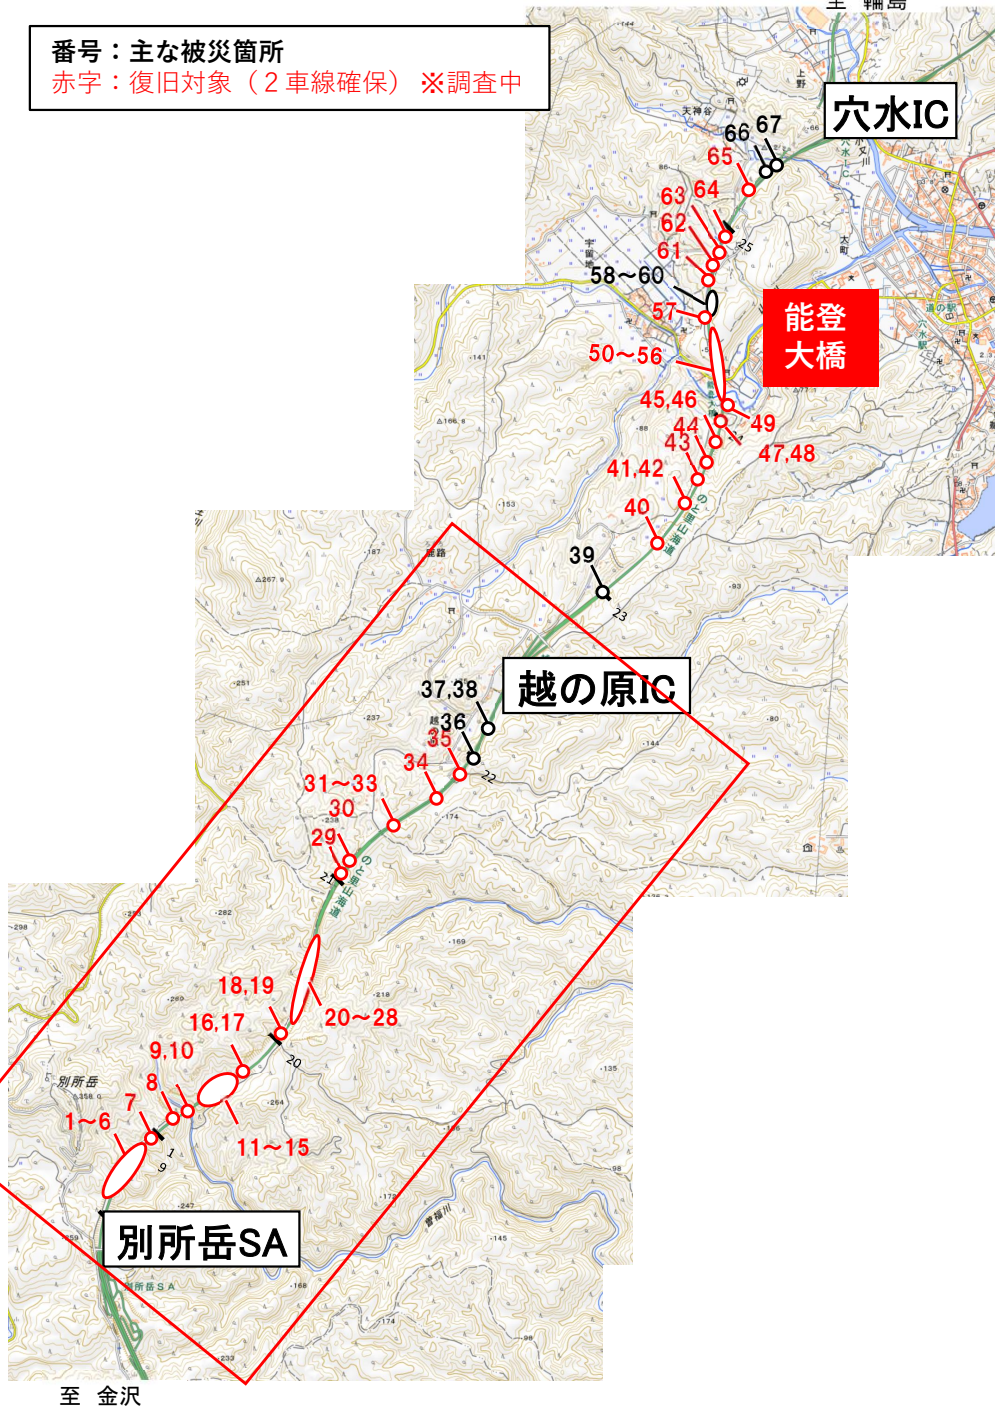

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.26付近 舗装撤去状況




工事件名	令和6年能登半島地震 能越自動車道道路修繕工事その3
工事場所	のと里山海道(別所岳SA～越の原IC)20.49～20.50km
As舗装版撤去状況	

R6.3.1撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

3月1日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

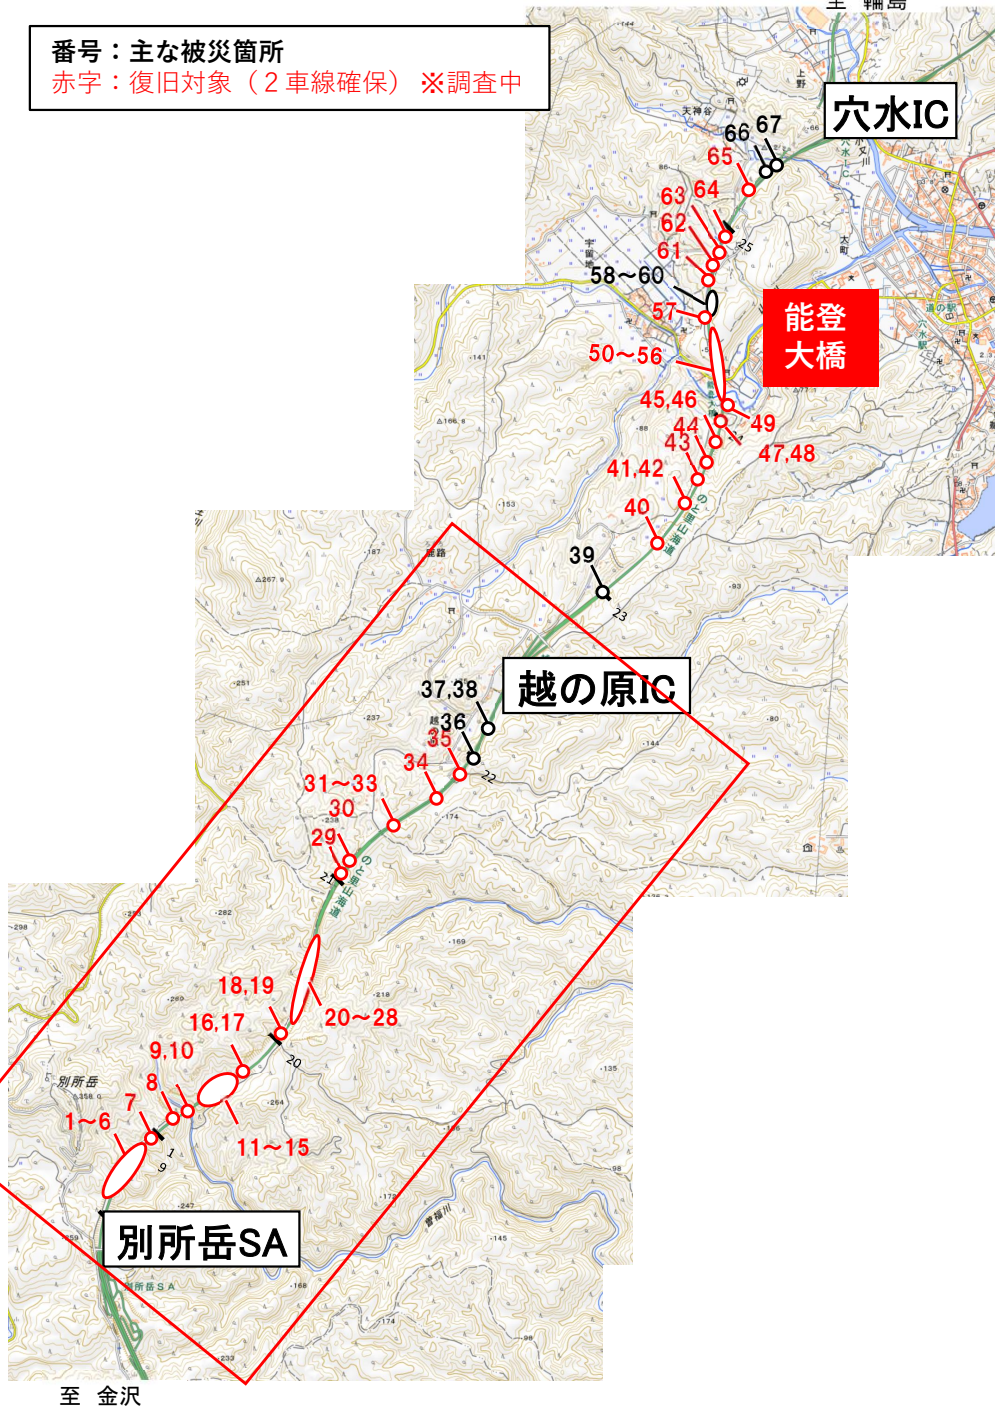

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.19付近 アスガラ運搬状況



No.35付近 舗装撤去状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月28日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

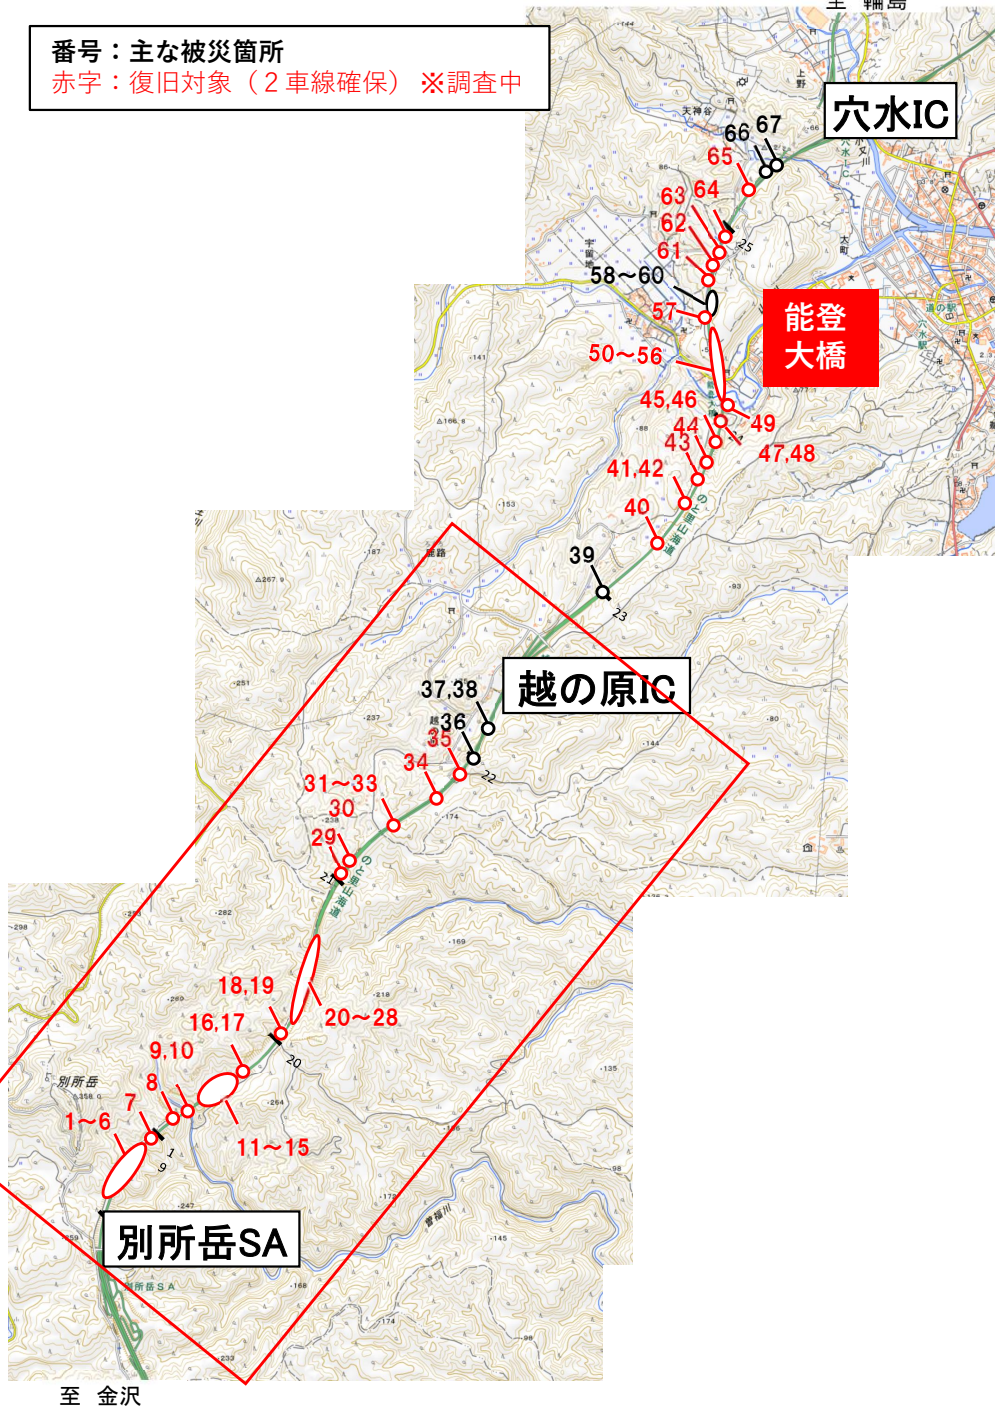

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.12付近 アスガラ積込・運搬状況



No.34付近 アスガラ積込・運搬状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月26日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

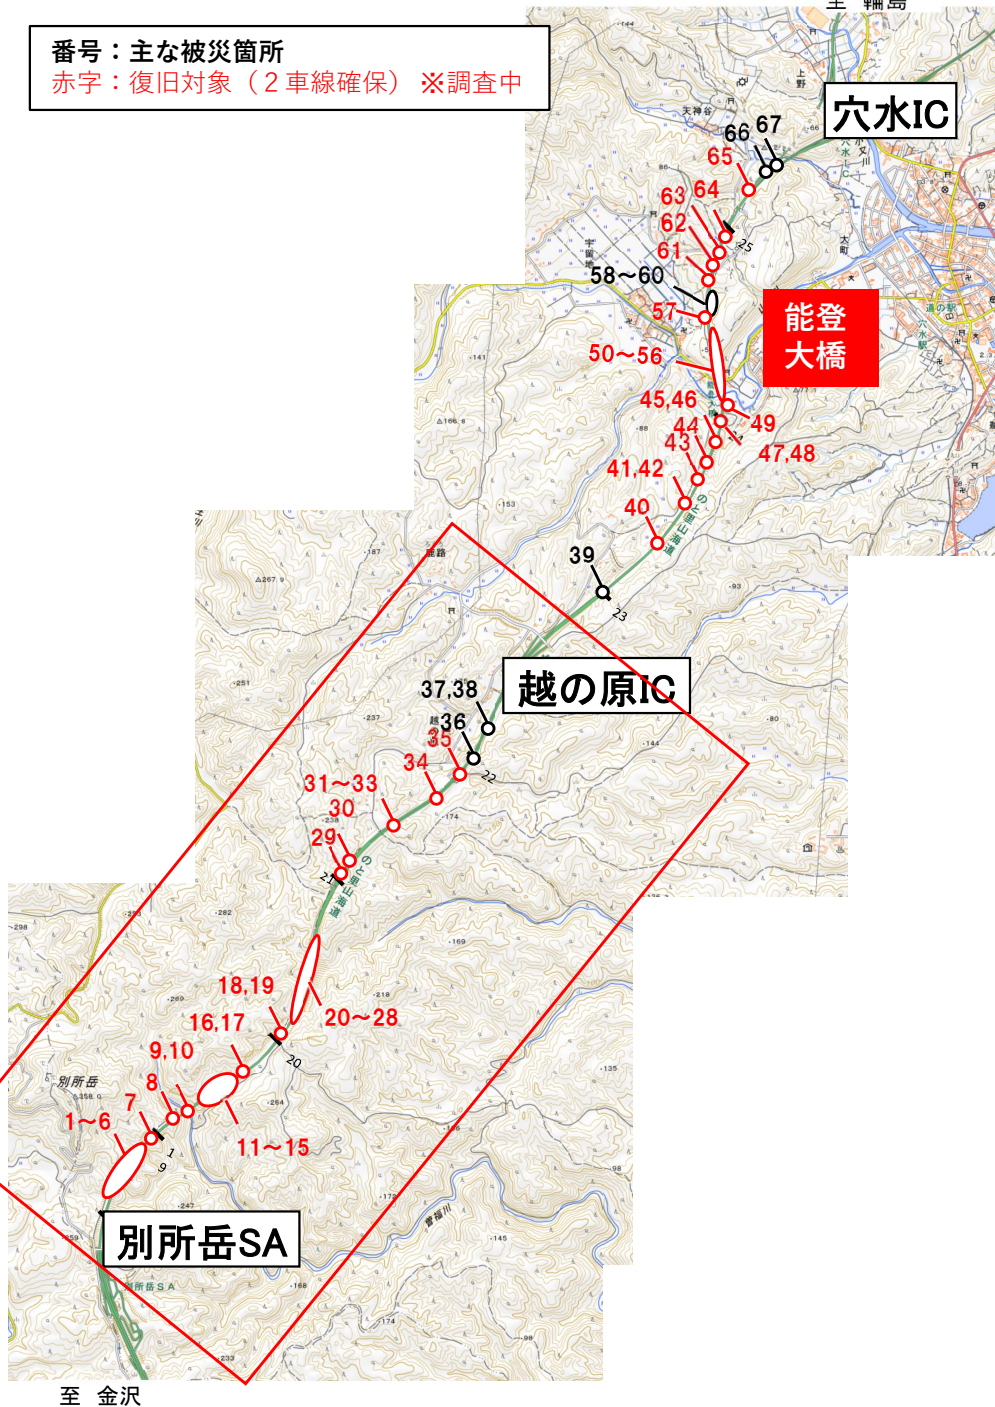

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.8付近 路盤敷均し状況



工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道道路復旧工事第03
工事場所	のと里山海道(別所岳SA～越の原IC)k.p.19.08-19.15
施工状況	
路盤敷均し・転圧	
(株)大林組 2024/02/23	

No.6付近 路盤敷均し・転圧状況




工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道道路復旧工事第03
工事場所	のと里山海道(別所岳SA～越の原IC)k.p.19.08-19.15
砕石敷均し状況	
(株)大林組 2024/02/24	

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月21日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

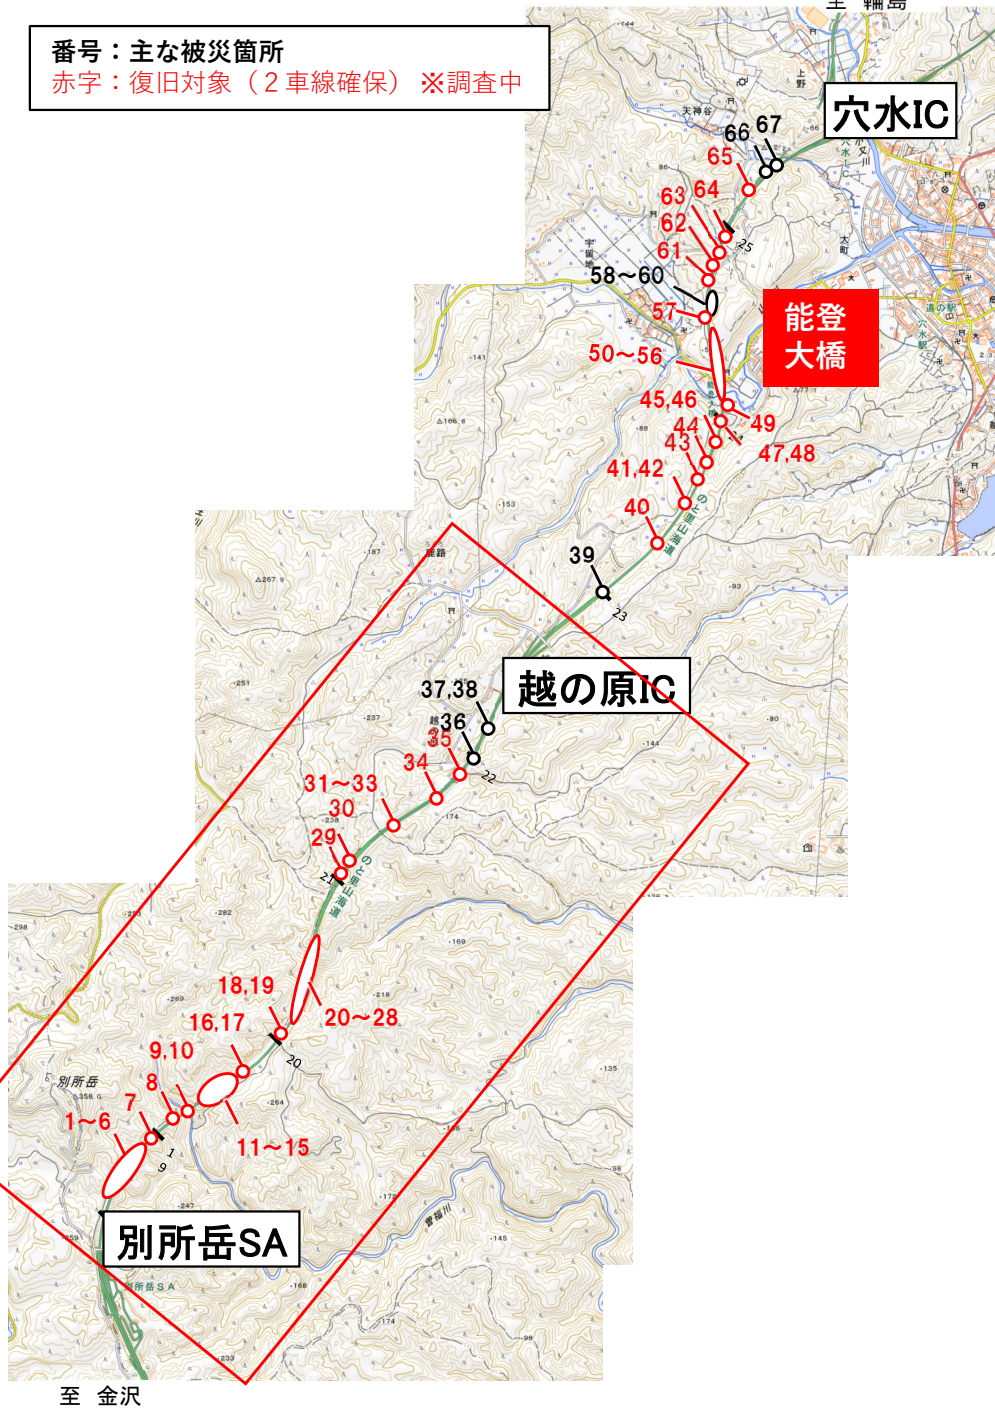

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.6付近 舗装撤去状況



No.6付近 路盤敷均し・転圧状況






令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月15日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

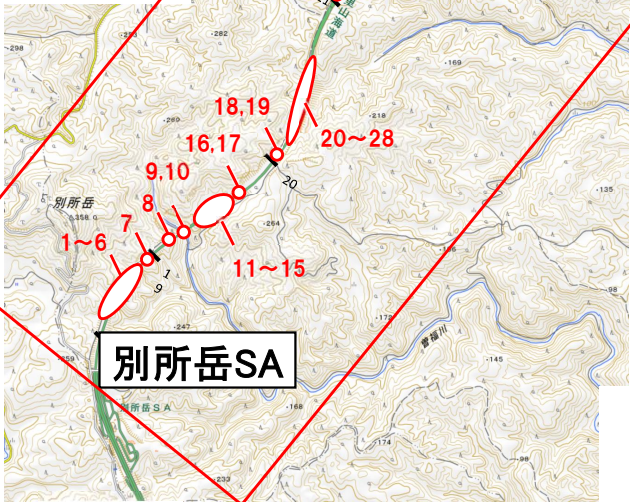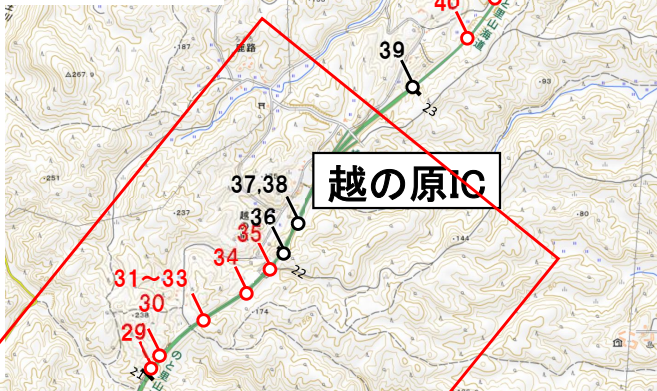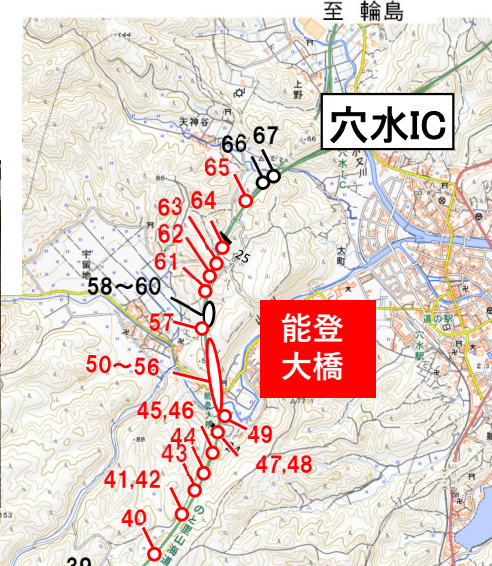

緊急復旧完了（1車線確保）
令和6年2月15日～通行止め解除
（一方通行・緊急車両等のみ通行可）

1車線通行状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況




越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月15日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）



No.29～30被災状況

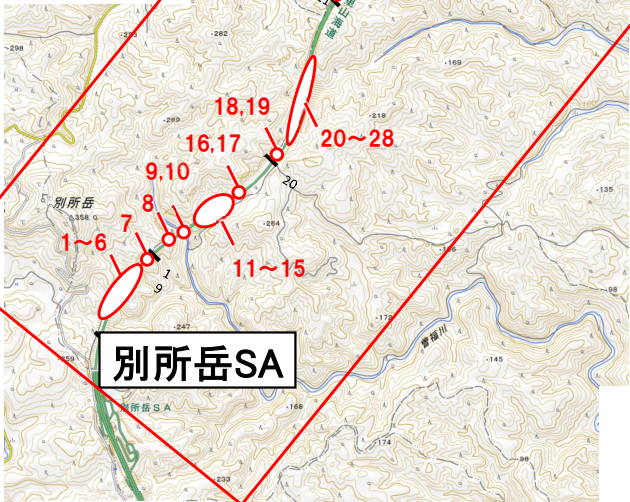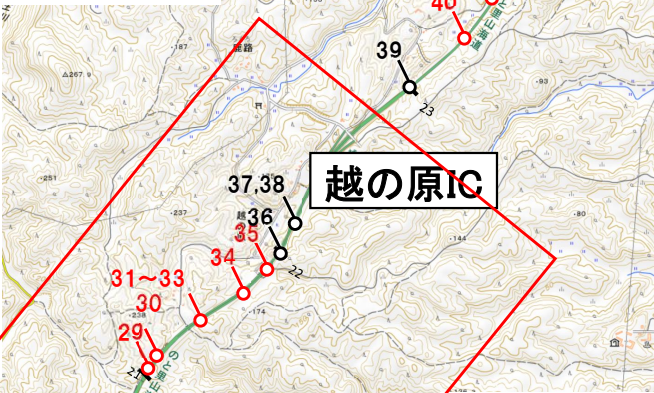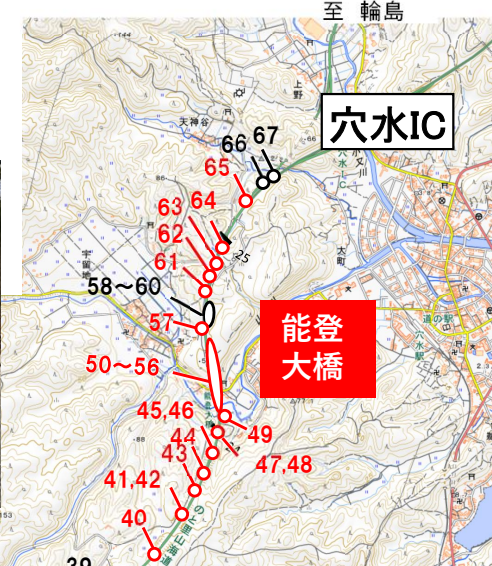

至 金沢

緊急復旧完了（1車線確保）
令和6年2月15日～通行止め解除
（一方通行・緊急車両等のみ通行可）

No.7付近 1車線復旧完了



R6.2.14撮影

No.29付近 1車線復旧完了



R6.2.14撮影


令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月13日現在

番号：主な被災箇所

赤字：復旧対象 (1車線確保)

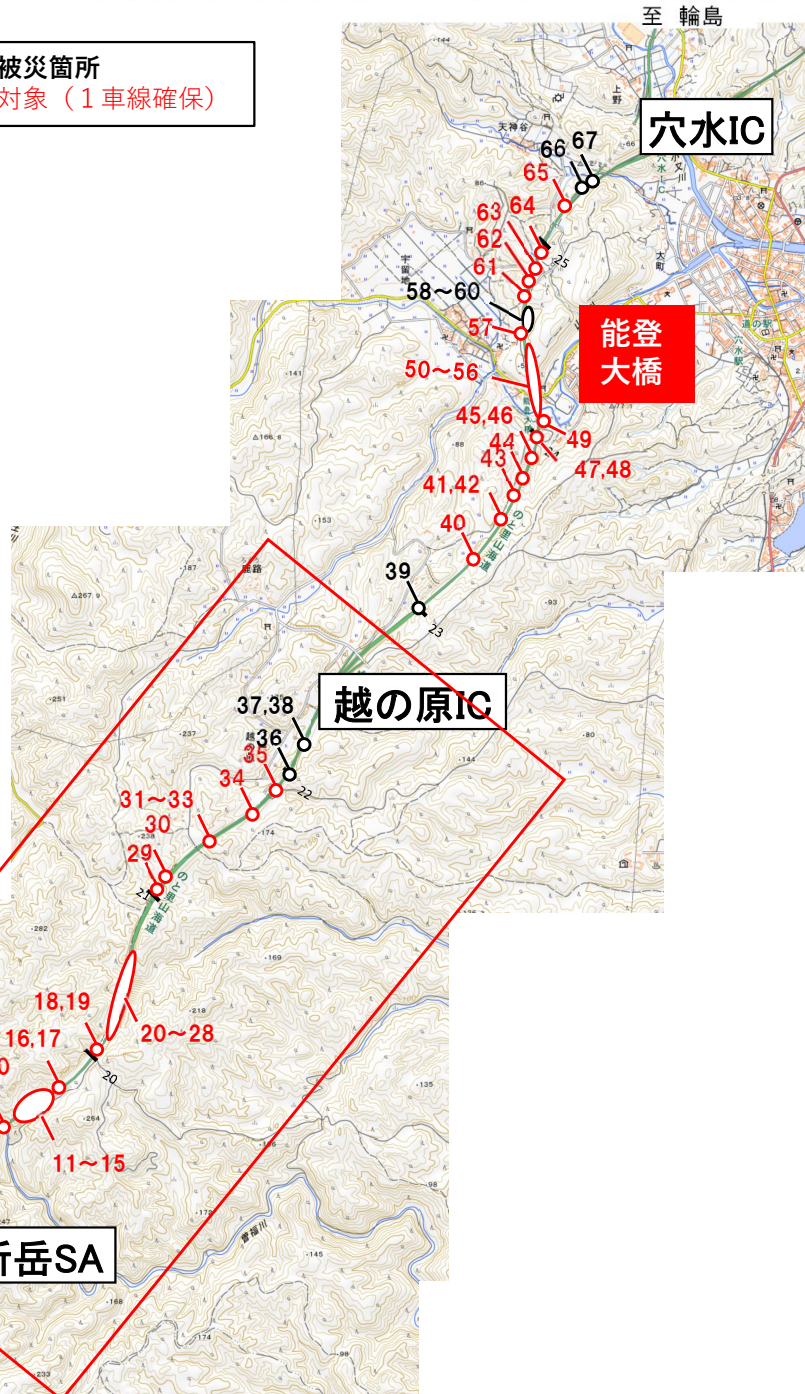

緊急復旧作業中 (1車線確保)
38箇所完了 (舗装以外) / 38箇所

No.24付近 路肩路盤整備状況



R6.2.11撮影

No.29 路盤整備およびAs舗装完了




R6.2.10撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月9日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

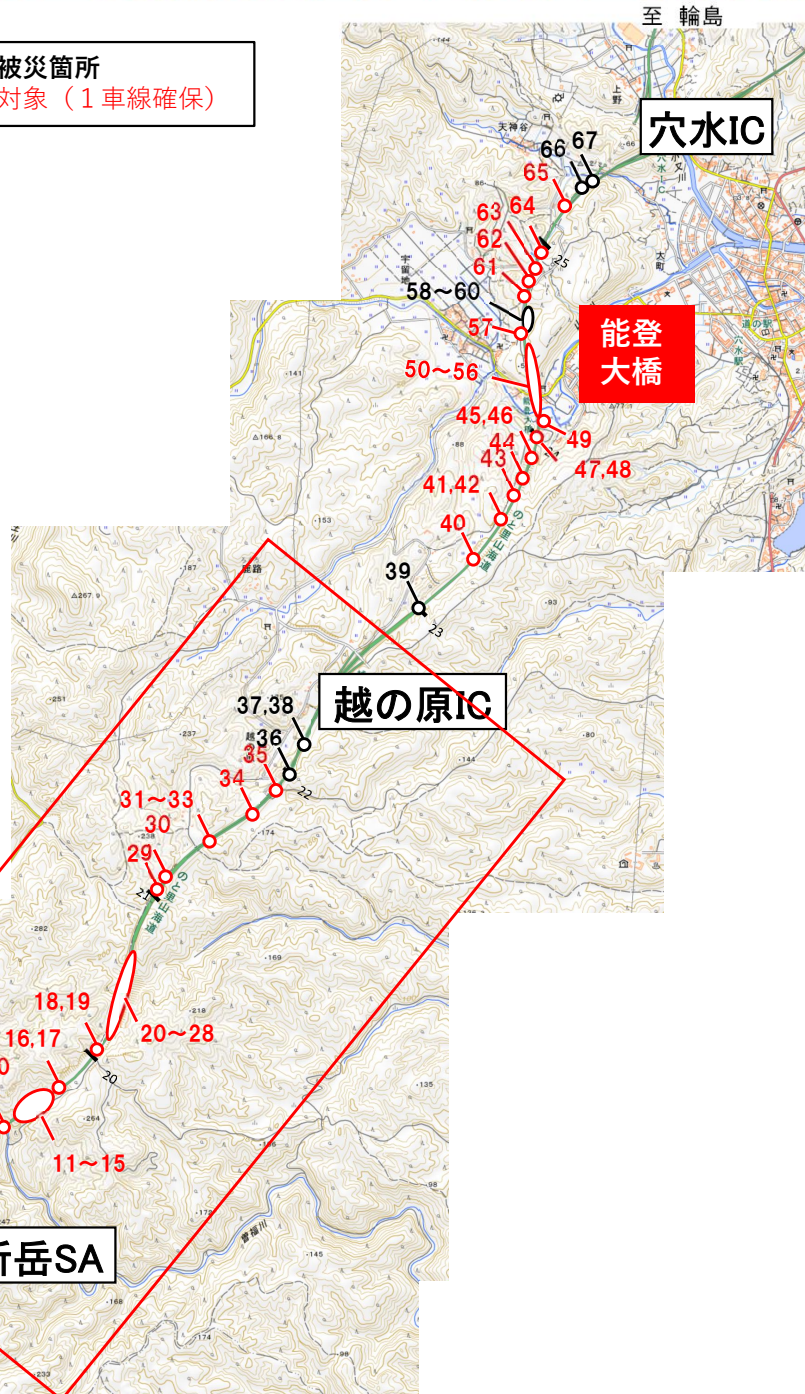

緊急復旧作業中（1車線確保）
29箇所完了（舗装以外）／38箇所

No.34付近 舗装状況






No.4付近 亀裂・段差補修状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月7日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (1車線確保)

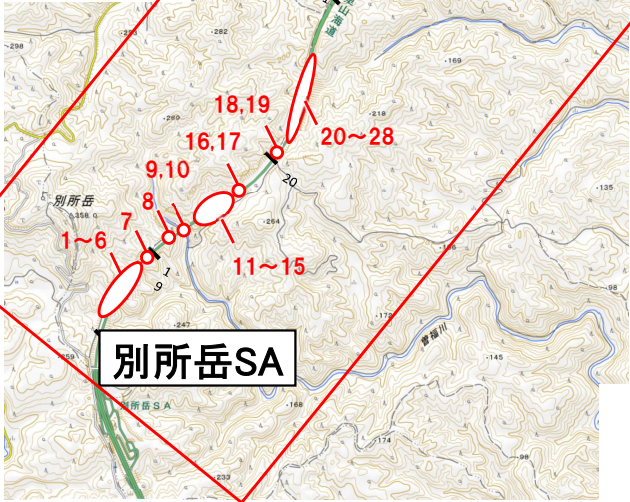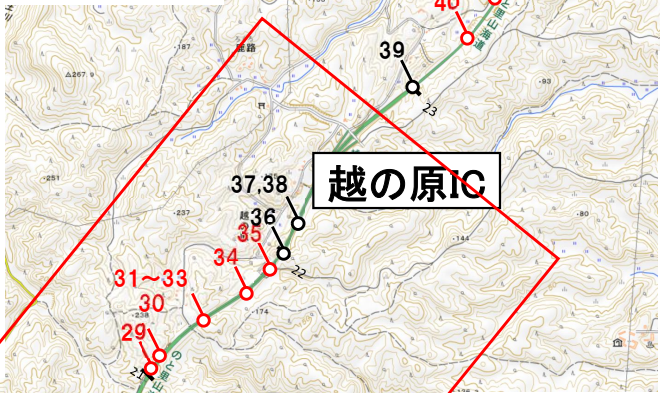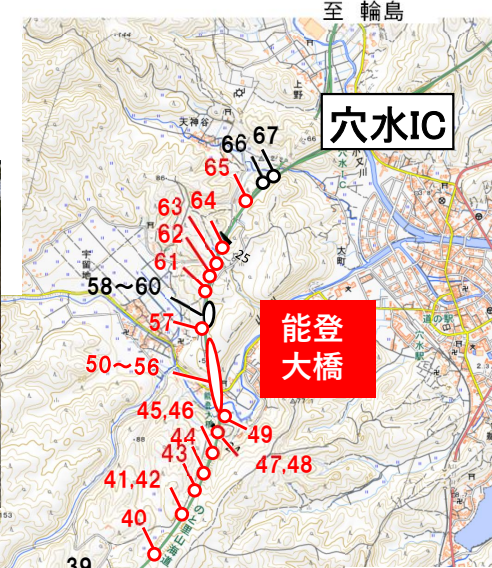

緊急復旧作業中 (1車線確保)
29箇所完了 (舗装以外) / 38箇所


No.29～30付近 舗装施工状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月5日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

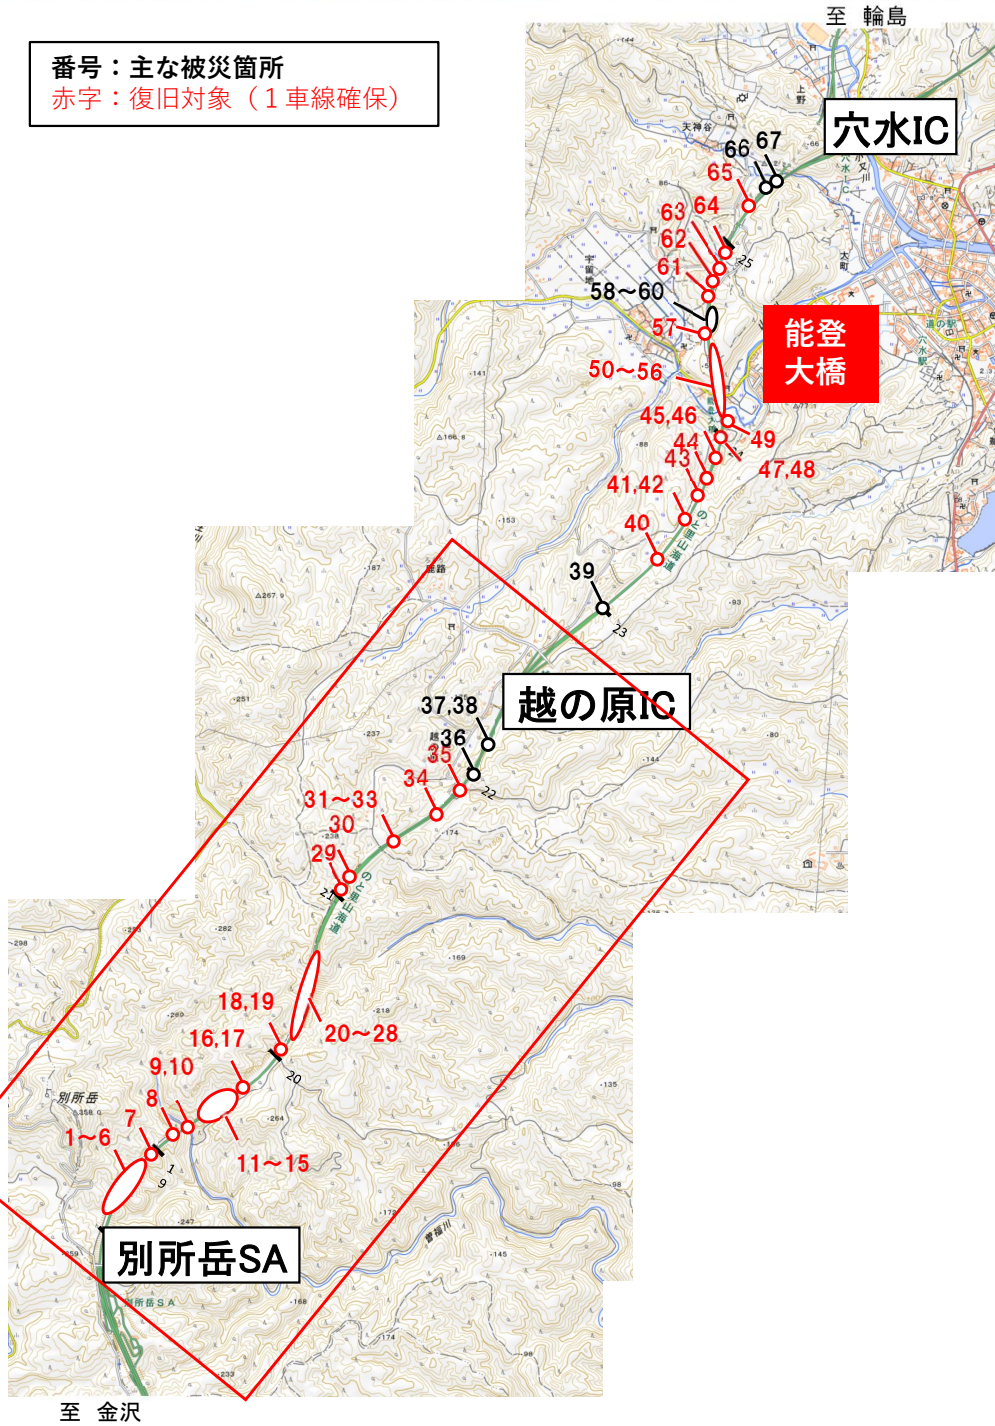

緊急復旧作業中（1車線確保）
29箇所完了（舗装以外）／38箇所

No.7付近 路盤施工状況






令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月1日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (1車線確保)



No.29～30被災状況

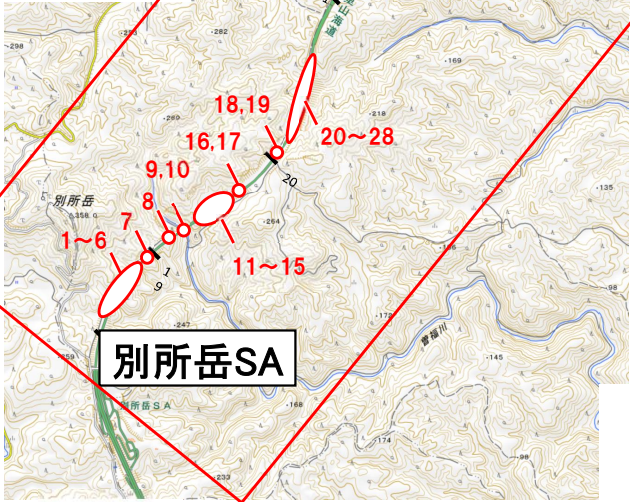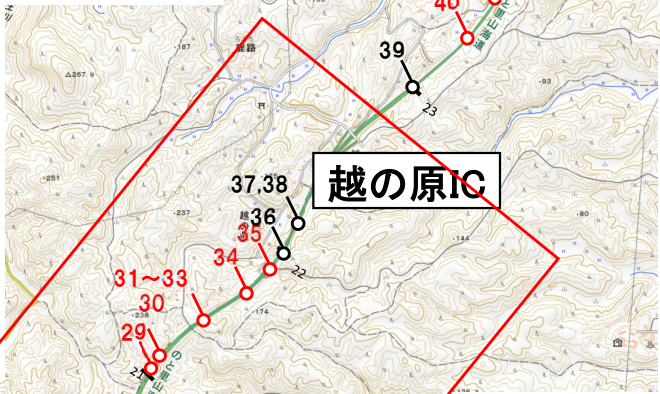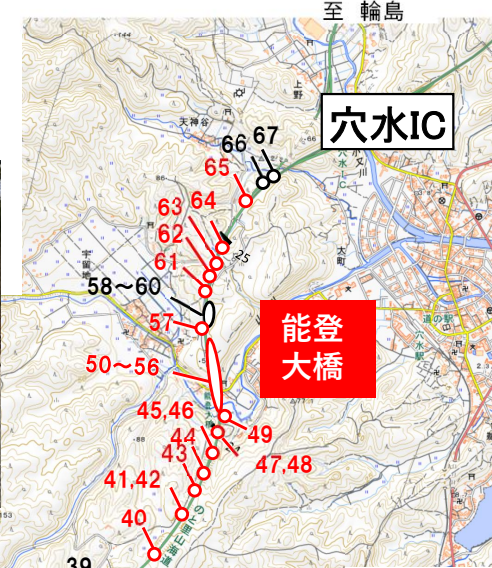

緊急復旧作業中 (1車線確保)
29箇所完了 (舗装以外) / 38箇所

No.30路盤転圧状況



工事件名 令和6年能登半島地震災害復旧
工事場所 のと里山海道(別所岳SA～越の原IC) k.p.21.2
作業状況
路盤転圧
R6.2.1撮影


令和6年能登半島地震　のと里山海道　緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA　（担当会社　（株）大林組　（株）熊谷組）

1月31日現在

番号：主な被災箇所

赤字：復旧対象（1車線確保）

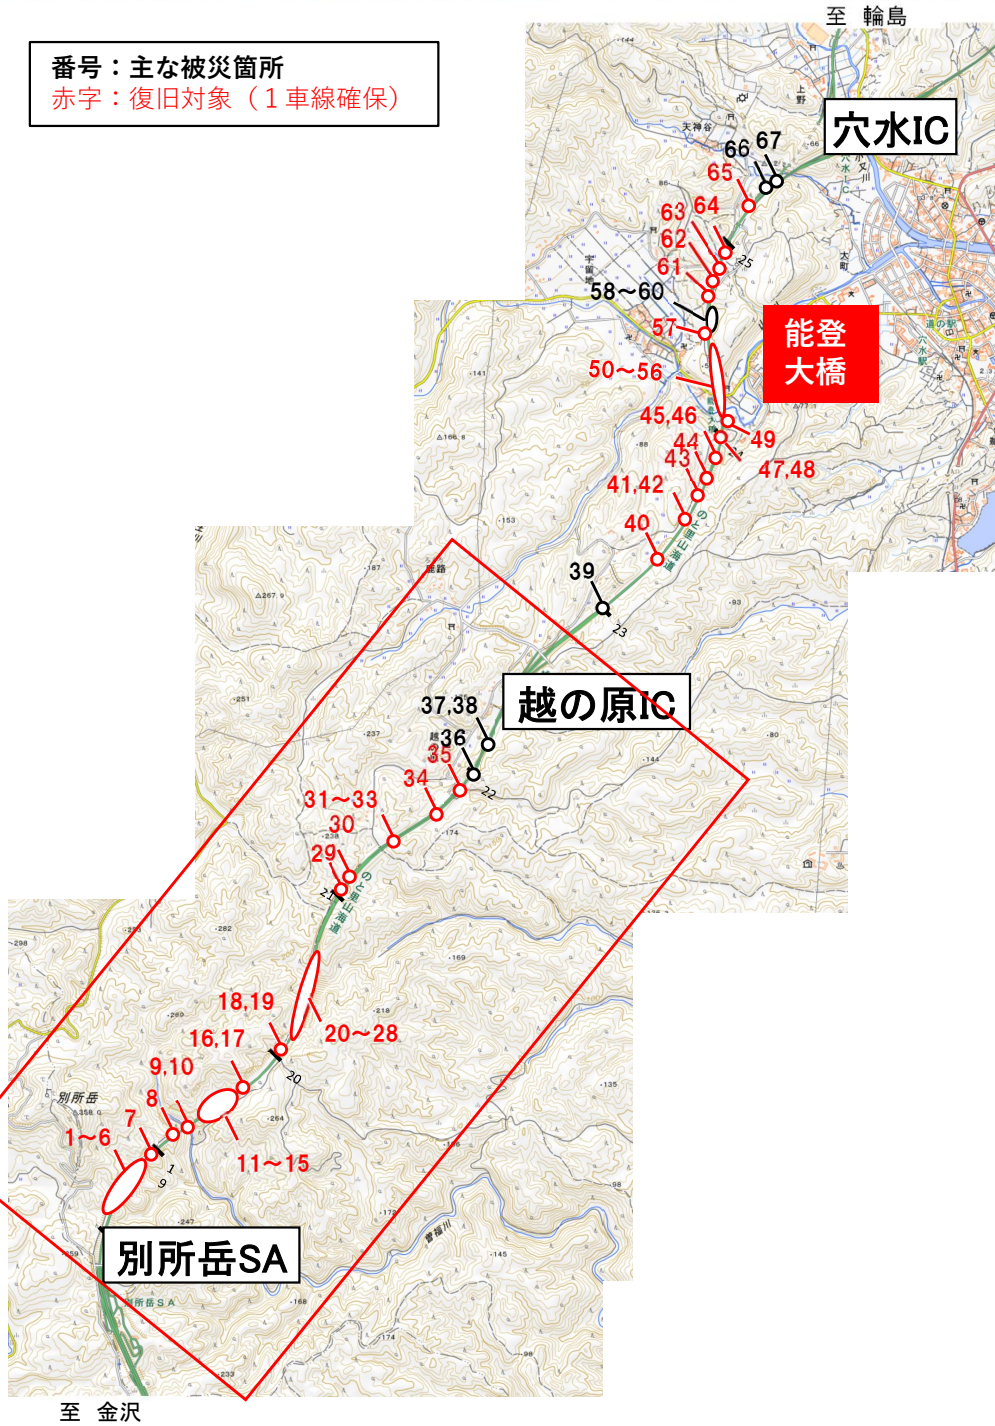

緊急復旧作業中（1車線確保）

29箇所完了（舗装以外）／38箇所




No.16 碎石敷設状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

1月30日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

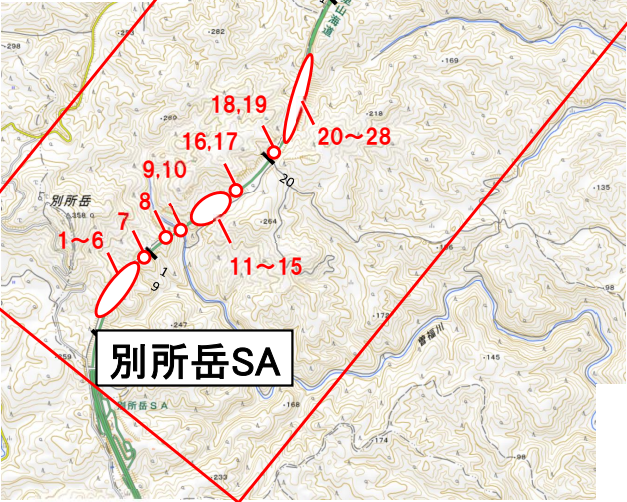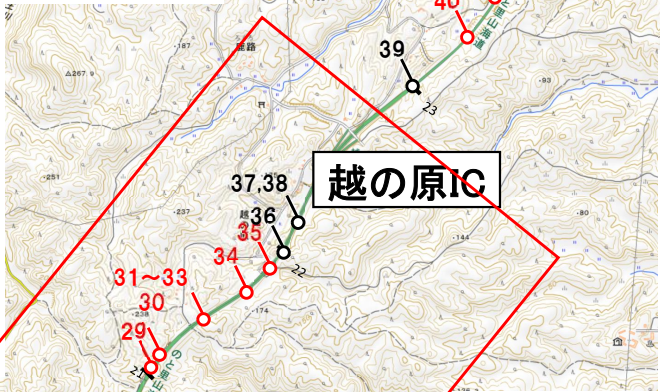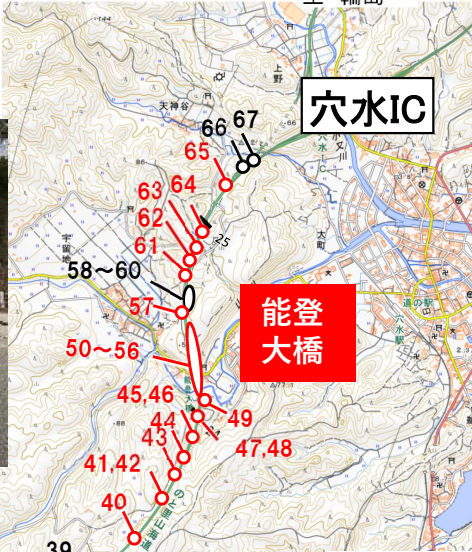

至 金沢

緊急復旧作業中（1車線確保）
29箇所完了（舗装以外）／38箇所

No.16掘削状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)


1月29日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）



緊急復旧作業中（1車線確保）
29箇所完了（舗装以外）／38箇所

No.7～30土砂撤去状況

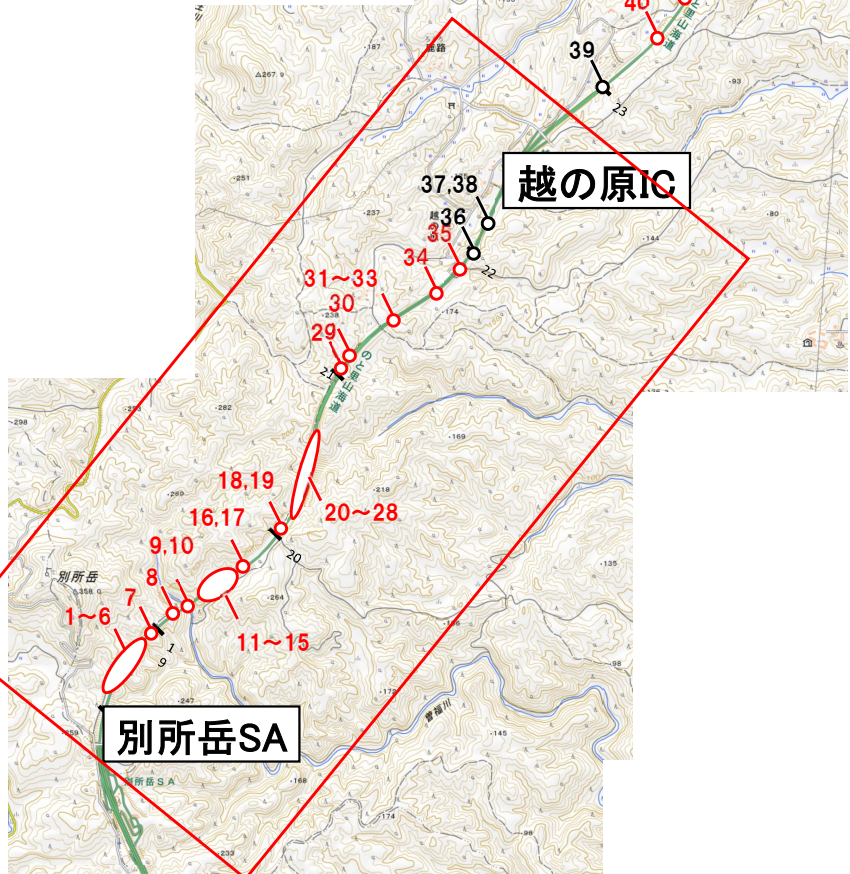



至 金沢

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

1月28日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

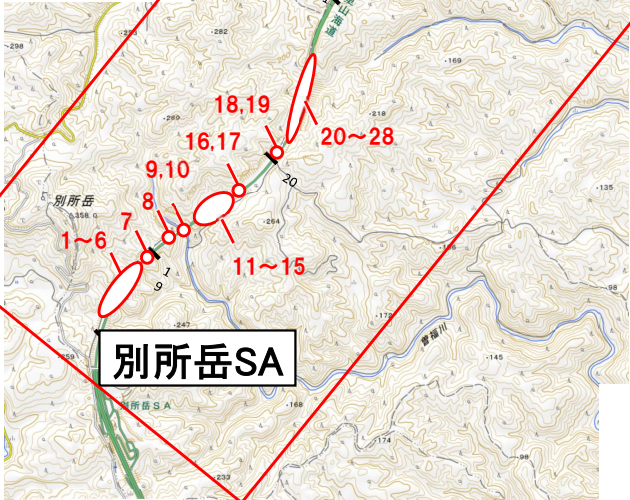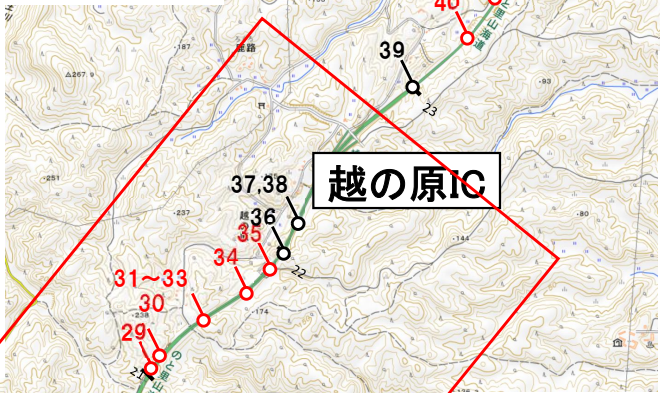

至 金沢

緊急復旧作業中（1車線確保）
29箇所完了（舗装以外）／38箇所

No.29崩落土砂撤去状況



工事名	令和6年能登半島地震 能登道/のと里山海道 道路管轄
工 種	
測 点	のと里山海道 KP21.03-21.13
土砂撤去状況	

R6.1.28撮影
