


令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

7月1日現在

穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

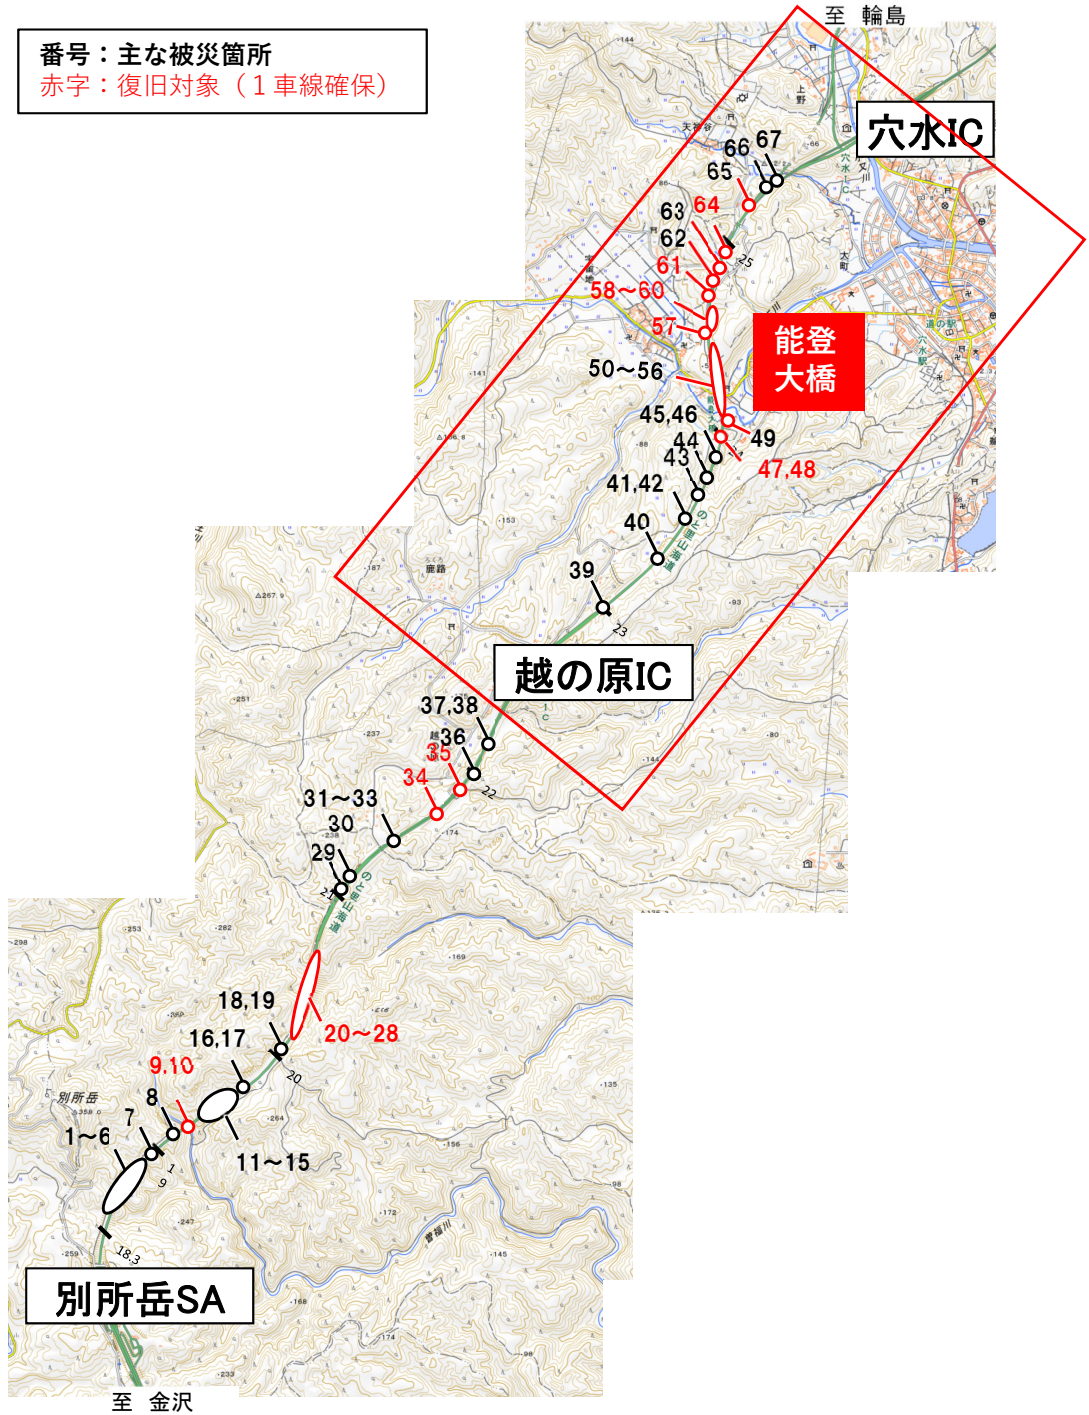

緊急復旧作業中（2車線確保）


No.29 施工完了状況



No.24付近 現場発生品仕分け状況



番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

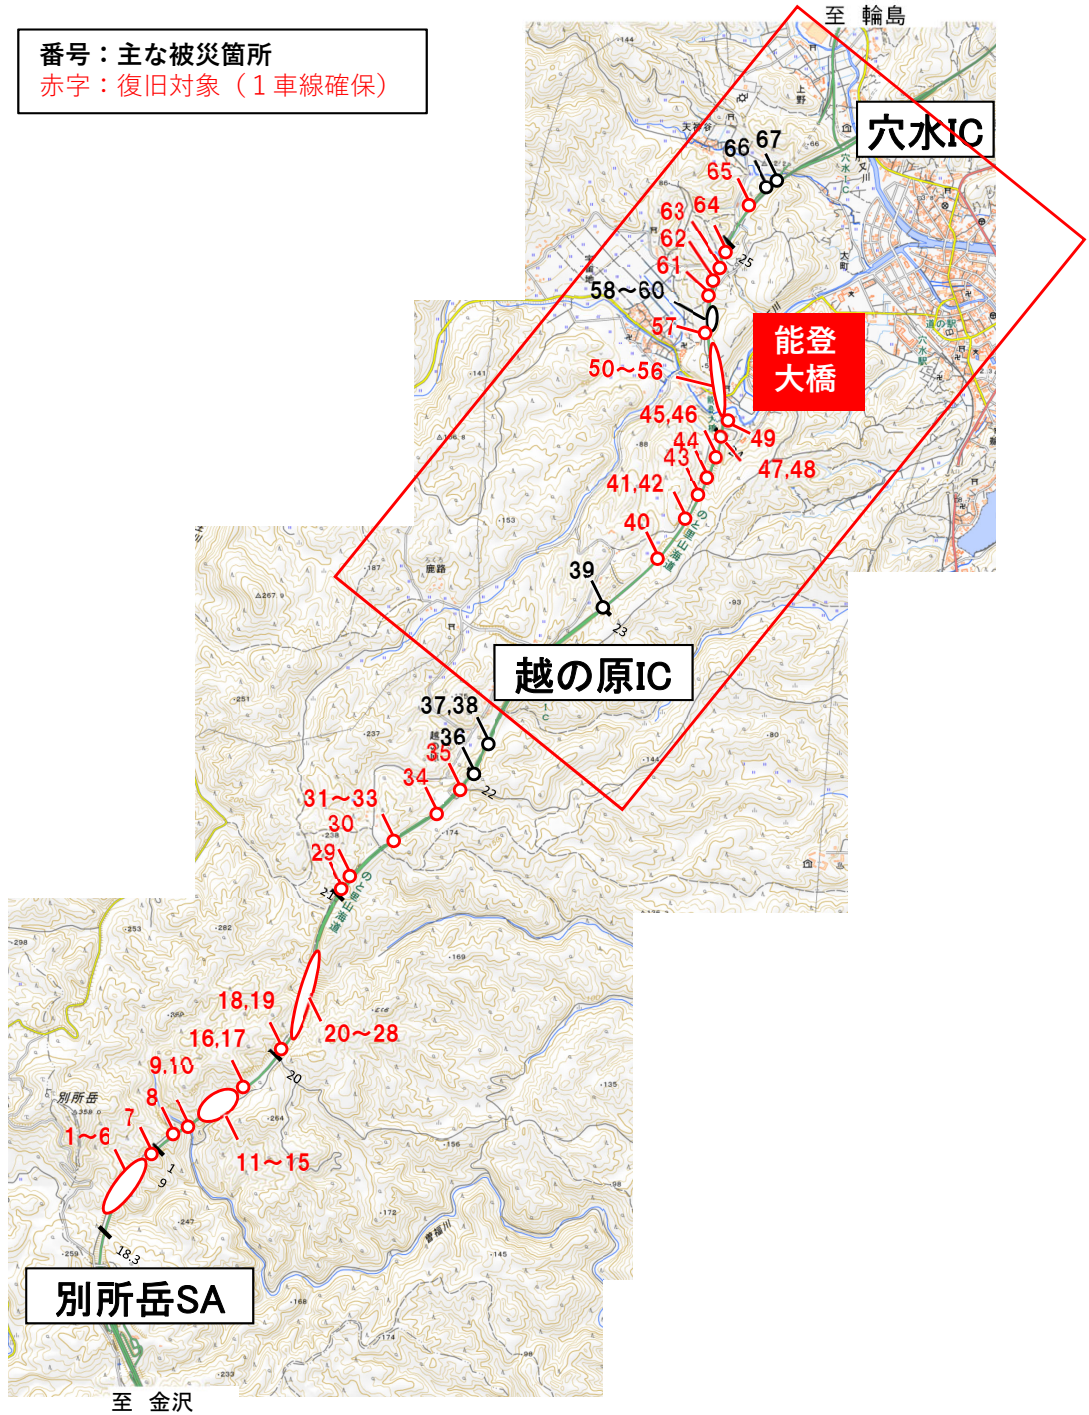

緊急復旧作業中（2車線確保）

能登大橋・A2橋台 排水管設置,片付け状況



R6.6.20撮影


No.24付近 舗装工状況



工事名	能登自動車道道路管理工事 その他
工種	舗装工
測点	能登大橋起点御橋台部(下り線)
基層施工状況	
R6年6月22日 鹿島建設株式会社	

R6.6.22撮影

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

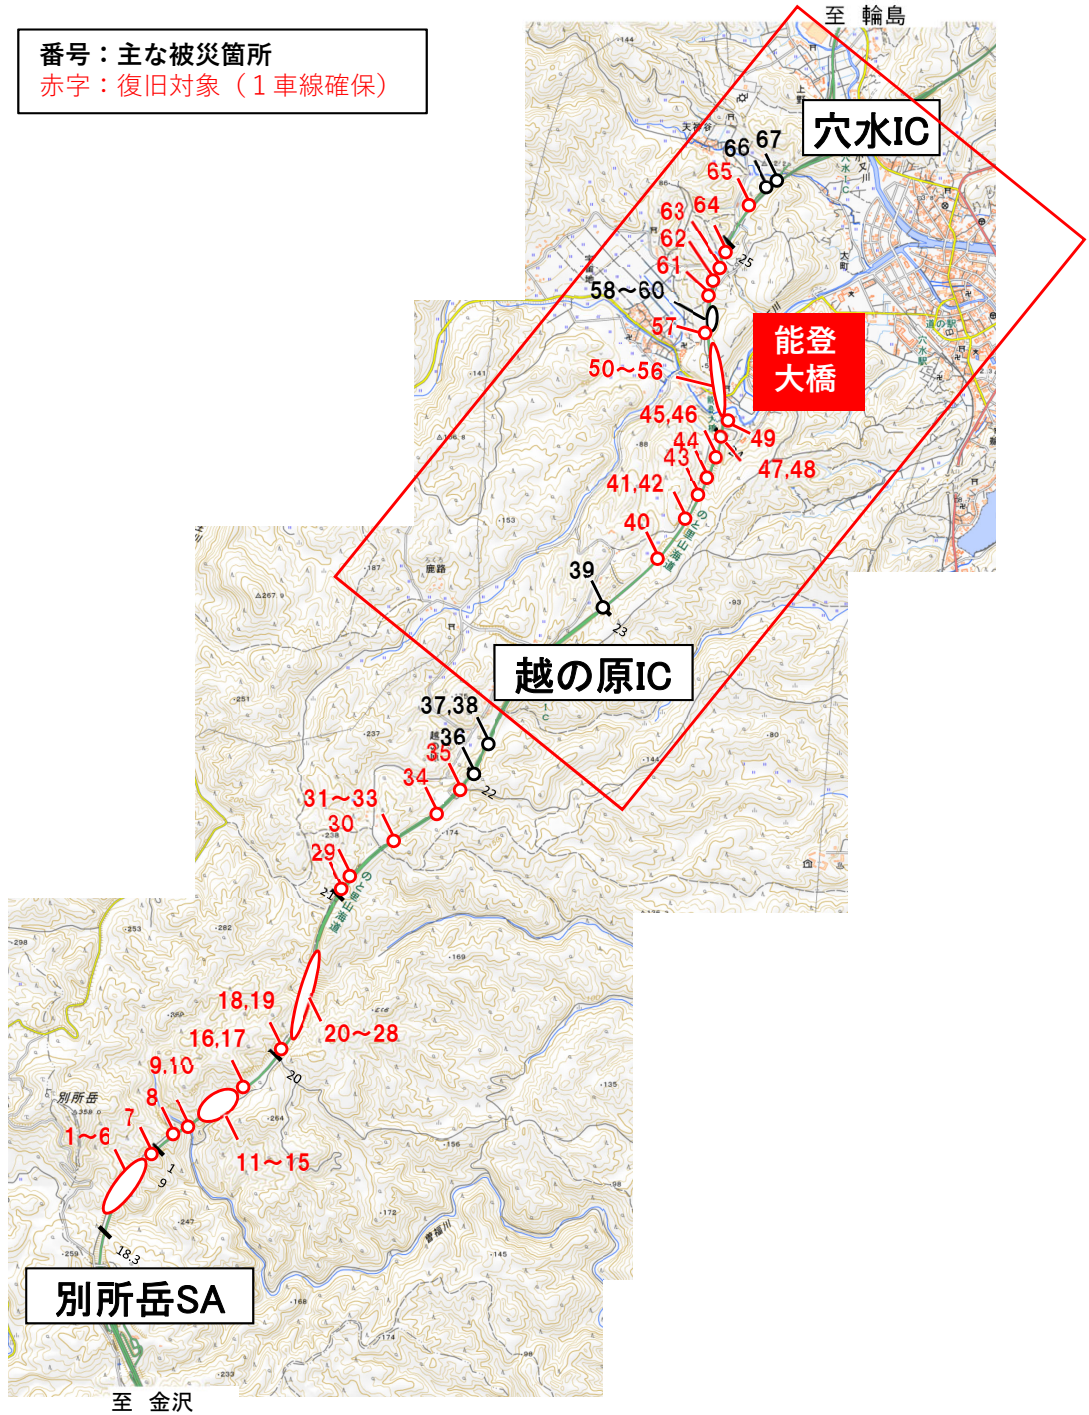


緊急復旧作業中（2車線確保）

能登大橋・A2・PA1橋台 足場材返納、片付け状況



R6.6.13撮影


No.50 法面保護工状況

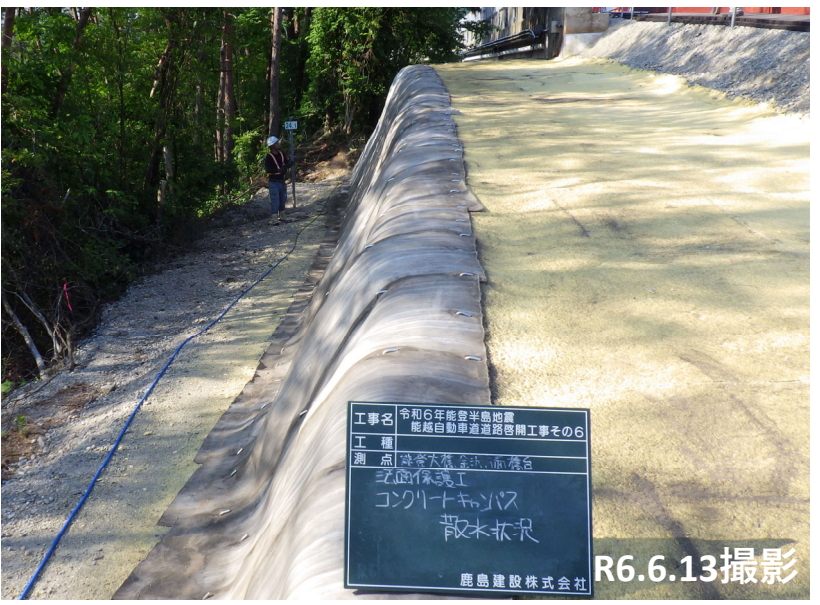

工事名 令和6年能登半島地震
能登自動車道道路閉鎖工事その6
工種 法面保護工
測点 能登大橋A2・PA1橋台
コンクリートキャスト
散水状況
鹿島建設株式会社

R6.6.13撮影

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

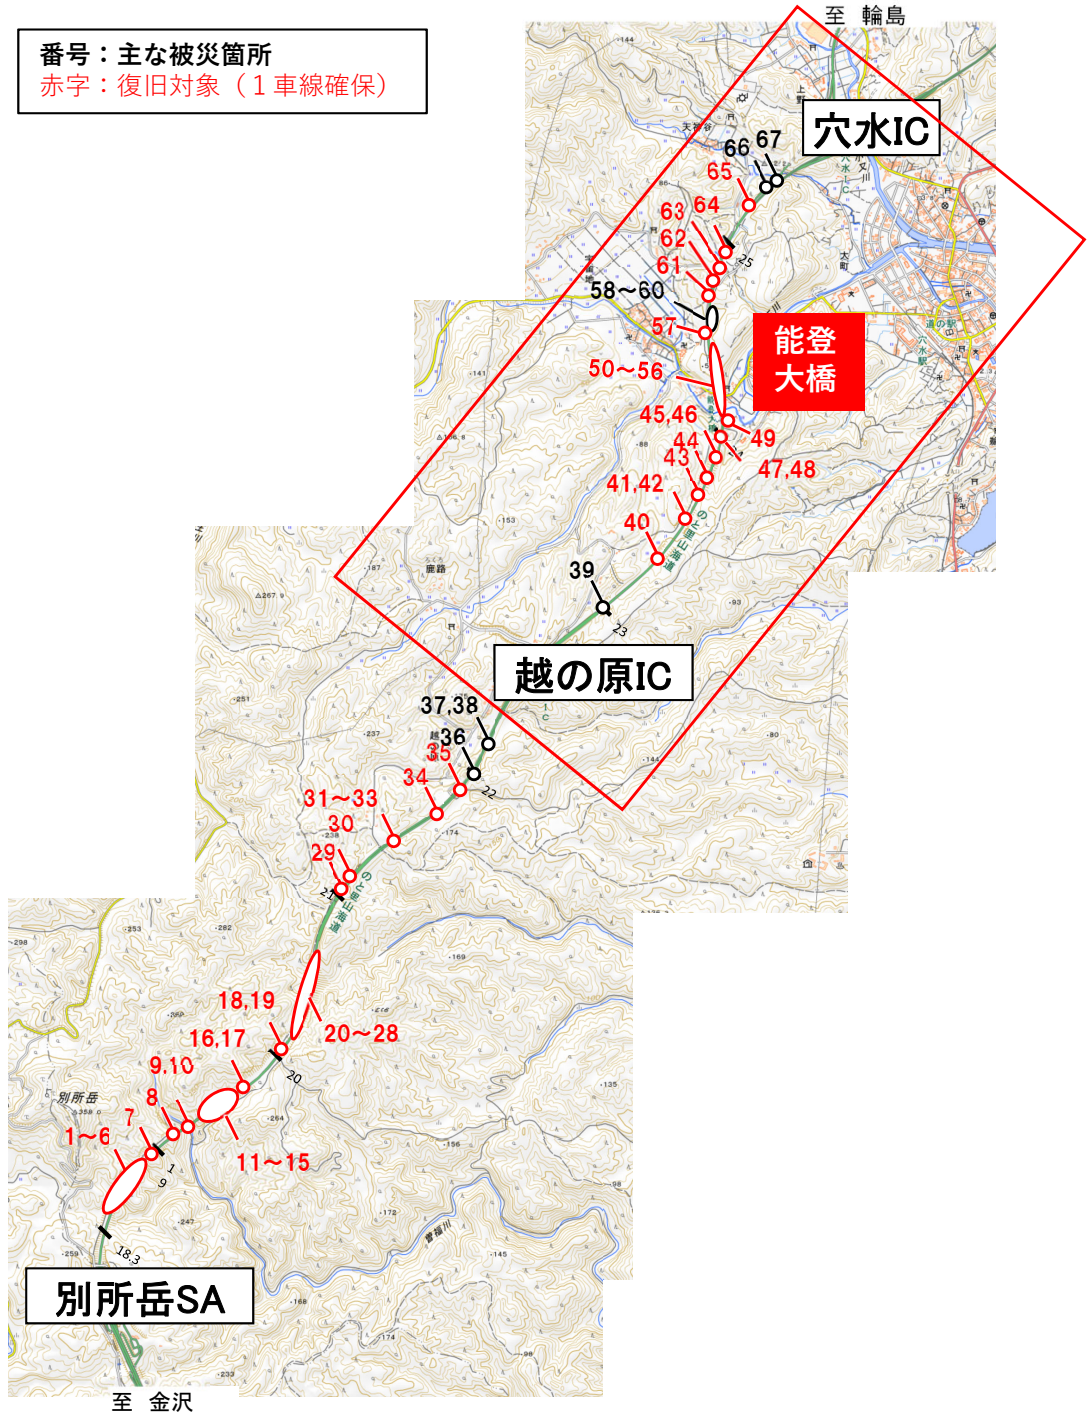


緊急復旧作業中（2車線確保）

能登大橋・A2橋台通信ケーブル管復旧状況



R6.6.5撮影

No.50 発泡ウレタン吹付状況

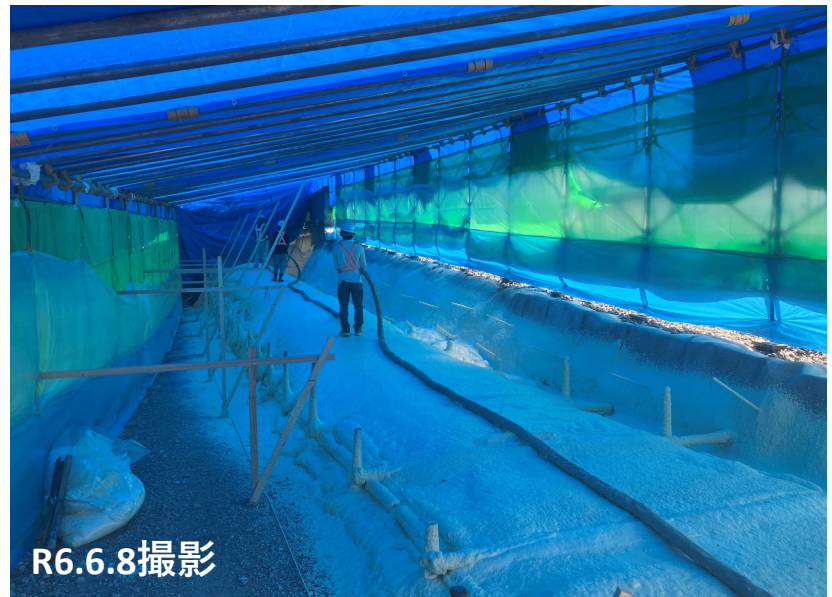


R6.6.8撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

6月3日現在

穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

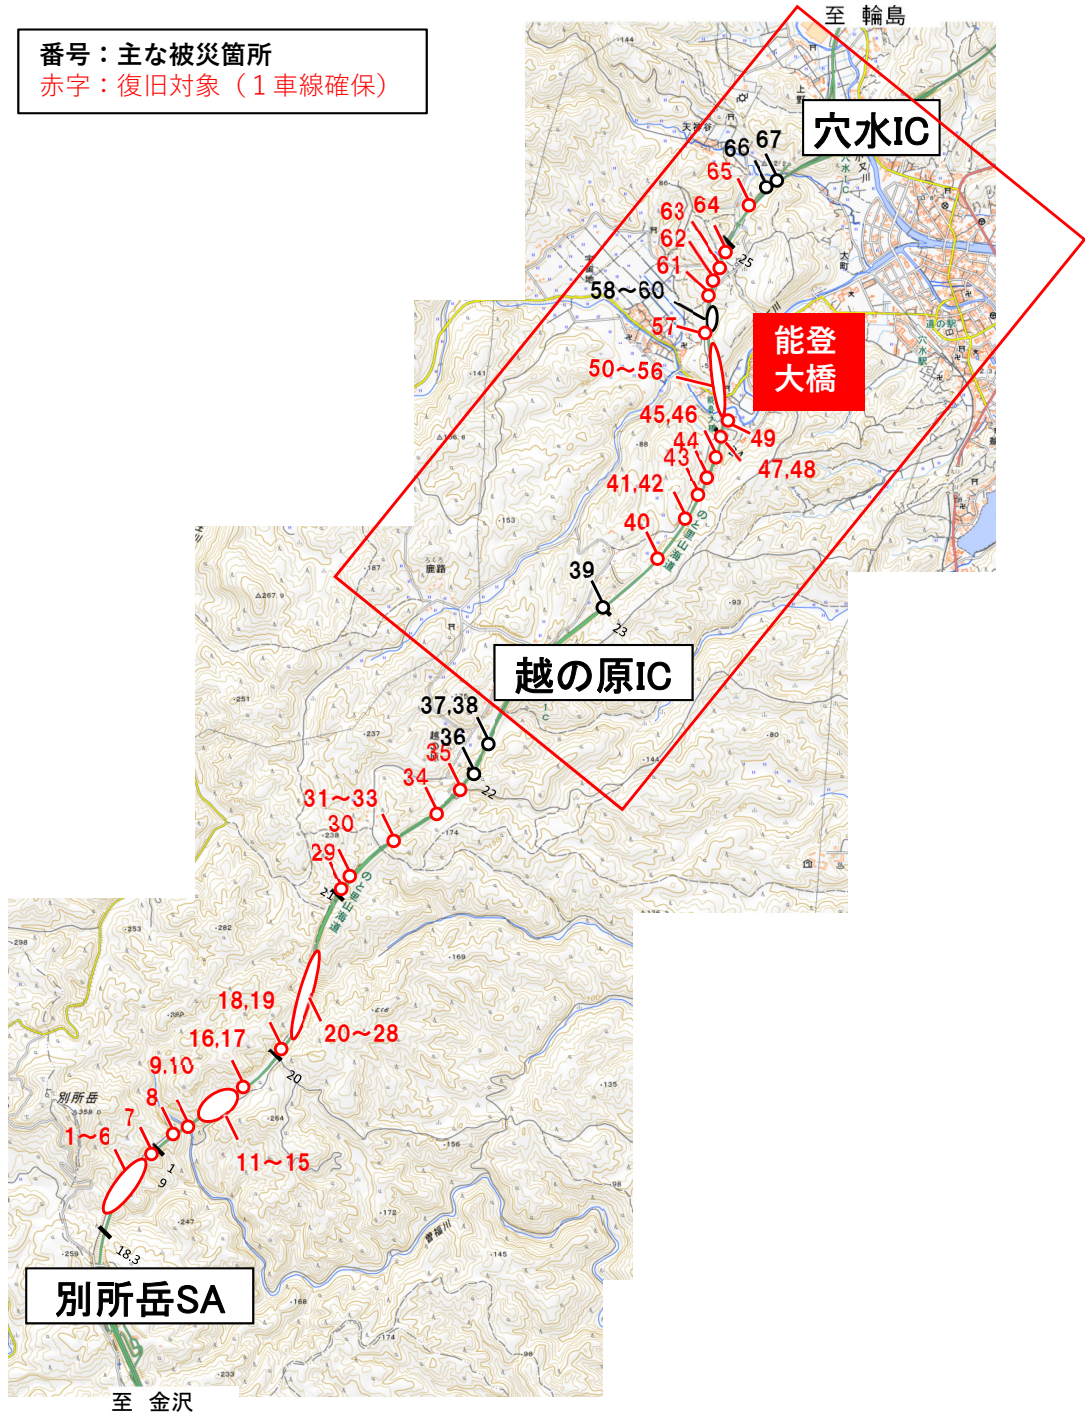

緊急復旧作業中（2車線確保）

能登大橋・A2橋台 落橋防止断面修復状況




能登大橋・A2橋台 落橋防止断面修復状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

5月27日現在

穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

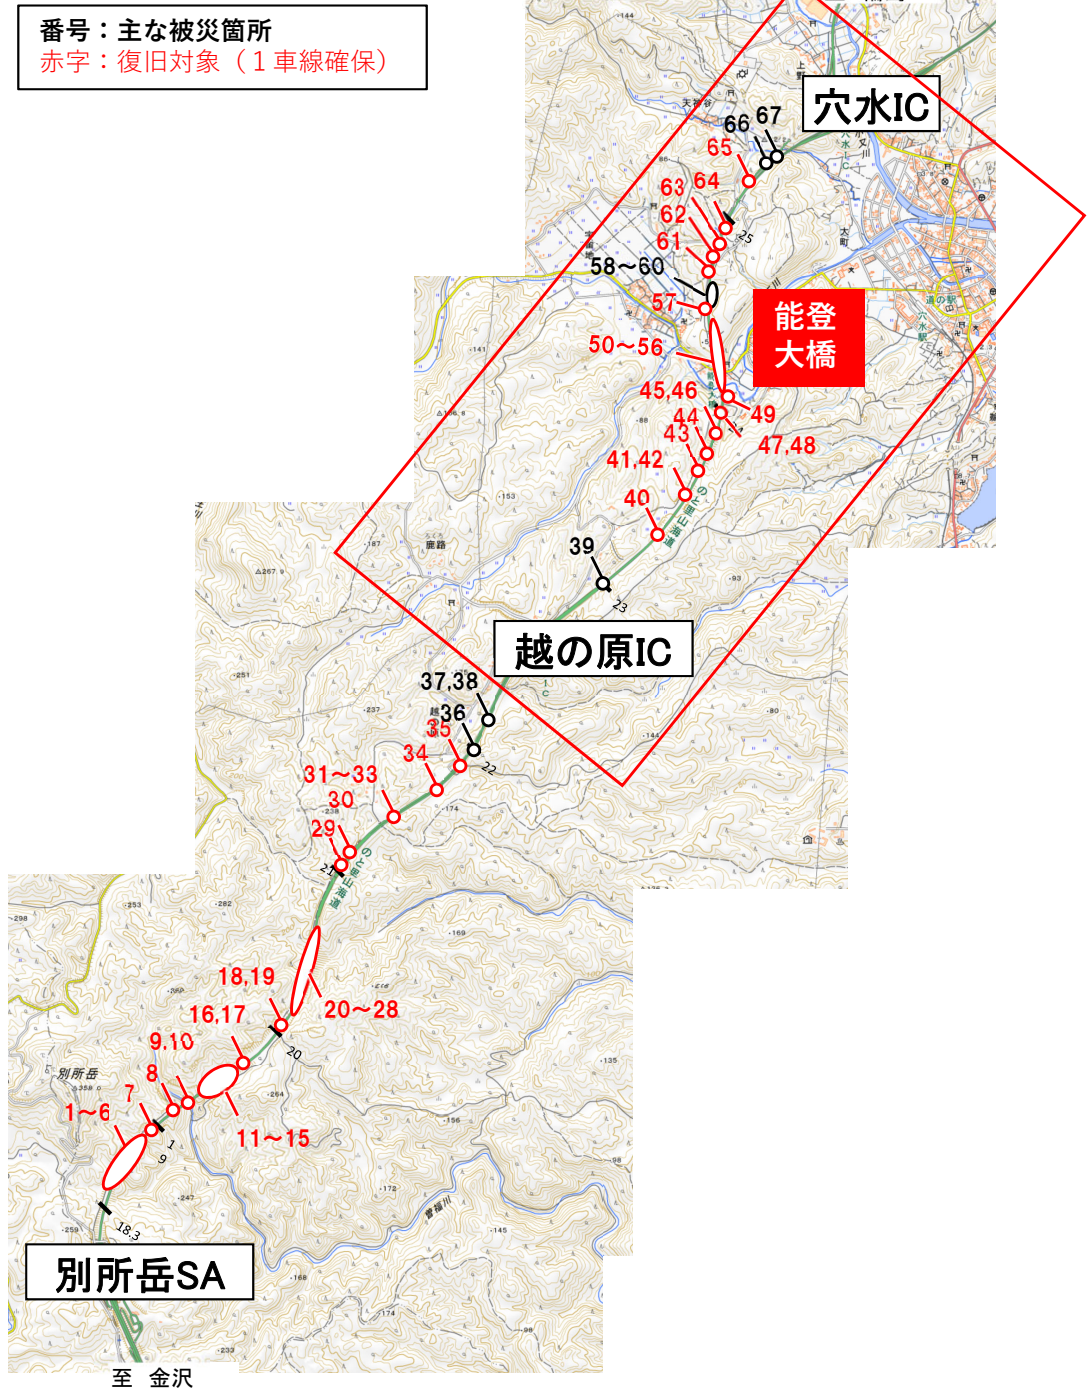

緊急復旧作業中（2車線確保）

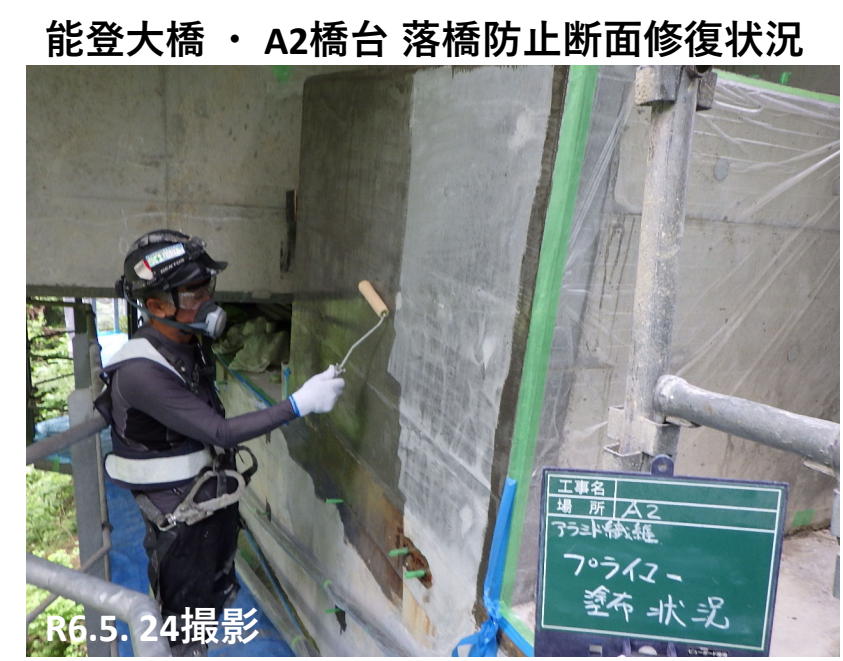


令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

5月20日現在

穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

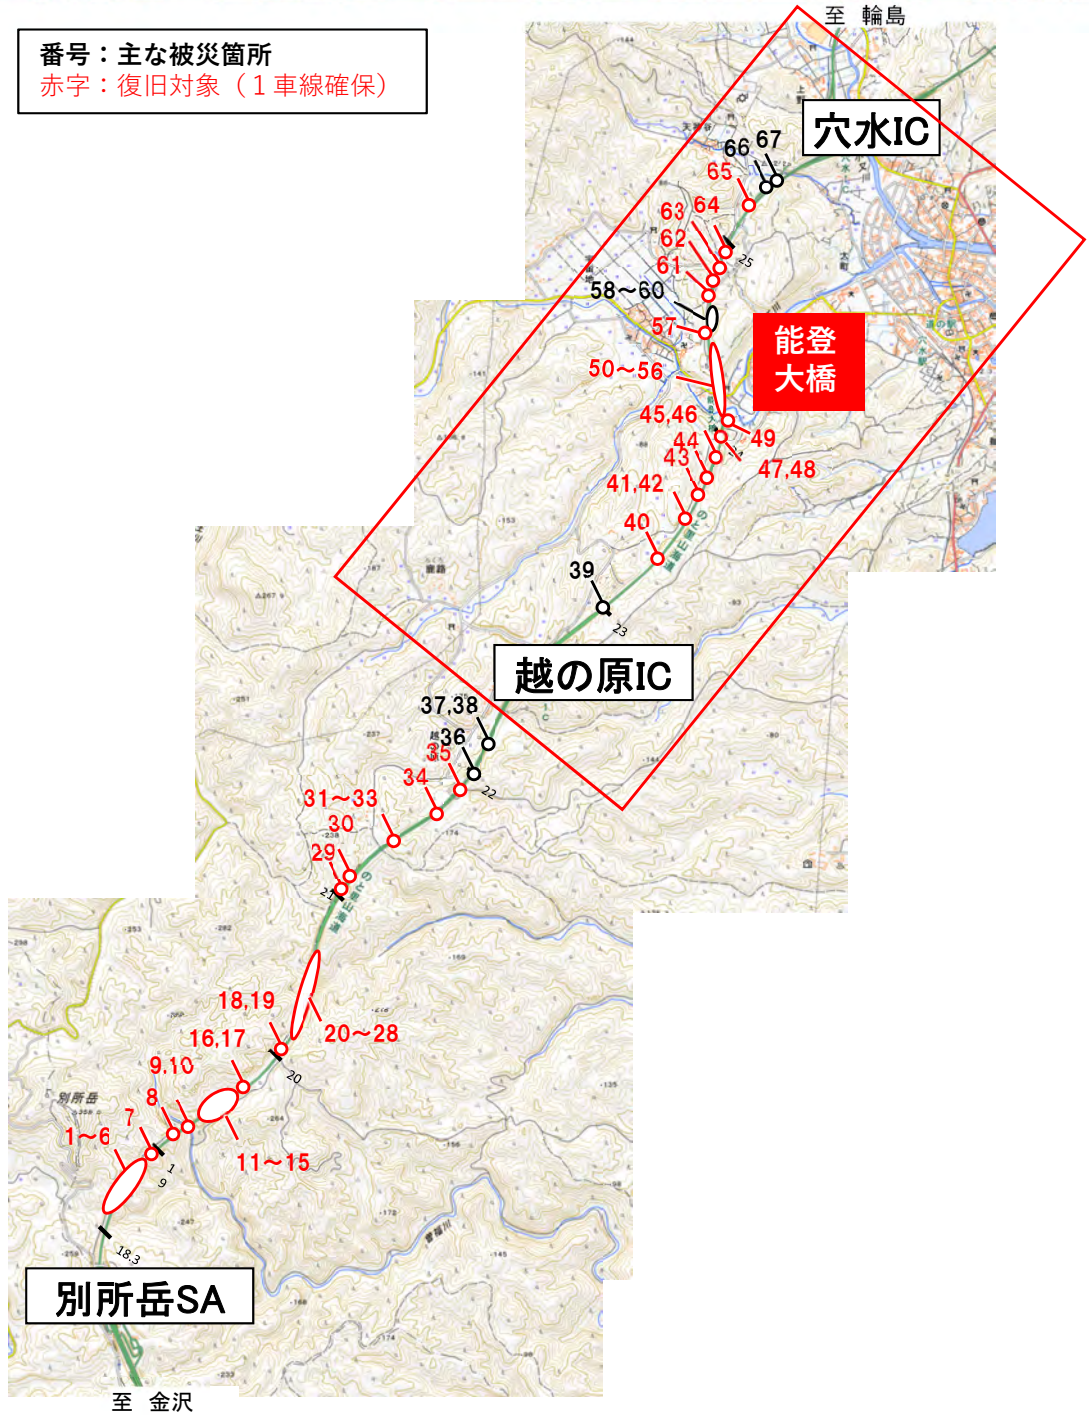

緊急復旧作業中（2車線確保）

能登大橋・A2橋台 落橋防止断面修復状況



能登大橋・A2橋台 落橋防止断面修復状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

5月13日現在

穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

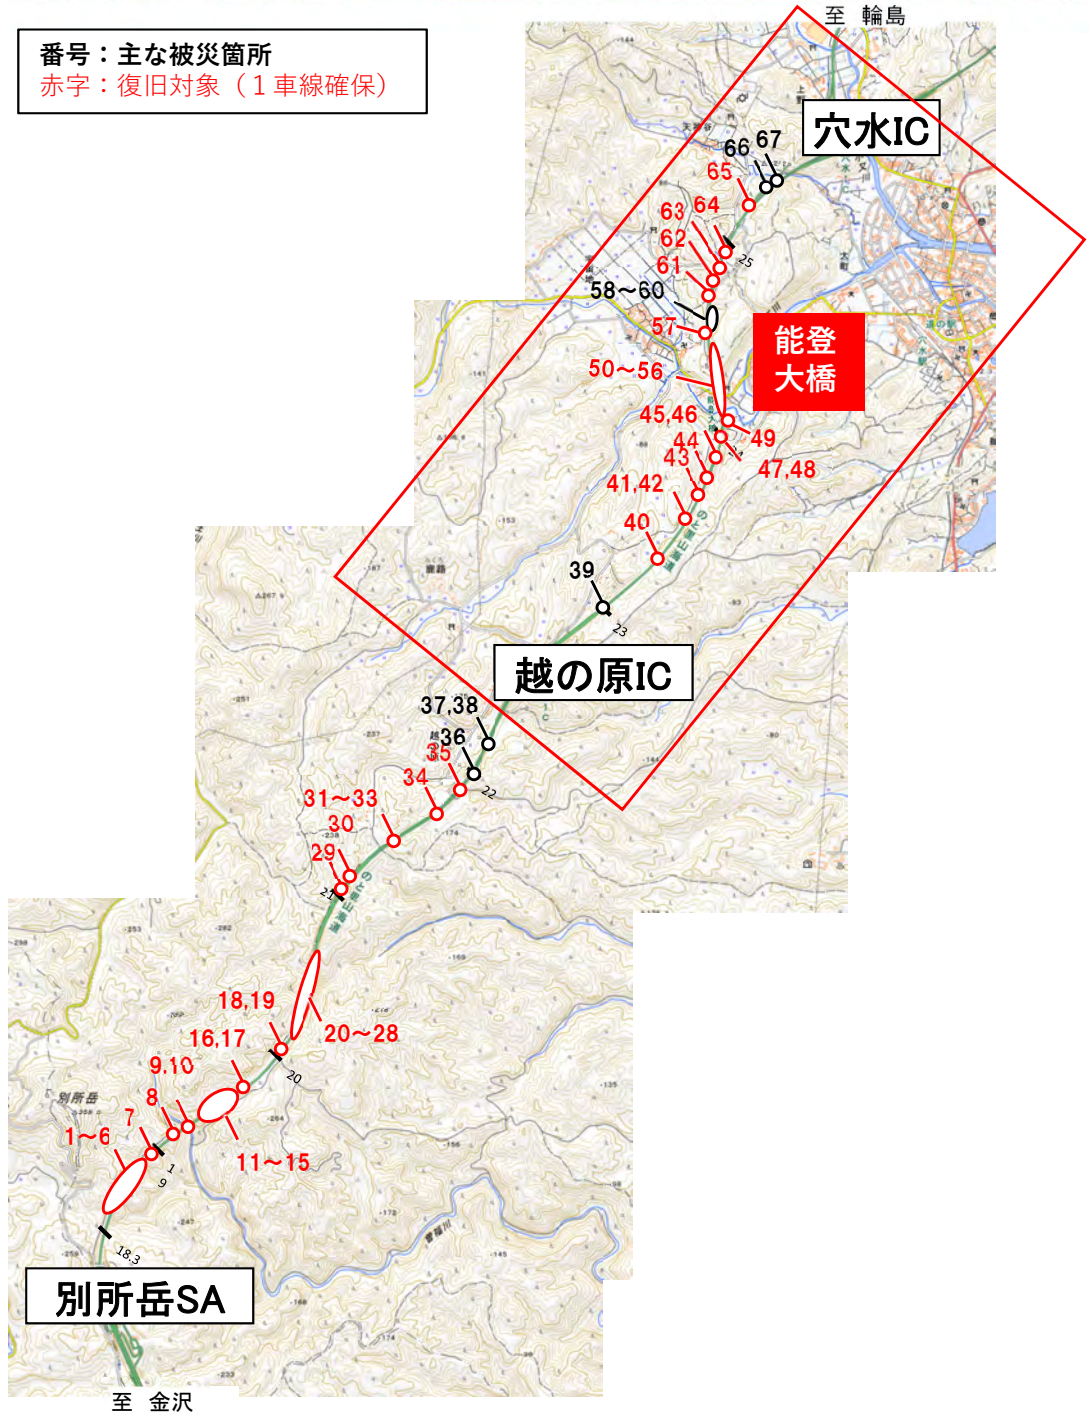

緊急復旧作業中（2車線確保）

能登大橋・A2橋台 落橋防止断面修復状況



R6.5.10撮影


能登大橋・A2橋台(上り線側)地覆部断面修復状況



工事名	
場所	A2
細収縮状況	
仕上状況	

R6.5.10撮影

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

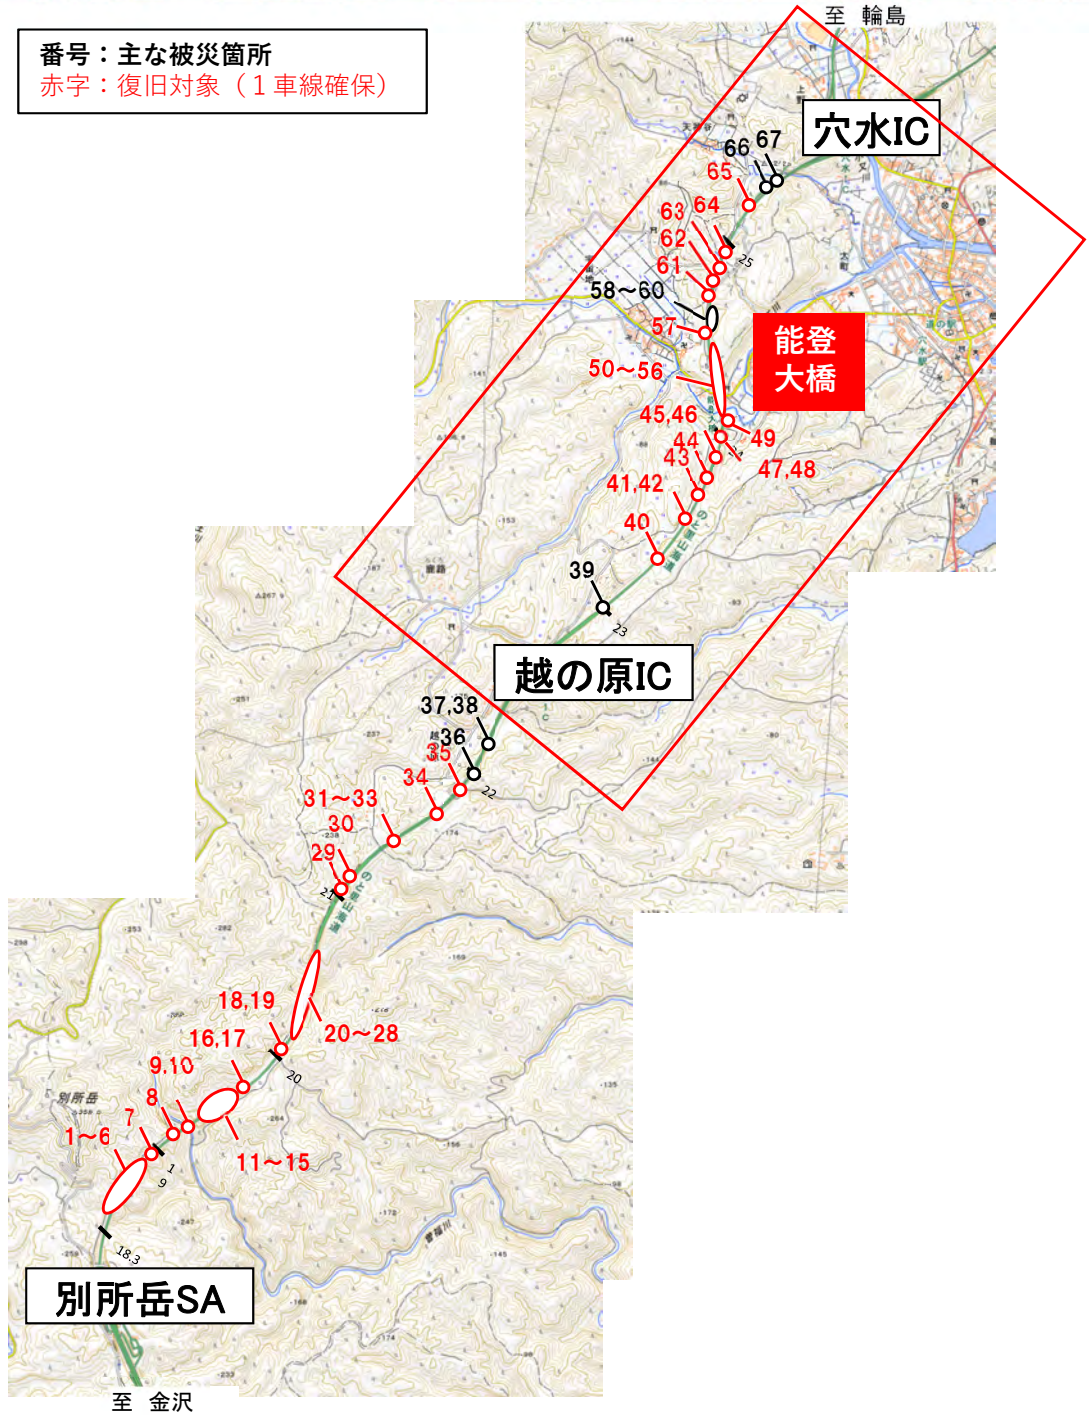

緊急復旧作業中（2車線確保）


能登大橋・PA1橋台 T桁断面修復状況



能登大橋・PA1橋台中央ヒンジ部断面修復状況



番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

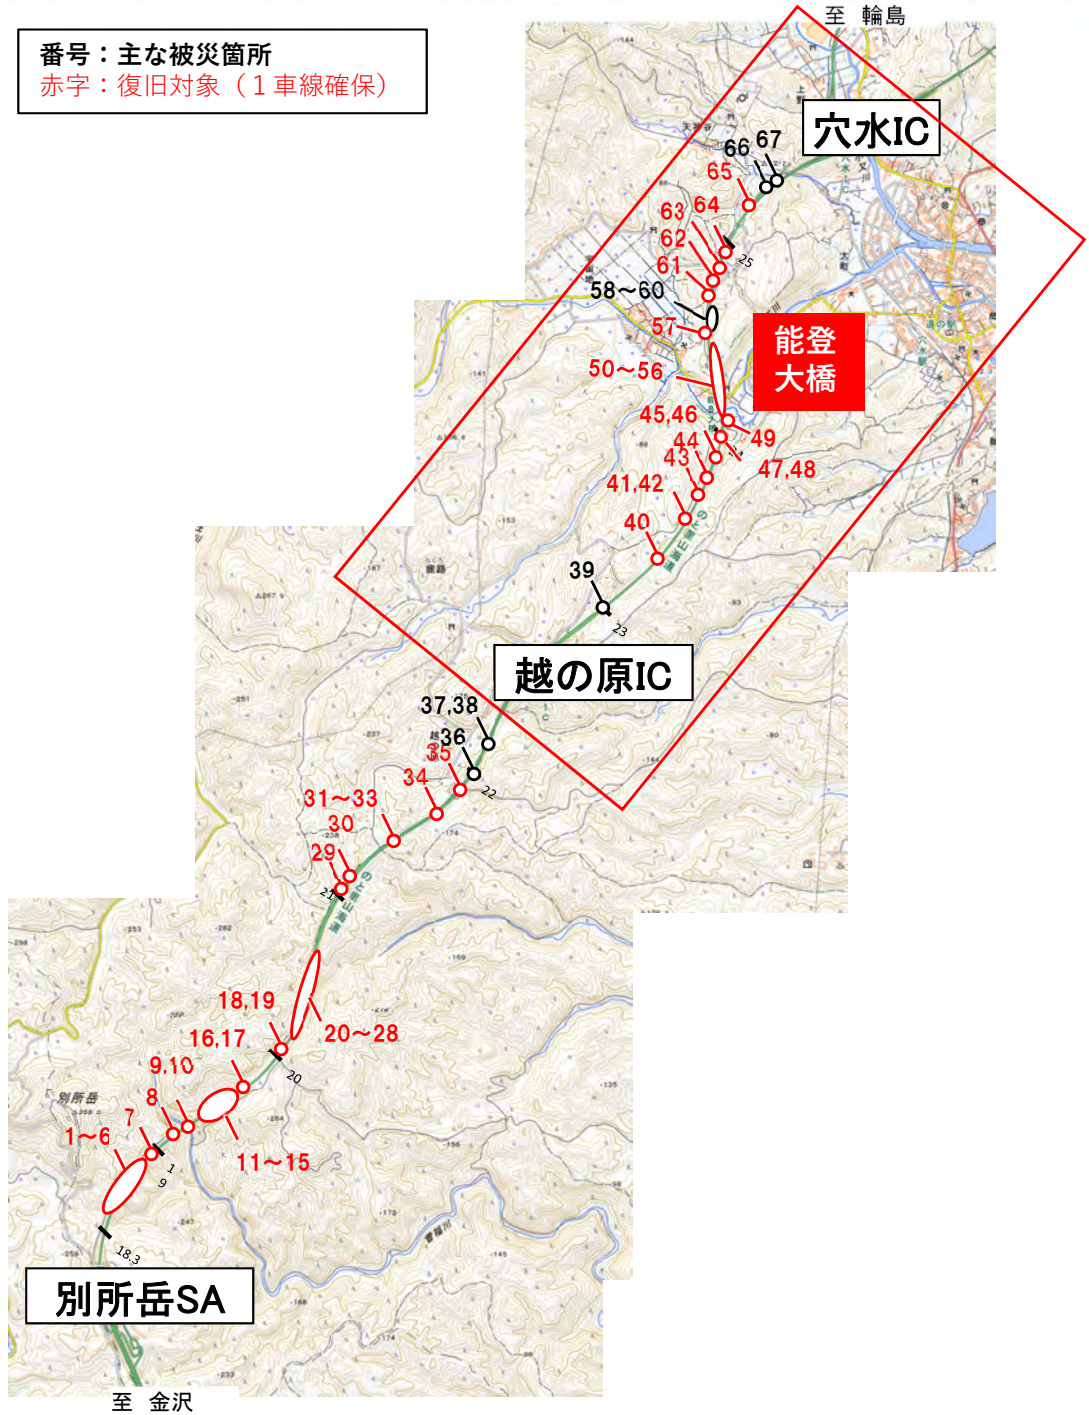


緊急復旧作業中（2車線確保）

能登大橋・PA2橋台 排水管取替え状況




R6.4. 10撮影

能登大橋・PA2橋台 排水管取替え状況

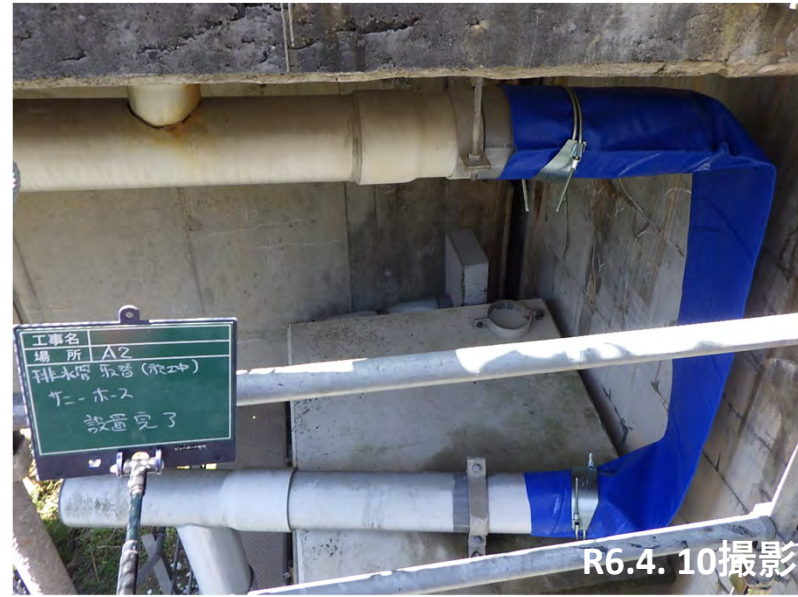

R6.4. 10撮影

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

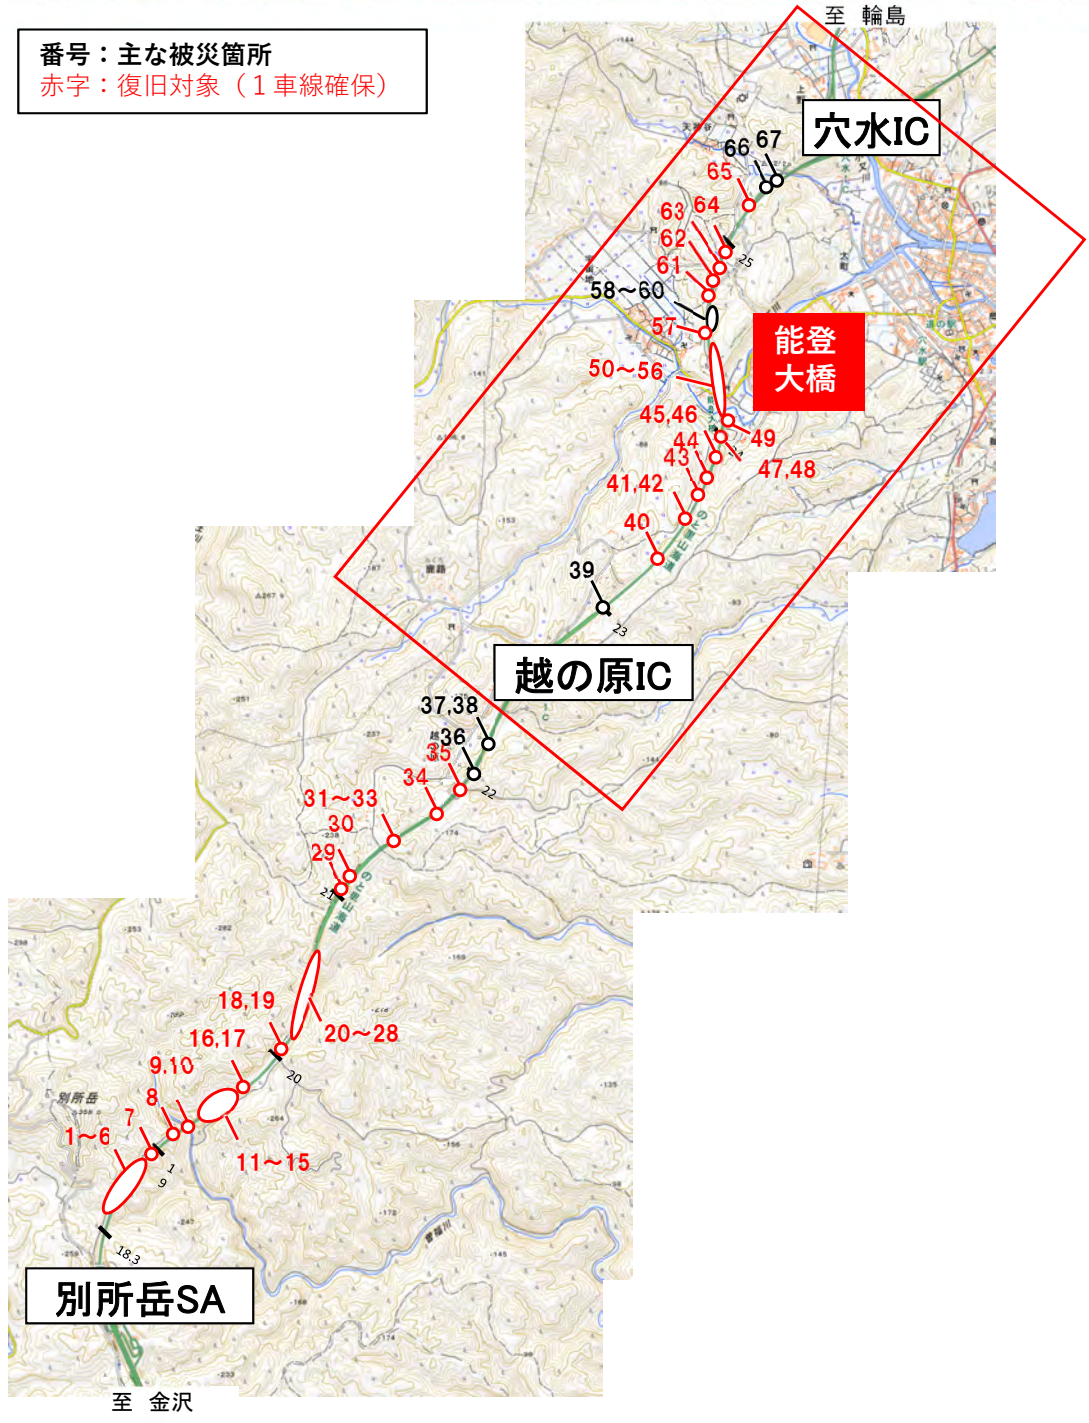


緊急復旧作業中（2車線確保）

能登大橋・PA1橋台 鉄筋・コンクリート撤去状況




R6.4.1撮影

能登大橋・PA1橋台 鉄筋・コンクリート撤去状況

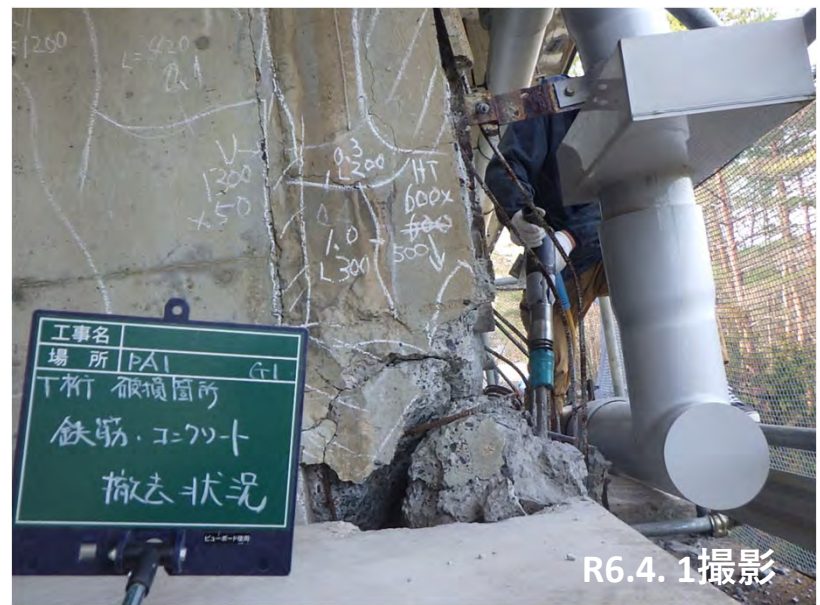

R6.4.1撮影

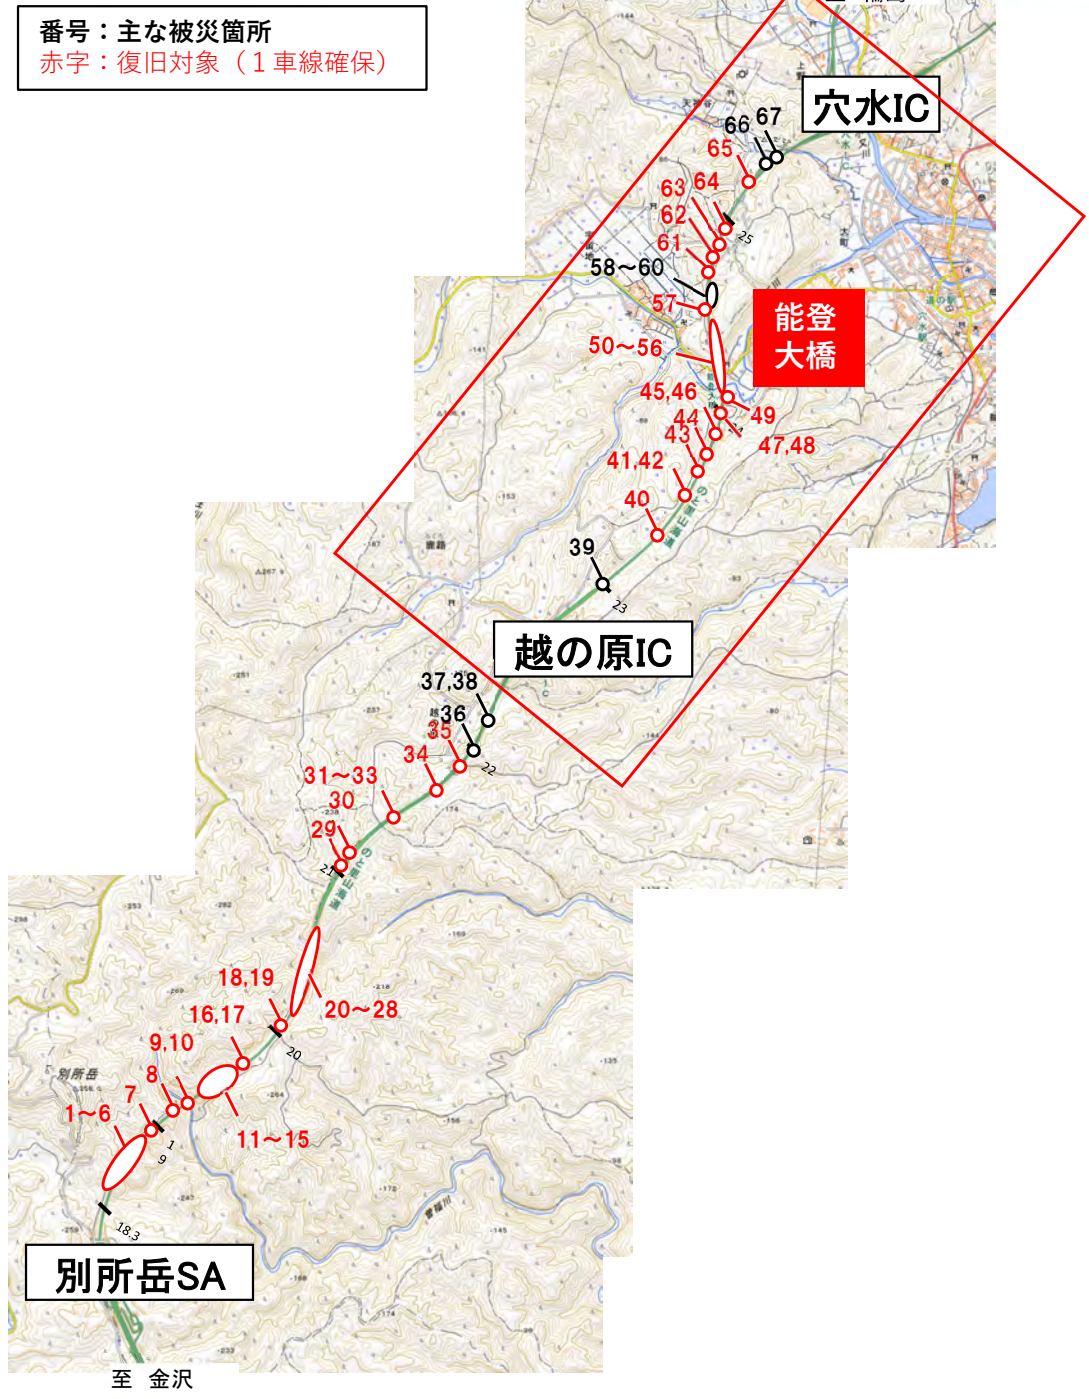

緊急復旧作業中（2車線確保）

能登大橋 A1橋台前面 点検用足場組立状況




能登大橋 箱桁出入り口手掛け設置状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

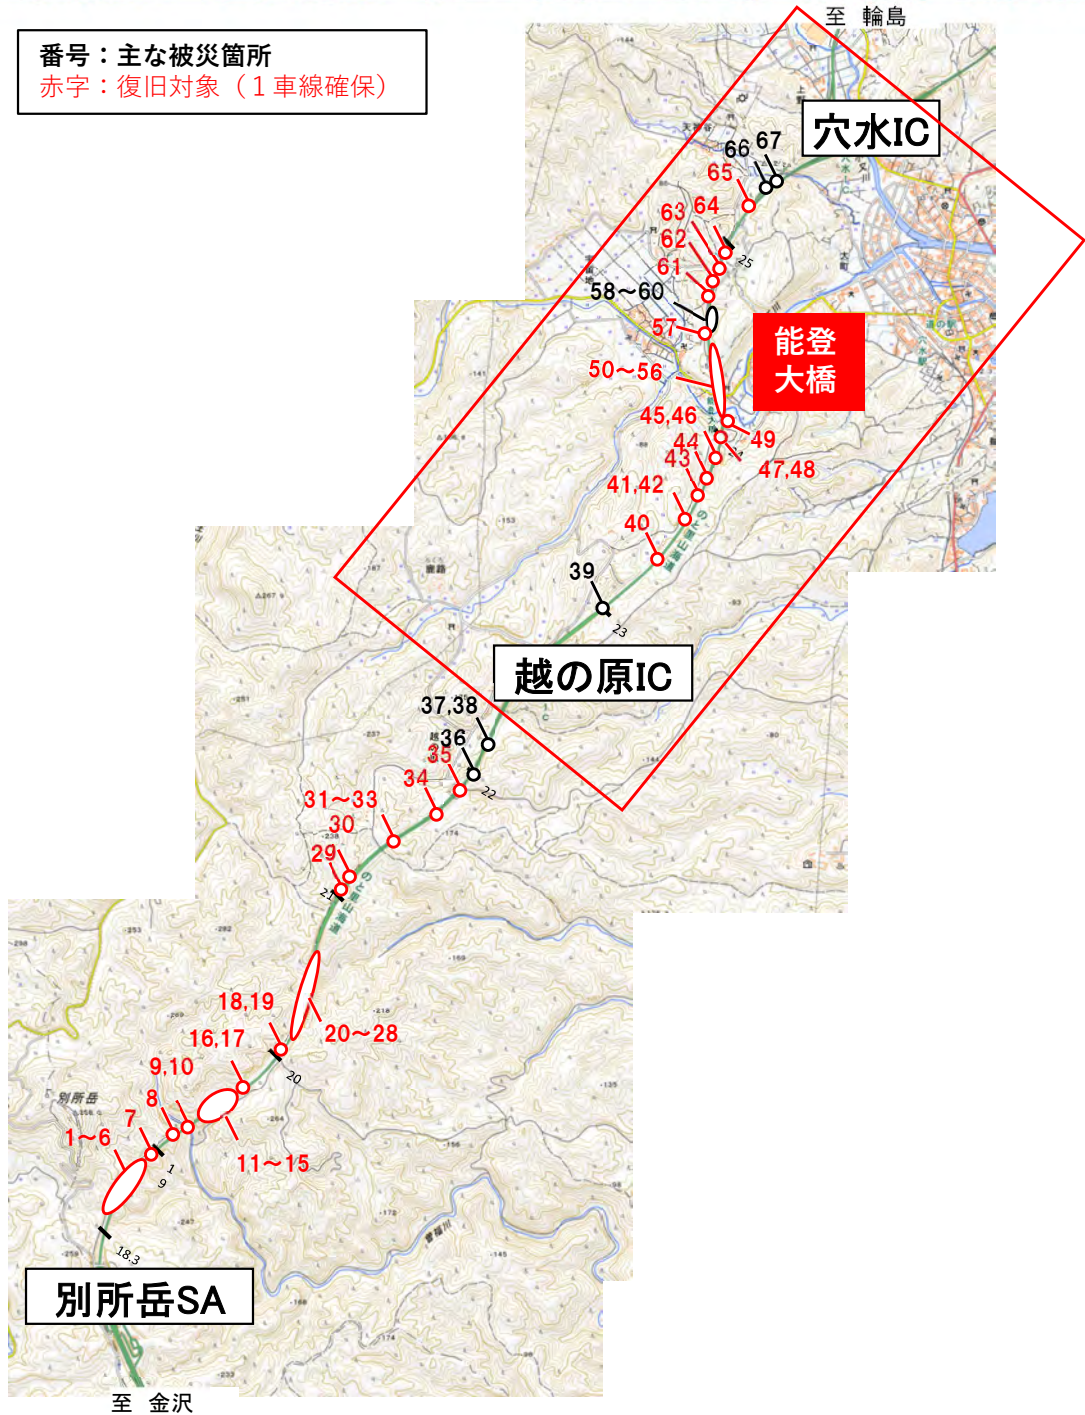

緊急復旧完了（1車線確保）
令和6年3月15日～通行止め解除（一方通行）


22. 50km付近 1車線復旧完了開放後状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

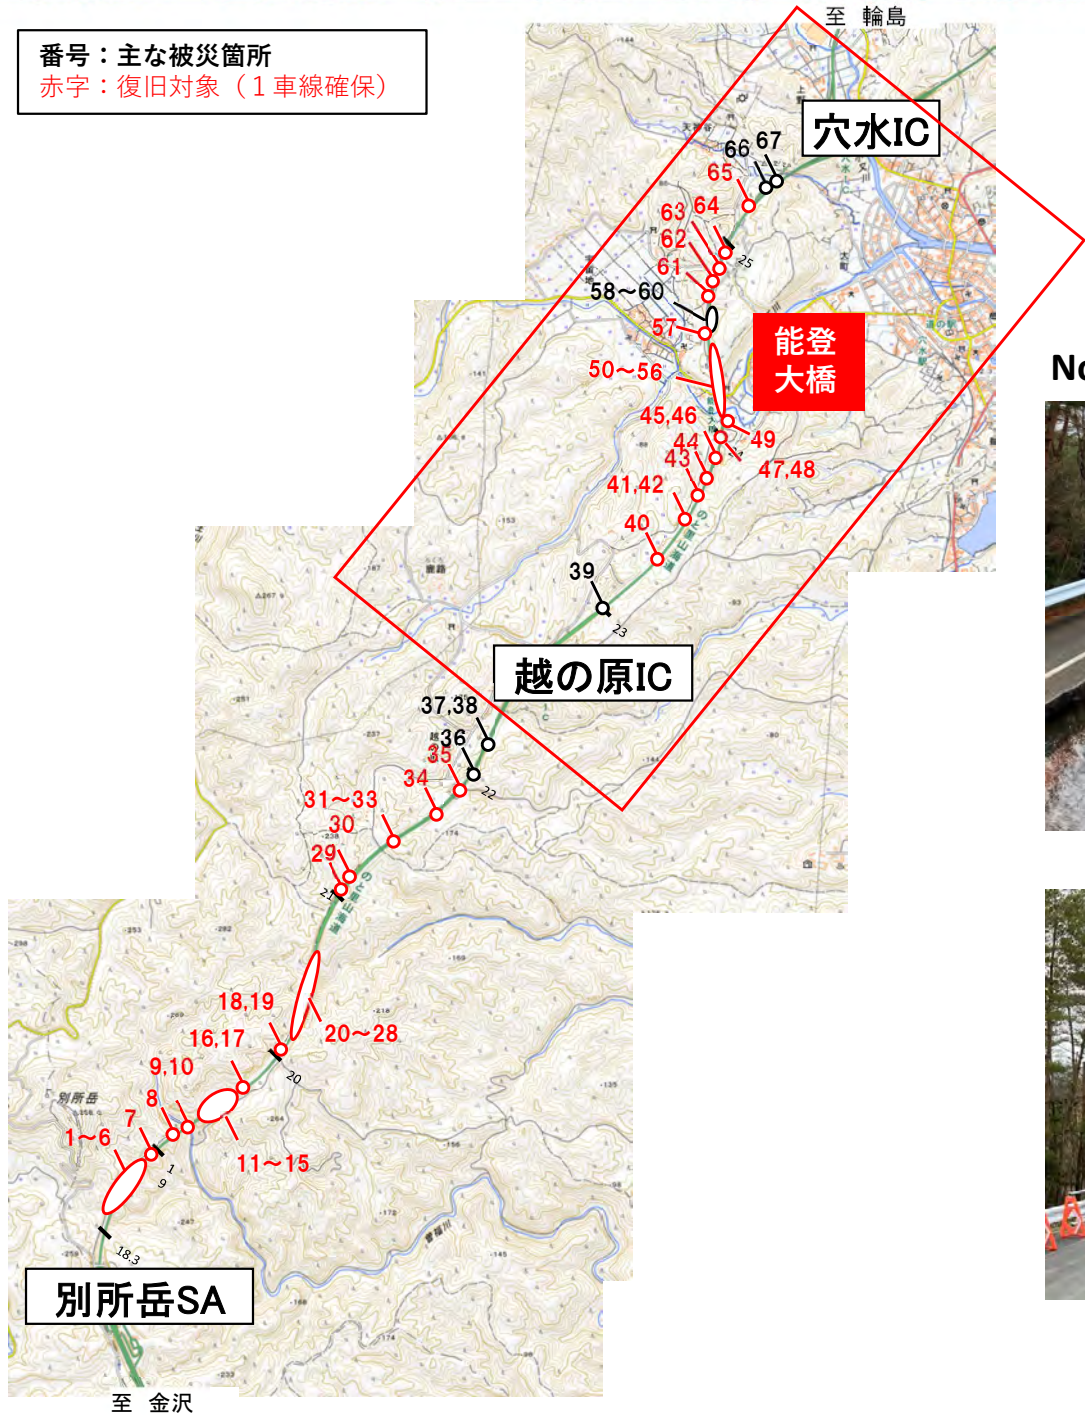

緊急復旧完了（1車線確保）
令和6年3月15日～通行止め解除（一方通行）

No45～50付近 1車線復旧完了






令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

3月13日現在

穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

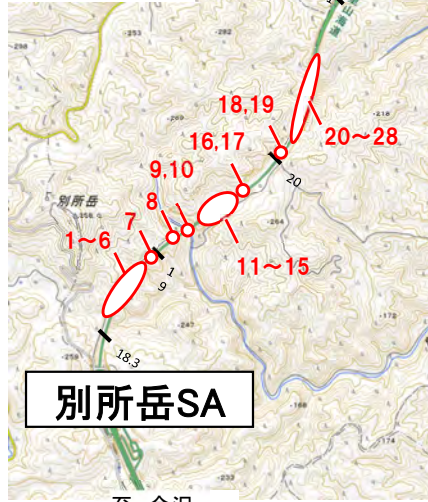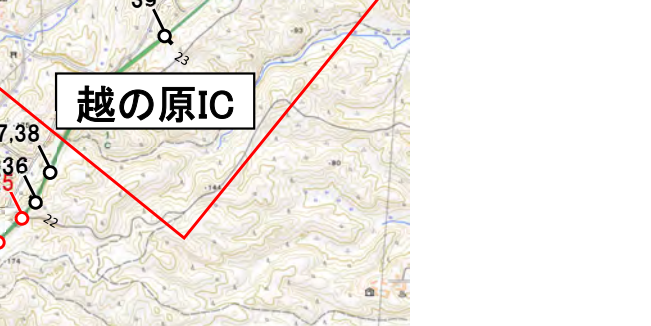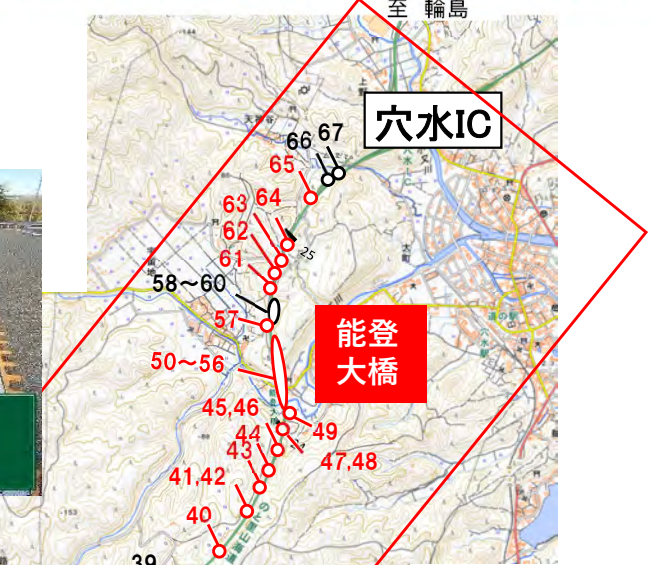

緊急復旧作業中（1車線確保）
26箇所完了（舗装以外）／29箇所

No. 40 舗装施工状況



工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道等道路復旧工事その4
工事場所	23.40KP
施工状況	施工状況
穴水～越の原 舗装工事 加熱材施工状況(表層)	



R6.3.12撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

3月11日現在

穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

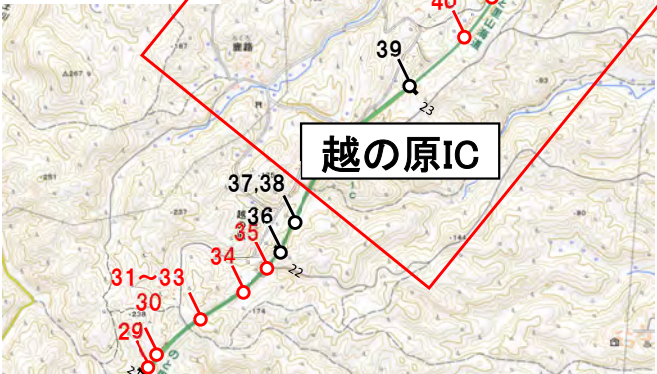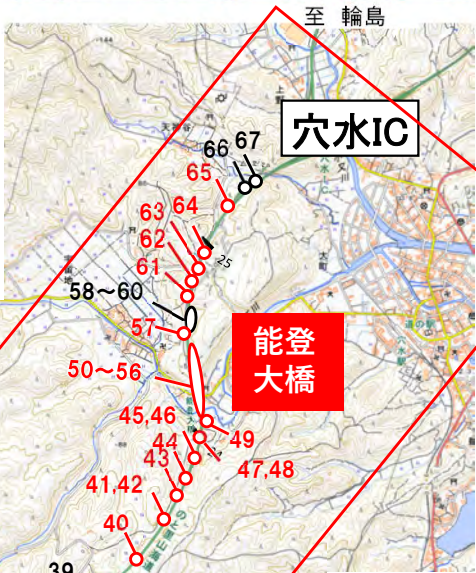

緊急復旧作業中（1車線確保）
26箇所完了（舗装以外）／29箇所

能登大橋 A1橋台足場組立状況



No. 45加熱合材施工状況





令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

3月8日現在

穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

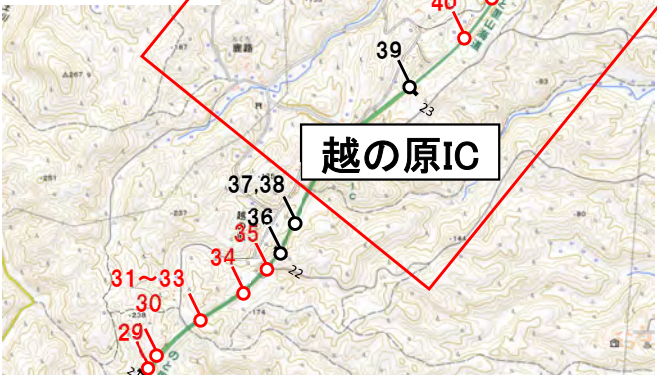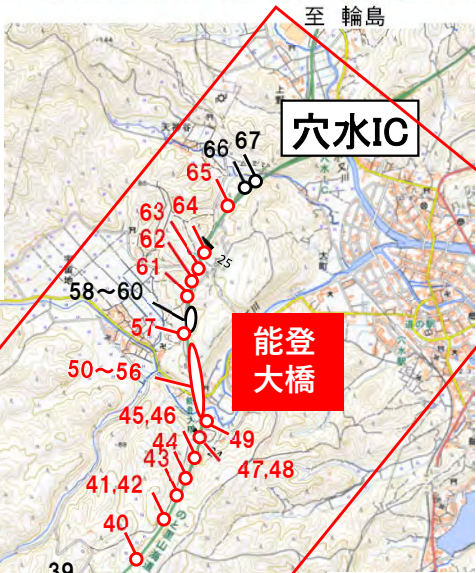

緊急復旧作業中（1車線確保）
25箇所完了（舗装以外）／29箇所

能登大橋 A1橋台鋼材H200設置状況



No. 45 舗装工乳剤散布施工状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株)）

3月6日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）




No48被災状況

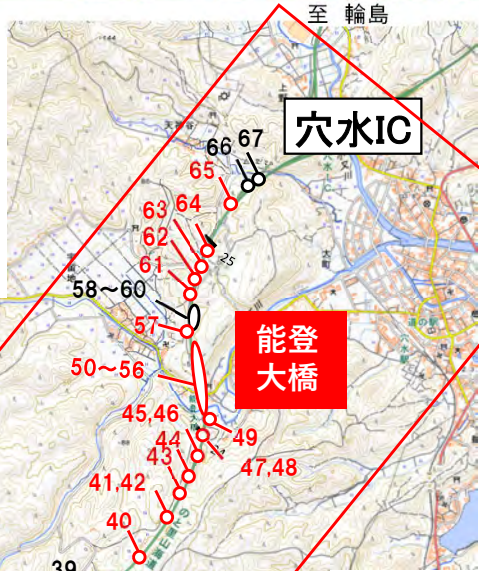

穴水IC

能登大橋

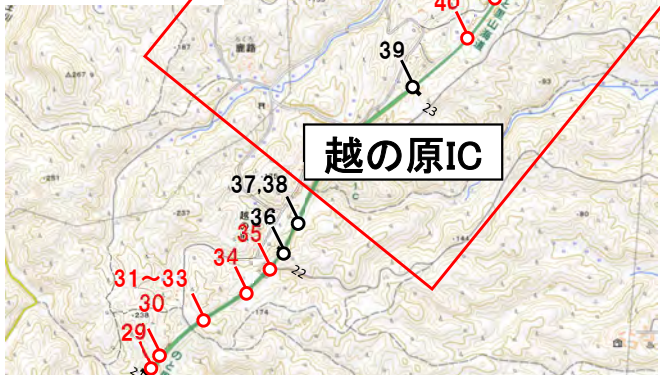

越の原IC



別所岳SA

至 金沢



No50被災状況

緊急復旧作業中（1車線確保）
23箇所完了（舗装以外）／29箇所

No. 55付近 舗装切削状況



工事名 令和6年能登半島地震 能登自動車道等道路
管理工事その4
工 種 舗装工 測 点 越の原IC～穴水IC
24.47KP
舗装切削完了

R6.3.5撮影

No. 45～50 砕石敷均し転圧状況





工事名 令和6年能登半島地震
工 種 のと里山海道管理工事
測 点 23.90kp～能登大橋間
全景写真
R6年3月5日 施工者 鹿島建設

R6.3.5撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株)）

3月4日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

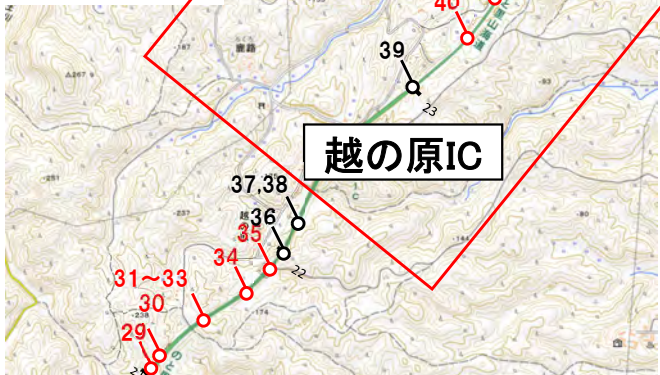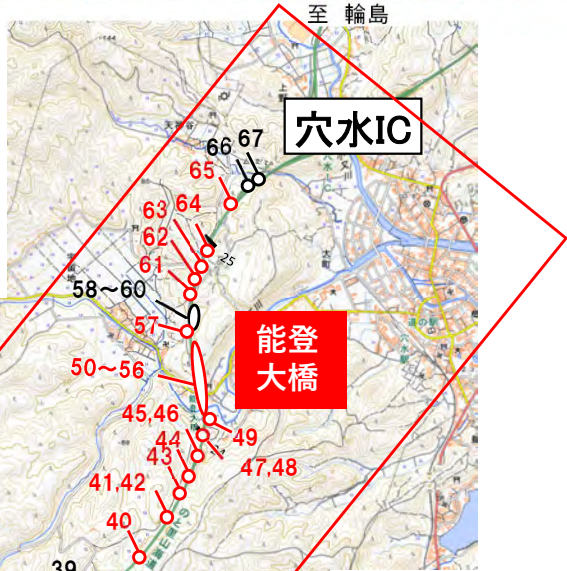

緊急復旧作業中（1車線確保）
23箇所完了（舗装以外）／29箇所

No. 65付近 隙間充填完了状況




No. 49付近 1車線啓開作業状況



番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）




No48被災状況

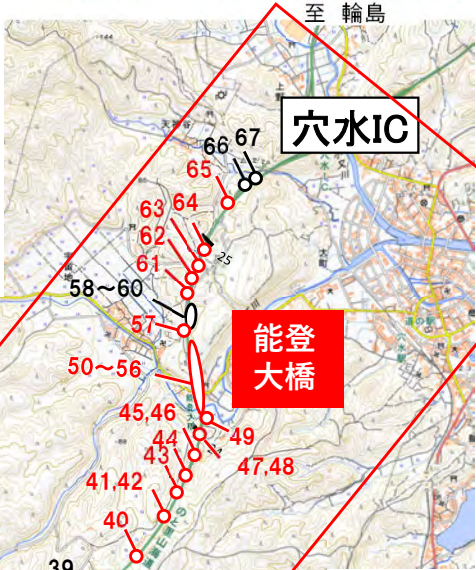

穴水IC

能登大橋

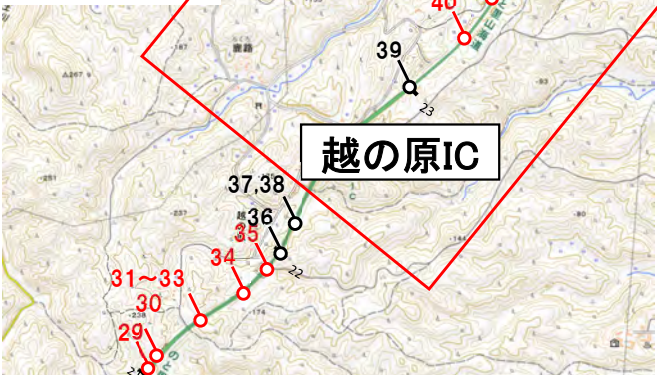

越の原IC



別所岳SA

至 金沢



No50被災状況

緊急復旧作業中（1車線確保）
23箇所完了（舗装以外）／29箇所

No. 61 法面形成状況



工事件名 中津川地区中津川橋梁・国道169号能登半島地震緊急復旧工事
工事場所 24.80kP
施工状況 施工状況
撮影日時 R6.2.27
撮影者 鹿島建設

R6.2.27撮影

No. 49付近 発砲ウレタン施工状況





工事名 令和6年能登半島地震
工種 のと里山海道管轄工事
測点 24.07kP～能登大橋間
発砲ウレタン盛土
施工完了
R6年2月27日 施工者 鹿島建設

R6.2.27撮影

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）



No48被災状況

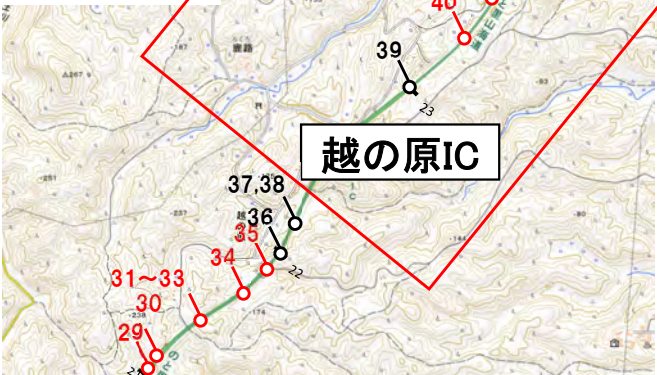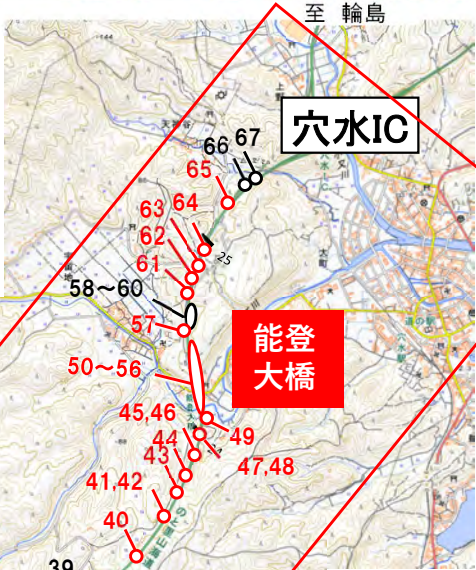

別所岳SA



No50被災状況

緊急復旧作業中（1車線確保）
23箇所完了（舗装以外）／29箇所

No. 49付近 発砲ウレタン盛土施工状況



R6.2.25撮影

工事名	令和6年能登半島地震
工種	のと里山海道管工工事
測点	24.07kp～能登大橋間
発砲ウレタン盛土 施工状況	
R6年2月25日 施工者 鹿島建設	



No. 56付近 砕石路盤不陸調整状況



R6.2.23撮影

工事名	令和6年能登半島地震
工種	管工工事その他IC
測点	24.53～24.60KP
砕石路盤不陸調整	
R6年2月23日 施工者 前田建設工業	

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

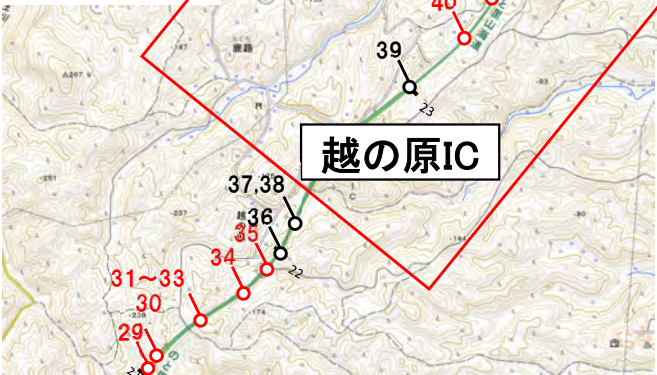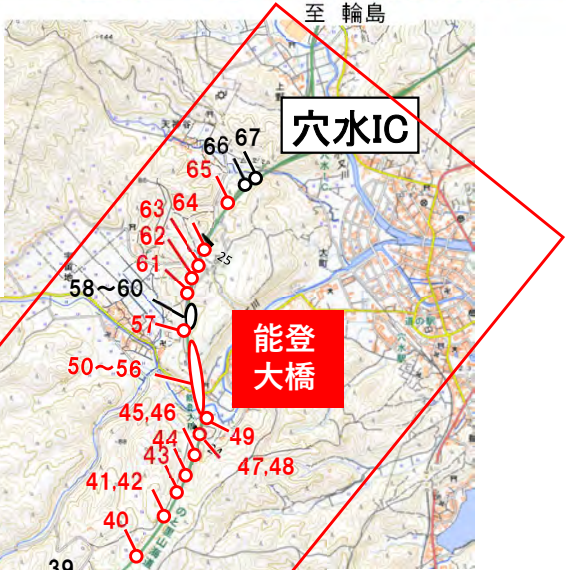

緊急復旧作業中（1車線確保）
23箇所完了（舗装以外）／29箇所

No. 50付近 足場設置状況



No. 46付近 路盤造成状況





工事名	令和6年能登半島地震
工種	のと里山海道等復旧工事
測点	23.75～23.85 k.p.間
路盤造成状況	
R6年2月20日 施工者 鹿島建設	

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株)）

2月19日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

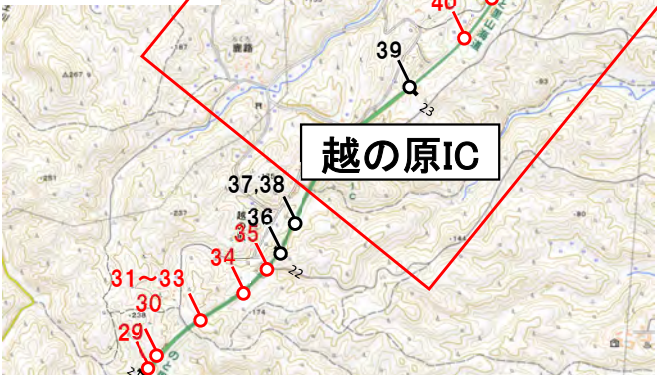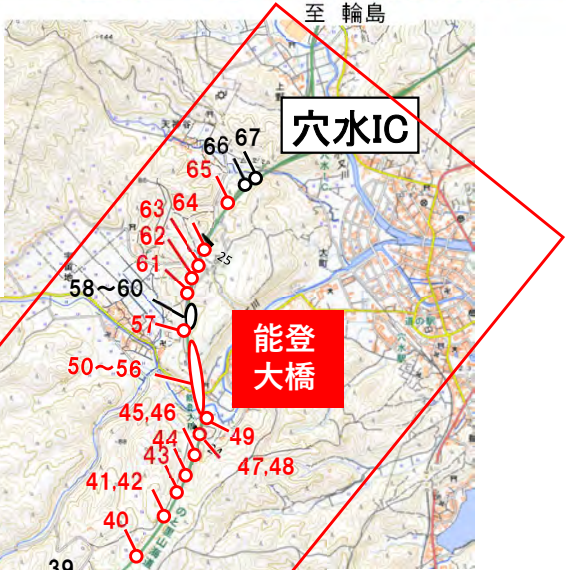

緊急復旧作業中（1車線確保）
23箇所完了（舗装以外）／29箇所

No. 50付近 仮設工施工状況



No. 56付近 施工完了状況





令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株)）

2月15日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

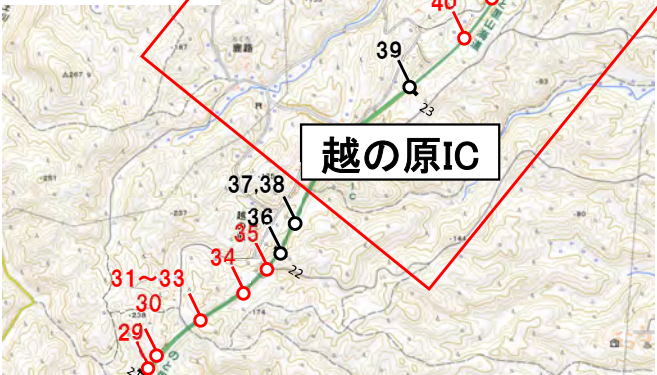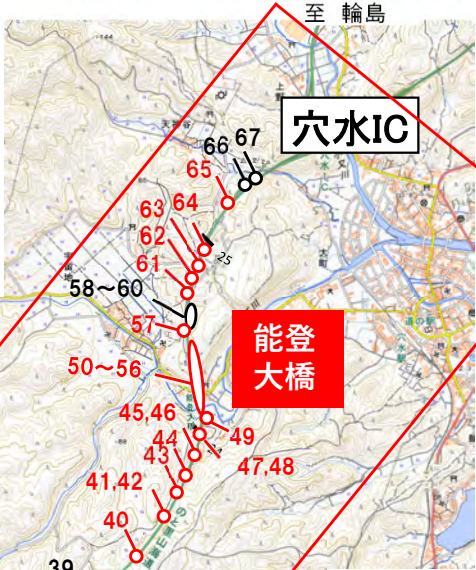

緊急復旧作業中（1車線確保）
23箇所完了（舗装以外）／29箇所

No. 47付近 土砂撤去状況



工事名	令和6年能登半島地震
工種	のと里山海道管理工事
箇所	24.0 k p 付近
掘削運搬状況	
R6年2月13日 施工者 鹿島建設	



No. 58付近 クラック補修状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株)）

2月13日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

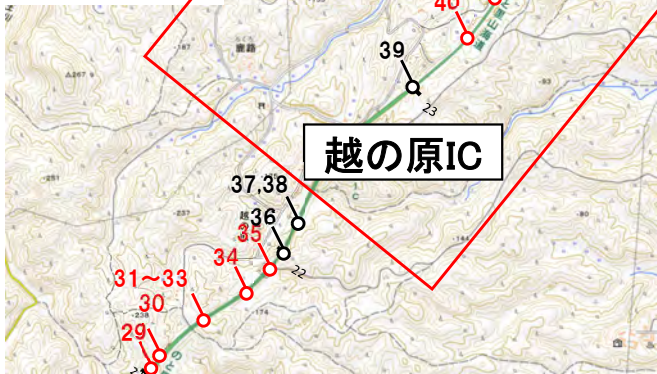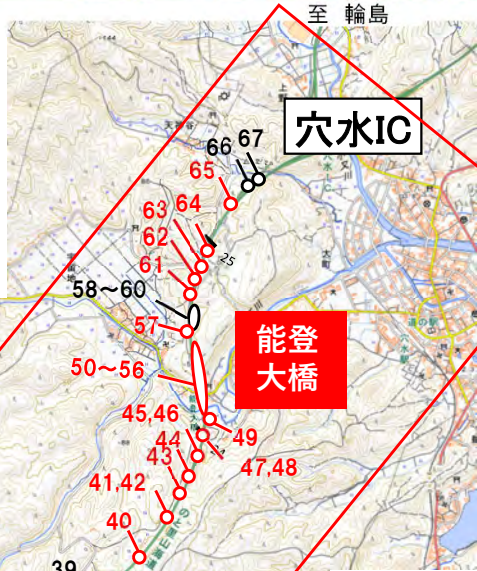

緊急復旧作業中（1車線確保）
23箇所完了（舗装以外）／29箇所



No. 49～52付近 碎石敷均状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株)）

2月9日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

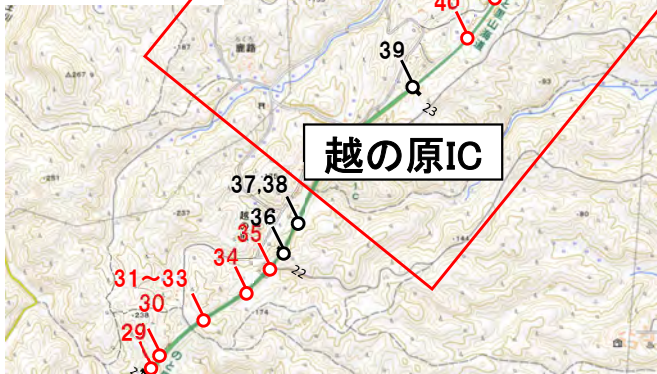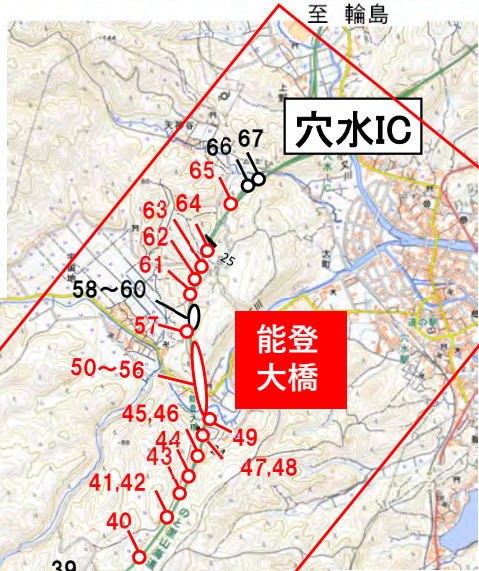

緊急復旧作業中（1車線確保）
23箇所完了（舗装以外）／29箇所

No. 47～50付近 走路整備状況




工事名	令和6年能登半島地震
工 種	のと里山海道復旧工事
測 点	24.0 kp付近
走路設備状況	
R6年2月8日 施工者 鹿島建設	

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株)）

2月7日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

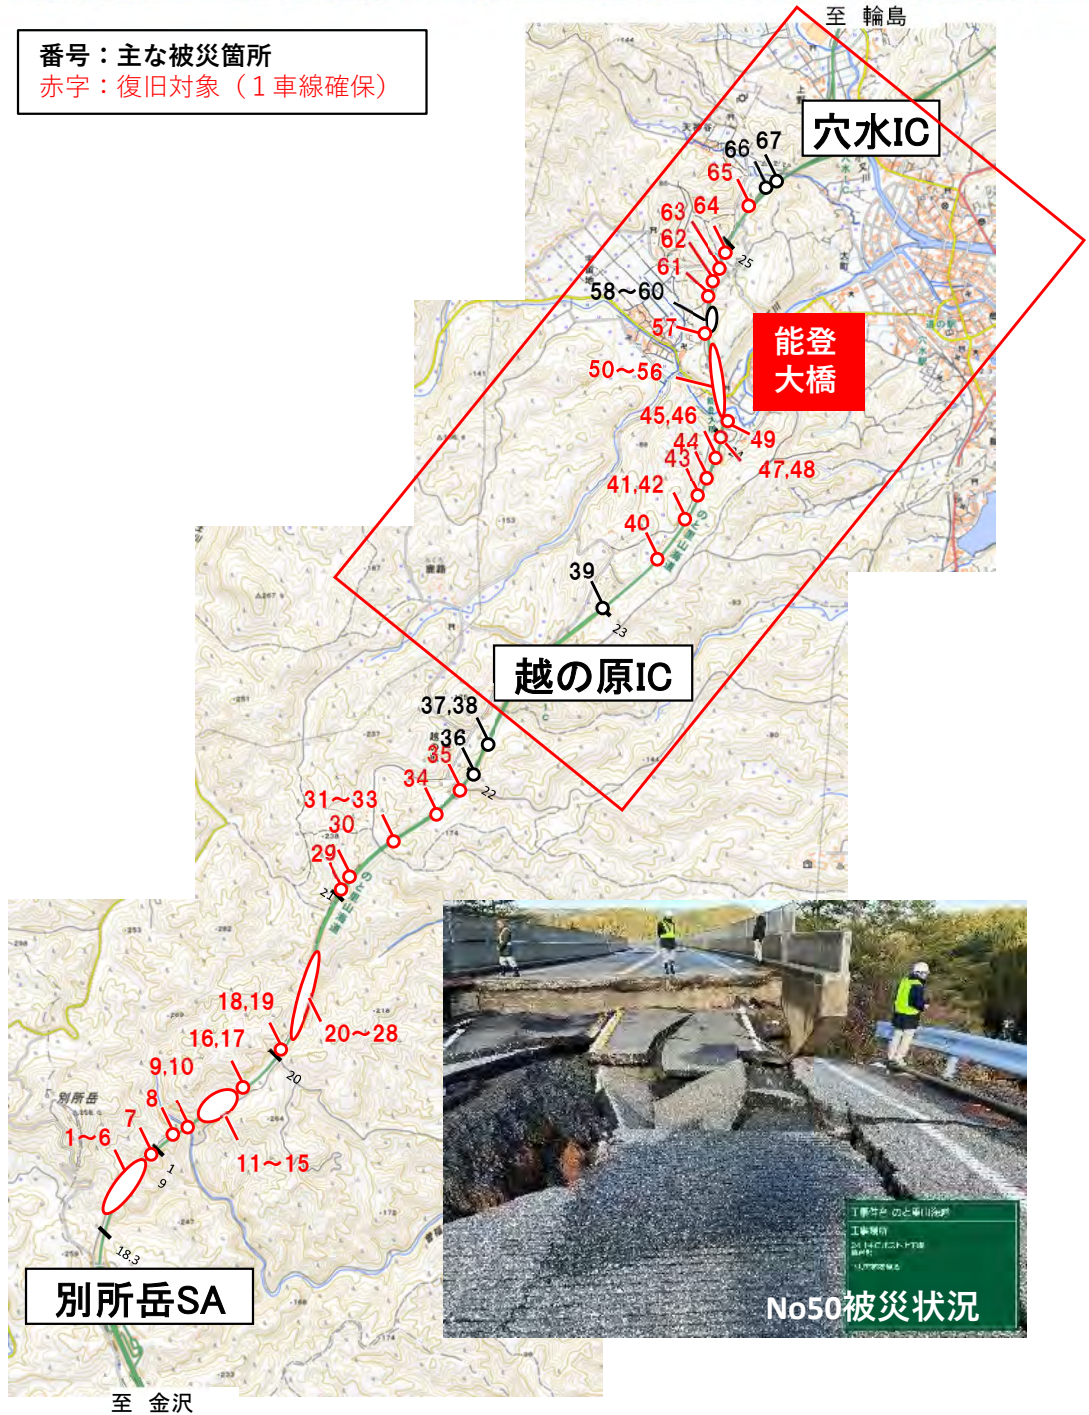

緊急復旧作業中（1車線確保）
23箇所完了（舗装以外）／29箇所



No. 49～50付近 掘削状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株)）

2月1日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

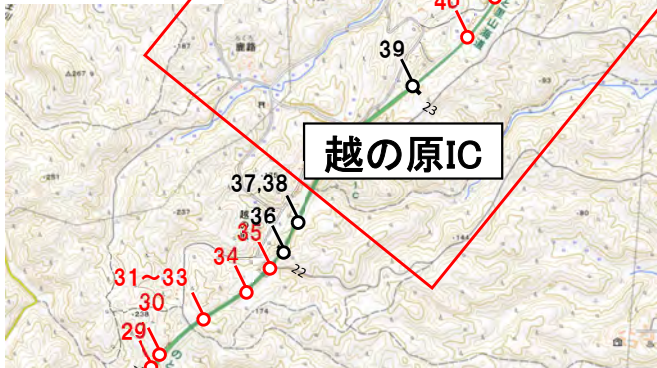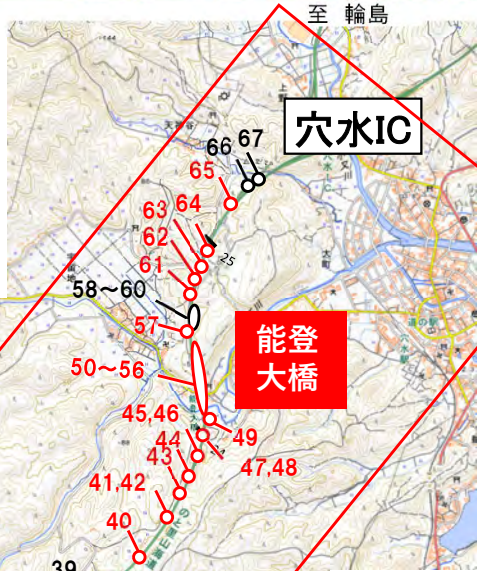

緊急復旧作業中（1車線確保）
23箇所完了（舗装以外）／29箇所



No.62路床整正状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株)）

1月31日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

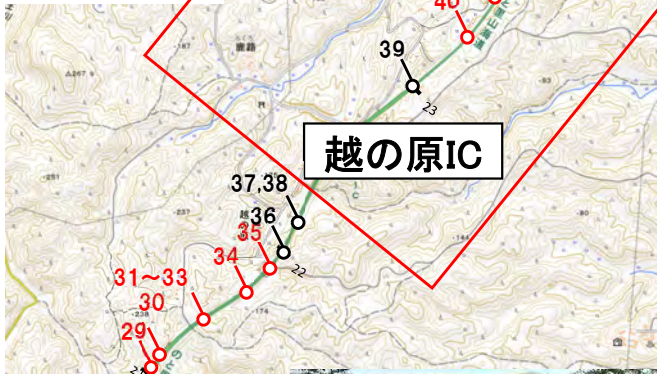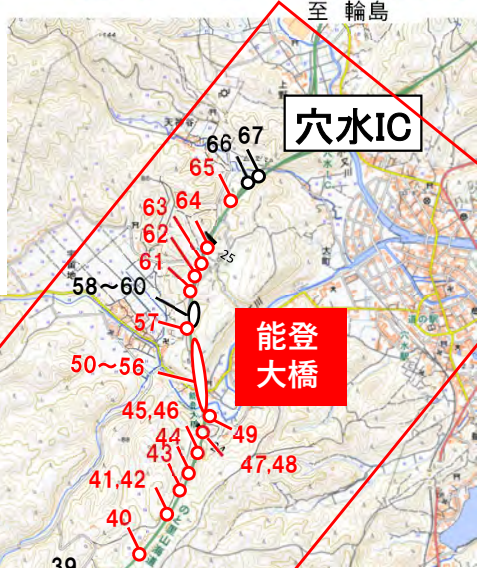

緊急復旧作業中（1車線確保）
23箇所完了（舗装以外）／29箇所

No.40路盤造成状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株)）

1月30日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）




No48被災状況

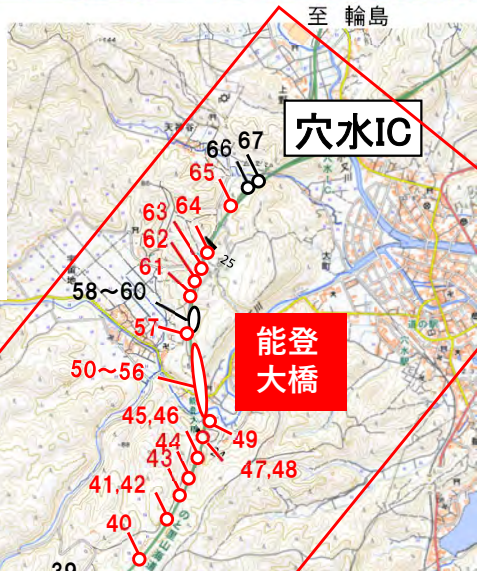

穴水IC

能登大橋

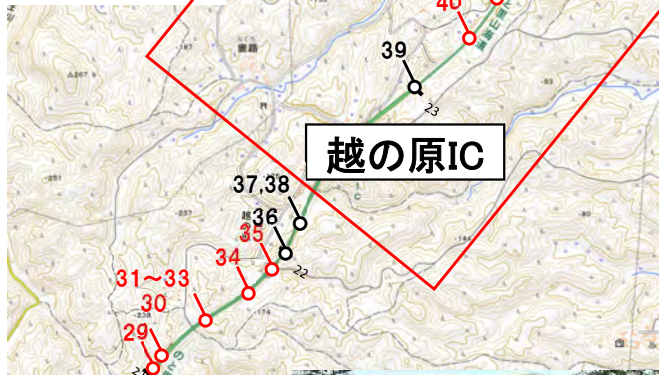

越の原IC



別所岳SA

至 金沢



No50被災状況

緊急復旧作業中（1車線確保）
23箇所完了（舗装以外）／29箇所

No.48詳細調査状況



R6.1.30撮影




R6.1.30撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株)）

1月29日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

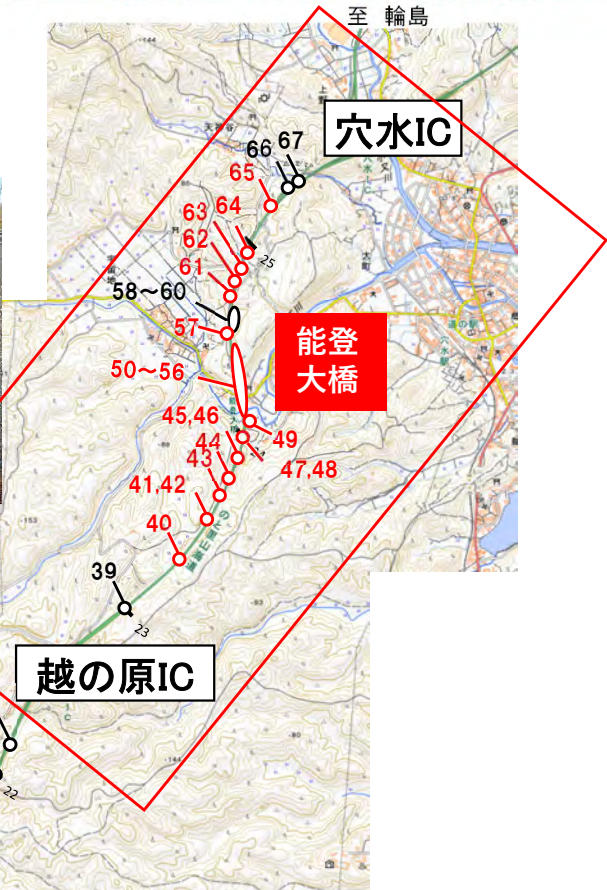

緊急復旧作業中（1車線確保）
23箇所完了（舗装以外）／29箇所

No.48～50詳細調査・残土処理状況





至 金沢

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC（担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株)）

1月28日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

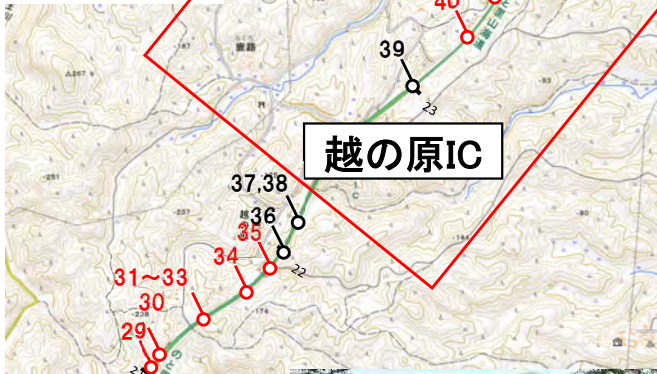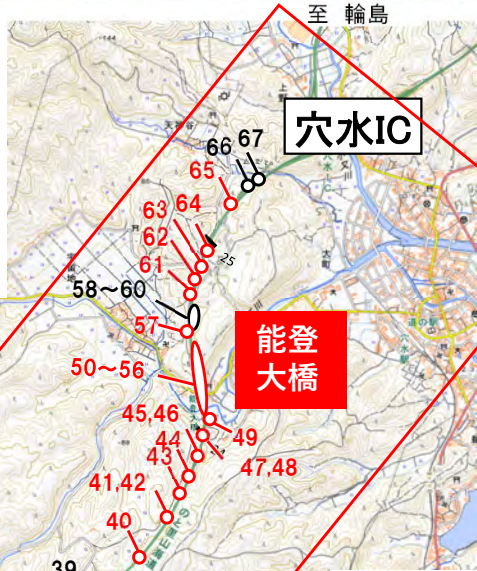

緊急復旧作業中（1車線確保）
23箇所完了（舗装以外）／29箇所

No.48測量状況

