

令和6年能登半島地震　のと里山海道　緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA（担当会社（株）大林組（株）熊谷組）

7月17日現在

番号：主な被災箇所



至 金沢

緊急復旧（2車線対面通行）




至 金沢

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

4月22日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

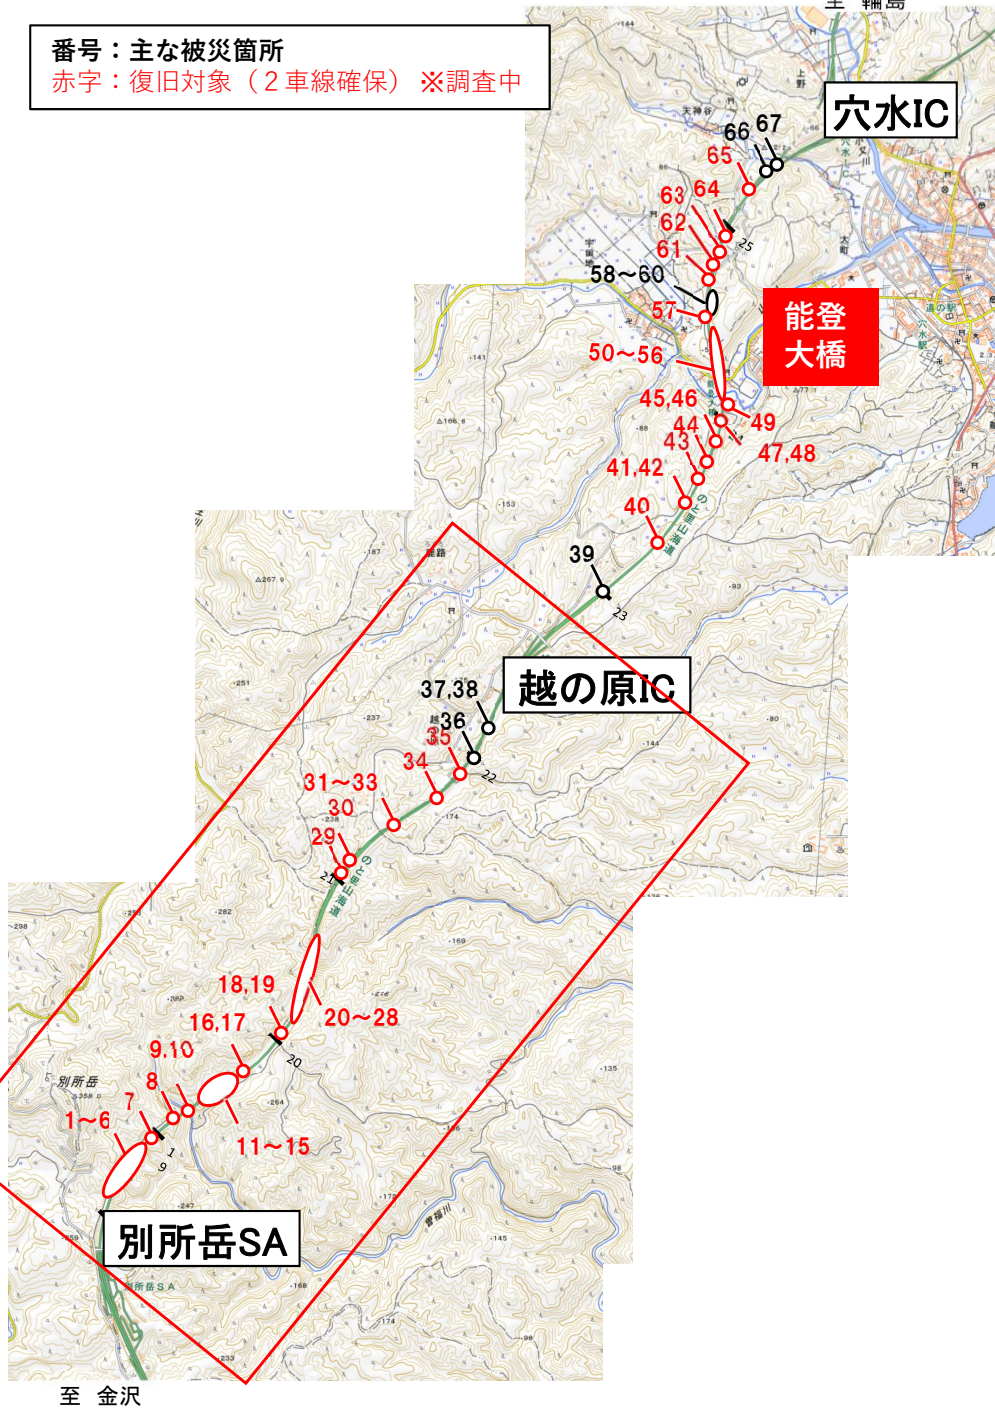

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.29付近 舗装状況



No.29付近 舗装状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

4月15日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

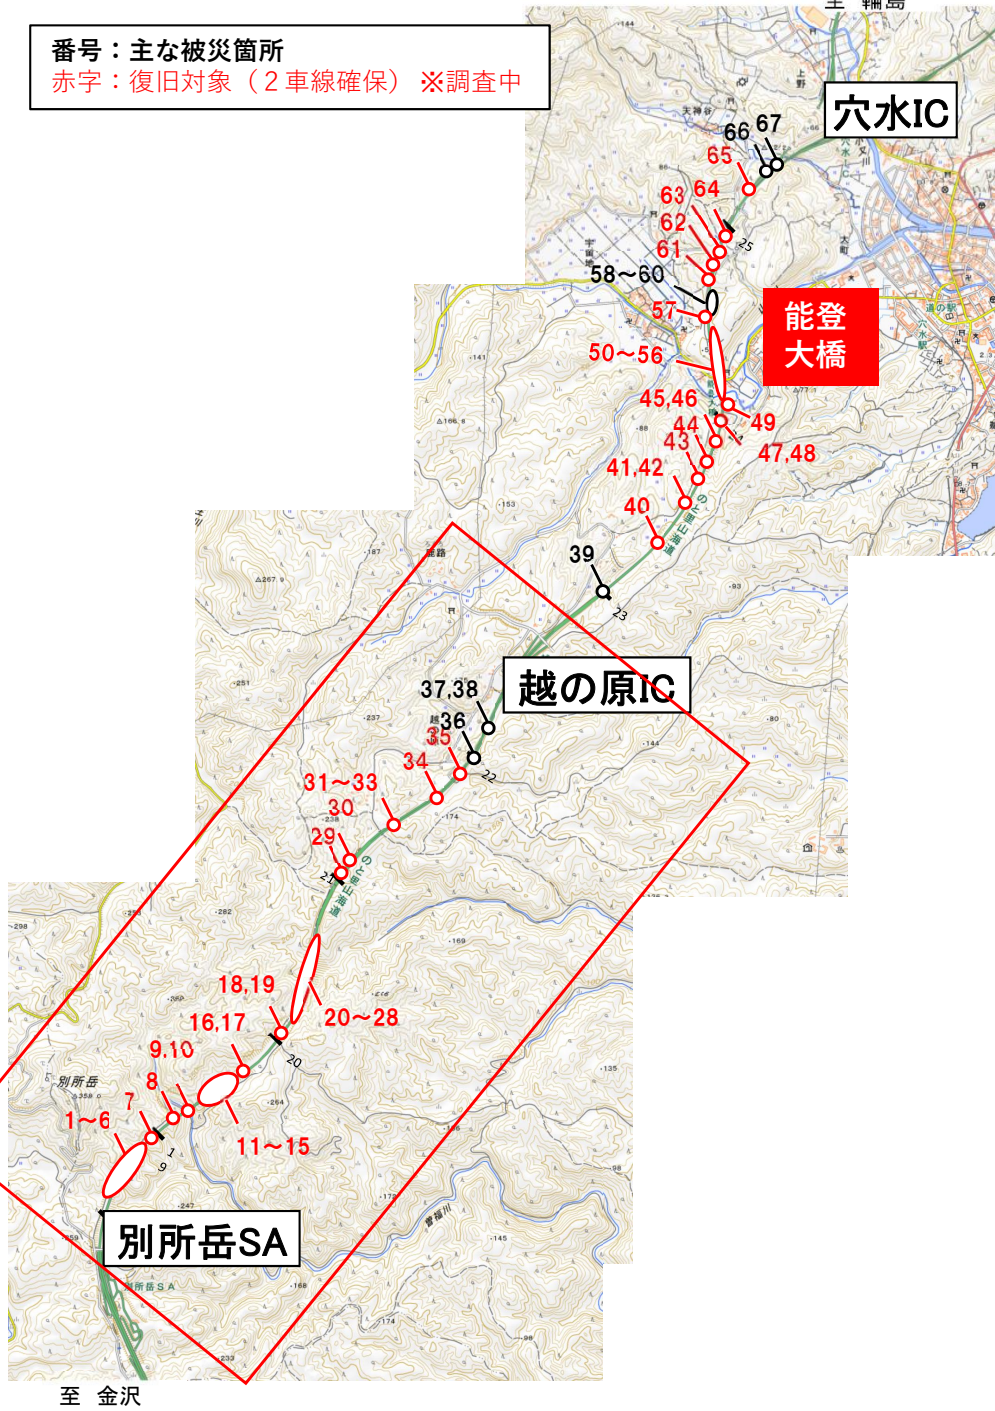

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.13付近 乳剤散布状況



R6.4.13撮影

No.24付近 路盤工状況



R6.4.13撮影


令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

4月8日現在

番号：主な被災箇所

赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

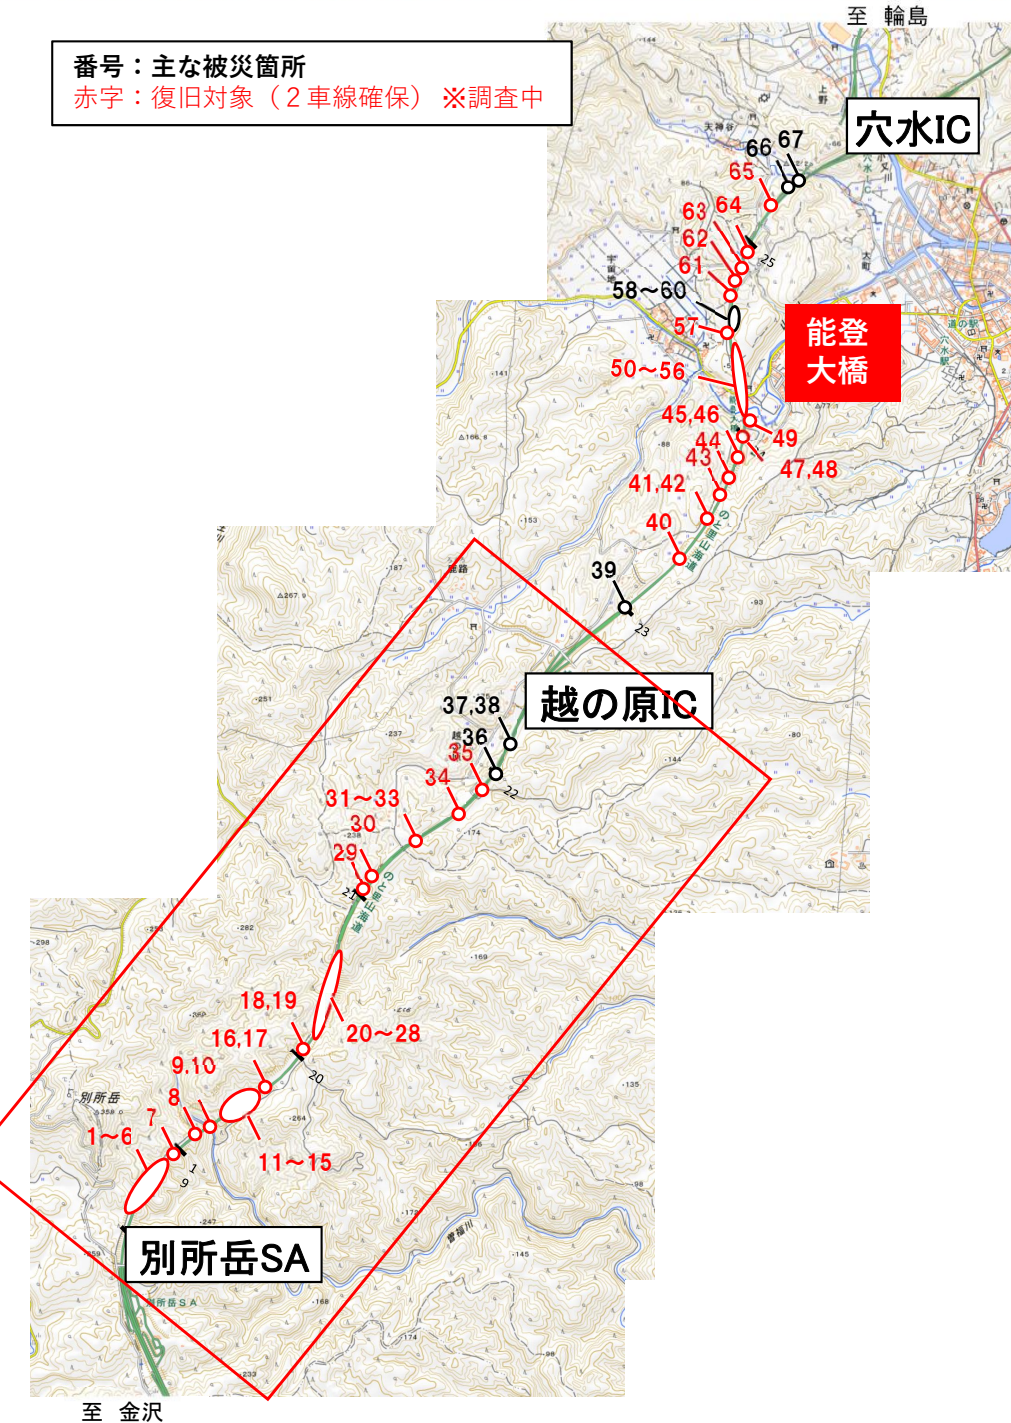

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.38付近 アスファルト舗装 乳剤散布状況



R6.4.6撮影

No.37付近 路盤完了状況




R6.4.6撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

3月25日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

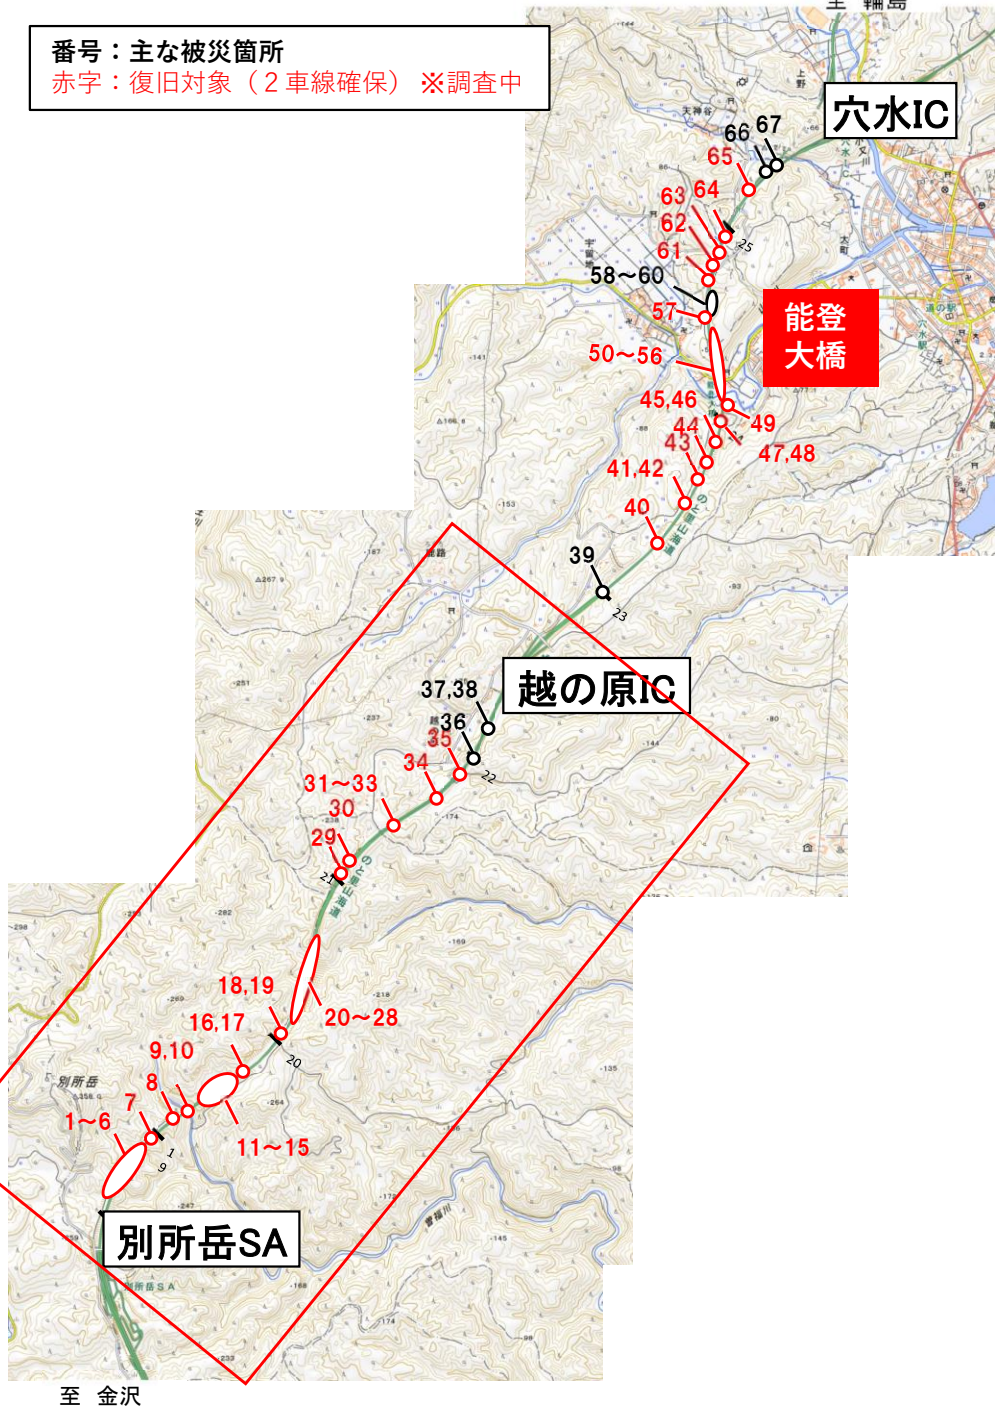

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.1 碎石敷均し・転圧状況



No.30 碎石敷均し・転圧状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

3月18日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

緊急復旧作業中（2車線確保）

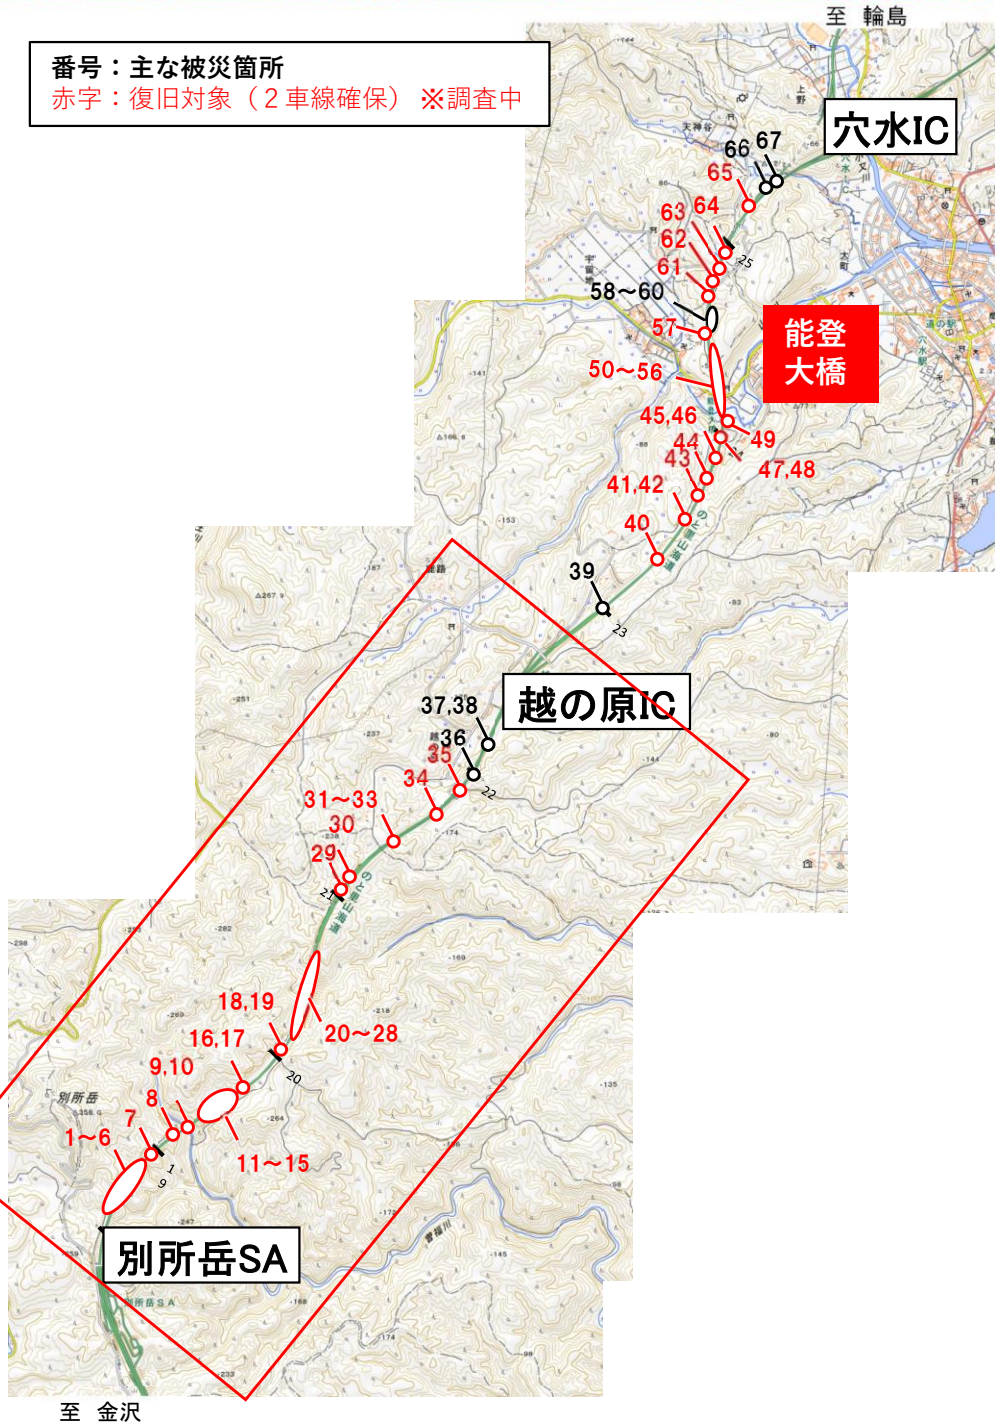

No.5路盤材敷均し、転圧状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

3月15日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

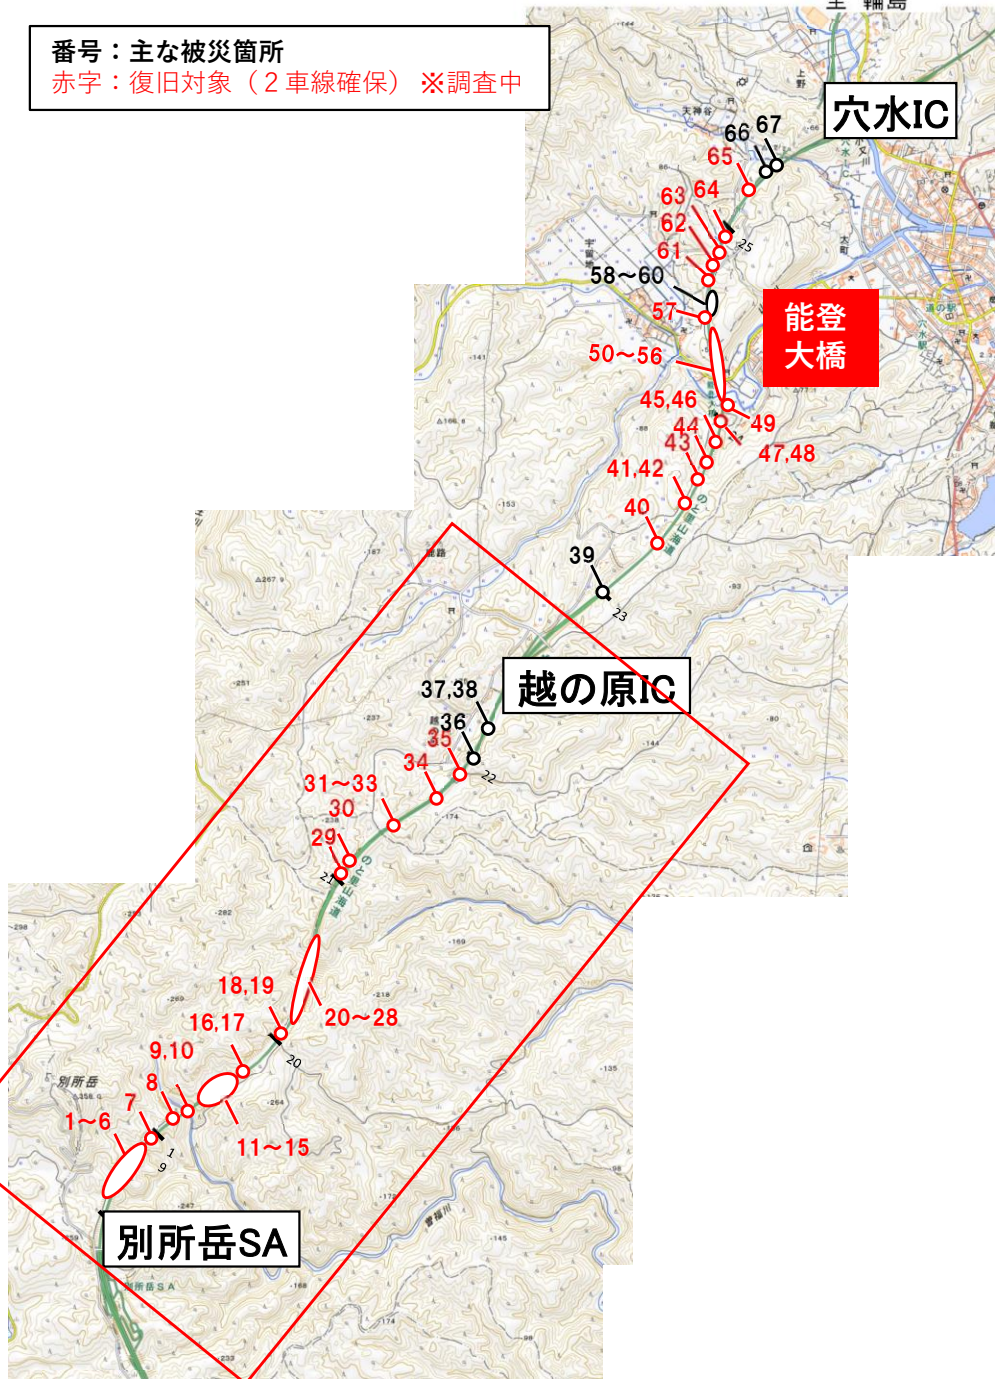

至 金沢

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.1 路盤材敷均し状況



工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道道路復旧工事その3
工事場所	のと里山海道(別所岳SA～越の原IC) 18.20kp
施工状況	
路盤材敷均し・転圧	

No.29 改良土敷き均し状況



工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道道路復旧工事その3
工事場所	のと里山海道(別所岳SA～越の原IC) k.p. 21.2
改良土敷き均し状況	


(株)大林組 2024/03/14

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

3月13日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

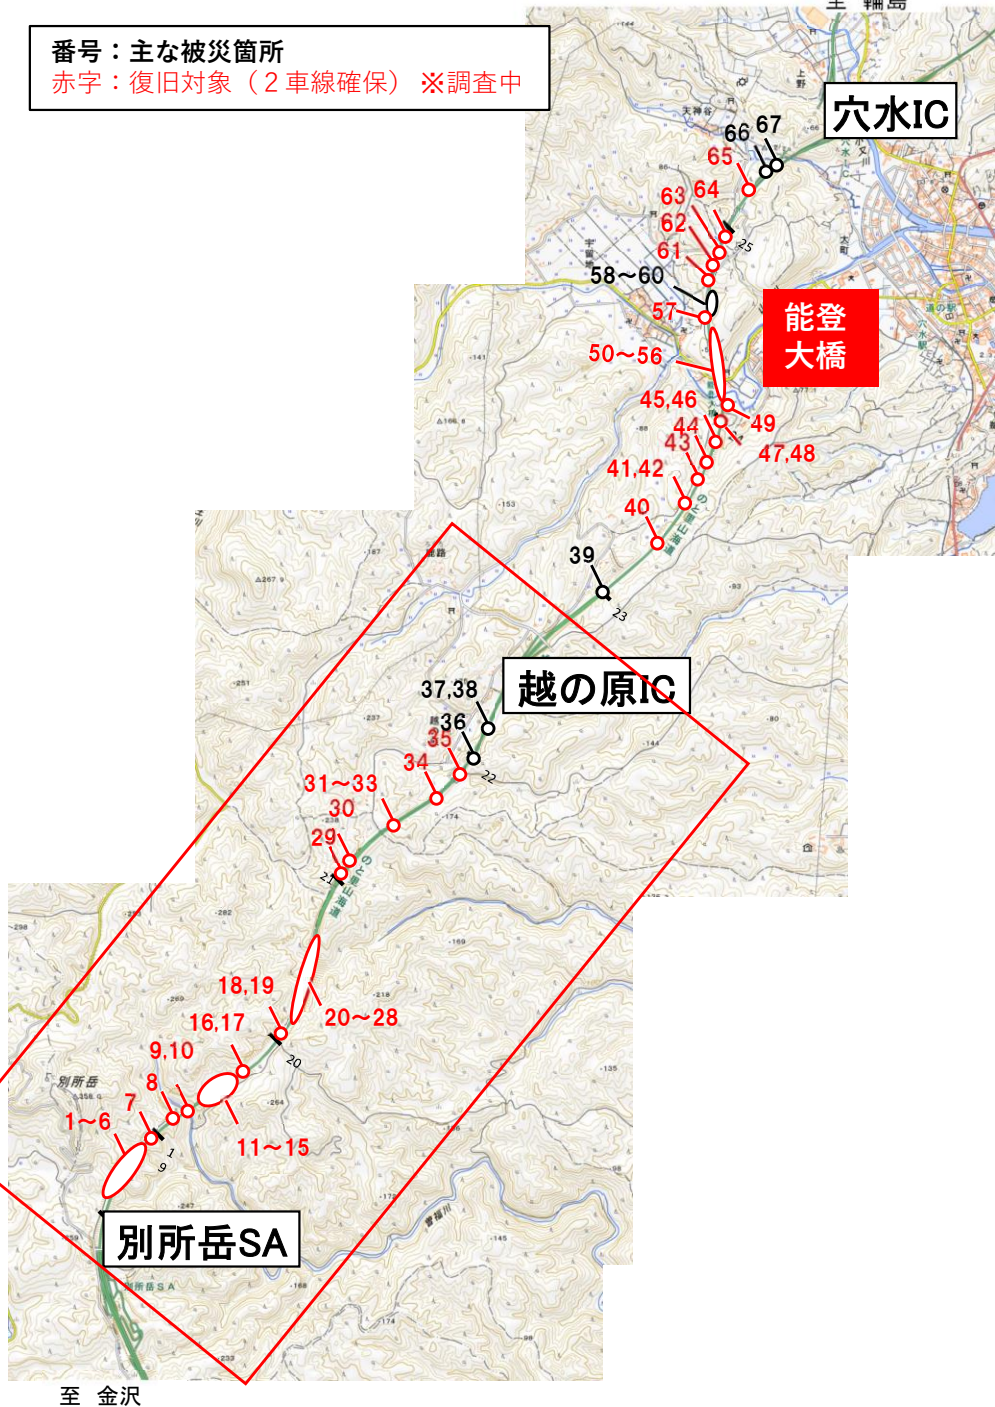

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.30 法面仕上げ状況




No.30付近 舗装撤去状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

3月11日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

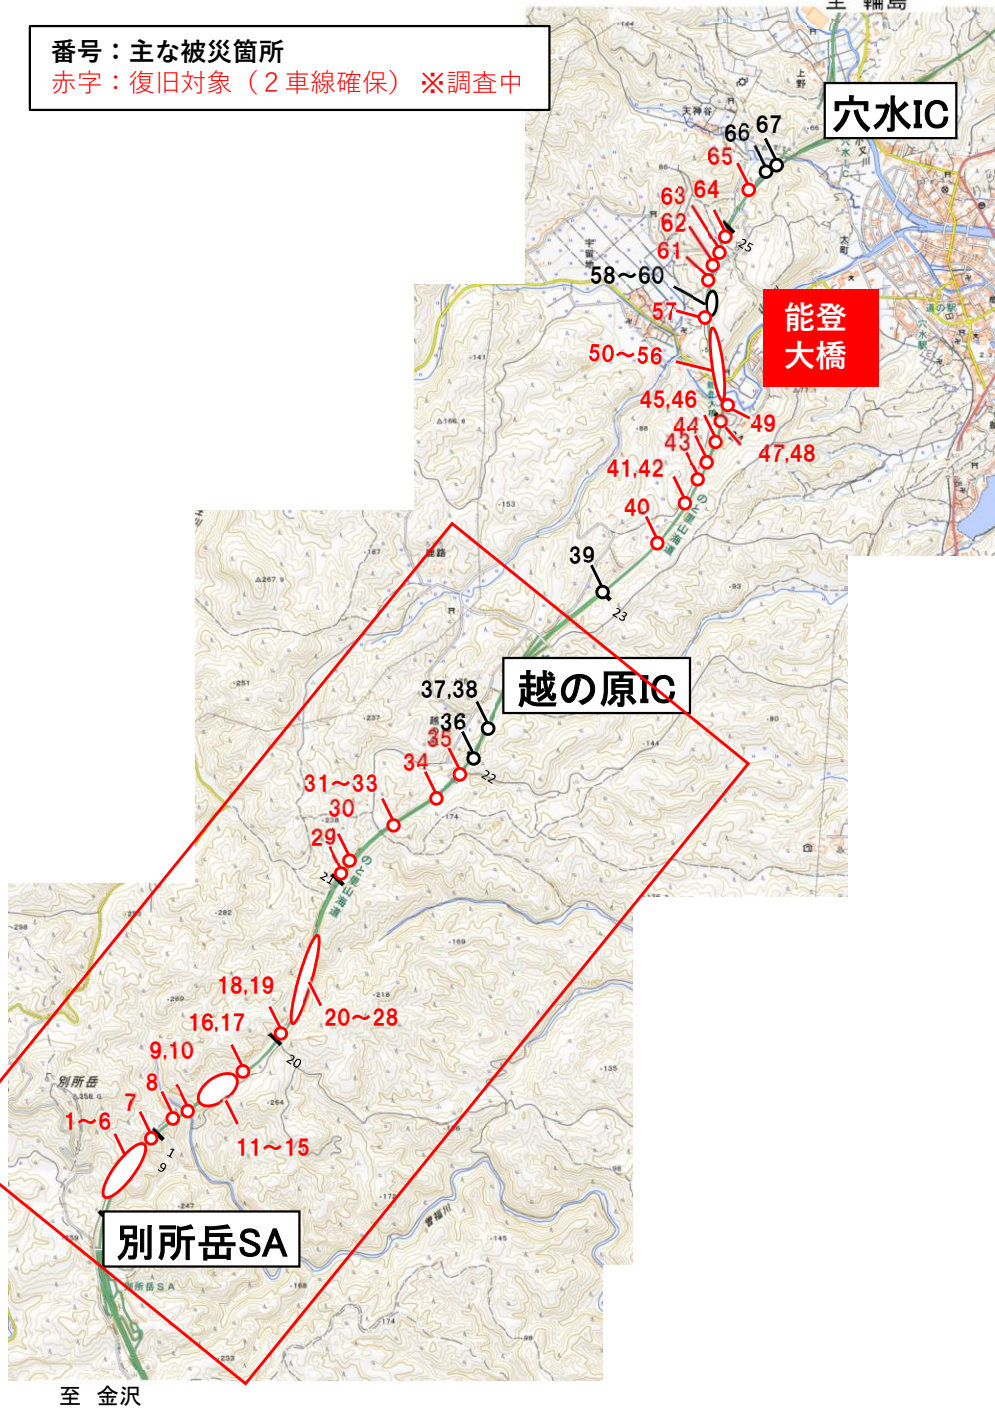

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.38 路盤材敷均し転圧状況




No.33 砕石敷均し・転圧状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

3月8日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

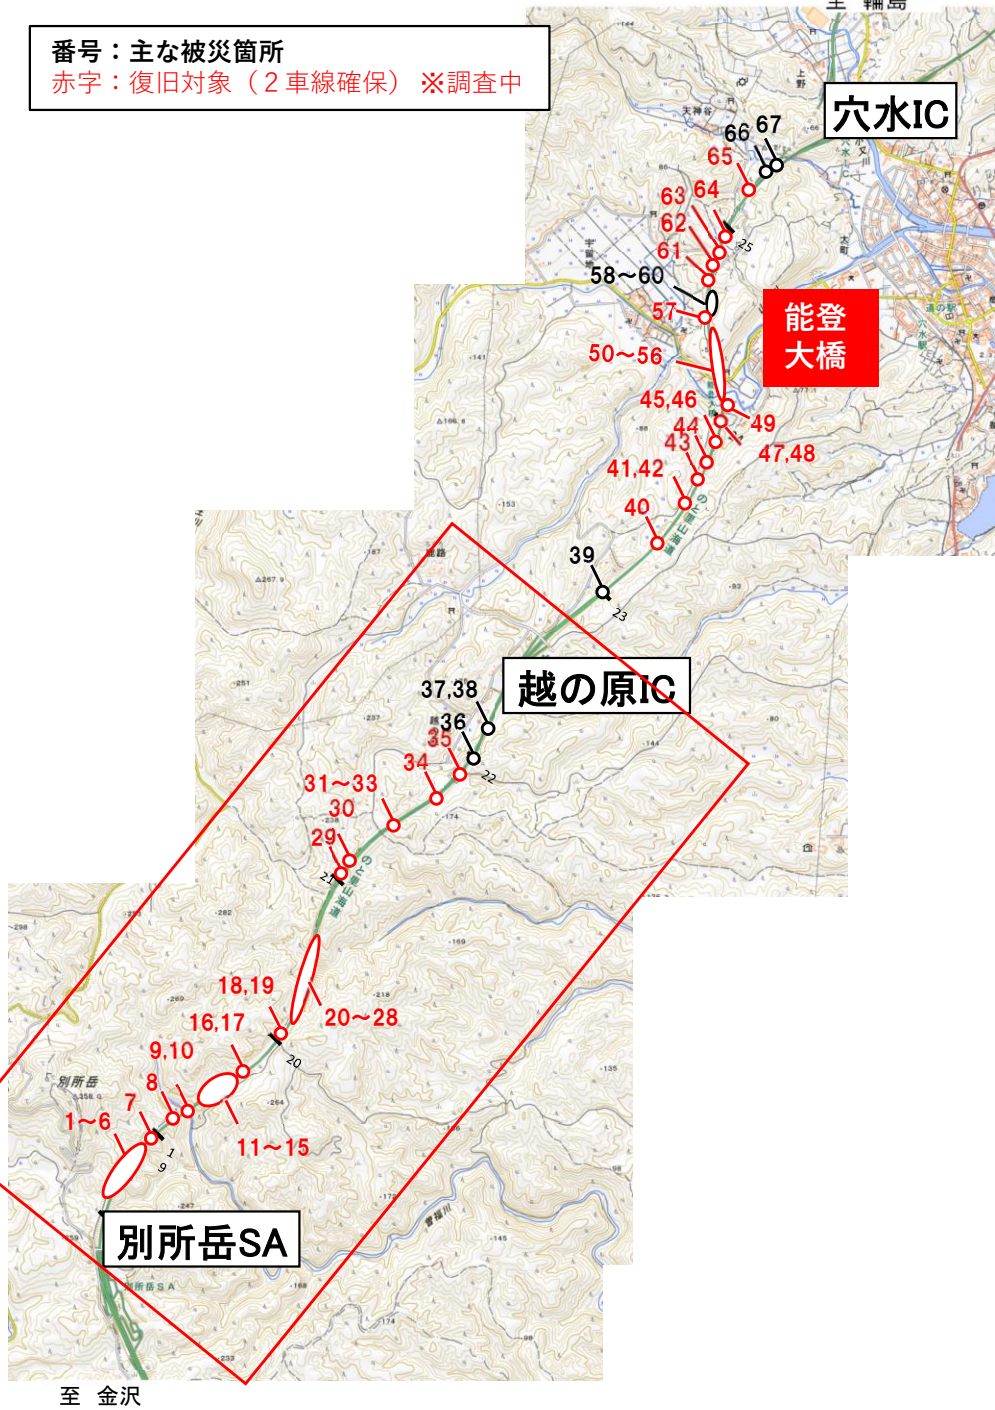

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.30 碎石敷均し転圧状況



工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道緊急復旧工事その3
工事場所	のと里山海道 別所岳SA～越の原IC間 J.A.21-21-22
施工状況	
碎石敷均し、転圧	
[株]大林組 2024/03/07	

No.34 碎石敷均し・転圧状況




工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道緊急復旧工事その3
工事場所	のと里山海道 別所岳SA～越の原IC間 J.A.21-21-24
施工状況	
碎石敷均し、転圧	
[株]大林組 2024/03/08	

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

3月6日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

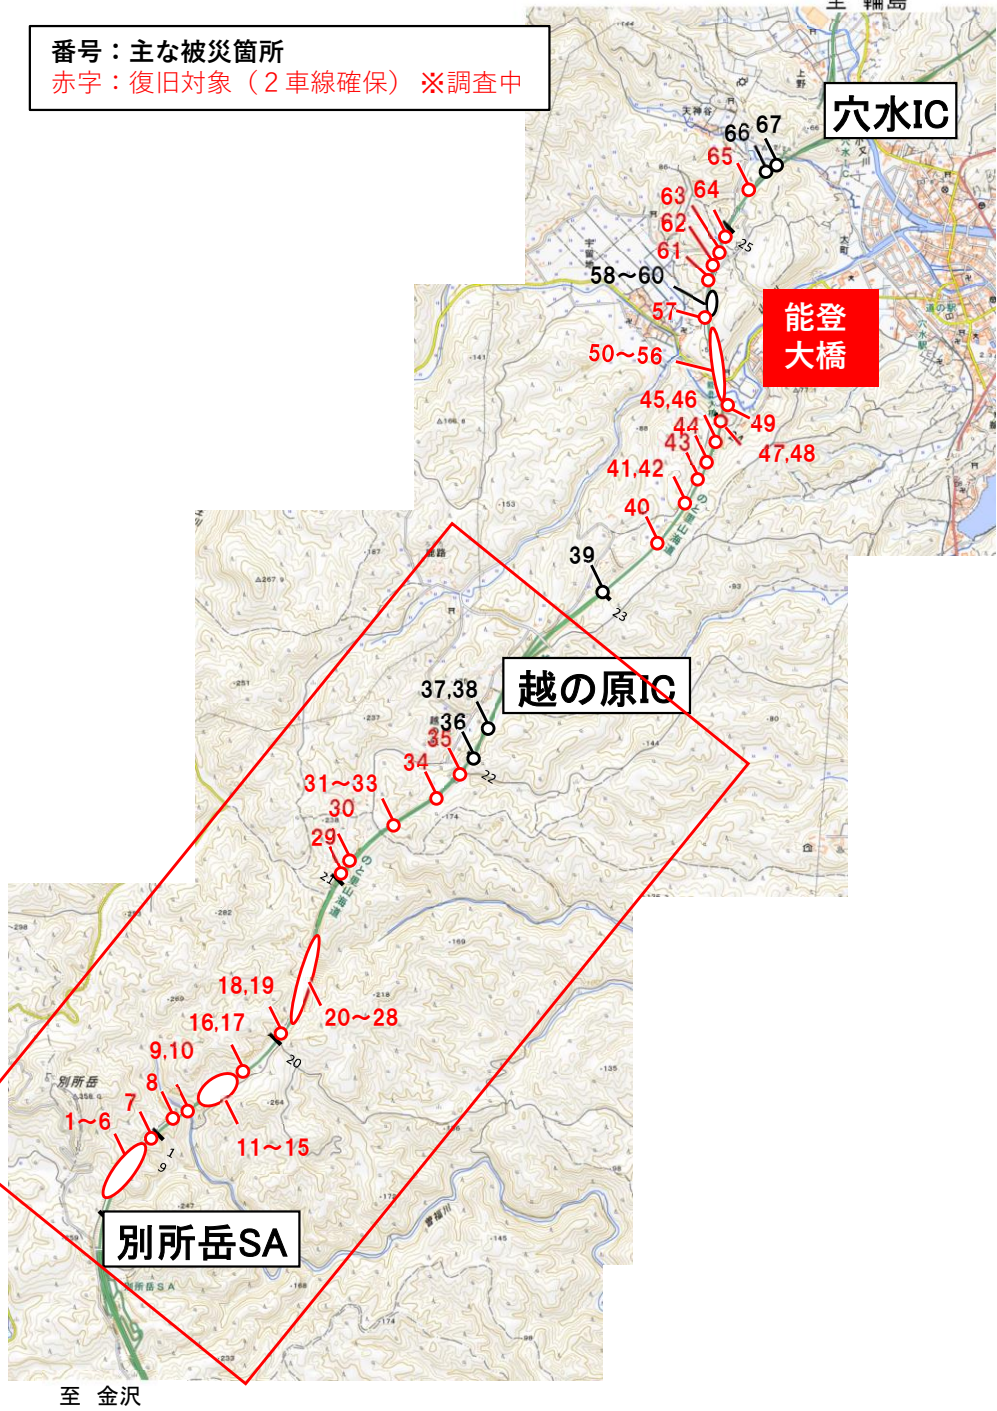

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.35 路盤整形状況




No.38 舗装撤去状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

3月4日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

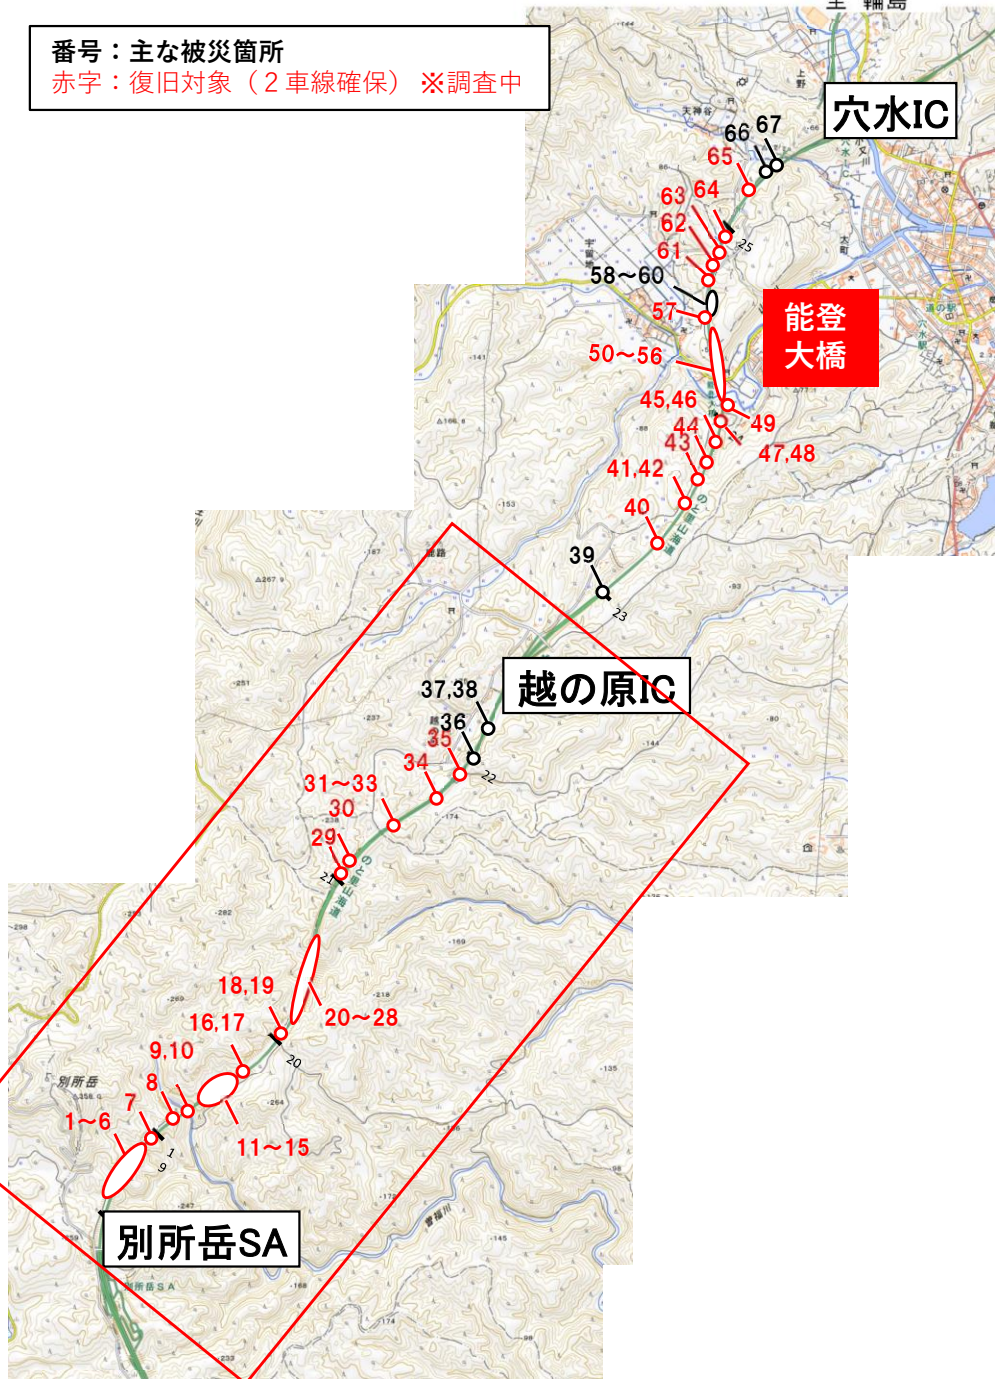

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.26付近 舗装撤去状況




工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道道路修繕工事その3
工事場所	のと里山海道(別所岳SA～越の原IC)20.49～20.50km
As舗装版撤去状況	

R6.3.1撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

3月1日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

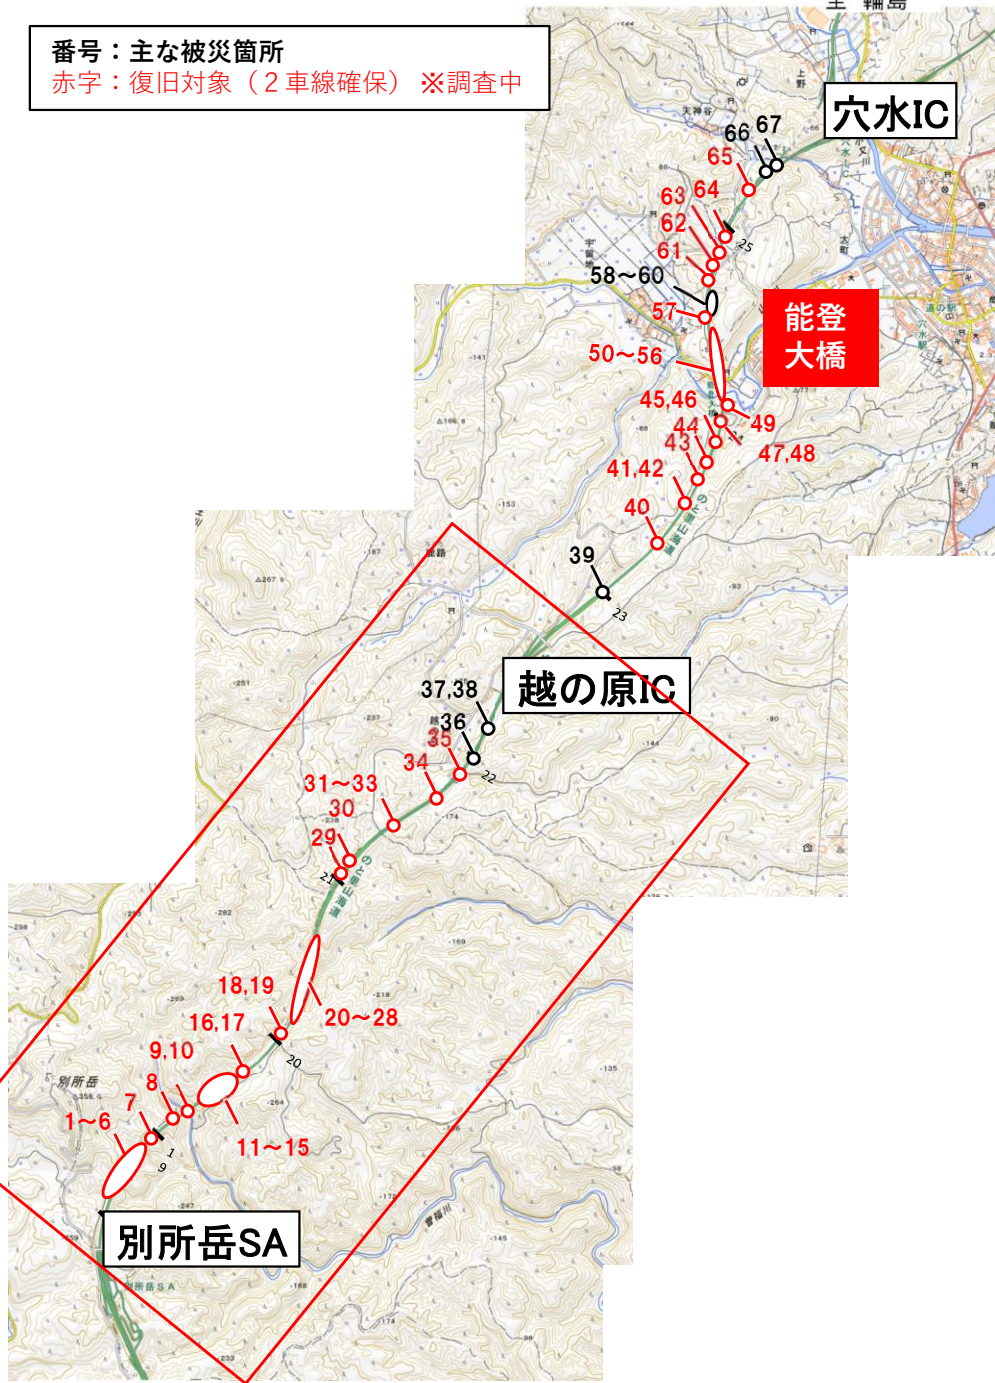

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.19付近 アスガラ運搬状況




No.35付近 舗装撤去状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月28日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

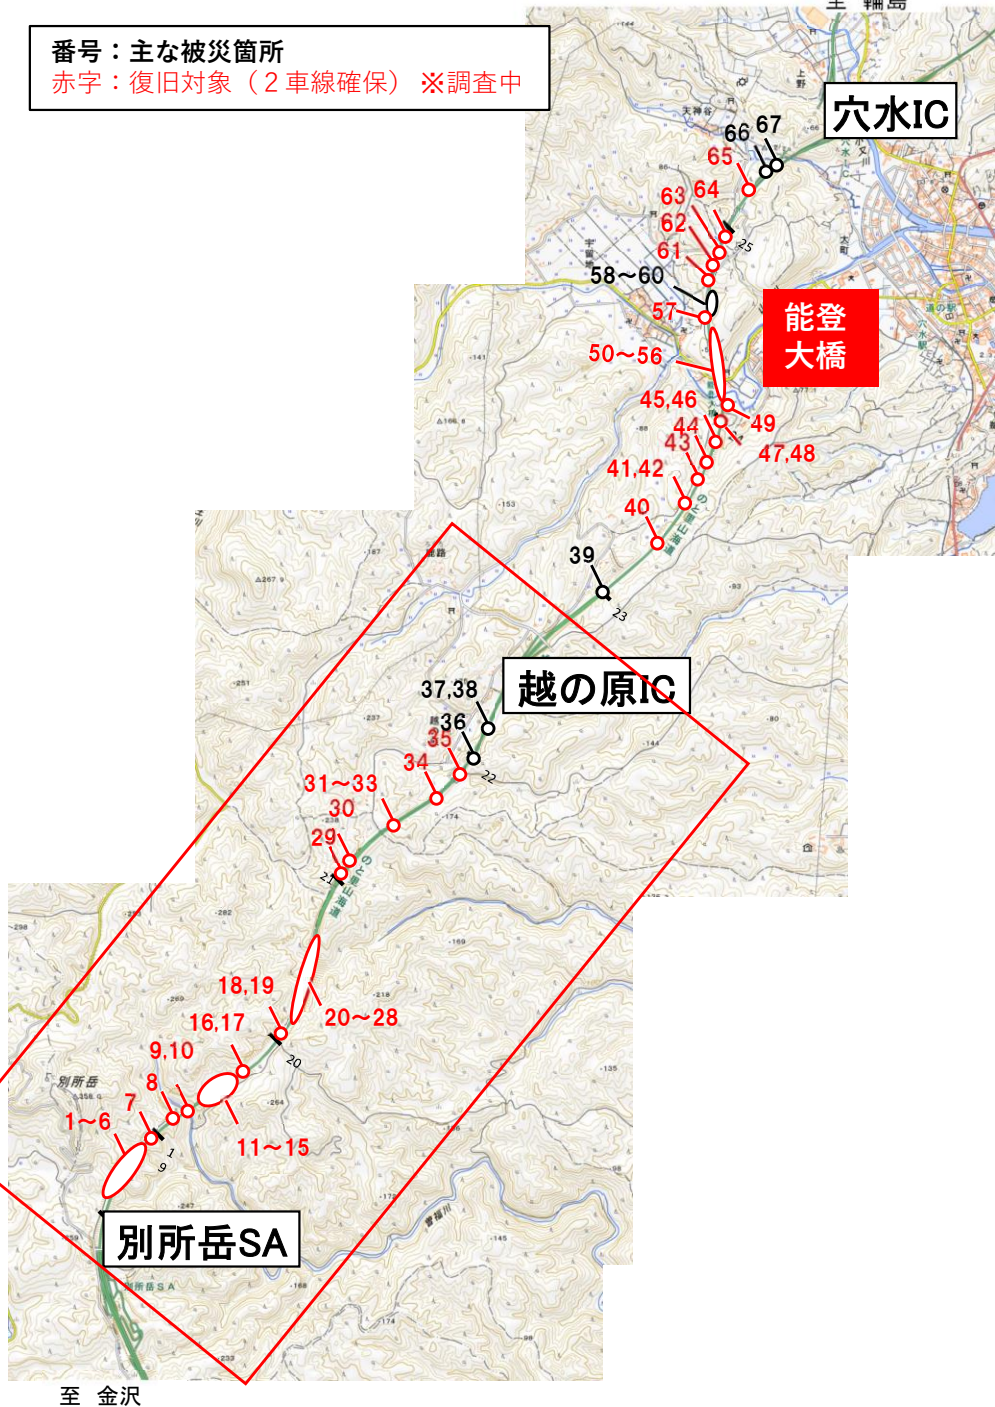

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.12付近 アスガラ積込・運搬状況



No.34付近 アスガラ積込・運搬状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月26日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

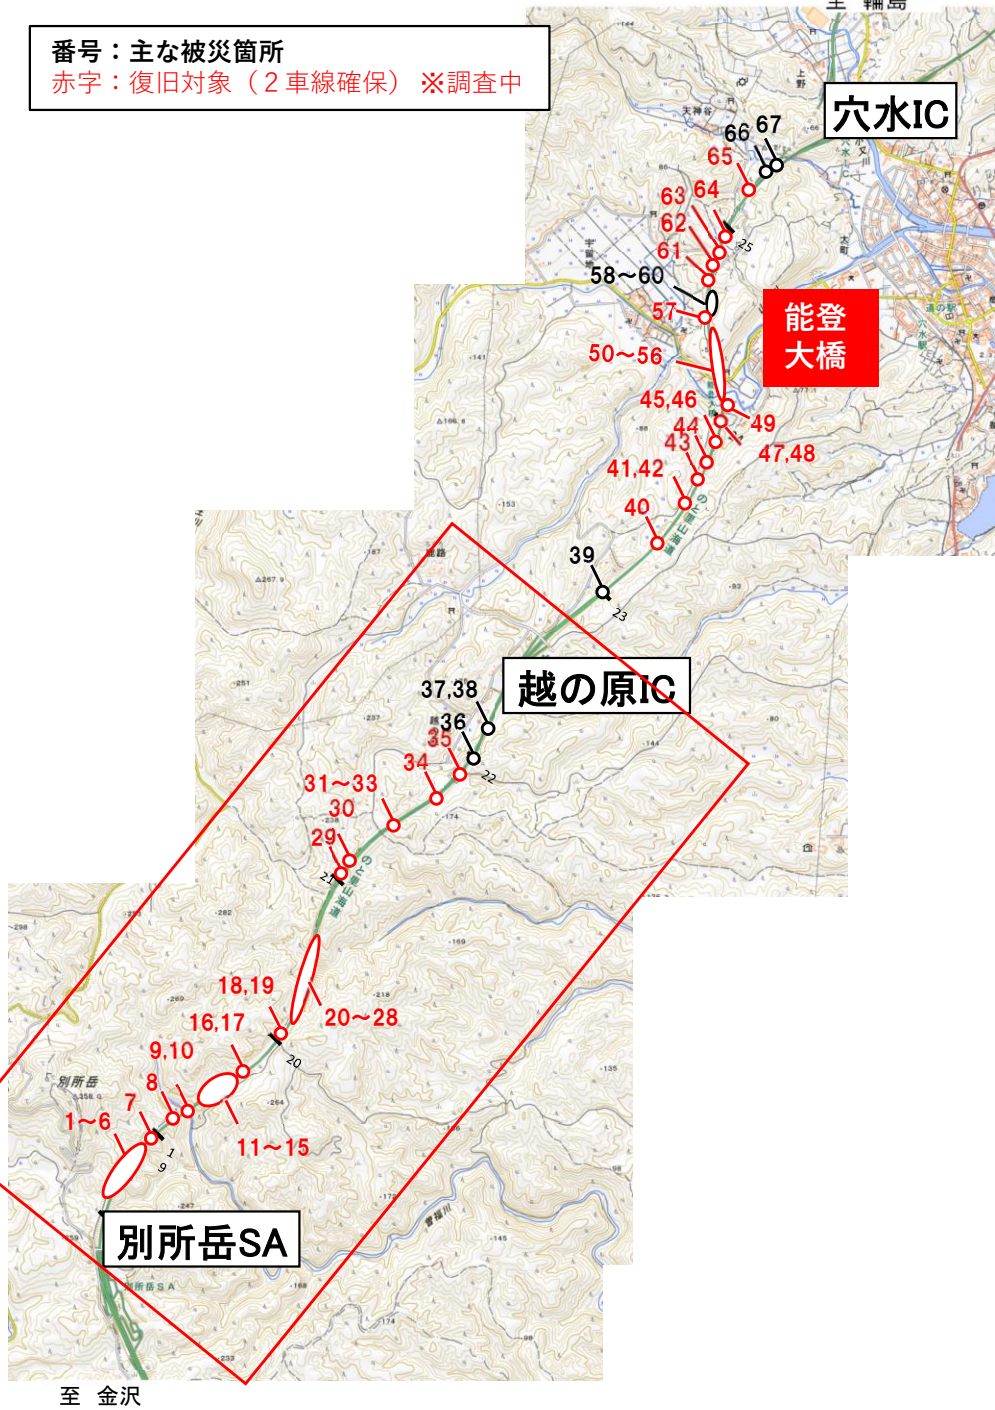

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.8付近 路盤敷均し状況




No.6付近 路盤敷均し・転圧状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月21日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

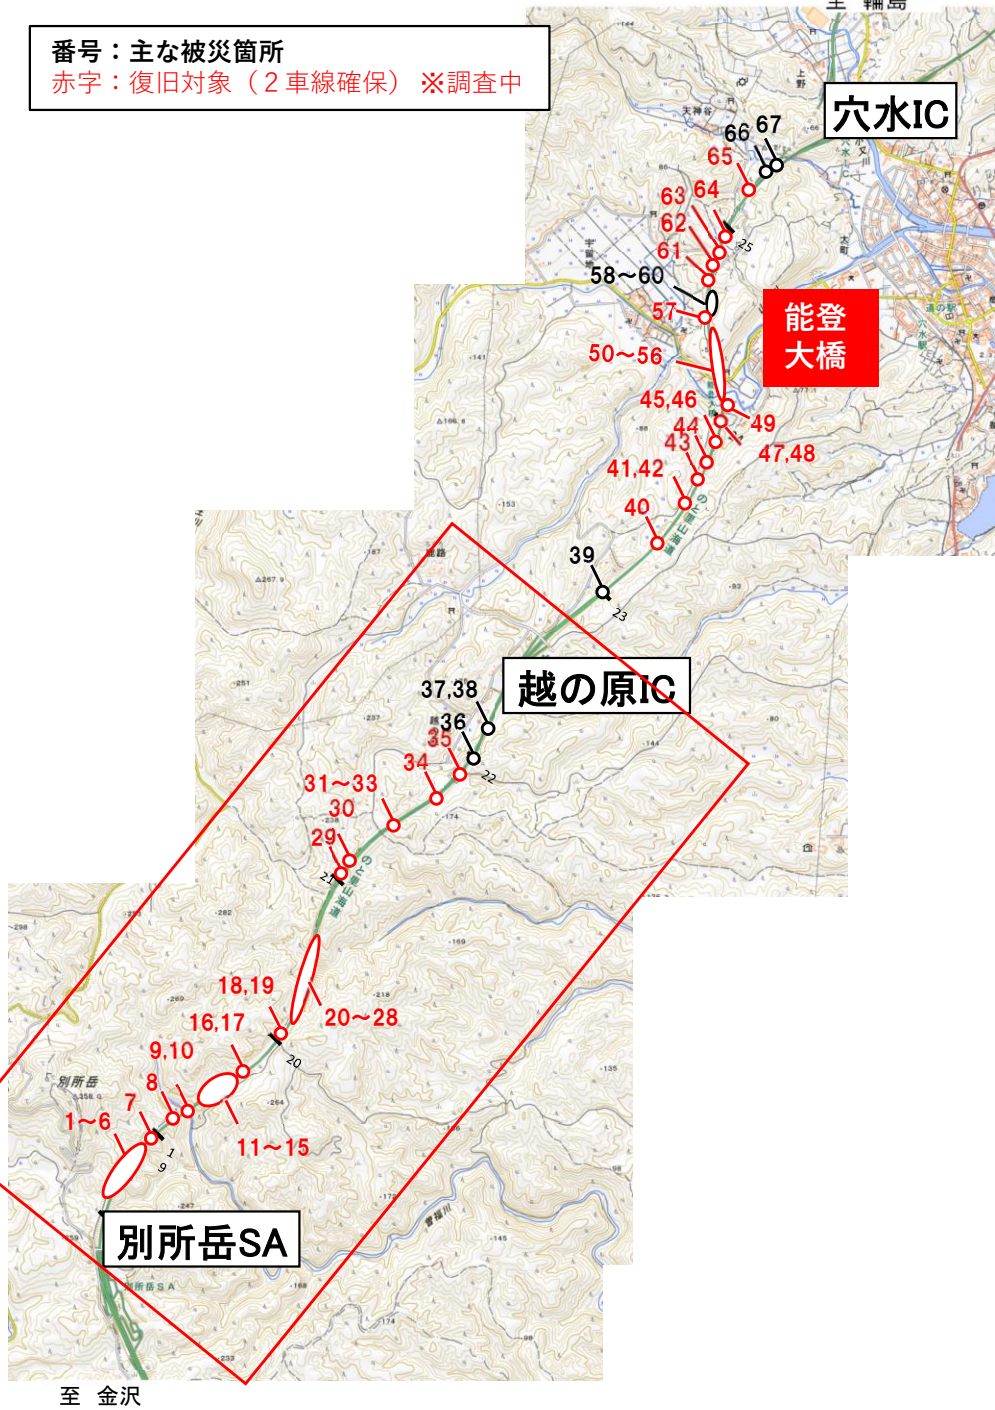

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.6付近 舗装撤去状況



No.6付近 路盤敷均し・転圧状況






令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月15日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

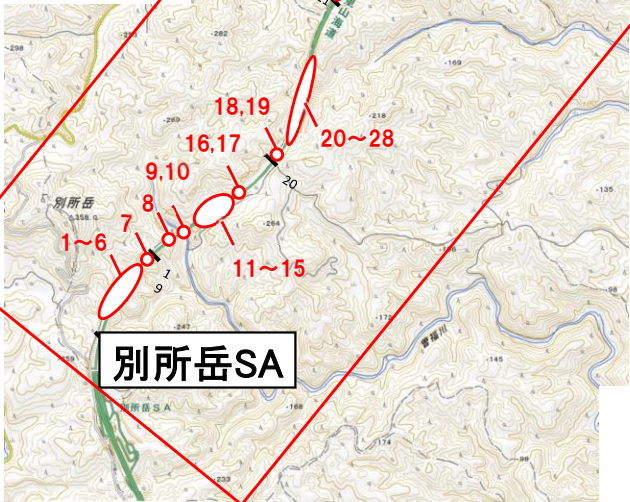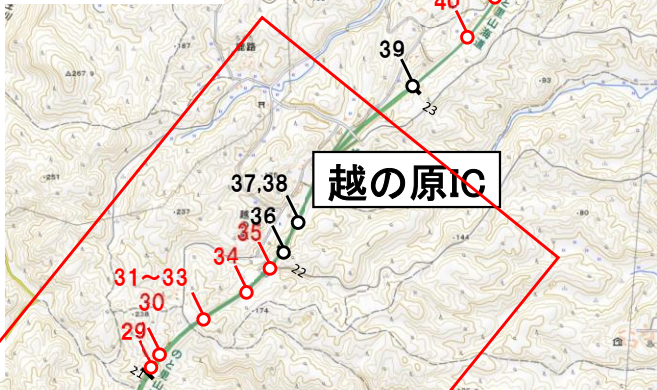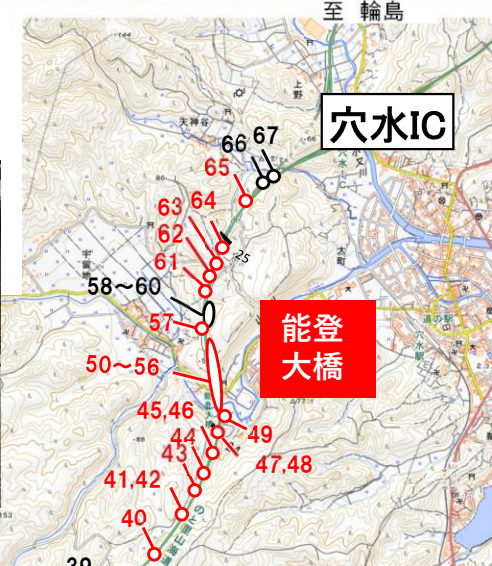

緊急復旧完了（1車線確保）
令和6年2月15日～通行止め解除
（一方通行・緊急車両等のみ通行可）

1車線通行状況





令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月15日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (1車線確保)



No.29～30被災状況

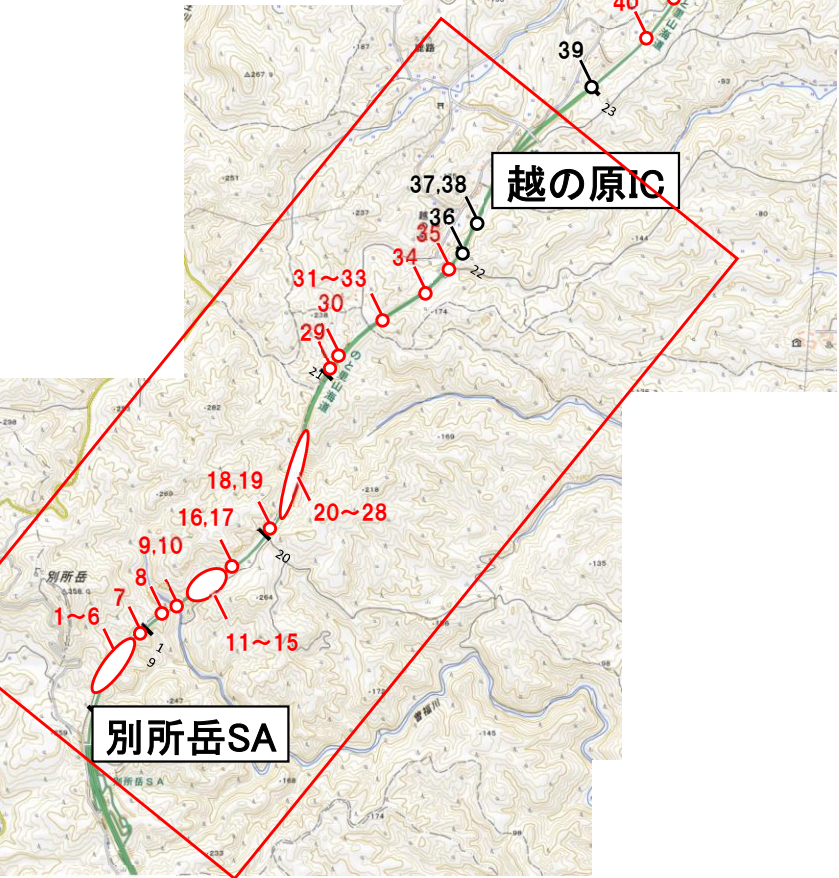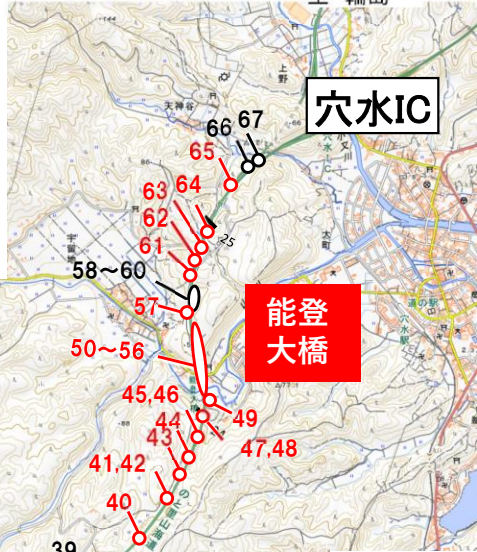

至 金沢

緊急復旧完了 (1車線確保)
令和6年2月15日～通行止め解除
(一方通行・緊急車両等のみ通行可)

No.7付近 1車線復旧完了



R6.2.14撮影

No.29付近 1車線復旧完了




R6.2.14撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月13日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (1車線確保)

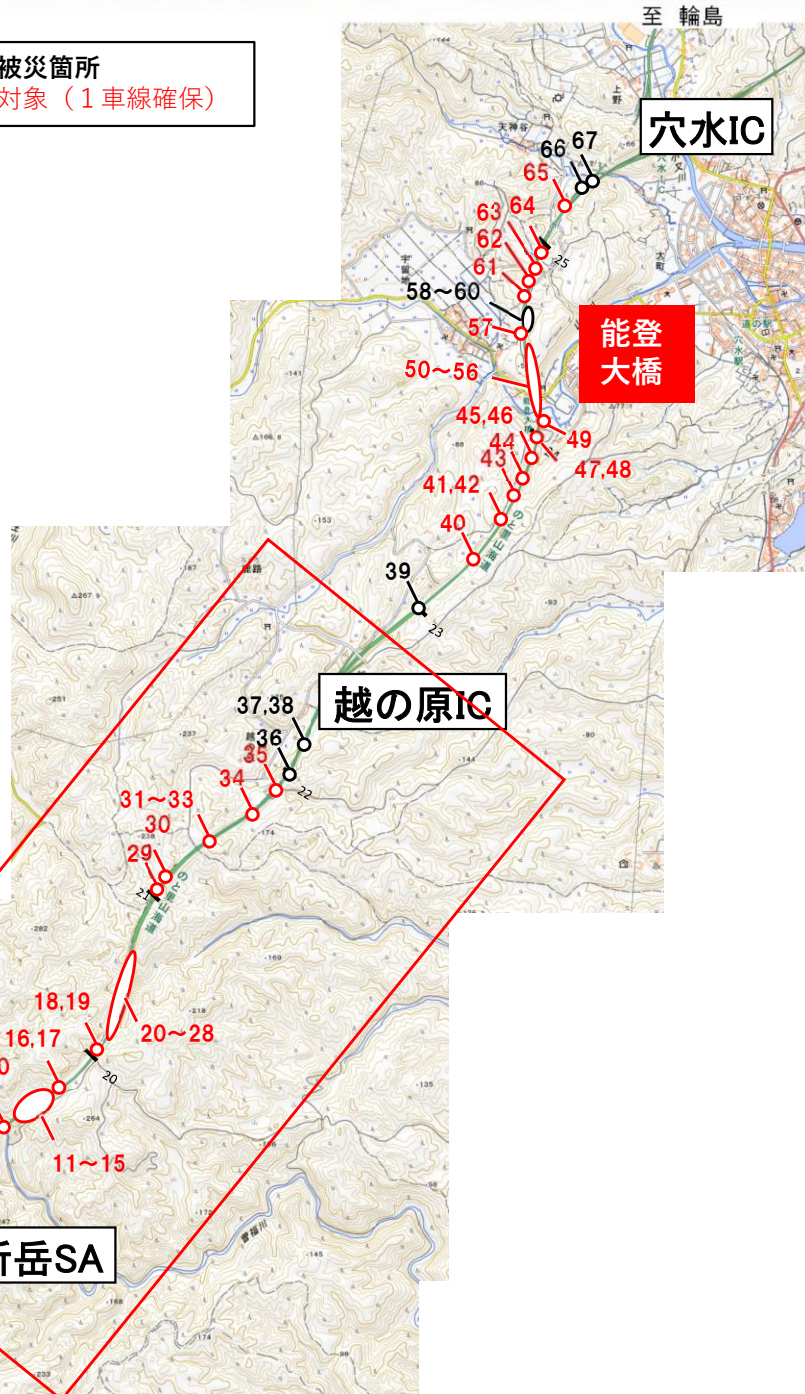

緊急復旧作業中 (1車線確保)
38箇所完了 (舗装以外) / 38箇所

No.24付近 路肩路盤整備状況



R6.2.11撮影

No.29 路盤整備およびAs舗装完了




R6.2.10撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月9日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

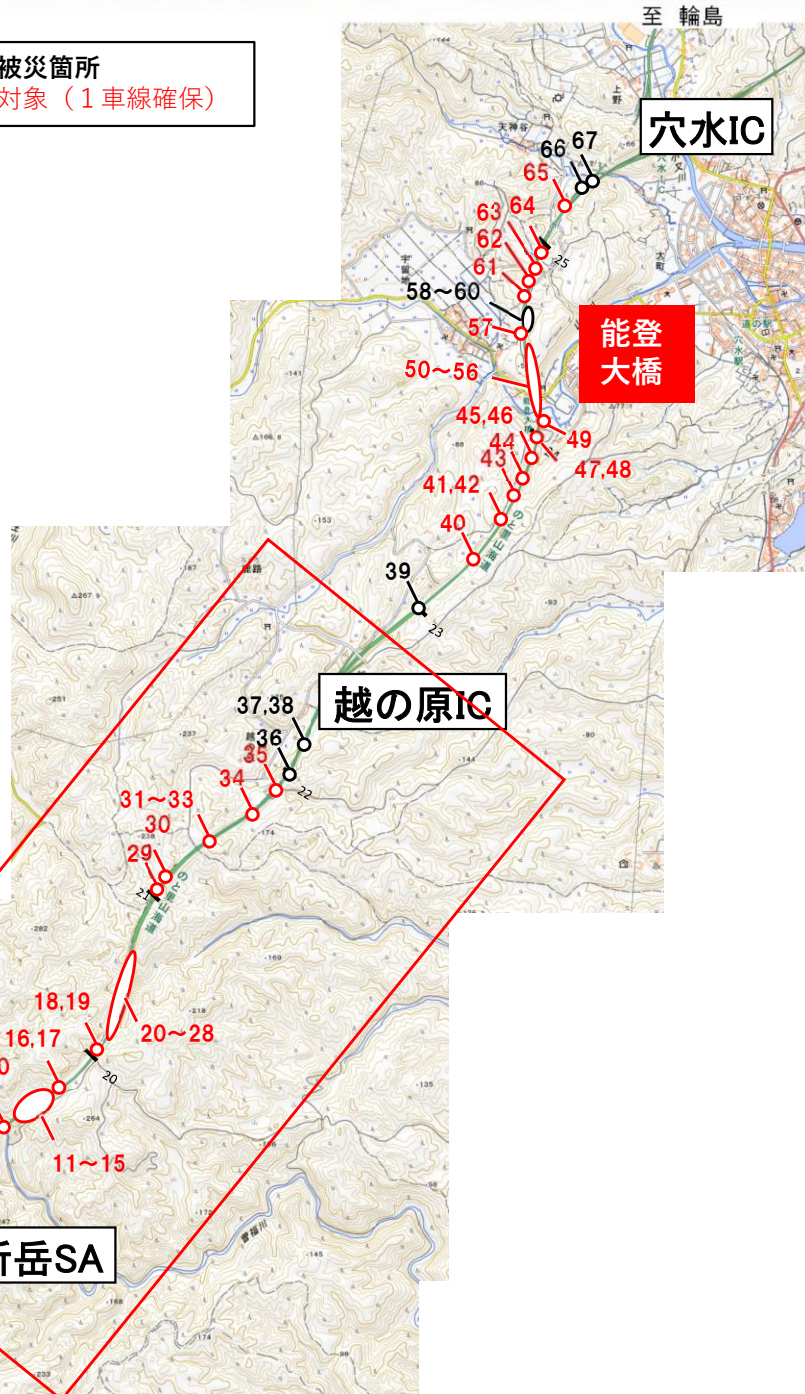

緊急復旧作業中（1車線確保）
29箇所完了（舗装以外）／38箇所

No.34付近 舗装状況




No.4付近 亀裂・段差補修状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)


2月7日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

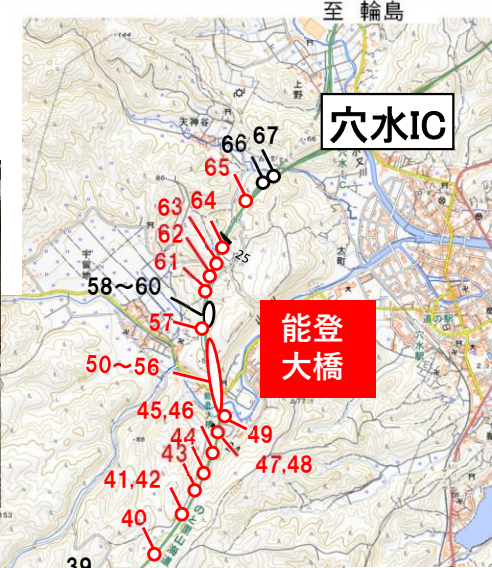

緊急復旧作業中（1車線確保）
29箇所完了（舗装以外）／38箇所

No.29～30付近 舗装施工状況

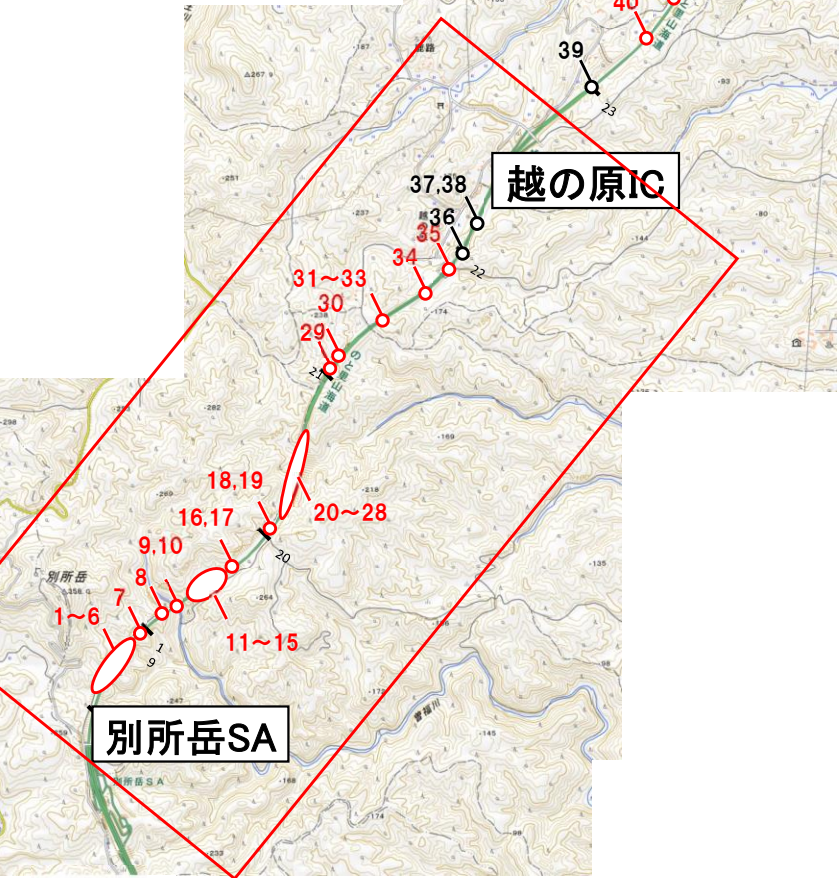


令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月5日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

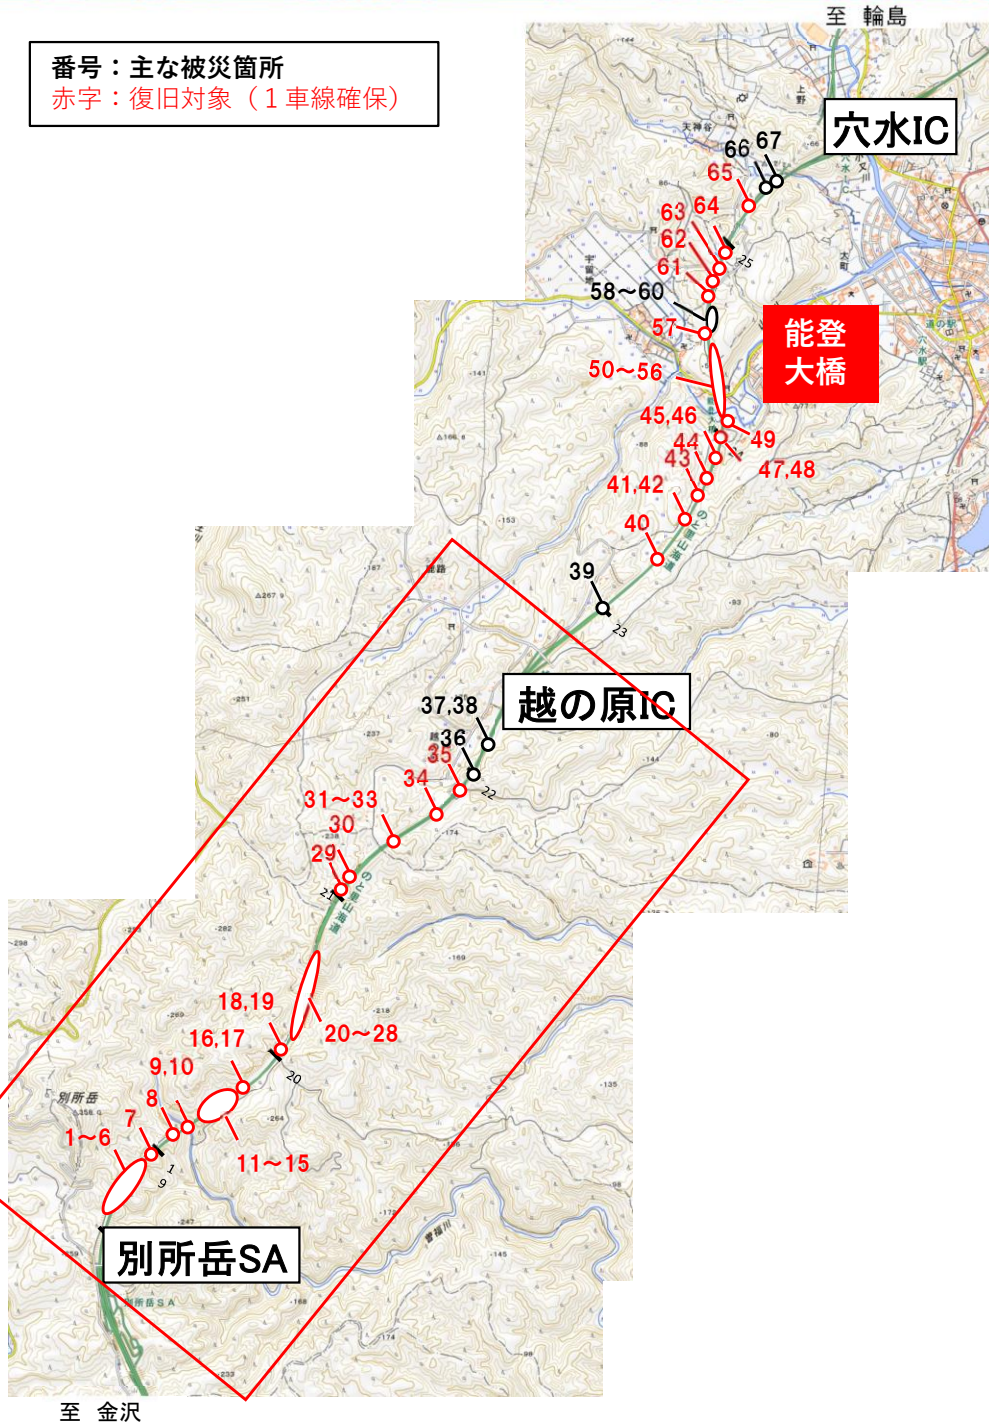

緊急復旧作業中（1車線確保）
29箇所完了（舗装以外）／38箇所

No.7付近 路盤施工状況



R6.2.2撮影



R6.2.4撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況



越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月1日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）



No.29～30被災状況

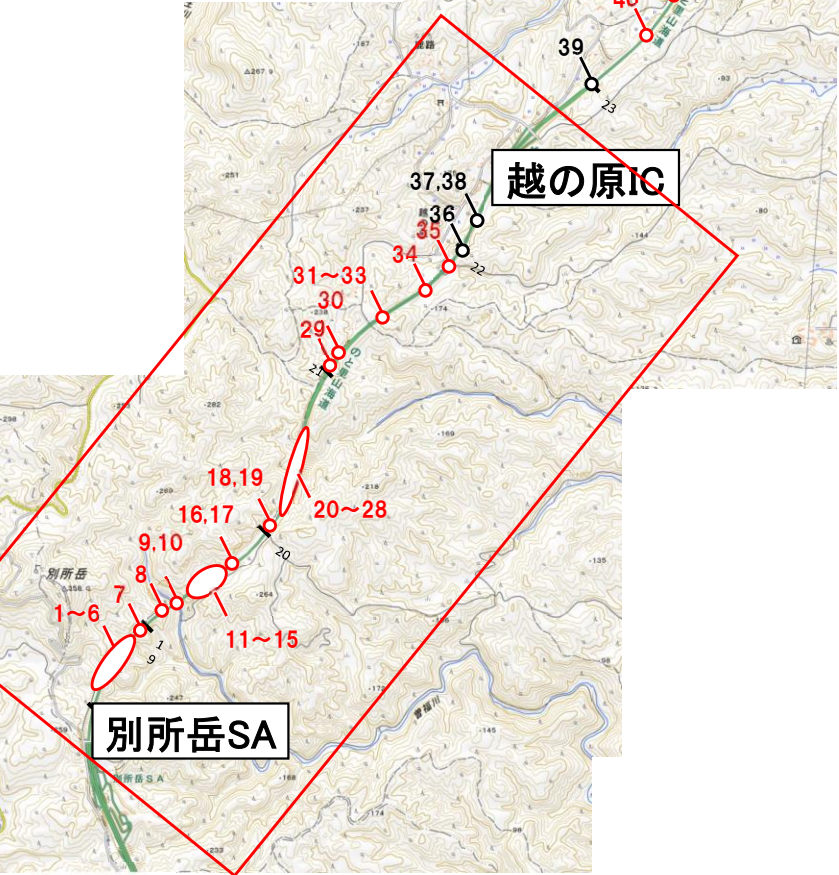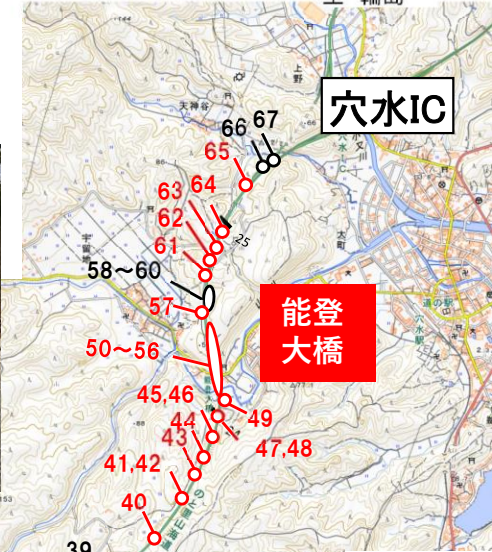

至 金沢

緊急復旧作業中（1車線確保）
29箇所完了（舗装以外）／38箇所

No.30路盤転圧状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

1月31日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

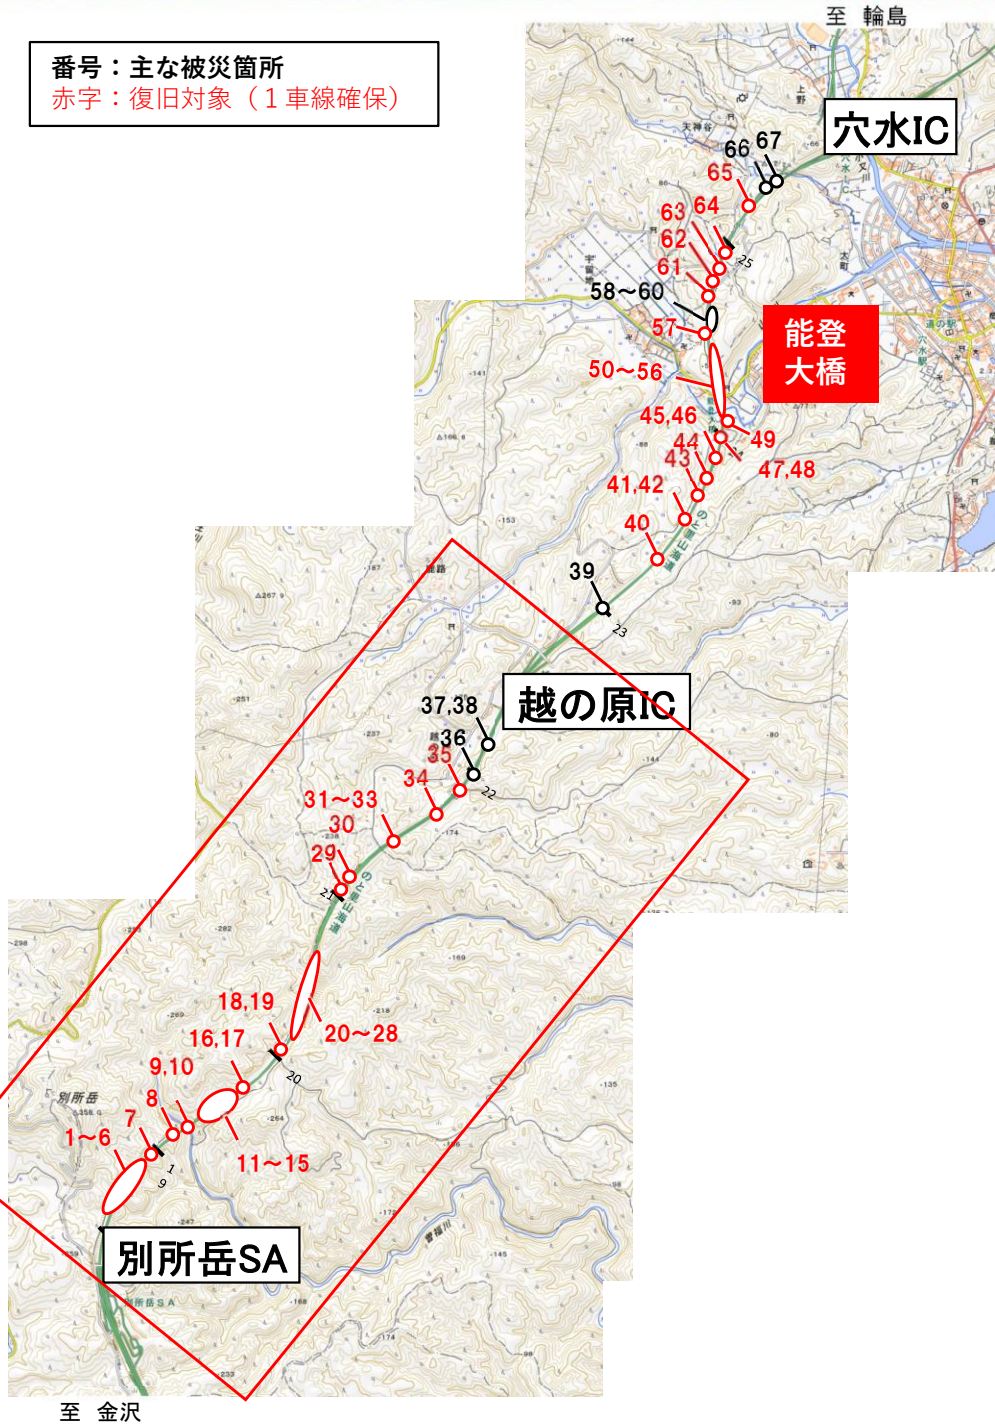

緊急復旧作業中（1車線確保）
29箇所完了（舗装以外）／38箇所

No.16 碎石敷設状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

1月30日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）



No.29～30被災状況

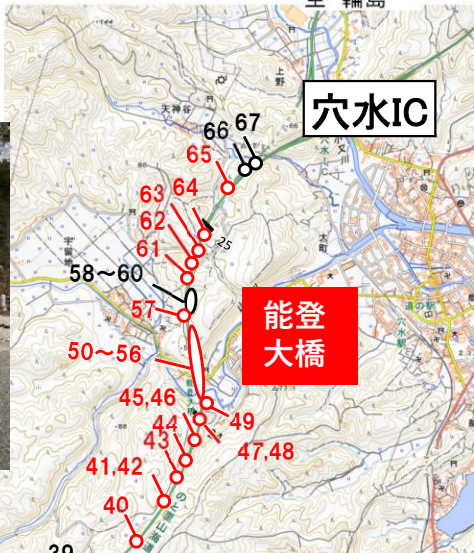


緊急復旧作業中（1車線確保）
29箇所完了（舗装以外）／38箇所

No.16掘削状況



R6.1.30撮影

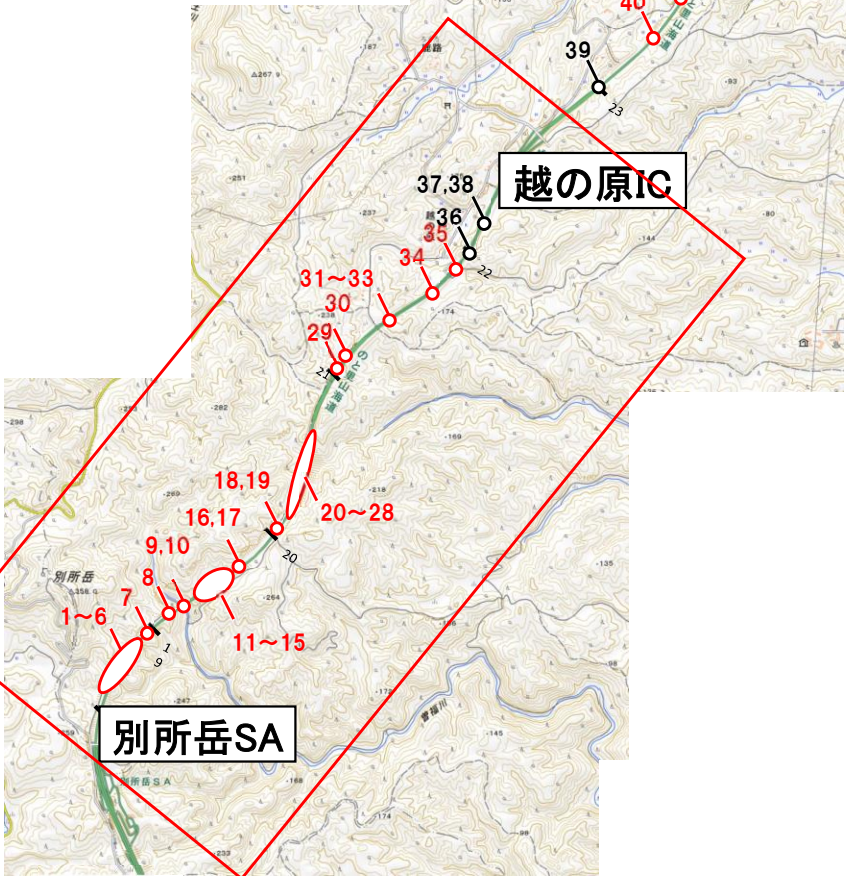

至 金沢



R6.1.30撮影


令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

1月29日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）



No.29～30被災状況

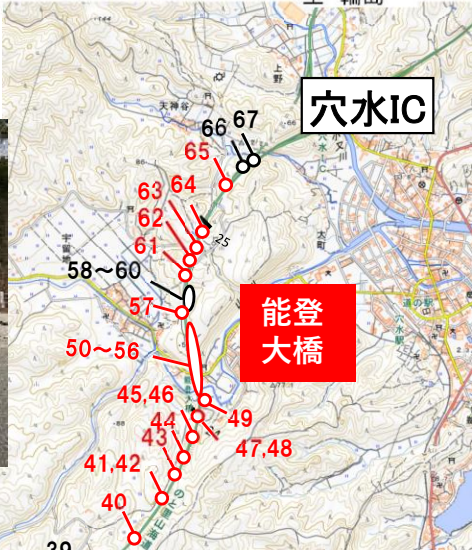


緊急復旧作業中（1車線確保）
29箇所完了（舗装以外）／38箇所

No.7～30土砂撤去状況



R6.1.29撮影

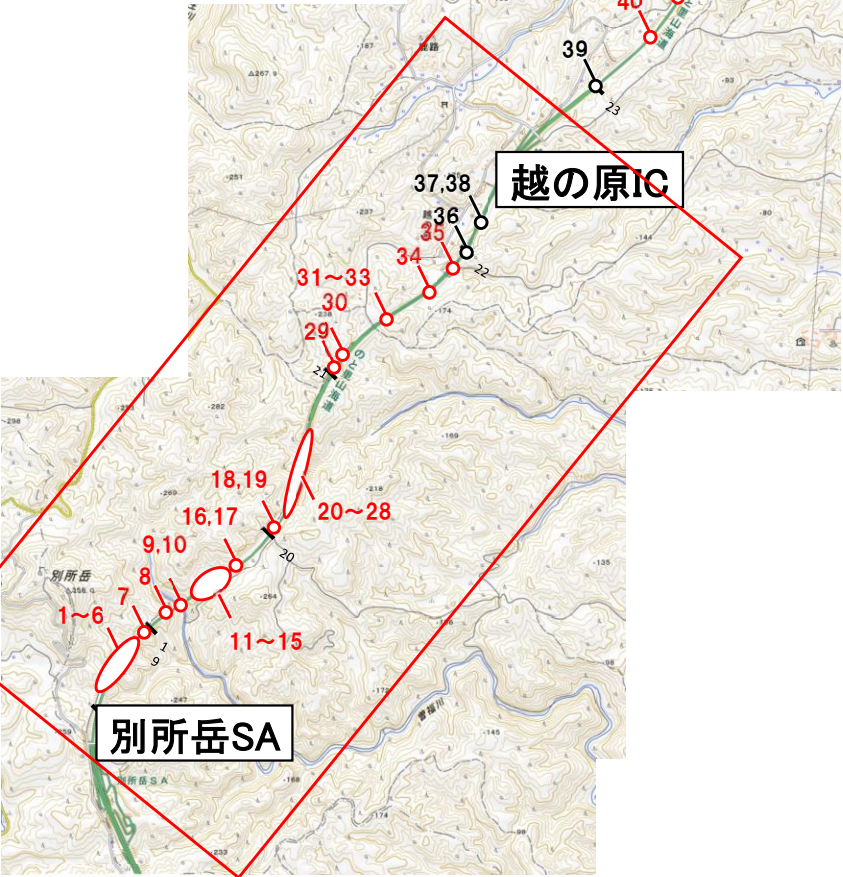

至 金沢






R6.1.29撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

1月28日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（1車線確保）

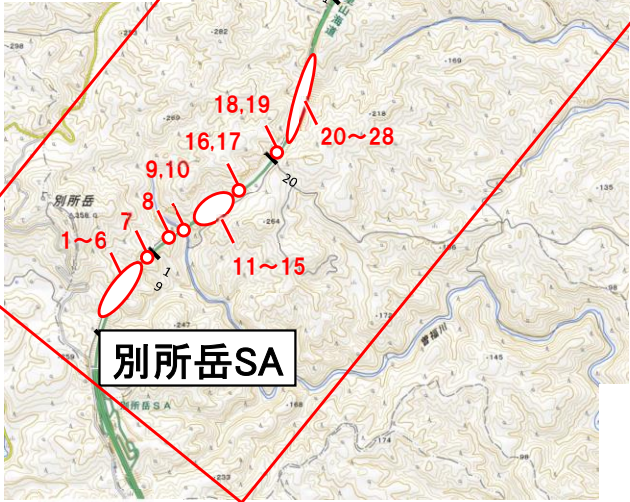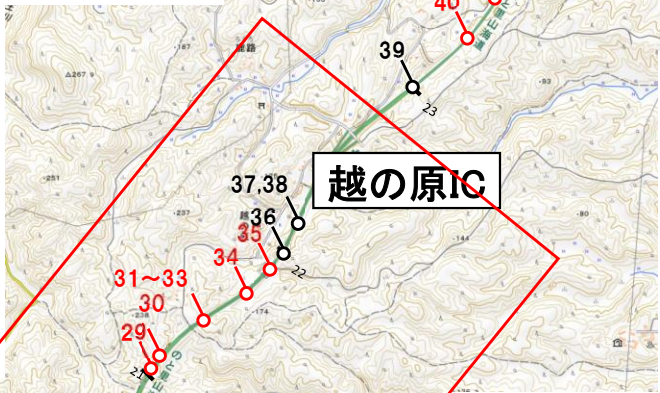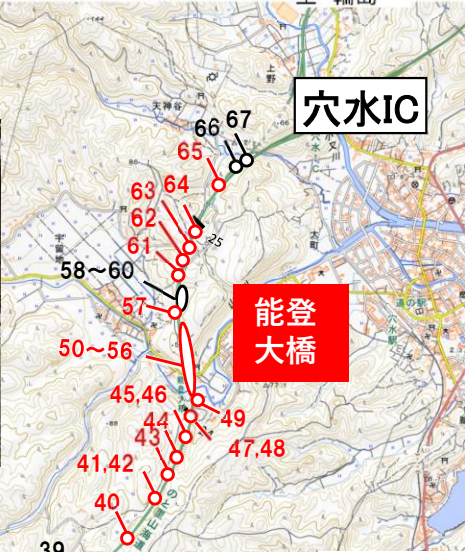

至 金沢

緊急復旧作業中（1車線確保）
29箇所完了（舗装以外）／38箇所

No.29崩落土砂撤去状況



工事名	令和6年能登半島地震 能登道/のと里山海道 道路復旧
工種	道路復旧
測点	のと里山海道 KP21.03-21.13

土砂撤去状況

R6.1.28撮影
