

再評価結果（平成26年度事業継続箇所）

担当課：道路局 国道・防災課

担当課長名：茅野 牧夫

事業名	一般国道9号 静岡・仁摩道路	事業区分	一般国道	事業主体	国土交通省 中国地方整備局
起終点	自：島根県大田市静岡町 至：島根県大田市仁摩町大国			延長	7.9km
事業概要	<p>一般国道9号は、京都市から下関市に至る延長約755kmの主要幹線道路である。 静岡・仁摩道路は、一般国道9号の交通隘路区間の回避及び交通安全の確保等を目的とした島根県大田市静岡町から大田市仁摩町大国に至る延長7.9kmの自動車専用道路である。</p>				
H20年度事業化	H17年度都市計画決定 (H一年度変更)	H23年度用地着手	H一年度工事着手		
全体事業費	約220億円	事業進捗率	6%	供用済延長	0.0km
計画交通量	16,100台/日				
費用対効果 分析結果	B/C (事業全体) 1.9 (残事業) 2.1	総費用 (残事業)/(事業全体) 180/207億円 事業費：161/188億円 維持管理費：19/19億円	総便益 (残事業)/(事業全体) 385/385億円 走行時間短縮便益：276/276億円 走行経費減少便益：78/78億円 交通事故減少便益：31/31億円	基準年 平成25年	
感度分析の結果	【事業全体】交通量：B/C=1.6~2.2(交通量±10%) 【残事業】交通量：B/C=1.8~2.5(交通量±10%) 事業費：B/C=1.7~2.0(事業費±10%) 事業費：B/C=2.0~2.4(事業費±10%) 事業期間：B/C=1.7~2.0(事業期間±20%) 事業期間：B/C=2.0~2.3(事業期間±20%)				
事業の効果等	①円滑なモビリティの確保 ・損失時間の削減が見込まれる ・利便性の向上が期待できるバス路線が存在する（石見交通） ・江津市から出雲空港（第3種空港）へのアクセス向上 ②物流効率化の支援 ・大田市から浜田港（重要港湾）へのアクセス向上 ・国際コンテナ通行支障トンネル4箇所の解消 ③国土・地域ネットワークの構築 ・日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する【大田市～浜田市】 ④個性ある地域の形成 ・石見銀山（H24観光入込客数：約43万人）へのアクセス向上 ⑤災害への備え ・島根県緊急輸送道路ネットワーク計画（H21年3月策定）において第1次緊急輸送道路に位置づけあり ・第1次緊急輸送路である国道9号の代替路線を形成する ⑥地球環境の保全 ・CO2排出量の削減が見込まれる				

関係する地方公共団体等の意見

大田市長など3市4町の首長で構成される出雲・江津間高規格道路建設促進期成同盟会など複数の団体から静間・仁摩道路の早期完成の要望を受けている。

島根県知事の意見：対応方針（原案）については妥当である。

一般国道9号静間・仁摩道路は、世界遺産石見銀山遺跡を活用した観光振興、国際標準コンテナ車通行支障区間の解消による物流効率化の支援を始め、企業誘致の促進、事故・災害時の代替道路機能の確保、救急医療活動の支援等、地域産業の活性化、地域間交流の促進のため必要不可欠な路線であり、早期完成を図って頂きたい。

また、その他の山陰道の各区分についても、未着手区間の早期事業着手、事業中区分間の事業促進を図り、2020年を目途に山陰道全線の開通を図って頂きたい。

なお、道路利用者から声が上がっているトイレ等の休憩施設について、現道の道の駅への案内誘導等、配慮願いたい。

事業評価監視委員会の意見

事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。

審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は、妥当であると意見集約した。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・並行する国道9号では、主要な交差点において交通事故も多発しており、交通事故による通行止めにより著しい渋滞や大幅な迂回も発生している。

事業の進捗状況、残事業の内容等

- ・平成25年5月末で用地買収は約70%完了している。
- ・平成25年3月末で事業進捗は約6%完了している。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・現在、調査設計、用地買収を行っており、早期開通を目指し事業を推進する。

施設の構造や工法の変更等

今後の事業の実施にあたっては、コスト削減を図りつつ事業を推進していく。


対応方針

事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

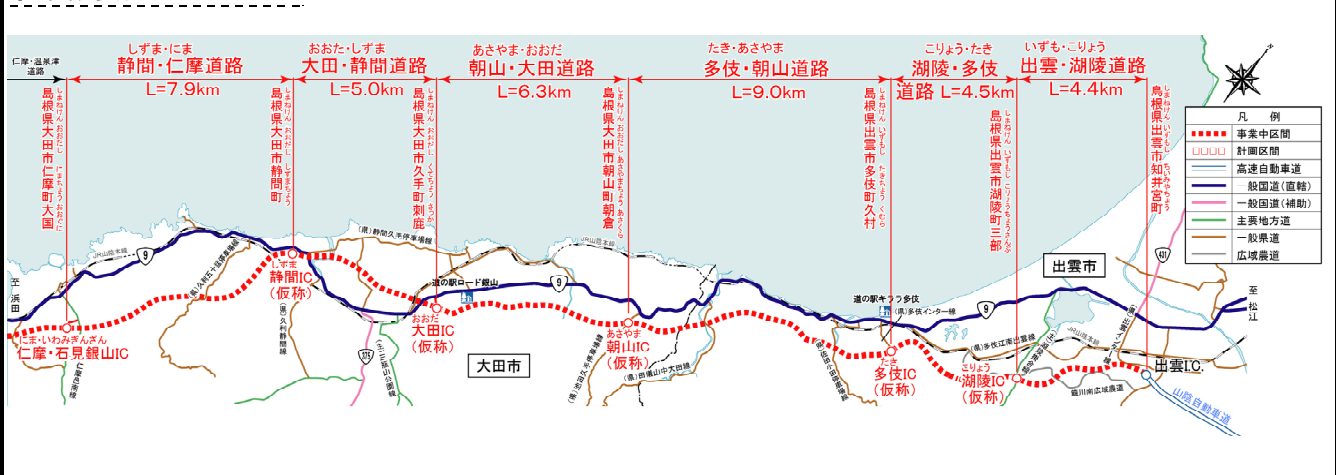

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
