

## 再評価結果（令和6年度事業継続箇所）

担当課：道路局国道・技術課  
担当課長名：高松 諭

事業名	一般国道329号 <small>はえぼる</small> 南風原バイパス		事業区分	一般国道	事業主体	内閣府 沖縄総合事務局						
起終点	自： <small>おきなわけん はえぼるちやうよな は</small> 沖縄県南風原町与那覇 至： <small>おきなわけん なは しやうえま</small> 沖縄県那覇市上間			延長	2.8km							
事業概要												
<p>一般国道329号南風原バイパスは、南風原町字与那覇から那覇市上間に至る延長約2.8kmの主要幹線道路である。</p> <p>沖縄ブロック新広域道路交通計画において、広域交通の拠点となる都市や、空港・港湾を高規格道路等と効率的かつ効果的に連絡する「一般広域道路」として位置付けられている。また、那覇都市圏において「2環状7放射道路」としても位置付けられている。</p> <p>南風原バイパスの整備により、南風原町～那覇市間の交通渋滞の緩和を図るとともに、那覇空港自動車道とのアクセス強化による交通の分散化、一般国道329号の交通安全の確保及び沿道環境の改善、関連事業の支援に寄与する道路である。</p>												
H7年度事業化		H12年度都市計画決定		H14年度用地着手		H15年度工事着手						
全体事業費	約490億円		事業進捗率 (令和5年3月末時点)	約68%	供用済延長	2.0km						
計画交通量	32,400台/日											
費用対効果 分析結果	B/C	総費用		総便益	基準年							
	(事業全体) 1.3 (残事業) 2.1	<small>(残事業)/(事業全体)</small> 140/588億円 (事業費：127/565億円) 維持管理費：12/22億円		<small>(残事業)/(事業全体)</small> 298/771億円 (走行時間短縮便益：280/727億円) (走行経費減少便益：15/40億円) (交通事故減少便益：2.2/3.9億円)	令和5年度							
感度分析の結果												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">(事業全体) 交通量変動 B/C = 1.2~1.3 (交通量±10%)</td> <td style="width: 50%;">(残事業) B/C = 2.1~2.5 (交通量±10%)</td> </tr> <tr> <td>事業費変動 B/C = 1.2~1.3 (事業費±10%)</td> <td>B/C = 2.2~2.6 (事業費±10%)</td> </tr> <tr> <td>事業期間変動 B/C = 1.3~1.3 (事業期間±20%)</td> <td>B/C = 2.2~2.5 (事業期間±20%)</td> </tr> </table>							(事業全体) 交通量変動 B/C = 1.2~1.3 (交通量±10%)	(残事業) B/C = 2.1~2.5 (交通量±10%)	事業費変動 B/C = 1.2~1.3 (事業費±10%)	B/C = 2.2~2.6 (事業費±10%)	事業期間変動 B/C = 1.3~1.3 (事業期間±20%)	B/C = 2.2~2.5 (事業期間±20%)
(事業全体) 交通量変動 B/C = 1.2~1.3 (交通量±10%)	(残事業) B/C = 2.1~2.5 (交通量±10%)											
事業費変動 B/C = 1.2~1.3 (事業費±10%)	B/C = 2.2~2.6 (事業費±10%)											
事業期間変動 B/C = 1.3~1.3 (事業期間±20%)	B/C = 2.2~2.5 (事業期間±20%)											
事業の効果等												
<ol style="list-style-type: none"> <li>① 円滑なモビリティの確保                         <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 損失時間の削減が見込まれる。</li> <li>・ 那覇空港から西原町役場へのアクセスが向上。</li> </ul> </li> <li>② 個性ある地域の形成                         <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 那覇空港からマリパークへのアクセス性が向上。</li> </ul> </li> <li>③ 安全で安心できるくらしの確保                         <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第3次医療施設へのアクセス性が向上。</li> </ul> </li> <li>④ 地球環境の保全                         <ul style="list-style-type: none"> <li>・ CO2排出量の削減が見込まれる。</li> </ul> </li> <li>⑤ 生活環境の改善・保全                         <ul style="list-style-type: none"> <li>・ NOx排出量の削減が見込まれる。</li> <li>・ SPM排出量の削減が見込まれる。</li> </ul> </li> </ol>												
関係する地方公共団体等の意見												
<p>【沖縄県知事】</p> <p>一般国道329号与那原バイパス及び南風原バイパスは、沖縄ブロック新広域道路交通計画において、広域交通の拠点となる都市や、空港・港湾を高規格道路等と効率的かつ効果的に連絡する「一般広域道路」として位置付けられているとともに、2環状7放射道路の一部を形成することから極めて重要な道路と認識しております。</p> <p>本道路は、那覇都市圏の交通渋滞の緩和を図ることを目的とする道路であるとともに、マリンタウンMICEエリアと那覇方面とのアクセス性が強化されることから、本道路の早期整備は急務であります。</p> <p>以上により、対応方針（原案）のとおり事業継続に同意いたします。</p>												

事業評価監視委員会の意見

- ・事業の継続を了承する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

- ・南風原バイパスの東側に接続する一般国道329号与那原バイパスが令和3年度に全線暫定2車線開通。
- ・「沖縄県マリンタウンMICEエリア形成事業基本計画」が令和4年8月に策定され、大型MICE施設や、付随する宿泊施設や商業施設の建設が予定されている。南風原バイパスの整備により、那覇方面へのアクセスが強化され、東海岸地域の活性化に寄与することが期待される。

事業の進捗状況、残事業の内容等

- ・平成7年度に事業化、用地進捗率86%、事業進捗率68%（令和5年3月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

- ・引き続き、事業を推進し、早期の全線開通を目指す。

施設の構造や工法の変更等

- ・今後、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減に努めながら事業を推進。

対応方針（原案）


事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

位置図

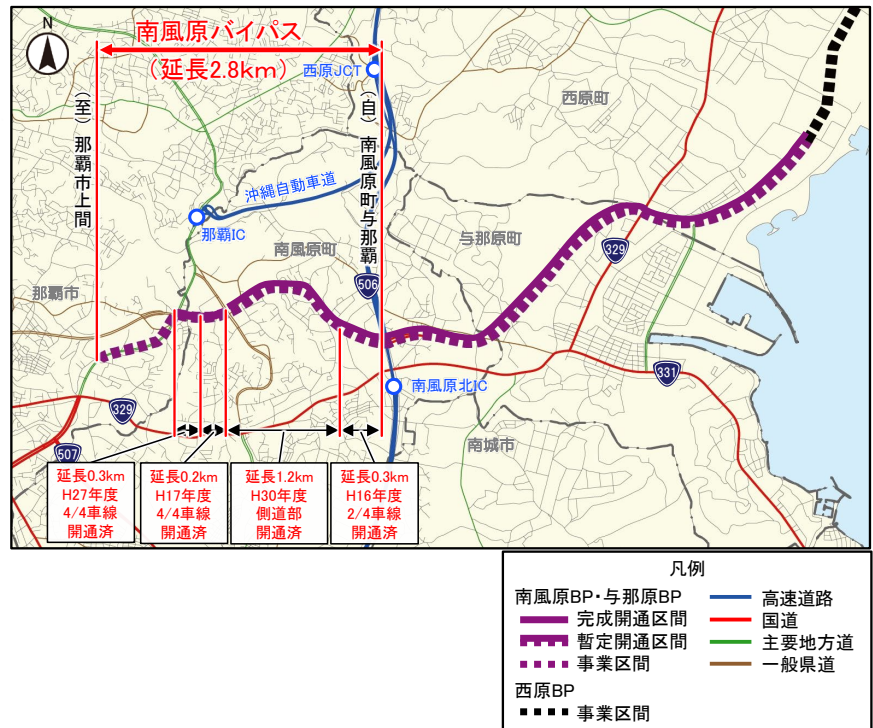

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
