

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

別紙 - 7

事業名	一般国道25号 斑鳩バイパス
事業主体	近畿地方整備局

事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	便益が費用を上回っている	費用便益比 ( B / C ) = 1.5 ( 経済的純現在価値 ( B - C ) = 108億円、経済的内部収益率 ( E I R R ) = 5.9% )

事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標 ( 対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは を に変更 )	指標チェックの根拠
1. 活力 円滑なモビリティの確保	円滑なモビリティの確保	現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間b ( 当該区間 / 平行区間 ) について : ( 当該区間名 = 国道 2 5 号 ) 並行区間等 ( 当該区間 ) の渋滞損失時間 : 256,200人・時間/年 並行区間等 ( 当該区間 ) の渋滞損失削減率 : 8 割削減
		現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	対象区間 ( 斑鳩町神南字笠町 )、改善見込み ( 旅行速度18.4km/h 40km/h )
		現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	-
		現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	奈良交通 路線バス ( JR王寺町 ~ JR法隆寺駅 ~ JR奈良駅等 ) ・観光バス ( JR法隆寺駅 ~ 法隆寺 )
		新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	-
		第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	-
	物流効率化の支援	特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる	-
		農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	-
	現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	-	

1. 活力	都市の再生	都市再生プロジェクトを支援する事業である	-	
		広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	-	
		市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	-	
		中心市街地内で行う事業である	-	
		幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	-	
		DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	-	
		対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	-	
	国土・地域ネットワークの構築	高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り	-	
		地域高規格道路の位置づけあり	-	
		当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	-	
		現道等における交通不能区間を解消する	-	
		現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	斑鳩町幸前～斑鳩町龍田南(国道25号)	
		日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	対象自治体名(斑鳩町)=斑鳩町、王寺町、改善見込み(24分 13分)	
	個性ある地域の形成	鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	-	
		拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	-	
		主要な観光地へのアクセス向上が期待される	法隆寺 年間入れ込み客数60.4万人/年(H17)	
		特別立法に基づく事業である	-	
		新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	-	
	2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	-
			交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	-
無電柱化による美しい町並みの形成		対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	-	
		市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	-	
安全で安心できるくらしの確保		三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	県立奈良病院、アクセス向上が見込まれる自治体名(地区名=斑鳩町)(50分 44分)	

3. 安全	安全な生活環境の確保	現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	-
		当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	-
	災害への備え	近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	-
		対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	第一次緊急輸送道路（国道25号）
		緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	国道25号、斑鳩町幸前～斑鳩町龍田南
		並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	-
		現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	-
		現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	-
		避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	対象地区名等
		幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する	
4. 環境	地球環境の保全	対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：2,523t/年、削減率約0.1%
	生活環境の改善・保全	現道等における自動車からのNO2排出削減率	評価対象区間（現道/平行区間等）：（区間名＝国道25号） 排出削減量：16.1t/年、排出削減率：約5.2%削減 バイパス等についてNOx排出増加量：11.7t/年
		現道等における自動車からのSPM排出削減率	評価対象区間（現道/平行区間等）：（区間名＝国道25号） 排出削減量：1.5t/年、排出削減率：約5.1%削減 バイパス等についてSPM排出増加量：1.1t/年
		現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	斑鳩町法隆寺南（1箇所：夜間73dB 70dB（要請限度））
		その他、環境や景観上の効果が期待される	バイパス区間をゾーン分けし、沿道状況に対応したゾーンテーマを策定して整備予定
5. その他	他のプロジェクトとの関係	関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	-
		他機関との連携プログラムに位置づけられている	斑鳩町都市計画マスタープラン
		道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	斑鳩町都市計画マスタープラン
		その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	-

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BPの別
一般国道25号	斑鳩バイパス	L = 4.7 Km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
10,000 ~ 14,100	2	近畿地方整備局

## 費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成 18 年		
単純合計	234億円	51億円	284億円
うち残事業分	192億円	51億円	243億円
基準年における 現在価値 (C)	191億円	18億円	209億円
うち残事業分	145億円	18億円	162億円

## 便 益

	走行時間 短縮便益	走行費用 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基準年	平成 18 年			
供用年	平成 28 年			
単年便益 (初年便益)	22億円	1億円	0億円	23億円
基準年における 現在価値 (B)	304億円	12億円	1億円	317億円
うち残事業分	291億円	11億円	1億円	303億円

## 結 果

費用便益比 (事業全体)	1.5
費用便益比 (残事業)	1.9

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

## 感 度 分 析 (残事業を対象)

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B / C)
交通量	10,000 ~ 14,100	± 10%	1.7 (-10%) ~ (+10%) 2.2
事業費	162億円	± 10%	1.7 (+10%) ~ (-10%) 2.1
事業期間	9年	± 2年	1.8 (+2年) ~ (-2年) 2.1
割引率	1.04	± 1%	1.6 (+1%) ~ (-1%) 2.3

## 交通状況の変化

事業名：斑鳩バイパス（事業全体）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等]  4.7km	交通量	[台/日]	0	11,700	
	走行時間	[分]	0	5	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	15.71	
②主な周 辺道路	現道(国 道25号) : 4.4km	交通量	[台/日]	16,000	10,900
		走行時間	[分]	10	7
		走行時間費用	[億円/年]	44.08	20.91
	県) 安堵 王寺線 : 6.6km	交通量	[台/日]	4,400	1,600
		走行時間	[分]	11	10
		走行時間費用	[億円/年]	12.66	4.03
③その他道路合計： 48,067.5km	走行時間費用	[億円/年]	138017.65	138011.38	


			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便 益
合計：48,083.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	138074.39	138052.02	22.37

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

- ※1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：斑鳩バイパス（事業全体）

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

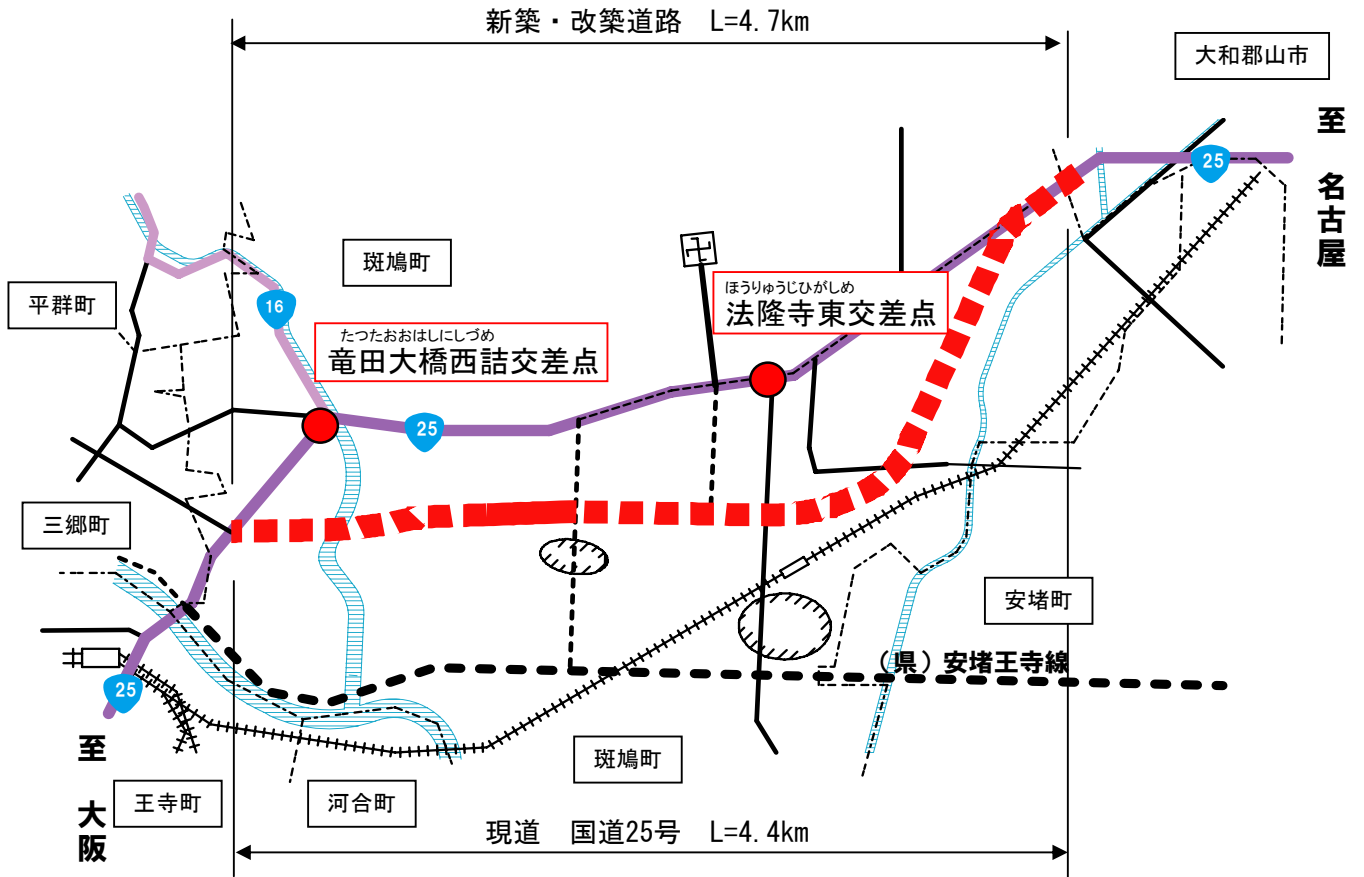

## 交通状況の変化

事業名：斑鳩バイパス（残事業）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等]  4.3km	交通量	[台/日]	0	11,800	
	走行時間	[分]	0	5	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	14.63	
②主な周 辺道路	現道(国 道25号) : 4.4km	交通量	[台/日]	15,900	10,900
		走行時間	[分]	10	7
		走行時間費用	[億円/年]	42.52	20.91
	県) 安堵 王寺線 : 6.6km	交通量	[台/日]	4,500	1,600
		走行時間	[分]	11	10
		走行時間費用	[億円/年]	12.74	4.03
③その他道路合計： 48,067.9km	走行時間費用	[億円/年]	138018.19	138012.46	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便 益
合計：48,083.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	138073.44	138052.02	21.42

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※ 1： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※ 2： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。


※ 3： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。



事業名：斑鳩バイパス（残事業）

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

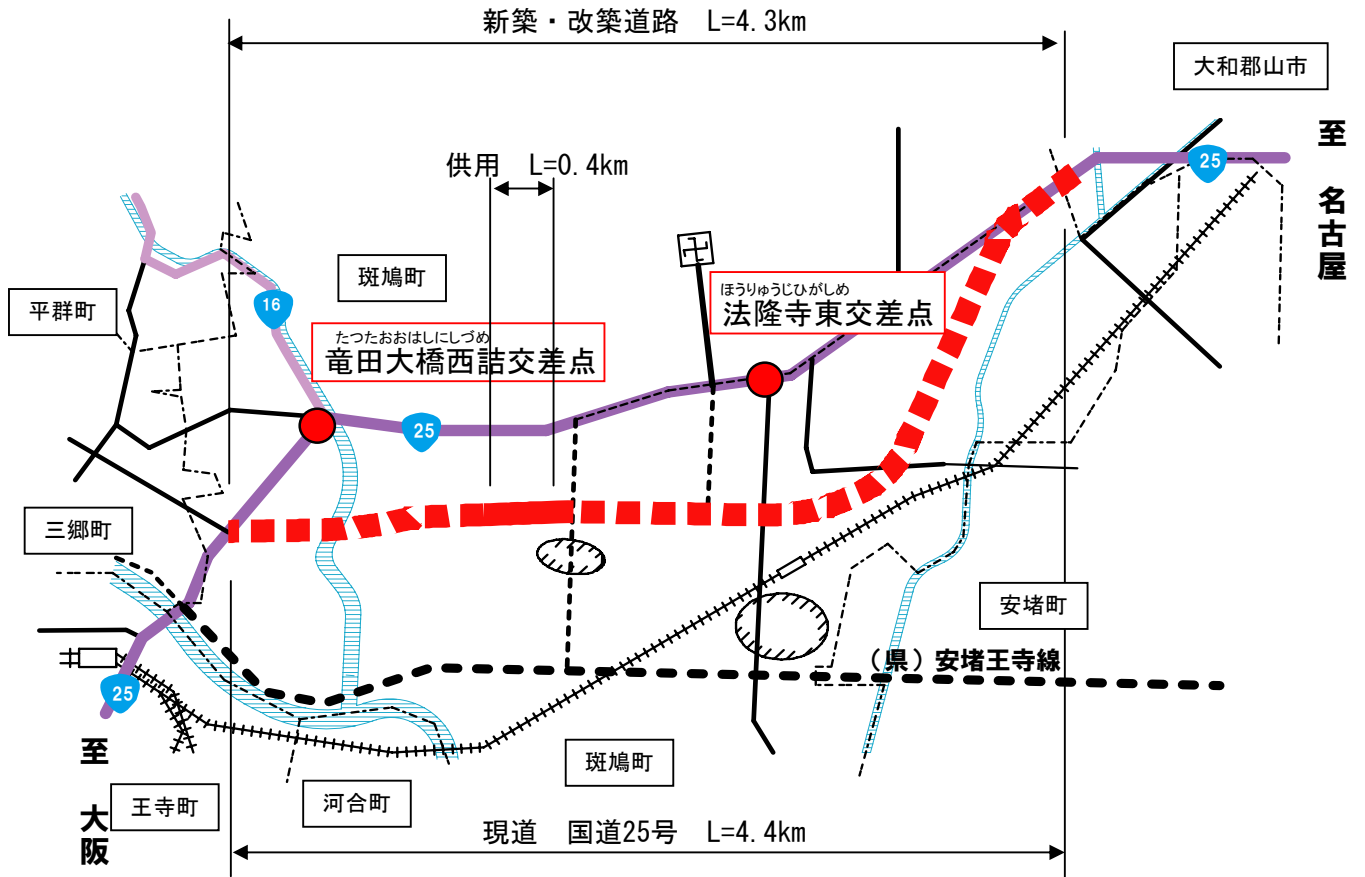

## 費用便益分析の条件

事業名：斑鳩バイパス

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	
	その他	
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	平成18年
交通流の推計時点	1時点のみ推計	(H42)
	複数時点での推計	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	
	整備の有無のいずれかのみ推計	有 無
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	(H11センサス)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	
	その他( )	
開発交通量の考慮	無	
	有	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ( )台トリップ/日 考慮した理由を記載
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	
	転換率式を用いた配分	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	
	簡易手法	
	簡易手法の場合	小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他( )
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	
	採用理由を記載 QV式には、自由流限界容量、可能交通容量の2段階で速度が低下する台形式を用いているため、可能交通容量を超える場合、速度が著しく低下するため、最終速度を用いた場合、便益を過大・過小評価する可能性がある。このため、本検討では、分割配分の各分割回における速度を交通量で重み付けをした加重平均速度を用いている。	
	最終配分の速度	
	採用理由を記載	
その他( )		



## 費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 斑鳩バイパス

採用単価の根拠 一般国道(直轄)		
単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.27	4.7	1.27

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-44年目	S 47	3.7943	0.06	0.23		
-43年目	S 48	3.6484	0.02	0.07		
-42年目	S 49	3.5081	0.00	0.00		
-41年目	S 50	3.3731	0.00	0.00		
-40年目	S 51	3.2434	0.00	0.00		
-39年目	S 52	3.1187	0.11	0.34		
-38年目	S 53	2.9987	0.00	0.00		
-37年目	S 54	2.8834	0.00	0.00		
-36年目	S 55	2.7725	0.00	0.00		
-35年目	S 56	2.6658	0.00	0.00		
-34年目	S 57	2.5633	0.04	0.10		
-33年目	S 58	2.4647	0.05	0.12		
-32年目	S 59	2.3699	0.04	0.09		
-31年目	S 60	2.2788	0.07	0.16		
-30年目	S 61	2.1911	0.05	0.11		
-29年目	S 62	2.1068	0.04	0.08		
35年目	S 63	0.1712	0.00	0.00		
-27年目	H 1	1.9479	0.00	0.00		
-26年目	H 2	1.8730	0.00	0.00		
-25年目	H 3	1.8009	0.08	0.14		
-24年目	H 4	1.7317	0.05	0.08		
-23年目	H 5	1.6651	0.29	0.48		
-22年目	H 6	1.6010	0.10	0.16		
-21年目	H 7	1.5395	0.19	0.30		
-20年目	H 8	1.4802	0.11	0.16		
-19年目	H 9	1.4233	0.35	0.50		
-18年目	H 10	1.3686	1.35	1.85		
-17年目	H 11	1.3159	13.81	18.17		
-16年目	H 12	1.2653	3.51	4.44		
-15年目	H 13	1.2167	2.88	3.50		
-14年目	H 14	1.1699	0.97	1.13		
-13年目	H 15	1.1249	7.26	8.17		
-12年目	H 16	1.0816	3.23	3.49		
-11年目	H 17	1.0400	2.19	2.28		
-10年目	H 18	1.0000	4.20	4.20		
-9年目	H 19	0.9615	9.33	8.97		
-8年目	H 20	0.9246	19.52	18.05		
-7年目	H 21	0.8890	19.52	17.36		
-6年目	H 22	0.8548	19.52	16.69		
-5年目	H 23	0.8219	24.29	19.96		
-4年目	H 24	0.7903	24.29	19.19		
-3年目	H 25	0.7599	24.29	18.45		
-2年目	H 26	0.7307	24.20	17.68		
-1年目	H 27	0.7026	27.52	19.34		
供用開始年次	H 28	0.6756			1.27	0.86
1年目	H 29	0.6496			1.27	0.82
2年目	H 30	0.6246			1.27	0.79
3年目	H 31	0.6006			1.27	0.76
4年目	H 32	0.5775			1.27	0.73
5年目	H 33	0.5553			1.27	0.70
6年目	H 34	0.5339			1.27	0.68
7年目	H 35	0.5134			1.27	0.65
8年目	H 36	0.4936			1.27	0.63
9年目	H 37	0.4746			1.27	0.60
10年目	H 38	0.4564			1.27	0.58
11年目	H 39	0.4388			1.27	0.56
12年目	H 40	0.4220			1.27	0.54
13年目	H 41	0.4057			1.27	0.51
14年目	H 42	0.3901			1.27	0.50
15年目	H 43	0.3751			1.27	0.48
16年目	H 44	0.3607			1.27	0.46
17年目	H 45	0.3468			1.27	0.44
18年目	H 46	0.3335			1.27	0.42
19年目	H 47	0.3207			1.27	0.41
20年目	H 48	0.3083			1.27	0.39
21年目	H 49	0.2965			1.27	0.38
22年目	H 50	0.2851			1.27	0.36
23年目	H 51	0.2741			1.27	0.35
24年目	H 52	0.2636			1.27	0.33
25年目	H 53	0.2534			1.27	0.32
26年目	H 54	0.2437			1.27	0.31
27年目	H 55	0.2343			1.27	0.30
28年目	H 56	0.2253			1.27	0.29
29年目	H 57	0.2166			1.27	0.27
30年目	H 58	0.2083			1.27	0.26
31年目	H 59	0.2003			1.27	0.25
32年目	H 60	0.1926			1.27	0.24
33年目	H 61	0.1852			1.27	0.24
34年目	H 62	0.1780			1.27	0.23
35年目	H 63	0.1712			1.27	0.22
36年目	H 64	0.1646			1.27	0.21
37年目	H 65	0.1583			1.27	0.20
38年目	H 66	0.1522			1.27	0.19
39年目	H 67	0.1463	-103.23	-15.10	1.27	0.19
合計			130.30	190.94	50.76	17.65
単純事業費計			233.53		50.76	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

費用の現在価値算定表(残事業)

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 斑鳩バイパス

採用単価の根拠 一般国道(直轄)		
単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.27	4.7	1.27

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-44年目	S 47	3.7943				
-43年目	S 48	3.6484				
-42年目	S 49	3.5081				
-41年目	S 50	3.3731				
-40年目	S 51	3.2434				
-39年目	S 52	3.1187				
-38年目	S 53	2.9987				
-37年目	S 54	2.8834				
-36年目	S 55	2.7725				
-35年目	S 56	2.6658				
-34年目	S 57	2.5633				
-33年目	S 58	2.4647				
-32年目	S 59	2.3699				
-31年目	S 60	2.2788				
-30年目	S 61	2.1911				
-29年目	S 62	2.1068				
35年目	S 63	0.1712				
-27年目	H 1	1.9479				
-26年目	H 2	1.8730				
-25年目	H 3	1.8009				
-24年目	H 4	1.7317				
-23年目	H 5	1.6651				
-22年目	H 6	1.6010				
-21年目	H 7	1.5395				
-20年目	H 8	1.4802				
-19年目	H 9	1.4233				
-18年目	H 10	1.3686				
-17年目	H 11	1.3159				
-16年目	H 12	1.2653				
-15年目	H 13	1.2167				
-14年目	H 14	1.1699				
-13年目	H 15	1.1249				
-12年目	H 16	1.0816				
-11年目	H 17	1.0400				
-10年目	H 18	1.0000	0.00	0.00		
-9年目	H 19	0.9615	9.33	8.97		
-8年目	H 20	0.9246	19.52	18.05		
-7年目	H 21	0.8890	19.52	17.36		
-6年目	H 22	0.8548	19.52	16.69		
-5年目	H 23	0.8219	24.29	19.96		
-4年目	H 24	0.7903	24.29	19.19		
-3年目	H 25	0.7599	24.29	18.45		
-2年目	H 26	0.7307	24.20	17.68		
-1年目	H 27	0.7026	27.52	19.34		
供用開始年次	H 28	0.6756			1.27	0.86
1年目	H 29	0.6496			1.27	0.82
2年目	H 30	0.6246			1.27	0.79
3年目	H 31	0.6006			1.27	0.76
4年目	H 32	0.5775			1.27	0.73
5年目	H 33	0.5553			1.27	0.70
6年目	H 34	0.5339			1.27	0.68
7年目	H 35	0.5134			1.27	0.65
8年目	H 36	0.4936			1.27	0.63
9年目	H 37	0.4746			1.27	0.60
10年目	H 38	0.4564			1.27	0.58
11年目	H 39	0.4388			1.27	0.56
12年目	H 40	0.4220			1.27	0.54
13年目	H 41	0.4057			1.27	0.51
14年目	H 42	0.3901			1.27	0.50
15年目	H 43	0.3751			1.27	0.48
16年目	H 44	0.3607			1.27	0.46
17年目	H 45	0.3468			1.27	0.44
18年目	H 46	0.3335			1.27	0.42
19年目	H 47	0.3207			1.27	0.41
20年目	H 48	0.3083			1.27	0.39
21年目	H 49	0.2965			1.27	0.38
22年目	H 50	0.2851			1.27	0.36
23年目	H 51	0.2741			1.27	0.35
24年目	H 52	0.2636			1.27	0.33
25年目	H 53	0.2534			1.27	0.32
26年目	H 54	0.2437			1.27	0.31
27年目	H 55	0.2343			1.27	0.30
28年目	H 56	0.2253			1.27	0.29
29年目	H 57	0.2166			1.27	0.27
30年目	H 58	0.2083			1.27	0.26
31年目	H 59	0.2003			1.27	0.25
32年目	H 60	0.1926			1.27	0.24
33年目	H 61	0.1852			1.27	0.24
34年目	H 62	0.1780			1.27	0.23
35年目	H 63	0.1712			1.27	0.22
36年目	H 64	0.1646			1.27	0.21
37年目	H 65	0.1583			1.27	0.20
38年目	H 66	0.1522			1.27	0.19
39年目	H 67	0.1463	-74.15	-10.85	1.27	0.19
合計			118.33	144.84	50.76	17.65
単純事業費計			192.48		50.76	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

## 便益の現在価値算定表

箇所名:斑鳩バイパス

年次	年度 (基準年) H 18	総走行台数 <sup>1</sup> の年次別伸び率 (近畿内陸ブロック)			割引率 (A)	走行時間便益 (億円)						走行経費便益 (億円)						事故減少便益 (億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A) ×		現在価値 ×(A)	便益合計 ( ~ )	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 28	1.00755	0.99988	1.00523	0.6756	12.67	4.18	2.06	2.88	21.79	14.72	0.45	0.19	0.12	0.08	0.84	0.57	0.06	0.04	22.69	15.33
1年目	H 29	1.00750	0.99988	1.00521	0.6496	12.76	4.21	2.06	2.88	21.91	14.23	0.46	0.20	0.12	0.08	0.85	0.55	0.06	0.04	22.82	14.82
2年目	H 30	1.00744	0.99988	1.00518	0.6246	12.86	4.24	2.06	2.88	22.04	13.77	0.46	0.20	0.12	0.08	0.85	0.53	0.06	0.04	22.95	14.34
3年目	H 31	1.00739	0.99988	1.00515	0.6006	12.95	4.27	2.06	2.88	22.17	13.31	0.46	0.20	0.12	0.08	0.86	0.52	0.06	0.04	23.08	13.86
4年目	H 32	1.00144	0.99659	1.00001	0.5775	13.05	4.30	2.06	2.88	22.29	12.87	0.47	0.20	0.12	0.08	0.86	0.50	0.06	0.03	23.21	13.41
5年目	H 33	1.00144	0.99658	1.00001	0.5553	13.07	4.31	2.05	2.87	22.30	12.38	0.47	0.20	0.12	0.08	0.86	0.48	0.06	0.03	23.22	12.90
6年目	H 34	1.00144	0.99656	1.00001	0.5339	13.09	4.31	2.05	2.86	22.31	11.91	0.47	0.20	0.12	0.08	0.86	0.46	0.06	0.03	23.23	12.40
7年目	H 35	1.00144	0.99655	1.00001	0.5134	13.11	4.32	2.04	2.85	22.32	11.46	0.47	0.20	0.12	0.08	0.86	0.44	0.06	0.03	23.24	11.93
8年目	H 36	1.00144	0.99654	1.00001	0.4936	13.12	4.33	2.03	2.84	22.33	11.02	0.47	0.20	0.12	0.08	0.86	0.43	0.06	0.03	23.25	11.48
9年目	H 37	1.00143	0.99653	1.00001	0.4746	13.14	4.33	2.03	2.83	22.33	10.60	0.47	0.20	0.12	0.08	0.86	0.41	0.06	0.03	23.26	11.04
10年目	H 38	1.00143	0.99652	1.00001	0.4564	13.16	4.34	2.02	2.82	22.34	10.20	0.47	0.20	0.12	0.08	0.87	0.39	0.06	0.03	23.27	10.62
11年目	H 39	1.00143	0.99650	1.00001	0.4388	13.18	4.35	2.01	2.81	22.35	9.81	0.47	0.20	0.12	0.08	0.87	0.38	0.06	0.03	23.27	10.21
12年目	H 40	1.00143	0.99649	1.00001	0.4220	13.20	4.35	2.01	2.80	22.36	9.43	0.47	0.20	0.12	0.08	0.87	0.37	0.06	0.02	23.28	9.83
13年目	H 41	1.00143	0.99648	1.00001	0.4057	13.22	4.36	2.00	2.79	22.37	9.07	0.47	0.20	0.12	0.08	0.87	0.35	0.06	0.02	23.29	9.45
14年目	H 42	0.99651	0.99500	0.99608	0.3901	13.24	4.36	1.99	2.78	22.37	8.73	0.47	0.20	0.12	0.08	0.87	0.34	0.06	0.02	23.30	9.09
15年目	H 43	0.99650	0.99497	0.99606	0.3751	13.19	4.35	1.98	2.77	22.29	8.36	0.47	0.20	0.12	0.07	0.86	0.32	0.06	0.02	23.21	8.71
16年目	H 44	0.99649	0.99495	0.99605	0.3607	13.15	4.33	1.97	2.75	22.20	8.01	0.47	0.20	0.12	0.07	0.86	0.31	0.06	0.02	23.12	8.34
17年目	H 45	0.99647	0.99492	0.99603	0.3468	13.10	4.32	1.96	2.74	22.12	7.67	0.47	0.20	0.11	0.07	0.86	0.30	0.06	0.02	23.03	7.99
18年目	H 46	0.99646	0.99489	0.99602	0.3335	13.05	4.30	1.95	2.73	22.03	7.35	0.47	0.20	0.11	0.07	0.85	0.28	0.06	0.02	22.94	7.65
19年目	H 47	0.99645	0.99487	0.99600	0.3207	13.01	4.29	1.94	2.71	21.95	7.04	0.46	0.20	0.11	0.07	0.85	0.27	0.06	0.02	22.86	7.33
20年目	H 48	0.99644	0.99484	0.99598	0.3083	12.96	4.27	1.93	2.70	21.86	6.74	0.46	0.20	0.11	0.07	0.85	0.26	0.06	0.02	22.77	7.02
21年目	H 49	0.99642	0.99481	0.99597	0.2965	12.91	4.26	1.92	2.68	21.78	6.46	0.46	0.20	0.11	0.07	0.84	0.25	0.06	0.02	22.68	6.72
22年目	H 50	0.99641	0.99479	0.99595	0.2851	12.87	4.24	1.91	2.67	21.69	6.18	0.46	0.20	0.11	0.07	0.84	0.24	0.06	0.02	22.59	6.44
23年目	H 51	0.99640	0.99476	0.99593	0.2741	12.82	4.23	1.90	2.66	21.61	5.92	0.46	0.20	0.11	0.07	0.84	0.23	0.06	0.02	22.50	6.17
24年目	H 52	0.99576	0.99742	0.99623	0.2636	12.78	4.21	1.89	2.64	21.52	5.67	0.46	0.20	0.11	0.07	0.83	0.22	0.06	0.01	22.41	5.91
25年目	H 53	0.99574	0.99742	0.99622	0.2534	12.72	4.19	1.89	2.64	21.44	5.43	0.45	0.19	0.11	0.07	0.83	0.21	0.06	0.01	22.32	5.66
26年目	H 54	0.99573	0.99741	0.99620	0.2437	12.67	4.18	1.88	2.63	21.35	5.20	0.45	0.19	0.11	0.07	0.83	0.20	0.06	0.01	22.24	5.42
27年目	H 55	0.99571	0.99740	0.99619	0.2343	12.61	4.16	1.88	2.62	21.27	4.98	0.45	0.19	0.11	0.07	0.82	0.19	0.06	0.01	22.15	5.19
28年目	H 56	0.99569	0.99739	0.99617	0.2253	12.56	4.14	1.87	2.61	21.19	4.77	0.45	0.19	0.11	0.07	0.82	0.18	0.06	0.01	22.06	4.97
29年目	H 57	0.99567	0.99739	0.99616	0.2166	12.51	4.12	1.87	2.61	21.10	4.57	0.45	0.19	0.11	0.07	0.82	0.18	0.06	0.01	21.98	4.76
30年目	H 58	0.99565	0.99738	0.99614	0.2083	12.45	4.10	1.86	2.60	21.02	4.38	0.44	0.19	0.11	0.07	0.81	0.17	0.06	0.01	21.89	4.56
31年目	H 59	0.99563	0.99737	0.99613	0.2003	12.40	4.09	1.86	2.59	20.94	4.19	0.44	0.19	0.11	0.07	0.81	0.16	0.06	0.01	21.80	4.37
32年目	H 60	0.99561	0.99737	0.99611	0.1926	12.34	4.07	1.85	2.59	20.85	4.02	0.44	0.19	0.11	0.07	0.81	0.16	0.06	0.01	21.71	4.18
33年目	H 61	0.99559	0.99736	0.99610	0.1852	12.29	4.05	1.85	2.58	20.77	3.85	0.44	0.19	0.11	0.07	0.80	0.15	0.05	0.01	21.63	4.01
34年目	H 62				0.1780	12.23	4.03	1.84	2.57	20.68	3.68	0.44	0.19	0.11	0.07	0.80	0.14	0.05	0.01	21.54	3.83
35年目	H 63				0.1712	12.18	4.02	1.84	2.57	20.60	3.53	0.43	0.19	0.11	0.07	0.80	0.14	0.05	0.01	21.45	3.67
36年目	H 64				0.1646	12.13	4.00	1.83	2.56	20.52	3.38	0.43	0.19	0.11	0.07	0.79	0.13	0.05	0.01	21.37	3.52
37年目	H 65				0.1583	12.07	3.98	1.83	2.55	20.43	3.23	0.43	0.18	0.11	0.07	0.79	0.13	0.05	0.01	21.28	3.37
38年目	H 66				0.1522	12.02	3.96	1.82	2.55	20.35	3.10	0.43	0.18	0.11	0.07	0.79	0.12	0.05	0.01	21.19	3.23
39年目	H 67				0.1463	11.96	3.94	1.82	2.54	20.27	2.96	0.43	0.18	0.11	0.07	0.78	0.11	0.05	0.01	21.10	3.09
合計						510.80	168.38	77.71	108.51	865.40	304.20	18.22	7.82	4.54	2.93	33.51	11.78	2.28	0.80	901.19	316.78

## 便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名:斑鳩バイパス

年次	年度 (基準年)	総走行台数 $\times$ の年次別伸び率 (近畿内陸ブロック)			割引率 (A)	走行時間便益 (億円)						走行経費便益 (億円)						事故減少便益 (億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 $\times$ (A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A) $\times$		現在価値 $\times$ (A)	便益合計 ( ~ )	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 28	1.00755	0.99988	1.00523	0.6756	12.13	4.02	1.93	2.77	20.85	14.09	0.44	0.19	0.12	0.07	0.82	0.55	0.06	0.04	21.73	14.68
1年目	H 29	1.00750	0.99988	1.00521	0.6496	12.22	4.05	1.93	2.77	20.97	13.62	0.44	0.19	0.12	0.07	0.83	0.54	0.06	0.04	21.86	14.20
2年目	H 30	1.00744	0.99988	1.00518	0.6246	12.32	4.08	1.93	2.77	21.09	13.18	0.44	0.20	0.12	0.07	0.83	0.52	0.06	0.04	21.98	13.73
3年目	H 31	1.00739	0.99988	1.00515	0.6006	12.41	4.11	1.93	2.77	21.22	12.74	0.45	0.20	0.12	0.07	0.83	0.50	0.06	0.04	22.11	13.28
4年目	H 32	1.00144	0.99659	1.00001	0.5775	12.50	4.14	1.93	2.77	21.34	12.32	0.45	0.20	0.12	0.07	0.84	0.48	0.06	0.04	22.24	12.84
5年目	H 33	1.00144	0.99658	1.00001	0.5553	12.52	4.15	1.92	2.76	21.34	11.85	0.45	0.20	0.12	0.07	0.84	0.47	0.06	0.03	22.25	12.35
6年目	H 34	1.00144	0.99656	1.00001	0.5339	12.54	4.15	1.91	2.75	21.35	11.40	0.45	0.20	0.12	0.07	0.84	0.45	0.06	0.03	22.25	11.88
7年目	H 35	1.00144	0.99655	1.00001	0.5134	12.55	4.16	1.91	2.74	21.36	10.97	0.45	0.20	0.12	0.07	0.84	0.43	0.06	0.03	22.26	11.43
8年目	H 36	1.00144	0.99654	1.00001	0.4936	12.57	4.16	1.90	2.73	21.37	10.55	0.45	0.20	0.12	0.07	0.84	0.41	0.06	0.03	22.27	10.99
9年目	H 37	1.00143	0.99653	1.00001	0.4746	12.59	4.17	1.89	2.72	21.38	10.15	0.45	0.20	0.12	0.07	0.84	0.40	0.06	0.03	22.28	10.57
10年目	H 38	1.00143	0.99652	1.00001	0.4564	12.61	4.18	1.89	2.71	21.38	9.76	0.46	0.20	0.12	0.07	0.84	0.38	0.06	0.03	22.29	10.17
11年目	H 39	1.00143	0.99650	1.00001	0.4388	12.63	4.18	1.88	2.70	21.39	9.39	0.46	0.20	0.12	0.07	0.84	0.37	0.06	0.03	22.30	9.78
12年目	H 40	1.00143	0.99649	1.00001	0.4220	12.64	4.19	1.87	2.69	21.40	9.03	0.46	0.20	0.12	0.07	0.84	0.36	0.06	0.03	22.30	9.41
13年目	H 41	1.00143	0.99648	1.00001	0.4057	12.66	4.19	1.87	2.69	21.41	8.69	0.46	0.20	0.11	0.07	0.84	0.34	0.06	0.02	22.31	9.05
14年目	H 42	0.99651	0.99500	0.99608	0.3901	12.68	4.20	1.86	2.68	21.42	8.35	0.46	0.20	0.11	0.07	0.84	0.33	0.06	0.02	22.32	8.71
15年目	H 43	0.99650	0.99497	0.99606	0.3751	12.64	4.19	1.85	2.66	21.34	8.00	0.46	0.20	0.11	0.07	0.84	0.31	0.06	0.02	22.24	8.34
16年目	H 44	0.99649	0.99495	0.99605	0.3607	12.59	4.17	1.84	2.65	21.25	7.67	0.45	0.20	0.11	0.07	0.84	0.30	0.06	0.02	22.15	7.99
17年目	H 45	0.99647	0.99492	0.99603	0.3468	12.55	4.16	1.83	2.64	21.17	7.34	0.45	0.20	0.11	0.07	0.83	0.29	0.06	0.02	22.07	7.65
18年目	H 46	0.99646	0.99489	0.99602	0.3335	12.50	4.14	1.82	2.62	21.09	7.03	0.45	0.20	0.11	0.07	0.83	0.28	0.06	0.02	21.98	7.33
19年目	H 47	0.99645	0.99487	0.99600	0.3207	12.46	4.13	1.81	2.61	21.01	6.74	0.45	0.20	0.11	0.07	0.83	0.26	0.06	0.02	21.89	7.02
20年目	H 48	0.99644	0.99484	0.99598	0.3083	12.41	4.11	1.80	2.60	20.93	6.45	0.45	0.20	0.11	0.07	0.82	0.25	0.06	0.02	21.81	6.72
21年目	H 49	0.99642	0.99481	0.99597	0.2965	12.37	4.10	1.80	2.58	20.85	6.18	0.45	0.20	0.11	0.07	0.82	0.24	0.06	0.02	21.72	6.44
22年目	H 50	0.99641	0.99479	0.99595	0.2851	12.33	4.08	1.79	2.57	20.76	5.92	0.44	0.20	0.11	0.07	0.82	0.23	0.06	0.02	21.64	6.17
23年目	H 51	0.99640	0.99476	0.99593	0.2741	12.28	4.07	1.78	2.56	20.68	5.67	0.44	0.20	0.11	0.07	0.81	0.22	0.06	0.02	21.55	5.91
24年目	H 52	0.99576	0.99742	0.99623	0.2636	12.24	4.05	1.77	2.54	20.60	5.43	0.44	0.19	0.11	0.07	0.81	0.21	0.06	0.02	21.47	5.66
25年目	H 53	0.99574	0.99742	0.99622	0.2534	12.19	4.04	1.76	2.54	20.52	5.20	0.44	0.19	0.11	0.07	0.81	0.20	0.06	0.01	21.39	5.42
26年目	H 54	0.99573	0.99741	0.99620	0.2437	12.13	4.02	1.76	2.53	20.44	4.98	0.44	0.19	0.11	0.07	0.80	0.20	0.06	0.01	21.30	5.19
27年目	H 55	0.99571	0.99740	0.99619	0.2343	12.08	4.00	1.75	2.52	20.36	4.77	0.44	0.19	0.11	0.06	0.80	0.19	0.06	0.01	21.22	4.97
28年目	H 56	0.99569	0.99739	0.99617	0.2253	12.03	3.99	1.75	2.52	20.28	4.57	0.43	0.19	0.11	0.06	0.80	0.18	0.06	0.01	21.14	4.76
29年目	H 57	0.99567	0.99739	0.99616	0.2166	11.98	3.97	1.74	2.51	20.20	4.38	0.43	0.19	0.11	0.06	0.79	0.17	0.06	0.01	21.05	4.56
30年目	H 58	0.99565	0.99738	0.99614	0.2083	11.93	3.95	1.74	2.50	20.12	4.19	0.43	0.19	0.11	0.06	0.79	0.16	0.06	0.01	20.97	4.37
31年目	H 59	0.99563	0.99737	0.99613	0.2003	11.87	3.93	1.74	2.50	20.04	4.01	0.43	0.19	0.11	0.06	0.79	0.16	0.06	0.01	20.88	4.18
32年目	H 60	0.99561	0.99737	0.99611	0.1926	11.82	3.92	1.73	2.49	19.96	3.84	0.43	0.19	0.11	0.06	0.79	0.15	0.06	0.01	20.80	4.01
33年目	H 61	0.99559	0.99736	0.99610	0.1852	11.77	3.90	1.73	2.48	19.88	3.68	0.42	0.19	0.11	0.06	0.78	0.14	0.06	0.01	20.72	3.84
34年目	H 62				0.1780	11.72	3.88	1.72	2.48	19.80	3.52	0.42	0.19	0.11	0.06	0.78	0.14	0.06	0.01	20.63	3.67
35年目	H 63				0.1712	11.67	3.87	1.72	2.47	19.72	3.38	0.42	0.19	0.11	0.06	0.78	0.13	0.06	0.01	20.55	3.52
36年目	H 64				0.1646	11.62	3.85	1.71	2.46	19.64	3.23	0.42	0.18	0.11	0.06	0.77	0.13	0.06	0.01	20.47	3.37
37年目	H 65				0.1583	11.56	3.83	1.71	2.46	19.56	3.10	0.42	0.18	0.11	0.06	0.77	0.12	0.06	0.01	20.38	3.23
38年目	H 66				0.1522	11.51	3.81	1.70	2.45	19.48	2.96	0.42	0.18	0.10	0.06	0.77	0.12	0.06	0.01	20.30	3.09
39年目	H 67				0.1463	11.46	3.80	1.70	2.44	19.40	2.84	0.41	0.18	0.10	0.06	0.76	0.11	0.06	0.01	20.22	2.96
合計						489.27	162.09	72.58	104.39	828.35	291.17	17.66	7.77	4.46	2.69	32.58	11.45	2.36	0.83	863.29	303.46
