

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道185号 安芸津バイパス
事業主体	中国地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	○費用 ・事業全体：事業費158億円（94億円）、維持管理費18億円（14億円） ○効果 ①災害時の迂回解消を含めた走行時間の短縮等：215億円（140億円） ②地域住民の不安感の解消 ・災害時の迂回ルート確保による不安解消：77億円 ※（ ）内の数値は残事業の効果 (注1) 事業の効果に記載している金額は、防災面の効果を完成後50年間の便益額として現在価値化して算出した値であり、試算値に含む (注2) 費用に記載している金額は、現在価値化して算出した値

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 （対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更）	指標チェックの根拠	
1. 活力 円滑なモビリティの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a（費用便益分析対象区間）について 損失時間（整備無）：22,366千人・時間/年 損失削減時間：576千人・時間/年（22,366千人・時間/年⇒21,790千人・時間/年） 区間b（当該区間／並行区間）について：国道185号（東広島市安芸津町鳳早～竹原市中央3丁目） 並行区間等（当該区間）の損失時間：477千人・時間/年 並行区間等（当該区間）の損失削減率：約4割削減（477千人・時間/年⇒293千人・時間/年）	
	<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される		
	<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される		
	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	現道国道185号の混雑緩和によるバスの定時性の確保が見込まれる （芸陽バス：竹原～安芸津・大芝北～西条駅前～近畿大学線、竹原～安芸津線、安芸津～小松原～大芝北線）	
	<input type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる		
	<input type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる		
	物流効率化の支援	<input checked="" type="checkbox"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	対象港湾：重要港湾呉港、対象自治体名：竹原市 改善見込み（呉港～竹原市役所間 現況79分⇒将来77分（2分短縮））
		<input type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくは180規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	国際標準コンテナ車通行支障区間 木谷トンネル（空間高不足）を解消
	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
	<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する		
	<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり		
	<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である		
	<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である		
	<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する		
	<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発（300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上）への連絡道路となる		

1. 活力	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	隣接する日常活動圏中心都市：呉市、竹原市 改善見込み（呉市役所～竹原市役所間 現況75分⇒将来73分（2分短縮））
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	幅員狭小区間（三津大橋区間W=5.8m）、平面線形不良区間（最小曲線半径Rmin=25m）などの大型車離合困難区間を解消
		<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	日常活動圏中心都市：東広島市 改善見込み（安芸津町内から東広島市へのアクセス向上が期待される）
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
		<input type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	
		<input type="checkbox"/> 特別立法に基づく事業である	
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
		<input type="checkbox"/> 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業である	
	2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input checked="" type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上に該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる
<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される			
無電柱化による美しい町並みの形成		<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	竹原市・安芸津町の一部地域から国立呉医療センターまでの所要時間が1分短縮（現況57分⇒将来56分）	

3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は児童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり <input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	 第一次緊急輸送道路に位置付け 国道185号安芸津町内通行規制時において、代替路線を形成する
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される <input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	 現道国道185号に老朽橋が2橋存在（宮崎橋、三津大橋）
		<input type="checkbox"/> 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	
		<input type="checkbox"/> 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する	
		<input type="checkbox"/> 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす	
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：3千t-CO2/年 排出削減率：約0.2%削減（整備なし 1,230千t/年⇒整備あり 1,227千t/年）
	生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	（現況） 自動車NOx・PM法対策地域指定の別：無し NOxについて環境基準を達成している測定局数の実績（1箇所：安芸津三津小学校H16末廃止） （推計結果） 評価対象区間：便益算出対象エリア 排出削減量：19t/年、排出削減率：約0.4%削減（整備なし 5,519t/年⇒整備あり 5,500t/年）
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	（現況） 自動車NOx・PM法対策地域指定の別：無し SPMについて環境基準を達成している測定局数の実績（1箇所：安芸津三津小学校H16末廃止） （推計結果） 評価対象区間：便益算出対象エリア 排出削減量：2t/年、排出削減率：約0.4%削減（整備なし 472t/年⇒整備あり 470t/年）
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

費用と便益の内容

※便益は、災害時の迂回解消を含めた走行時間の短縮 等

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道185号	安芸津バイパス	L=6.1km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
7,900~9,300	2	中国地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成22年度		
単純合計	179億円	61億円	240億円
うち残事業分	124億円	46億円	170億円
基準年における 現在価値 (C)	158億円	18億円	177億円
うち残事業分	94億円	14億円	108億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成22年度			
供用年	平成32年度			
単年便益 (初年便益)	13億円	1.6億円	0.47億円	15億円
基準年における 現在価値 (B)	184億円	24億円	6.7億円	215億円
うち残事業分	119億円	16億円	4.6億円	140億円

交通状況の変化

様式-3①


事業名：安芸津バイパス(事業全体)

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 : 6.1km	交通量	[台/日]	—	8,400	
	走行時間	[分]	—	7	
	走行時間費用	[億円/年]	—	9.86	
②主な周辺道路	国道185号 : 10.5km	交通量	[台/日]	8,300	6,300
		走行時間	[分]	20	20
		走行時間費用	[億円/年]	28.83	20.91
	国道2号 : 9.5km	交通量	[台/日]	36,800	34,900
		走行時間	[分]	16	15
		走行時間費用	[億円/年]	119.61	110.35
	国道432号 : 6.7km	交通量	[台/日]	13,700	11,900
		走行時間	[分]	10	10
		走行時間費用	[億円/年]	26.13	22.62
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
	交通量	[台/日]			
	走行時間	[分]			
	走行時間費用	[億円/年]			
③その他道路合計 : 1018.7km	走行時間費用	[億円/年]	2,239.50	2,237.53	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 1051.5km	走行時間短縮便益	[億円/年]	2,414.07	2,401.27	12.80

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)

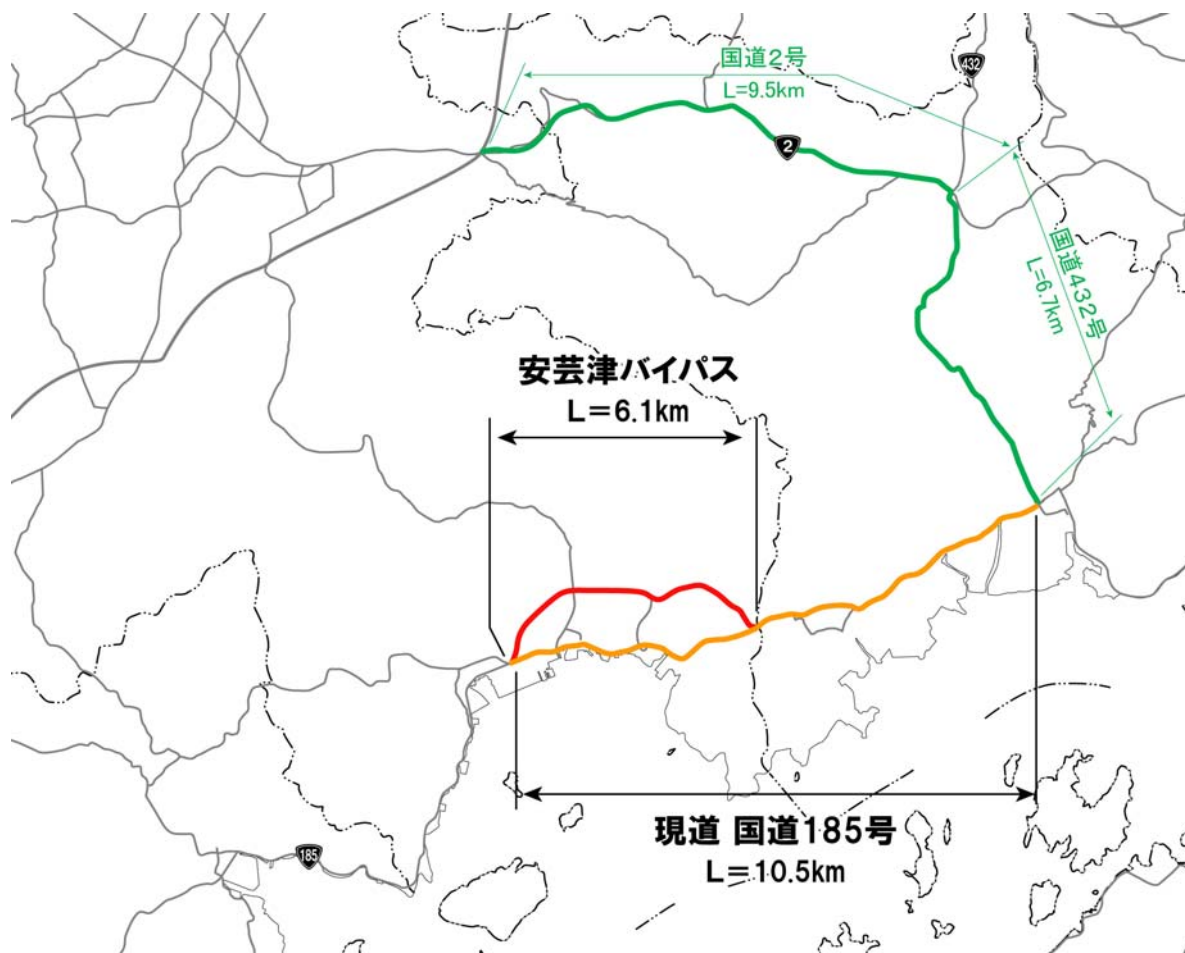

交通状況の変化

様式-3①


事業名：安芸津バイパス（残事業）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 : 6.1km	交通量	[台/日]	5,200	8,400	
	走行時間	[分]	2	7	
	走行時間費用	[億円/年]	1.51	9.86	
②主な周辺道路	国道185号 : 10.5km	交通量	[台/日]	8,800	6,300
		走行時間	[分]	20	20
		走行時間費用	[億円/年]	30.15	20.91
	国道2号 : 9.5km	交通量	[台/日]	35,400	34,900
		走行時間	[分]	16	15
		走行時間費用	[億円/年]	112.56	110.35
	国道432号 : 6.7km	交通量	[台/日]	12,400	11,900
		走行時間	[分]	10	10
		走行時間費用	[億円/年]	23.43	22.62
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
	交通量	[台/日]			
	走行時間	[分]			
	走行時間費用	[億円/年]			
③その他道路合計 : 1018.7km	走行時間費用	[億円/年]	2,241.92	2,237.53	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 1051.5km	走行時間短縮便益	[億円/年]	2,409.57	2,401.27	8.30

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)

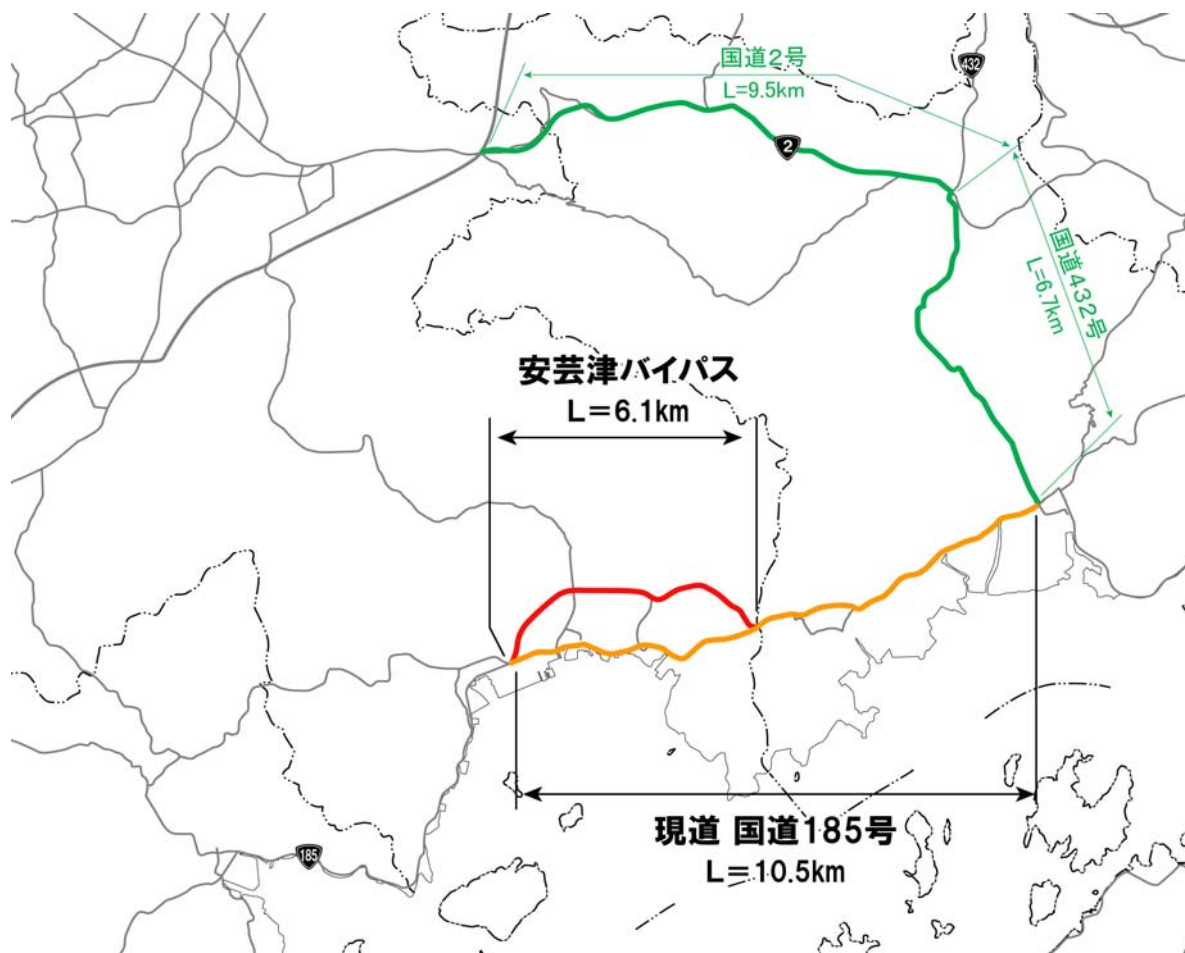

算出の条件

事業名：安芸津バイパス

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成22年度	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42年)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみを推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	その他()		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
	その他(最終配分交通量とQV式との関係から平均速度を設定)	<input checked="" type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	()%
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載 過去10年間の通行止め日数より算出	(0.014)日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載 過去の実績値がないため	<input type="checkbox"/>
冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
	考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載 冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	()日	
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:安芸津バイパス(事業全体)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.21	6.1	1.28

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-22年目	H 10	1.6010	102.8	0.19	0.27		
-21年目	H 11	1.5395	101.3	0.48	0.67		
-20年目	H 12	1.4802	99.7	0.19	0.26		
-19年目	H 13	1.4233	98.4	3.06	4.04		
-18年目	H 14	1.3686	96.6	7.12	9.21		
-17年目	H 15	1.3159	95.4	6.27	7.90		
-16年目	H 16	1.2653	94.4	0.65	0.80		
-15年目	H 17	1.2167	93.2	4.24	5.05		
-14年目	H 18	1.1699	92.5	10.63	12.27		
-13年目	H 19	1.1249	91.7	12.79	14.32		
-12年目	H 20	1.0816	91.3	8.70	9.41		
-11年目	H 21	1.0400	91.3	0.90	0.94		
-10年目	H 22	1.0000	91.3	0.19	0.19		
-9年目	H 23	0.9615	91.3	0.95	0.91		
-8年目	H 24	0.9246	91.3	0.19	0.18		
-7年目	H 25	0.8890	91.3	5.25	4.67		
-6年目	H 26	0.8548	91.3	8.15	6.97		
-5年目	H 27	0.8219	91.3	12.79	10.51		
-4年目	H 28	0.7903	91.3	20.43	16.15		
-3年目	H 29	0.7599	91.3	35.16	26.72		
-2年目	H 30	0.7307	91.3	26.19	19.14		
-1年目	H 31	0.7026	91.3	14.44	10.15		
供用開始年次	H 32	0.6756	91.3			1.22	0.82
1年目	H 33	0.6496	91.3			1.22	0.79
2年目	H 34	0.6246	91.3			1.22	0.76
3年目	H 35	0.6006	91.3			1.22	0.73
4年目	H 36	0.5775	91.3			1.22	0.70
5年目	H 37	0.5553	91.3			1.22	0.68
6年目	H 38	0.5339	91.3			1.22	0.65
7年目	H 39	0.5134	91.3			1.22	0.63
8年目	H 40	0.4936	91.3			1.22	0.60
9年目	H 41	0.4746	91.3			1.22	0.58
10年目	H 42	0.4564	91.3			1.22	0.56
11年目	H 43	0.4388	91.3			1.22	0.54
12年目	H 44	0.4220	91.3			1.22	0.51
13年目	H 45	0.4057	91.3			1.22	0.49
14年目	H 46	0.3901	91.3			1.22	0.48
15年目	H 47	0.3751	91.3			1.22	0.46
16年目	H 48	0.3607	91.3			1.22	0.44
17年目	H 49	0.3468	91.3			1.22	0.42
18年目	H 50	0.3335	91.3			1.22	0.41
19年目	H 51	0.3207	91.3			1.22	0.39
20年目	H 52	0.3083	91.3			1.22	0.38
21年目	H 53	0.2965	91.3			1.22	0.36
22年目	H 54	0.2851	91.3			1.22	0.35
23年目	H 55	0.2741	91.3			1.22	0.33
24年目	H 56	0.2636	91.3			1.22	0.32
25年目	H 57	0.2534	91.3			1.22	0.31
26年目	H 58	0.2437	91.3			1.22	0.30
27年目	H 59	0.2343	91.3			1.22	0.29
28年目	H 60	0.2253	91.3			1.22	0.27
29年目	H 61	0.2166	91.3			1.22	0.26
30年目	H 62	0.2083	91.3			1.22	0.25
31年目	H 63	0.2003	91.3			1.22	0.24
32年目	H 64	0.1926	91.3			1.22	0.23
33年目	H 65	0.1852	91.3			1.22	0.23
34年目	H 66	0.1780	91.3			1.22	0.22
35年目	H 67	0.1712	91.3			1.22	0.21
36年目	H 68	0.1646	91.3			1.22	0.20
37年目	H 69	0.1583	91.3			1.22	0.19
38年目	H 70	0.1522	91.3			1.22	0.19
39年目	H 71	0.1463	91.3			1.22	0.18
40年目	H 72	0.1407	91.3			1.22	0.17
41年目	H 73	0.1353	91.3			1.22	0.17
42年目	H 74	0.1301	91.3			1.22	0.16
43年目	H 75	0.1251	91.3			1.22	0.15
44年目	H 76	0.1203	91.3			1.22	0.15
45年目	H 77	0.1157	91.3			1.22	0.14
46年目	H 78	0.1112	91.3			1.22	0.14
47年目	H 79	0.1069	91.3			1.22	0.13
48年目	H 80	0.1028	91.3			1.22	0.13
49年目	H 81	0.0989	91.3	-25.97	-2.57	1.22	0.12
合計				152.99	158.14	61.00	18.41

単純事業費計		178.96	61.00
--------	--	--------	-------

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:安芸津バイパス(残事業)

				単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)	
				0.21	4.6	0.97	
年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-9年目	H 23	0.9615	91.3	0.95	0.91		
-8年目	H 24	0.9246	91.3	0.19	0.18		
-7年目	H 25	0.8890	91.3	5.25	4.67		
-6年目	H 26	0.8548	91.3	8.15	6.97		
-5年目	H 27	0.8219	91.3	12.79	10.51		
-4年目	H 28	0.7903	91.3	20.43	16.15		
-3年目	H 29	0.7599	91.3	35.16	26.72		
-2年目	H 30	0.7307	91.3	26.19	19.14		
-1年目	H 31	0.7026	91.3	14.44	10.15		
供用開始年次	H 32	0.6756	91.3			0.92	0.62
1年目	H 33	0.6496	91.3			0.92	0.60
2年目	H 34	0.6246	91.3			0.92	0.57
3年目	H 35	0.6006	91.3			0.92	0.55
4年目	H 36	0.5775	91.3			0.92	0.53
5年目	H 37	0.5553	91.3			0.92	0.51
6年目	H 38	0.5339	91.3			0.92	0.49
7年目	H 39	0.5134	91.3			0.92	0.47
8年目	H 40	0.4936	91.3			0.92	0.45
9年目	H 41	0.4746	91.3			0.92	0.44
10年目	H 42	0.4564	91.3			0.92	0.42
11年目	H 43	0.4388	91.3			0.92	0.40
12年目	H 44	0.4220	91.3			0.92	0.39
13年目	H 45	0.4057	91.3			0.92	0.37
14年目	H 46	0.3901	91.3			0.92	0.36
15年目	H 47	0.3751	91.3			0.92	0.35
16年目	H 48	0.3607	91.3			0.92	0.33
17年目	H 49	0.3468	91.3			0.92	0.32
18年目	H 50	0.3335	91.3			0.92	0.31
19年目	H 51	0.3207	91.3			0.92	0.29
20年目	H 52	0.3083	91.3			0.92	0.28
21年目	H 53	0.2965	91.3			0.92	0.27
22年目	H 54	0.2851	91.3			0.92	0.26
23年目	H 55	0.2741	91.3			0.92	0.25
24年目	H 56	0.2636	91.3			0.92	0.24
25年目	H 57	0.2534	91.3			0.92	0.23
26年目	H 58	0.2437	91.3			0.92	0.22
27年目	H 59	0.2343	91.3			0.92	0.22
28年目	H 60	0.2253	91.3			0.92	0.21
29年目	H 61	0.2166	91.3			0.92	0.20
30年目	H 62	0.2083	91.3			0.92	0.19
31年目	H 63	0.2003	91.3			0.92	0.18
32年目	H 64	0.1926	91.3			0.92	0.18
33年目	H 65	0.1852	91.3			0.92	0.17
34年目	H 66	0.1780	91.3			0.92	0.16
35年目	H 67	0.1712	91.3			0.92	0.16
36年目	H 68	0.1646	91.3			0.92	0.15
37年目	H 69	0.1583	91.3			0.92	0.15
38年目	H 70	0.1522	91.3			0.92	0.14
39年目	H 71	0.1463	91.3			0.92	0.13
40年目	H 72	0.1407	91.3			0.92	0.13
41年目	H 73	0.1353	91.3			0.92	0.12
42年目	H 74	0.1301	91.3			0.92	0.12
43年目	H 75	0.1251	91.3			0.92	0.12
44年目	H 76	0.1203	91.3			0.92	0.11
45年目	H 77	0.1157	91.3			0.92	0.11
46年目	H 78	0.1112	91.3			0.92	0.10
47年目	H 79	0.1069	91.3			0.92	0.10
48年目	H 80	0.1028	91.3			0.92	0.09
49年目	H 81	0.0989	91.3	-15.76	-1.56	0.92	0.09
合計				107.79	93.82	46.00	13.89
単純事業費計					123.55		46.00

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

