


## 再評価結果（平成26年度事業継続箇所）

担当課：道路局国道・防災課  
担当課長名：茅野 牧夫

事業名 地域高規格道路 <small>じょうしん じどうしゃどう</small> 一般国道145号 <small>あがつまにし</small> 吾妻西バイパス	事業 区分 一般国道	事業 主体 群馬県
起終点 自：群馬県吾妻郡東吾妻町松谷 <small>あがつまぐんひがしあがつままちまつや</small> 至：群馬県吾妻郡東吾妻町厚田 <small>あがつまぐんひがしあがつままちあつた</small>		延長 7.0km
<b>事業概要</b> 上信自動車道は、群馬県渋川市の関越自動車道・渋川伊香保ICと長野県東御市の上信越自動車道・東部湯の丸ICを連絡し、吾妻地域及び沼田・渋川地域集積圏と長野県の上田地域集積圏との連携強化を図るとともに、広域交流を促進する延長約80kmの地域高規格道路である。 一般国道145号川島BPは、上信自動車道の一部を構成する延長7.0kmの2車線道路である。		
H21年度事業化	都市計画決定なし	H24年度用地着手
H25年度工事着手		
全体事業費	97億円	事業進捗率 23%
計画交通量	7,300～12,800台/日	
費用対効果分析結果	B/C (事業全体) 1.4 (残事業) 1.8	総費用 (残事業)/(事業全体) 69/89億円 事業費：62/83億円 維持管理費：7/7億円
		総便益 (残事業)/(事業全体) 125/125億円 走行時間短縮便益：89/89億円 走行経費減少便益：17/17億円 交通事故減少便益：18/18億円
		基準年 平成25年
<b>感度分析の結果</b> (事業全体) 交通量 : B/C=1.3～1.5 (交通量 ±10%) 事業費 : B/C=1.3～1.5 (事業費 ±10%) 事業期間 : B/C=1.3～1.5 (事業期間±20%) (残事業) 交通量 : B/C=1.6～2.0 (交通量 ±10%) 事業費 : B/C=1.7～2.0 (事業費 ±10%) 事業期間 : B/C=1.8～2.0 (事業期間±20%)		
<b>事業の効果等</b> ・地域高規格道路「上信自動車道」の一部であり、吾妻地域の産業競争力の向上に寄与 ・地域防災力の強化や、第三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる ・草津温泉等の観光地へのアクセス向上が見込まれる		
<b>関係する地方公共団体等の意見</b> ・渋川市をはじめとする3市4町2村の首長や議会議長等で構成される「上信自動車道建設促進期成同盟会」より、当該路線の整備促進の要望を受けている。		
<b>事業評価監視委員会の意見</b> ・群馬県公共事業再評価委員会(第36回平成26年2月10日)において審議の結果「事業継続」が答申された。 ・知事は、上記委員会の答申を踏まえ平成26年2月14日「事業継続」の対応方針を決定。		
<b>事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等</b> ・平成23年3月19日に北関東自動車道が全線開通したことにより、群馬県内の高規格幹線道路網が完成。 ・平成23年12月20日に上信自動車道の一部区間であるハツ場バイパス(L=10.8km)が全線暫定供用した。		
<b>事業の進捗状況、残事業の内容等</b> ・平成21年度に事業化され、用地進捗率42%、事業進捗率23%となっている。 ・平成30年度全線開通予定。		
<b>事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等</b> ・計画の具体化にあたって地元住民や関係機関との合意形成に十分な時間をかけた。 ・今後も地元や関係機関との協力体制のもと、早期供用に向けて事業を推進する。		
<b>施設の構造や工法の変更等</b> ・道路縦断計画の一部見直しにより、橋梁延長の短縮や土工量収支に配慮し、処分費低減・残土の有効活用に努め、コスト縮減に努めている。		
対応方針 事業継続		
<b>対応方針決定の理由</b> ・以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性・重要性は変わらないと考えられる。		
<b>事業概要図</b>		

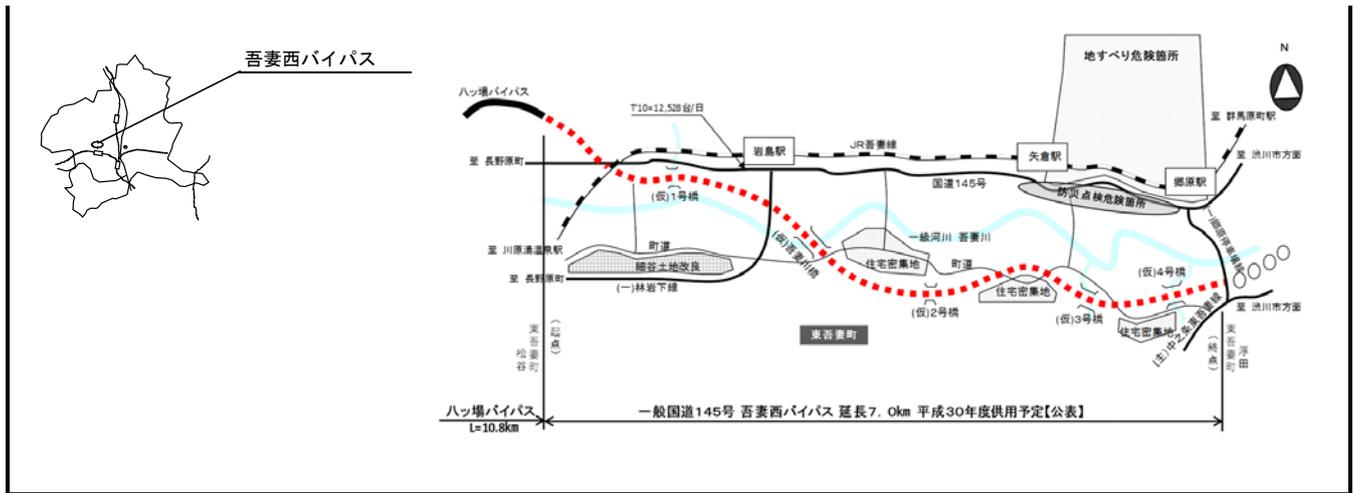

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したものの。  
 ※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
