


再評価結果（平成29年度事業継続箇所）

担当課：道路局国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

事業名：地域高規格道路 上信自動車道 一般国道145号 吾妻西バイパス	事業区分：一般国道	事業主体：群馬県			
起終点：自：群馬県吾妻郡東吾妻町松谷 至：群馬県吾妻郡東吾妻町厚田	延長：7.0km				
事業概要 上信自動車道は、群馬県の沼田・渋川地域集積圏と長野県の上田地域集積圏との連携を強化するとともに、広域交流を促進する延長約80kmの地域高規格道路である。 一般国道145号吾妻西バイパスは、上信自動車道の一部を構成し、土砂災害危険箇所の回避を目的としたバイパス事業である。					
H21年度事業化	都市計画決定なし	H24年度用地着手	H25年度工事着手		
全体事業費	124億円	事業進捗率	46%	供用済延長	0km
計画交通量	13,000台/日				
費用対効果分析結果	B/C：(事業全体) 1.3 (残事業) 2.9	総費用：(残事業)/(事業全体) 55/123億円 (事業費：49/116億円) (維持管理費：6.4/6.4億円)	総便益：(残事業)/(事業全体) 160/160億円 (走行時間短縮便益：126/126億円) (走行経費減少便益：24/24億円) (交通事故減少便益：9.7/9.7億円)	基準年：平成28年	
感度分析の結果 (事業全体) 交通量：B/C=1.2~1.4 (交通量 ±10%) (残事業) 交通量：B/C=2.6~3.2 (交通量 ±10%) 事業費：B/C=1.3~1.4 (事業費 ±10%) 事業費：B/C=2.7~3.2 (事業費 ±10%) 事業期間：B/C=1.3~1.4 (事業期間±20%) 事業期間：B/C=2.8~3.0 (事業期間±20%)					
事業の効果等 ・地域高規格道路「上信自動車道」の一部であり、吾妻地域の産業競争力の向上に寄与 ・災害に対する道路の信頼性が向上し、地域の防災力が強化されるほか、三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる ・草津温泉等の観光地へのアクセス向上が見込まれる					
関係する地方公共団体等の意見 ・渋川市をはじめとする3市4町2村の首長や議会議長等で構成される「上信自動車道建設促進期成同盟会」より、当該路線の整備促進の要望を受けている。					
事業評価監視委員会の意見 ・群馬県公共事業再評価委員会(第42回平成29年1月23日)において審議の結果「事業継続」が答申された。 ・知事は、上記委員会の答申を踏まえ平成29年2月9日「事業継続」の対応方針を決定。					
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 ・平成23年3月19日に北関東自動車道が全線開通したことにより、群馬県内の高規格幹線道路網が完成。 ・平成23年12月20日に上信自動車道の一部区間である八ッ場バイパス(L=10.8km)が全線暫定供用した。					
事業の進捗状況、残事業の内容等 ・平成21年度に事業化され、用地進捗率82%、事業進捗率46%となっている。					
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 ・計画の具体化にあたって地元住民や関係機関との合意形成に十分な時間をかけた。 ・一部区間で用地取得が難航しているが、任意交渉と合わせて土地収用法の手続きを進め、平成33年度的全線開通を目指して事業を推進する。					
施設の構造や工法の変更等 ・土工量収支に配慮し、処分費低減・残土の有効活用に努め、コスト縮減に努めている。					
対応方針：事業継続					
対応方針決定の理由 ・以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性・重要性は変わらないと考えられる。					

事業概要図

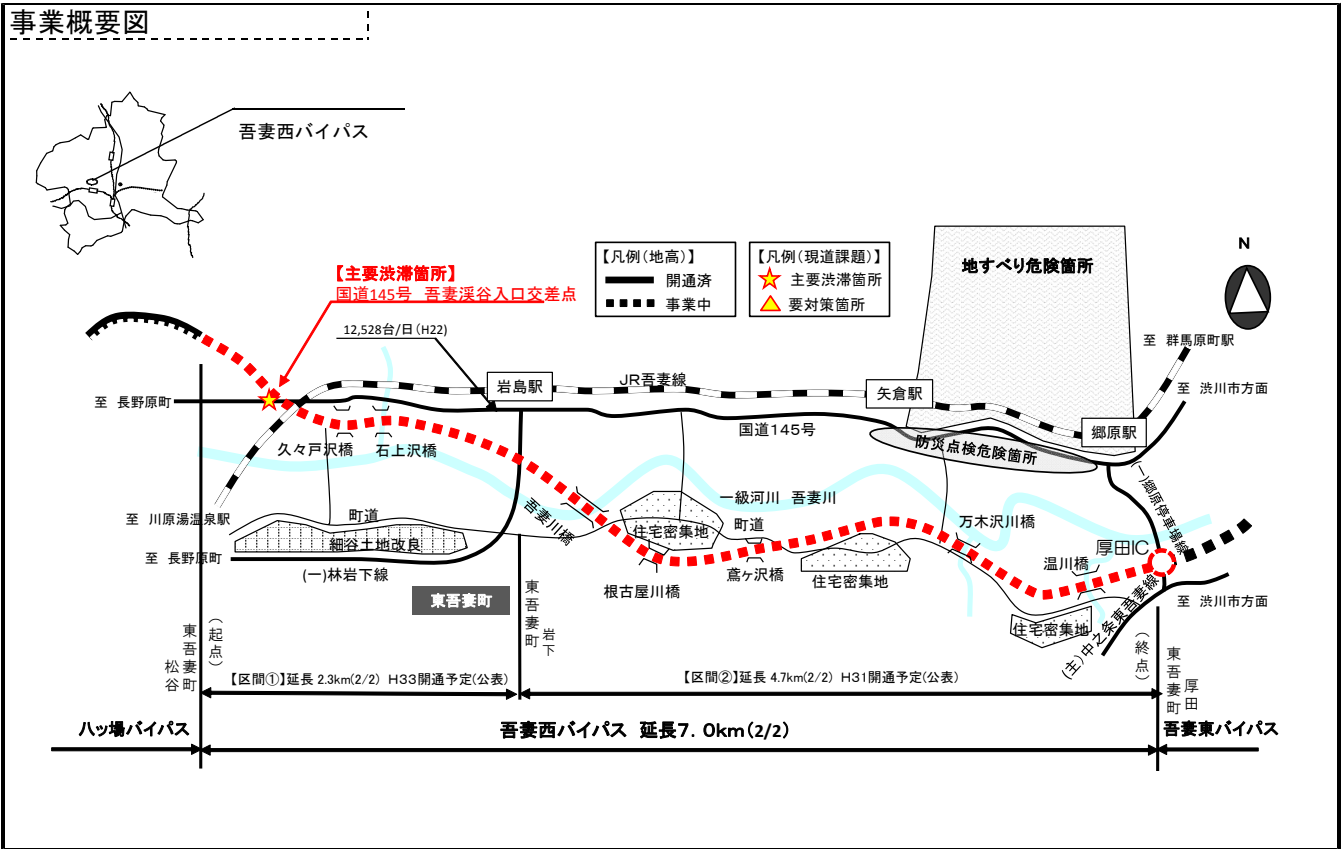

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
 ※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
