

水道

- 水道については、発災後、最大で約108,000戸が断水する状況となりましたが、国土交通省及び日本水道協会より水道技術者を全国から派遣し、点検・応急復旧作業を進めており、現在、断水戸数は約36,600戸（八代市、宇城市、甲佐町、氷川町）まで減少しています。
- 今後の復旧見込みは以下の通りです。

市町村	地区	断水解消見込み
八代市	旧八代市地区	8月末
	日奈久地区	解消
	鏡町・千丁町	8月末
	東陽町	解消
	泉町	解消
宇城市	松橋地区	8月末
	小川地区	8月末
	豊野地区	8月末
	不知火地区の一部	解消


市町村	地区	断水解消見込み
甲佐町	船津地区	8月初旬
	南三箇地区	解消
	中山地区	8月初旬
	津志田地区	解消
	有安地区の一部	8月初旬
氷川町		8月末

※下線部は、今回新たに断水が解消した地区

※避難所、医療機関、福祉施設等の重要施設につながる管路については、上下水道一体で優先的に復旧を図る。

令和8年熊本地震における上下水道の復旧見込みについて②

令和8年8月7日10時時点

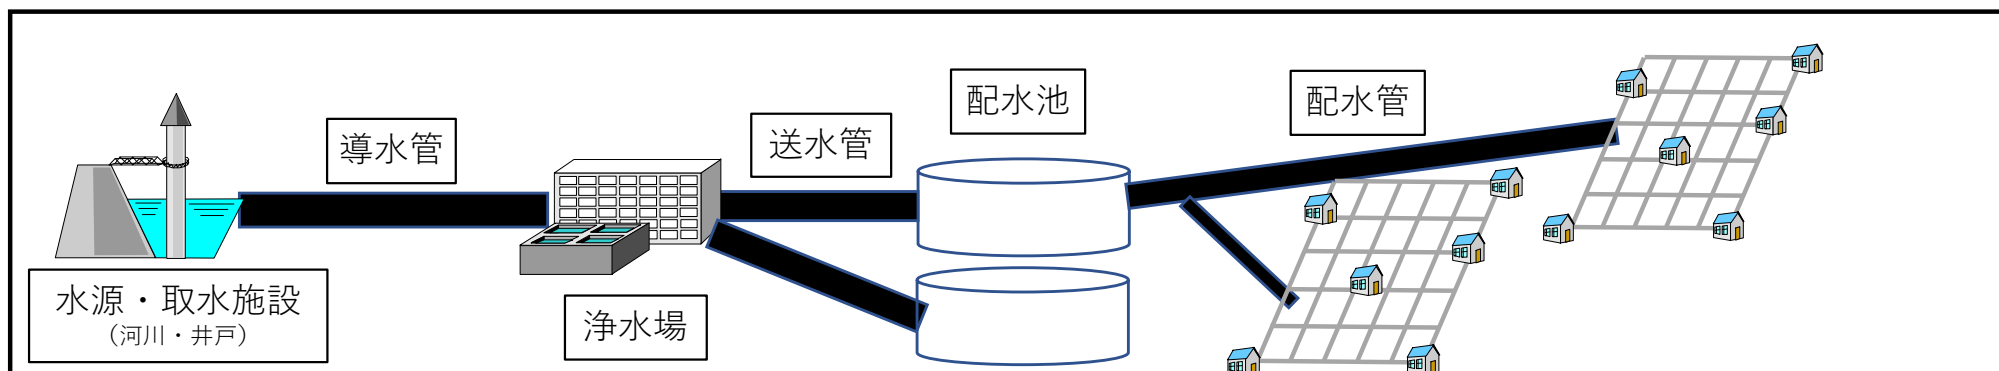

8/4時点で概ねの機能を確保

8月末までに完了見込み

発災 (7/28)

直後

8/4

8月末完了見込み

(応急復旧の流れ)

現地調査

被害・漏水調査

復旧計画

全体計画の策定

応急復旧

施設の修繕工事 (上流から順番に施工)

被災自治体

調査・計画する職員が不足

工事設計・監督職員が不足
工事業者が不足

国土交通省
日本水道協会

↑ 応援
全国の自治体
(先遣隊+本調査)

↑ 応援
全国の自治体+工事業者

下水道

- 下水道については、国土交通省、全国の自治体※、日本下水道事業団より下水道技術者を派遣し、点検・応急復旧作業を実施。
※日本下水道協会の全国の相互支援ルールに基づき派遣
- 現在、点検はすべて完了し、2自治体（宇城市、氷川町）において応急復旧作業を進めており、作業完了の見込みは以下の通りです。
- なお、応急復旧作業中の地区においても下水道は使用可能です。

市町村	地区	作業完了見込み
熊本市	熊本市北区の一部	完了
八代市	旧千丁町、旧鏡町	完了
	旧八代市	完了
	新八代駅周辺地区	完了
宇土市	宇土市街地	完了
宇城市	旧小川町	8月中旬
	旧松橋町、旧不知火町	完了
氷川町	旧竜北町	8月中旬
	旧宮原町	8月中旬

※下線部は、今回新たに完了した地区
