

ぬのざわがわ  
布沢川生活貯水池建設事業の検証に係る検討

報告書 補足資料

平成 25 年 1 月

静 岡 県

---

---

布沢川生活貯水池建設事業の検証に係る検討概要資料

目 次

1. 興津川流域及び河川の概要 ..... 1

2. 興津川水系河川整備計画（平成 14 年 6 月策定・公表（平成 21 年 4 月一部変更））（抜粋）・1

3. 布沢川生活貯水池の事業経緯・現在の進捗状況 ..... 2

---

# 1. 興津川流域及び河川の概要



出典：「興津川水系河川整備計画（平成 21 年）」、静岡県

図 1.1 興津川水系流域図



写真①：布沢川（中流域：洪水防御区域）



写真②：布沢川（中流域）



写真③：布沢川（下流域）

# 2. 興津川水系河川整備計画（平成 14 年 6 月策定・公表（平成 21 年 4 月一部変更））（抜粋）


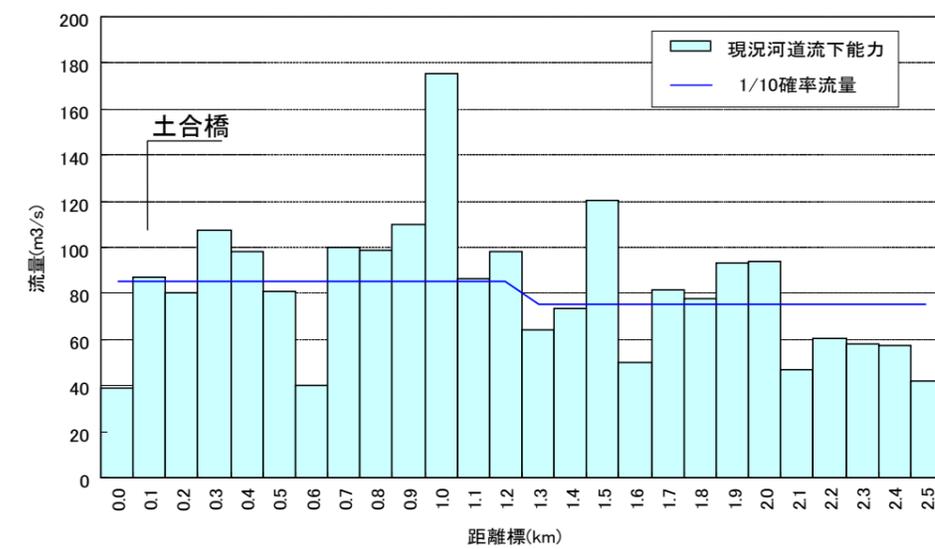


図 2.1 布沢川流下能力図

### 3. 布沢川生活貯水池の事業経緯・現在の進捗状況

表 3.1 布沢川生活貯水池建設事業の経緯

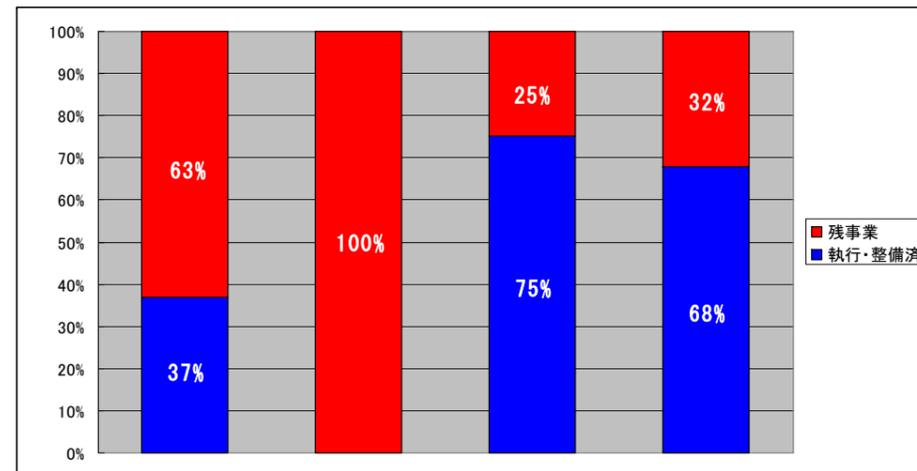

	事業費	用地	工事用道路 (吉原バイパス)	工事用道路 (吉原2号線)
全体	170.0 億円	7.6 ha	1.1 km	2.7 km
執行・整備済	62.8 億円	0 ha	0.8 km	1.8 km

図 3.1 事業進捗状況
