

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道50号 前橋笠懸道路
事業主体	関東地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	費用便益比 (B/C) = 3.2 (経済的純現在価値 (B-C) = 667億円、経済的內部収益率 (EIRR) = 10%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a (費用便益分析対象区間) について 渋滞損失時間 (現況) : 28,764,000人・時間/年 渋滞損失削減時間 : 2,891,000人・時間/年 (35,546,000人・時間/年⇒32,655,000人・時間/年) 削減率 : 8.1% 区間b (当該区間/平行区間) について : (一般国道50号、前橋市今井町～笠懸町鹿) 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失時間 : 1,220,000人・時間/年 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失削減率 : 9割削減
		■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	対象区間 (伊勢崎市赤堀町、H11センサス区間1024)、改善見込み (旅行速度18.5km/h⇒52.8km/h)
		□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上 の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	踏切なし
		■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	前橋公園～東大室 : 13往復/日
	□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる		
	□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる		
	物流効率化の支援	□ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	
		□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	
□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する			

1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
		<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
		<input checked="" type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	幹線都市計画道路網密度の変化 (0.82km/km2⇒0.89km/km2) ※前橋市、旧赤堀町、笠懸町の都市計画面積、都市計画道路延長より算出
		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	※桐生～前橋間は、北関東自動車道の方が早い。 ※既に最小車道幅員が5.5m以上を確保しているため、当該路線が整備されても改良済み道路の連絡数は変わらない
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	日常活動圏中心都市：前橋市、桐生市 改善見込み(前橋市～桐生市間の所要時間 74分⇒40分)
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	群馬県総合計画、前橋市・大胡町・宮城村・粕川村合併まちづくり事業計画(新市建設計画)
		<input type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	
		<input type="checkbox"/> 特別立法に基づく事業である	
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
		<input type="checkbox"/> 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業である	
	2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる
<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される			
無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り		
	<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する		
安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	三次医療施設：救命救急センター(国立高崎病院、前橋赤十字病院)、群馬大学医学部付属病院 桐生市～前橋赤十字病院間の所要時間：65分→36分	

3. 安全	安全な生活環境の確保	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる</li> </ul>	前橋市今井交差点（死傷事故率：525件/億台キロ） 当該区間の事故件数（現況：197件→将来：146件 ※合計で26%減少、現道では54%減少）
		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される</li> </ul>	
	災害への備え	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり</li> </ul>	群馬県地域防災計画：第一次緊急輸送道路として位置付け
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する</li> </ul>	代替する緊急輸送道路路線名：県道73号伊勢崎大間々線～県道352号 代替する区間：今井町～鹿（迂回時所要時間28分→14分に短縮）
		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす</li> </ul>			
4. 環境	地球環境の保全	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量</li> </ul>	CO2排出削減量：1,800t/年
		生活環境の改善・保全	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 現道等における自動車からのNO2排出削減率</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 現道等における自動車からのSPM排出削減率</li> </ul>		（現況） 自動車NOx・PM法対策地域指定なし SPMについて環境基準を達成している測定局数：9局 （推計結果） 評価対象区間：前橋市、伊勢崎市（旧境町除く）、太田市のうち旧藪塚本町、桐生市（旧黒保根村除く）、大間々町、笠懸町 排出削減量：0.2t/年、排出削減率：0.1%削減 （バイパス事業の場合） バイパス等についてSPM排出増加量6.3t/年
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある</li> </ul>		夜間要請限度（70db）の超過状況：①赤堀町今井252-1（75db）、②前橋市東大室町85（72db） ※H15道路環境センサス
	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ その他、環境や景観上の効果が期待される</li> </ul>		
	5. その他	他のプロジェクトとの関係	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり</li> </ul>			群馬県総合計画：幹線交通整備に向けた主要事業として位置付けあり 前橋市・大胡町・宮城村・粕川村合併まちづくり事業計画（新市建設計画）：主要事業の都市間幹線道路整備事業として位置付けあり
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる</li> </ul>			

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BPの別
一般国道50号	前橋笠懸道路	L = 12.5 km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
30,900 ~ 38,500	4	国土交通省 関東地方整備局

## 費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成17年度		
単純合計	407億円	134億円	541億円
うち残事業分	398億円	134億円	532億円
基準年における 現在価値(C)	271億円	34億円	305億円
うち残事業分	262億円	34億円	296億円

様式2(再評価)

便 益

	走行時間 短縮便益	走行費用 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基準年	平成17年度			
供用年	平成35年度			
単年便益 (初年便益)	44億円	5億円	0億円	49億円
基準年における 現在価値(B)	870億円	93億円	9億円	972億円
うち残事業分	870億円	93億円	9億円	972億円

結 果

費用便益比(事業全体)	3.2
費用便益比(残事業)	3.3

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

# 交通状況の変化

事業名：前橋笠懸道路（事業全体）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [前橋笠懸道路] : 12.5km	交通量	[台/日]	17,700	38,500	
	走行時間	[分]	10	14	
	走行時間費用	[億円/年]	52.66	137.48	
②主な周 辺道路	現道(国道 50号) : 6.6km	交通量	[台/日]	15,100	10,100
		走行時間	[分]	12	11
		走行時間費用	[億円/年]	47.06	28.04
	(主)前橋 大間々桐 生線 : 10.6km	交通量	[台/日]	16,000	14,000
		走行時間	[分]	15	15
		走行時間費用	[億円/年]	63.11	50.87
	(主)前橋 西久保線 : 8.0km	交通量	[台/日]	17,000	14,100
		走行時間	[分]	13	12
		走行時間費用	[億円/年]	59.50	42.42
	(主)前橋 館林線 : 9.6km	交通量	[台/日]	31,500	31,500
		走行時間	[分]	21	20
		走行時間費用	[億円/年]	229.31	207.08
	(一)笠懸 赤堀線 : 8.4km	交通量	[台/日]	9,000	5,600
		走行時間	[分]	14	12
		走行時間費用	[億円/年]	31.77	17.27
	(主)桐生 伊勢崎線 : 7.6km	交通量	[台/日]	24,700	18,500
		走行時間	[分]	10	10
		走行時間費用	[億円/年]	65.51	47.90
	(一)国定 藪塚線 : 6.4km	交通量	[台/日]	13,100	9,800
		走行時間	[分]	10	9
		走行時間費用	[億円/年]	32.21	22.91
③その他道路合計 : 816.5km	走行時間費用	[億円/年]	4,847.03	4,785.69	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：886.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	5428.18	5339.66	88.52

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※ 1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※ 2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：前橋笠懸道路(事業全体)

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

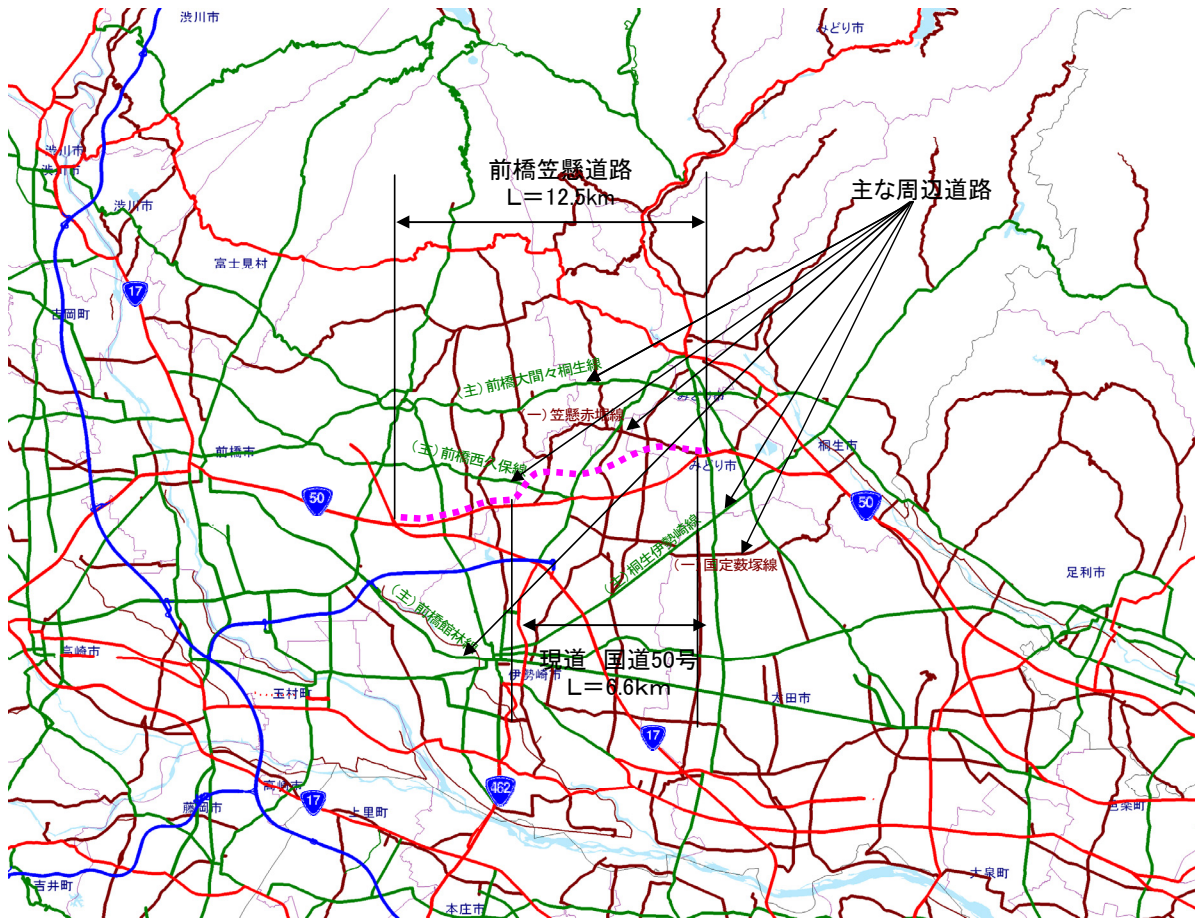

# 交通状況の変化

事業名：前橋笠懸道路（残事業）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [前橋笠懸道路] : 12.5km	交通量	[台/日]	17,700	38,500	
	走行時間	[分]	10	14	
	走行時間費用	[億円/年]	52.66	137.48	
②主な周辺道路	現道(国道50号) : 6.6km	交通量	[台/日]	15,100	10,100
		走行時間	[分]	12	11
		走行時間費用	[億円/年]	47.06	28.04
	(主)前橋大間々桐生線 : 10.6km	交通量	[台/日]	16,000	14,000
		走行時間	[分]	15	15
		走行時間費用	[億円/年]	63.11	50.87
	(主)前橋西久保線 : 8.0km	交通量	[台/日]	17,000	14,100
		走行時間	[分]	13	12
		走行時間費用	[億円/年]	59.50	42.42
	(主)前橋館林線 : 9.6km	交通量	[台/日]	31,500	31,500
		走行時間	[分]	21	20
		走行時間費用	[億円/年]	229.31	207.08
	(一)笠懸赤堀線 : 8.4km	交通量	[台/日]	9,000	5,600
		走行時間	[分]	14	12
		走行時間費用	[億円/年]	31.77	17.27
	(主)桐生伊勢崎線 : 7.6km	交通量	[台/日]	24,700	18,500
		走行時間	[分]	10	10
		走行時間費用	[億円/年]	65.51	47.90
	(一)国定藪塚線 : 6.4km	交通量	[台/日]	13,100	9,800
		走行時間	[分]	10	9
走行時間費用		[億円/年]	32.21	22.91	
③その他道路合計 : 816.5km	走行時間費用	[億円/年]	4,847.03	4,785.69	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：886.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	5428.18	5339.66	88.52

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※ 1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※ 2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。


※ 3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。



事業名：前橋笠懸道路(残事業)

【 図面 (①、②)に該当する道路を明示すること) 】

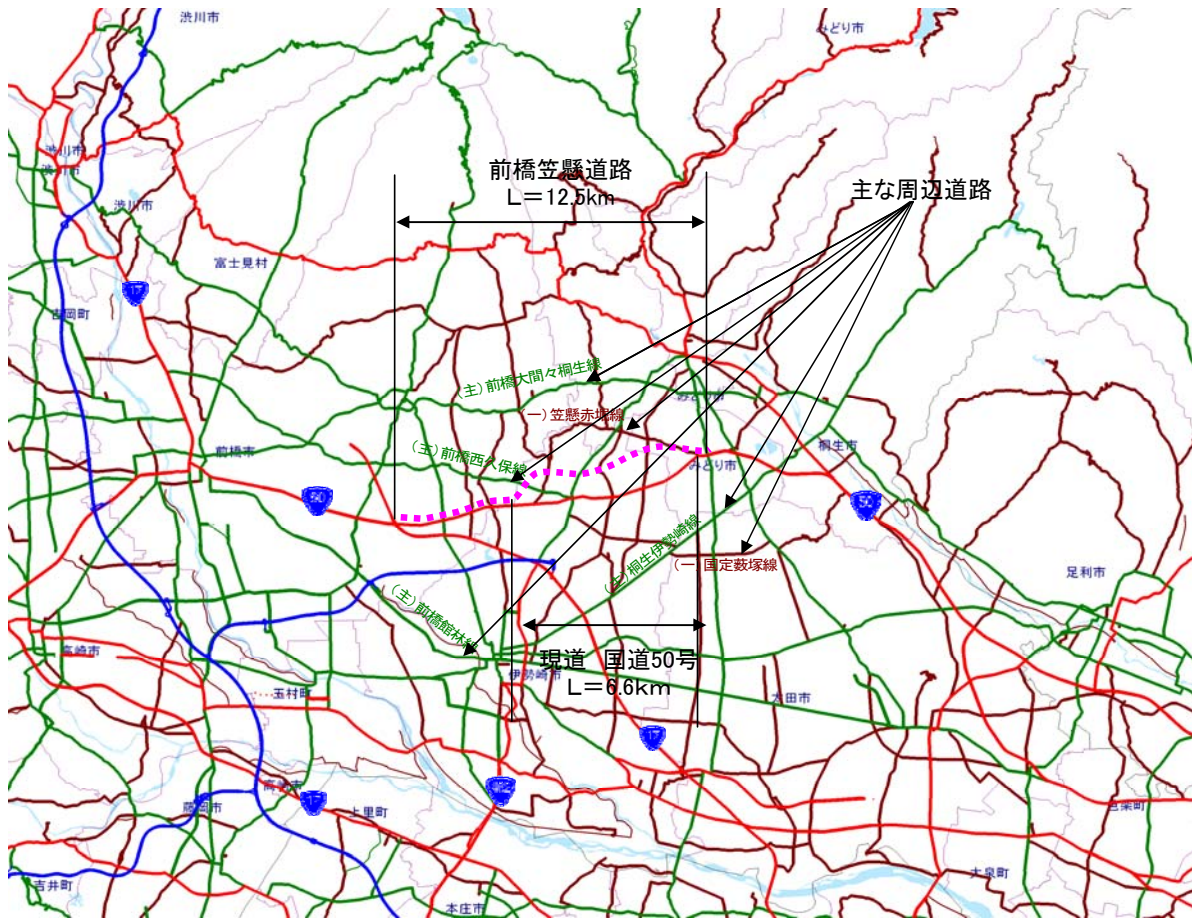

## 費用便益分析の条件

事業名：前橋笠懸道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)		
	その他		
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成17年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	
		整備の有無のいずれかのみ推計	有 無
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	(H11センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	
		その他( )	
	開発交通量の考慮	無	
		有	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載
	配分交通量の推計手法	Q - V式を用いた配分	
転換率式を用いた配分			
Q - V式と転換率式の併用による配分			
均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)			
簡易手法			
簡易手法の場合		小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他( )	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載	交通量が、交通容量(Qmax ~ Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin ~ Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	
	最終配分の速度 採用理由を記載		
	その他( )		
	その他( )		



費用の現在価値算定表(事業全体)

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 一般国道50号前橋笠懸道路

採用単価の根拠 一般国道(直轄)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.27	13	3.51

年次	年度	割戻率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-22年目	H 13	1.1699	2.00	2.34	0.00	0.00
-21年目	H 14	1.1249	1.43	1.61	0.00	0.00
-20年目	H 15	1.0816	1.74	1.89	0.00	0.00
-19年目	H 16	1.0400	1.36	1.42	0.00	0.00
-18年目	H 17	1.0000	2.19	2.19	0.00	0.00
-17年目	H 18	0.9615	2.19	2.11	0.00	0.00
-16年目	H 19	0.9246	2.86	2.64	0.00	0.00
-15年目	H 20	0.8890	4.29	3.81	0.00	0.00
-14年目	H 21	0.8548	5.71	4.88	0.00	0.00
-13年目	H 22	0.8219	6.67	5.48	0.00	0.00
-12年目	H 23	0.7903	41.90	33.12	0.00	0.00
-11年目	H 24	0.7599	53.33	40.53	0.00	0.00
-10年目	H 25	0.7307	70.48	51.50	0.00	0.00
-9年目	H 26	0.7026	76.19	53.53	0.00	0.00
-8年目	H 27	0.6756	48.57	32.81	0.00	0.00
-7年目	H 28	0.6496	17.14	11.14	0.00	0.00
-6年目	H 29	0.6246	9.94	6.21	0.00	0.00
-5年目	H 30	0.6006	10.48	6.29	0.00	0.00
-4年目	H 31	0.5775	14.29	8.25	0.00	0.00
-3年目	H 32	0.5553	19.05	10.58	0.00	0.00
-2年目	H 33	0.5339	9.52	5.08	0.00	0.00
-1年目	H 34	0.5134	5.81	2.98	0.00	0.00
供用開始年次	H 35	0.4936	0.00	0.00	3.34	1.65
1年目	H 36	0.4746	0.00	0.00	3.34	1.59
2年目	H 37	0.4564	0.00	0.00	3.34	1.53
3年目	H 38	0.4388	0.00	0.00	3.34	1.47
4年目	H 39	0.4220	0.00	0.00	3.34	1.41
5年目	H 40	0.4057	0.00	0.00	3.34	1.36
6年目	H 41	0.3901	0.00	0.00	3.34	1.30
7年目	H 42	0.3751	0.00	0.00	3.34	1.25
8年目	H 43	0.3607	0.00	0.00	3.34	1.21
9年目	H 44	0.3468	0.00	0.00	3.34	1.16
10年目	H 45	0.3335	0.00	0.00	3.34	1.11
11年目	H 46	0.3207	0.00	0.00	3.34	1.07
12年目	H 47	0.3083	0.00	0.00	3.34	1.03
13年目	H 48	0.2965	0.00	0.00	3.34	0.99
14年目	H 49	0.2851	0.00	0.00	3.34	0.95
15年目	H 50	0.2741	0.00	0.00	3.34	0.92
16年目	H 51	0.2636	0.00	0.00	3.34	0.88
17年目	H 52	0.2534	0.00	0.00	3.34	0.85
18年目	H 53	0.2437	0.00	0.00	3.34	0.81
19年目	H 54	0.2343	0.00	0.00	3.34	0.78
20年目	H 55	0.2253	0.00	0.00	3.34	0.75
21年目	H 56	0.2166	0.00	0.00	3.34	0.72
22年目	H 57	0.2083	0.00	0.00	3.34	0.70
23年目	H 58	0.2003	0.00	0.00	3.34	0.67
24年目	H 59	0.1926	0.00	0.00	3.34	0.64
25年目	H 60	0.1852	0.00	0.00	3.34	0.62
26年目	H 61	0.1780	0.00	0.00	3.34	0.60
27年目	H 62	0.1712	0.00	0.00	3.34	0.57
28年目	H 63	0.1646	0.00	0.00	3.34	0.55
29年目	H 64	0.1583	0.00	0.00	3.34	0.53
30年目	H 65	0.1522	0.00	0.00	3.34	0.51
31年目	H 66	0.1463	0.00	0.00	3.34	0.49
32年目	H 67	0.1407	0.00	0.00	3.34	0.47
33年目	H 68	0.1353	0.00	0.00	3.34	0.45
34年目	H 69	0.1301	0.00	0.00	3.34	0.43
35年目	H 70	0.1251	0.00	0.00	3.34	0.42
36年目	H 71	0.1203	0.00	0.00	3.34	0.40
37年目	H 72	0.1157	0.00	0.00	3.34	0.39
38年目	H 73	0.1112	0.00	0.00	3.34	0.37
39年目	H 74	0.1069	0.00	-19.14	3.34	0.36
合計			407.14	271.24	133.71	33.96
単純事業費計			407.14		133.71	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

費用の現在価値算定表(残事業)

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道50号前橋笠懸道路

採用単価の根拠 一般国道(直轄)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.27	13	3.51

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-17年目	H 18	0.9615	2.19	2.11	0.00	0.00
-16年目	H 19	0.9246	2.86	2.64	0.00	0.00
-15年目	H 20	0.8890	4.29	3.81	0.00	0.00
-14年目	H 21	0.8548	5.71	4.88	0.00	0.00
-13年目	H 22	0.8219	6.67	5.48	0.00	0.00
-12年目	H 23	0.7903	41.90	33.12	0.00	0.00
-11年目	H 24	0.7599	53.33	40.53	0.00	0.00
-10年目	H 25	0.7307	70.48	51.50	0.00	0.00
-9年目	H 26	0.7026	76.19	53.53	0.00	0.00
-8年目	H 27	0.6756	48.57	32.81	0.00	0.00
-7年目	H 28	0.6496	17.14	11.14	0.00	0.00
-6年目	H 29	0.6246	9.94	6.21	0.00	0.00
-5年目	H 30	0.6006	10.48	6.29	0.00	0.00
-4年目	H 31	0.5775	14.29	8.25	0.00	0.00
-3年目	H 32	0.5553	19.05	10.58	0.00	0.00
-2年目	H 33	0.5339	9.52	5.08	0.00	0.00
-1年目	H 34	0.5134	5.81	2.98	0.00	0.00
供用開始年次	H 35	0.4936	0.00	0.00	3.34	1.65
1年目	H 36	0.4746	0.00	0.00	3.34	1.59
2年目	H 37	0.4564	0.00	0.00	3.34	1.53
3年目	H 38	0.4388	0.00	0.00	3.34	1.47
4年目	H 39	0.4220	0.00	0.00	3.34	1.41
5年目	H 40	0.4057	0.00	0.00	3.34	1.36
6年目	H 41	0.3901	0.00	0.00	3.34	1.30
7年目	H 42	0.3751	0.00	0.00	3.34	1.25
8年目	H 43	0.3607	0.00	0.00	3.34	1.21
9年目	H 44	0.3468	0.00	0.00	3.34	1.16
10年目	H 45	0.3335	0.00	0.00	3.34	1.11
11年目	H 46	0.3207	0.00	0.00	3.34	1.07
12年目	H 47	0.3083	0.00	0.00	3.34	1.03
13年目	H 48	0.2965	0.00	0.00	3.34	0.99
14年目	H 49	0.2851	0.00	0.00	3.34	0.95
15年目	H 50	0.2741	0.00	0.00	3.34	0.92
16年目	H 51	0.2636	0.00	0.00	3.34	0.88
17年目	H 52	0.2534	0.00	0.00	3.34	0.85
18年目	H 53	0.2437	0.00	0.00	3.34	0.81
19年目	H 54	0.2343	0.00	0.00	3.34	0.78
20年目	H 55	0.2253	0.00	0.00	3.34	0.75
21年目	H 56	0.2166	0.00	0.00	3.34	0.72
22年目	H 57	0.2083	0.00	0.00	3.34	0.70
23年目	H 58	0.2003	0.00	0.00	3.34	0.67
24年目	H 59	0.1926	0.00	0.00	3.34	0.64
25年目	H 60	0.1852	0.00	0.00	3.34	0.62
26年目	H 61	0.1780	0.00	0.00	3.34	0.60
27年目	H 62	0.1712	0.00	0.00	3.34	0.57
28年目	H 63	0.1646	0.00	0.00	3.34	0.55
29年目	H 64	0.1583	0.00	0.00	3.34	0.53
30年目	H 65	0.1522	0.00	0.00	3.34	0.51
31年目	H 66	0.1463	0.00	0.00	3.34	0.49
32年目	H 67	0.1407	0.00	0.00	3.34	0.47
33年目	H 68	0.1353	0.00	0.00	3.34	0.45
34年目	H 69	0.1301	0.00	0.00	3.34	0.43
35年目	H 70	0.1251	0.00	0.00	3.34	0.42
36年目	H 71	0.1203	0.00	0.00	3.34	0.40
37年目	H 72	0.1157	0.00	0.00	3.34	0.39
38年目	H 73	0.1112	0.00	0.00	3.34	0.37
39年目	H 74	0.1069	0.00	-19.14	3.34	0.36
合計			398.42	261.80	133.71	33.96

単純事業費計	398.42	133.71
--------	--------	--------

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3)維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。



