
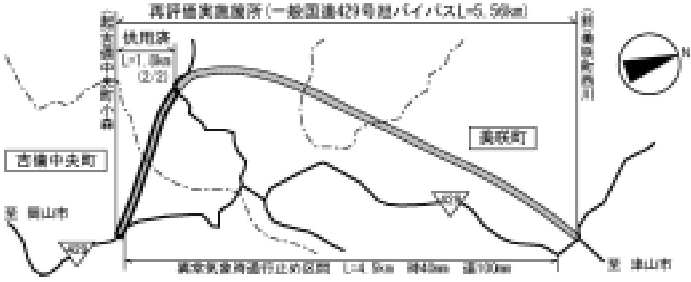


## 再評価結果（平成18年度事業継続箇所）

担当課：道路局 国道・防災課

担当課長名：鈴木 克宗

事業名	一般国道429号 <small>あさひ</small> 旭バイパス	事業区分	一般国道	事業主体	岡山県								
起終点	自：岡山県加賀郡吉備中央町小森 <small>おがやまけんががくんきびちゆうおうちようこもり</small> 至：岡山県久米郡美咲町西川 <small>おがやまけんくみくんみさきちようにしかわ</small>	延長	5.6 km										
事業概要	一般国道429号は、岡山県の南北地域を連絡し、沿道地域の産業、経済の発展、地域の振興を担う重要路線で、岡山県倉敷市を起点とし京都府福知山市に至る実延長約22.2kmの幹線道路である。旭バイパスは、異常気象時交通規制区間、隘路及び線形不良区間の解消を目的とした延長約5.6kmの2車線道路である。												
H8年度事業化	都市計画決定無し	H8年度用地着手	H9年度工事着手										
全体事業費	127億円	事業進捗率	52%	供用済延長	1.8km								
計画交通量	4,300～4,400台/日												
費用対効果分析結果	B/C： (事業全体) 1.1 (残事業) 2.3	総費用： (残事業)/(事業全体) 58/135億円 (事業費：55/130億円) 維持管理費：3/5億円	総便益： (残事業)/(事業全体) 135/145億円 (走行時間短縮便益：132/141億円) (走行費用減少便益：1/2億円) (交通事故減少便益：2/2億円)	基準年： 平成17年									
感度分析の結果	残事業について感度分析を実施 ・交通量変動：B/C=2.6(+10%) B/C=2.1(-10%) ・事業費変動：B/C=2.1(+10%) B/C=2.6(-10%)												
事業の効果等	・物流効率化の支援(現道の総重量25tの車両が通行できない区間が解消) ・災害への備え(現道の事前通行規制区間が解消)												
関係する地方公共団体等の意見	美咲町をはじめとする関係5市2町1村の首長で構成される国道429号道路整備促進期成会より早期整備の要望を受けている。												
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等	特になし												
事業の進捗状況、残事業の内容等	これまで起点側から順次改良工事を進め、平成16年度末までに起点から県道高梁旭線までの区間について部分供用している。残区間では、トンネル3基、橋梁2橋等の構造物を予定している。												
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等	これまで事業実施において特に大きな問題は生じておらず、平成20年代前半(H22予定)の完成供用に向け、重点整備を進める予定である。												
施設の構造や工法の変更等	「おがやまスタンダード」の適用により、歩行者が少なく通学路指定も見込まれない区間については、歩道を設置しない構造に変更し、コスト縮減を図っている。												
対応方針	事業継続												
対応方針決定の理由	早期完成供用の地元要望も強く、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。												
事業概要図	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">  </div> <div style="margin-right: 20px;"> <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th colspan="2">凡例</th></tr> <tr><td><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: black;"></span></td><td>供用中</td></tr> <tr><td><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px dashed black;"></span></td><td>再評価箇所</td></tr> <tr><td><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid black;"></span></td><td>うち供用中</td></tr> </table> </div> <div>  </div> </div>					凡例		<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: black;"></span>	供用中	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px dashed black;"></span>	再評価箇所	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid black;"></span>	うち供用中
凡例													
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: black;"></span>	供用中												
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px dashed black;"></span>	再評価箇所												
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid black;"></span>	うち供用中												

総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したものの。
