

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道32号 綾南・綾歌・満濃バイパス
事業主体	四国地方整備局

● 事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全事業：費用便益比 (B/C) = 2.4 (経済的純現在価値 (B-C) = 1329億円、経済的内部収益率 EIRR) = 9.4%) 残事業：費用便益比 (B/C) = 4.3 (経済的純現在価値 (B-C) = 180億円、経済的内部収益率 EIRR) = 140.0%)

<事業の効果や必要性を評価するための指標>

政策目標		指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間 (人・時間) 削減率	渋滞損失時間 (現況) : 305.1千人・時間/年 渋滞損失削減時間 : 127.8万人・時間/年 (305.1千人・時間/年⇒177.3千人・時間/年)
		□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		● 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	琴参バス(コミュニティバス)新規路線開設
		● 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	綾川町～JR琴平駅(土讃線) : 16分→15分(1分短縮)
		● 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	琴平町、まんのう町～高松空港(第二種空港) 53分→52分(1分短縮)
	物流効率化の支援	● 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	琴平町、まんのう町～高松港(重要港湾) 48分→47分(1分短縮)
	● 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	琴平町、まんのう町 にんにく生産全国第2位、なばな生産全国第3位、レタス生産全国第5位	
	□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する		

都市の再生	<input type="checkbox"/>	都市再生プロジェクトを支援する事業である	
	<input type="checkbox"/>	広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
	<input type="checkbox"/>	市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
	<input type="checkbox"/>	中心市街地内で行う事業である	
	<input type="checkbox"/>	幹線都市計画道路網密度が1.5km/km ² 以下である市街地内での事業である	
	<input type="checkbox"/>	DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
	<input type="checkbox"/>	対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/>	高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り	
	<input type="checkbox"/>	地域高規格道路の位置づけあり	
	<input type="checkbox"/>	当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
	<input type="checkbox"/>	当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
	<input type="checkbox"/>	現道等における交通不能区間を解消する	
	<input type="checkbox"/>	現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
	<input checked="" type="checkbox"/>	日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	琴平町、まんのう町～高松市48分→47分(1分短縮)
個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/>	鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
	<input type="checkbox"/>	拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
	<input checked="" type="checkbox"/>	主要な観光地へのアクセス向上が期待される	金刀比羅宮(2,975千人・H18)、国営讃岐まんのう公園(392千人・H18)、ニューレオマワールド(808千人・H18)
	<input type="checkbox"/>	特別立法に基づく事業である	
	<input type="checkbox"/>	新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
	<input type="checkbox"/>	歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業である	
2.暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/>	自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上に該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる
		<input type="checkbox"/>	交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される
無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/>	対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
	<input type="checkbox"/>	市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/>	三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	琴平町、まんのう町～県立中央病院48分→47分(1分短縮) 琴平町、まんのう町～香川大学医学部附属病院73分→72分(1分短縮)

3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は児童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	第1次輸送確保路線に指定されている
		<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	
		<input type="checkbox"/> 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する	
<input type="checkbox"/> 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす			
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：4,300 t /年 0.4%削減
	生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	NO2排出削減量：29.9 t /年 NO2排出削減率：40%削減
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	SPM排出削減量：2.8 t /年 SPM排出削減率：39%削減
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BPの別
一般国道32号	綾南・綾歌・満濃 バイパス	L=21.7km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
14,900~40,200	4	四国地方整備局

① 費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成19年度		
単純合計	636億円	281億円	917億円
うち残事業分	53億円	67億円	120億円
基準年における 現在価値 (C)	803億円	157億円	960億円
うち残事業分	34億円	20億円	54億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行費用 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	平成19年度			
供 用 年	平成12年度、平成16年度、平成17年度、平成19年度 平成20年度、平成22年度、平成42年度			
単年便益 (初年便益)	94億円	2億円	1億円	97億円
基準年における 現在価値 (B)	2,211億円	59億円	19億円	2,289億円
うち残事業分	229億円	4.1億円	0.94億円	234億円

③ 結 果

費用便益比 (事業全体)	2.4
費用便益比 (残事業)	4.3

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

交通状況の変化

事業名：綾南・綾歌・満濃バイパス(事業全体)

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] : 21.7km	交通量	[台/日]	26,000	22,500	
	走行時間	[分]	23	17	
	走行時間費用	[億円/年]	653	822	
②主な周辺道路	(県)高松綾南線 : 11.7km	交通量	[台/日]	6,800	5,600
		走行時間	[分]	22	22
		走行時間費用	[億円/年]	259	200
	(県)綾歌綾川線 : 11.5km	交通量	[台/日]	4,400	3,100
		走行時間	[分]	19	19
		走行時間費用	[億円/年]	142	97
	(県)財田まんのう線 : 8.6km	交通量	[台/日]	1,800	1,600
		走行時間	[分]	17	17
		走行時間費用	[億円/年]	52	46
	国道11号 : 10.3km	交通量	[台/日]	47,300	46,000
		走行時間	[分]	12	12
		走行時間費用	[億円/年]	960	927
③その他道路合計 : 1678.3km	走行時間費用	[億円/年]	40,403	40,282	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 1742.1km	走行時間短縮便益	[億円/年]	42,468	42,374	94

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。


※1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：綾南・綾歌・満濃バイパス（事業全体）

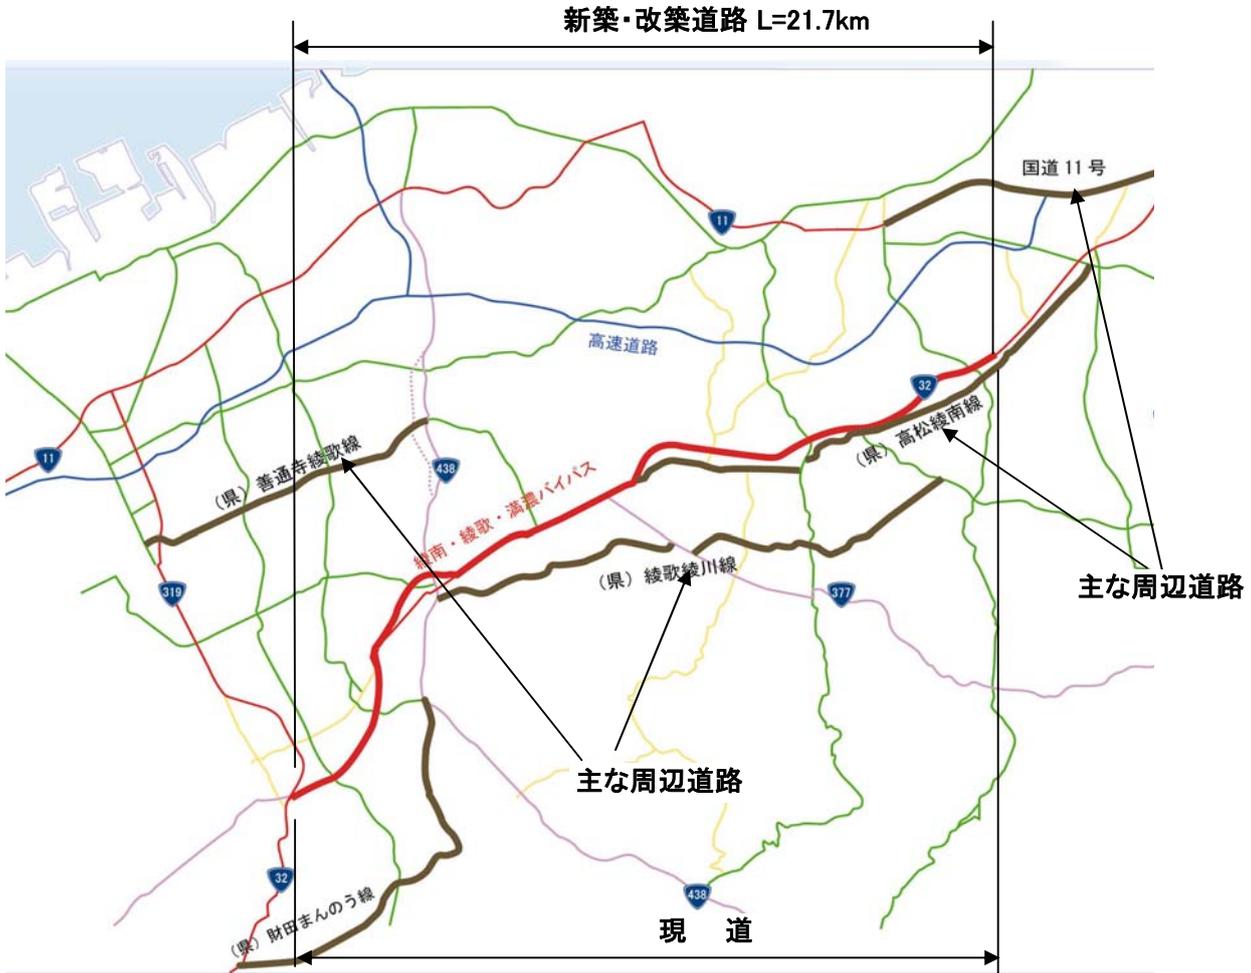

交通状況の変化

事業名：綾南・綾歌・満濃バイパス（残事業）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] : 21.7km	交通量	[台/日]	25,000	25,600	
	走行時間	[分]	29	30	
	走行時間費用	[億円/年]	530	564	
②主な周辺道路	(県)高松綾南線 : 11.7km	交通量	[台/日]	4,900	4,900
		走行時間	[分]	22	22
		走行時間費用	[億円/年]	75	76
	(県)綾歌綾川線 : 11.5km	交通量	[台/日]	1,800	1,700
		走行時間	[分]	18	18
		走行時間費用	[億円/年]	23	22
	(県)財田まんのう線 : 8.6km	交通量	[台/日]	1,600	1,300
		走行時間	[分]	17	17
		走行時間費用	[億円/年]	19	16
	国道11号 : 10.3km	交通量	[台/日]	45,000	44,900
		走行時間	[分]	12	12
		走行時間費用	[億円/年]	388	387
③その他道路合計 : 1678.3km	走行時間費用	[億円/年]	16,788	16,745	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1742.1km	走行時間短縮便益	[億円/年]	17,824	17,809	15

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。


※1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：綾南・綾歌・満濃バイパス（残事業）

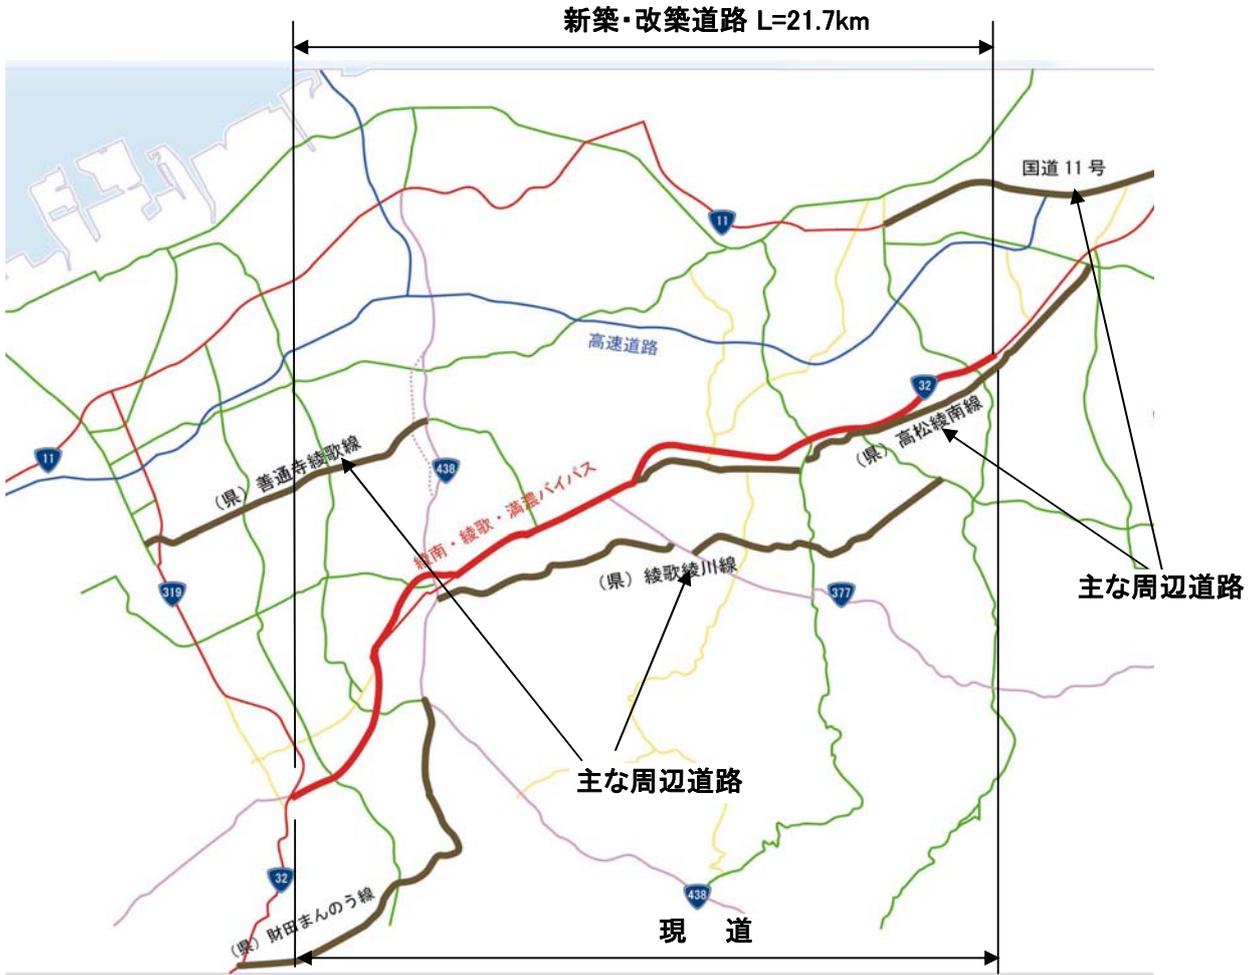

費用便益分析の条件

事業名：一般国道32号 綾南・綾歌・満濃バイパス

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成19年	
交通流の推計時点	1時点のみの推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
推計に用いたベースOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H11センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の場合	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他()	<input type="checkbox"/>		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載	<input checked="" type="checkbox"/>	
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	

事業名：一般国道32号 綾南・綾歌・満濃バイパス

		項目	チェック欄	
便 益 の 算 定	休日交通の 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する 場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
	採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		() %	
	交通流推計の 時点以外の 便益の算定	平成15年8月12日付け事務連絡に基づく設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他 ()	<input type="checkbox"/>	
	車種別時間 価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>	
	車種別走行 経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>	
	交通事故減少 便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>	
		中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	時間短縮・費用 減少・事故減少 以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)		<input type="checkbox"/>		
その他				
費 用 の 算 定	事業費	詳細事業計画による値を採用	<input type="checkbox"/>	
		標準投資パターンを採用	<input type="checkbox"/>	
		その他(供用まで残事業費を等配分した)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	維持管理費	マニュアルの値を採用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		事務所等の実績値より設定	<input type="checkbox"/>	
		その他()	<input type="checkbox"/>	
雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	<input type="checkbox"/>		
その他				
4.その他				
上記のほか、B/Cの算定にあたっての問題点があれば、記述				

維持管理費の単純単価の算出

採用単価の根拠 一般国道(直轄)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.27	21.7	5.86

費用の現在価値算定表

【全事業】

箇所名:一般国道32号 綾南・綾歌・満濃バイパス

年次	年度	割引率	改築費(億円)		維持管理費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-58年目	S 47	3.9461	0	0		
-57年目	S 48	3.7943	0	0		
-56年目	S 49	3.6484	0	0		
-55年目	S 50	3.5081	0	0		
-54年目	S 51	3.3731	1	3		
-53年目	S 52	3.2434	1	3		
-52年目	S 53	3.1187	3	8		
-51年目	S 54	2.9987	2	6		
-50年目	S 55	2.8834	3	9		
-49年目	S 56	2.7725	3	7		
-48年目	S 57	2.6658	4	10		
-47年目	S 58	2.5633	0	0		
-46年目	S 59	2.4647	0	1		
-45年目	S 60	2.3699	1	2		
-44年目	S 61	2.2788	1	2		
-43年目	S 62	2.1911	2	4		
-42年目	S 63	2.1068	5	11		
-41年目	H 1	2.0258	15	30		
-40年目	H 2	1.9479	12	24		
-39年目	H 3	1.8730	13	24		
-38年目	H 4	1.8009	9	17		
-37年目	H 5	1.7317	20	35		
-36年目	H 6	1.6651	11	18		
-35年目	H 7	1.6010	14	22		
-34年目	H 8	1.5395	16	24		
-33年目	H 9	1.4802	18	27		
-32年目	H 10	1.4233	28	40		
-31年目	H 11	1.3686	114	156		
暫定供用開始年次	H 12	1.3159	103	135	4	6
-29年目	H 13	1.2653	32	40	4	5
-28年目	H 14	1.2167	12	15	4	5
-27年目	H 15	1.1699	24	28	4	5
暫定供用開始年次	H 16	1.1249	34	39	5	5
暫定供用開始年次	H 17	1.0816	38	42	5	6
-24年目	H 18	1.0400	24	25	5	5
暫定供用開始年次	H 19	1.0000	22	22	5	5
暫定供用開始年次	H 20	0.9615	2	2	5	5
-21年目	H 21	0.9246	2	2	5	5
暫定供用開始年次	H 22	0.8890	2	2	6	5
-19年目	H 23	0.8548	2	2	6	5
-18年目	H 24	0.8219	2	2	6	5
-17年目	H 25	0.7903	2	2	6	5
-16年目	H 26	0.7599	2	2	6	4
-15年目	H 27	0.7307	2	2	6	4
-14年目	H 28	0.7026	2	2	6	4
-13年目	H 29	0.6756	2	2	6	4
-12年目	H 30	0.6496	2	2	6	4
-11年目	H 31	0.6246	2	2	6	4
-10年目	H 32	0.6006	2	1	6	4
-9年目	H 33	0.5775	2	1	6	3
-8年目	H 34	0.5553	2	1	6	3
-7年目	H 35	0.5339	2	1	6	3
-6年目	H 36	0.5134	2	1	6	3
-5年目	H 37	0.4936	2	1	6	3
-4年目	H 38	0.4746	2	1	6	3
-3年目	H 39	0.4564	2	1	6	3
-2年目	H 40	0.4388	2	1	6	3
-1年目	H 41	0.4220	2	1	6	2
完成供用開始年次	H 42	0.4057			6	2
1年目	H 43	0.3901			6	2
2年目	H 44	0.3751			6	2
3年目	H 45	0.3607			6	2
4年目	H 46	0.3468			6	2

維持管理費の単純単価の算出

採用単価の根拠 一般国道(直轄)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.27	21.7	5.86

費用の現在価値算定表

【全事業】

箇所名:一般国道32号 綾南・綾歌・満濃バイパス

年次	年度	割引率	改築費(億円)		維持管理費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
5年目	H 47	0.3335			6	2
6年目	H 48	0.3207			6	2
7年目	H 49	0.3083			6	2
8年目	H 50	0.2965			6	2
9年目	H 51	0.2851	-138	-39	6	2
10年目	H 52	0.2741			5	1
11年目	H 53	0.2636			5	1
12年目	H 54	0.2534			5	1
13年目	H 55	0.2437	-61	-15	5	1
14年目	H 56	0.2343	-6	-1	2	1
15年目	H 57	0.2253			2	0
16年目	H 58	0.2166	-8	-2	2	0
17年目	H 59	0.2083	-6	-1	1	0
18年目	H 60	0.2003			1	0
19年目	H 61	0.1926	-6	-1	1	0
20年目	H 62	0.1852			1	0
21年目	H 63	0.1780			1	0
22年目	H 64	0.1712			1	0
23年目	H 65	0.1646			1	0
24年目	H 66	0.1583			1	0
25年目	H 67	0.1522			1	0
26年目	H 68	0.1463			1	0
27年目	H 69	0.1407			1	0
28年目	H 70	0.1353			1	0
29年目	H 71	0.1301			1	0
30年目	H 72	0.1251			1	0
31年目	H 73	0.1203			1	0
32年目	H 74	0.1157			1	0
33年目	H 75	0.1112			1	0
34年目	H 76	0.1069			1	0
35年目	H 77	0.1028			1	0
36年目	H 78	0.0989			1	0
37年目	H 79	0.0951			1	0
38年目	H 80	0.0914			1	0
39年目	H 81	0.0879			1	0
合計			412	803	281	157
単純事業費計			636		281	

注1) 用地費は、評価対象期間最終年における用地残存価値を控除する

注2) 維持管理費は便益算出マニュアルの参考値を基本とする

維持管理費の単純単価の算出

採用単価の根拠 一般国道(直轄)

費用の現在価値算定表

【残時業】

箇所名: 一般国道32号 綾南・綾歌・満濃バイパス

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.27	4.9	1.32

年次	年度	割戻率	改築費(億円)		維持管理費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
暫定供用開始年次	H 20	0.9615	2	2	0	0
-21年目	H 21	0.9246	2	2	0	0
暫定供用開始年次	H 22	0.8890	2	2	1	1
-19年目	H 23	0.8548	2	2	1	1
-18年目	H 24	0.8219	2	2	1	1
-17年目	H 25	0.7903	2	2	1	1
-16年目	H 26	0.7599	2	2	1	1
-15年目	H 27	0.7307	2	2	1	0
-14年目	H 28	0.7026	2	2	1	0
-13年目	H 29	0.6756	2	2	1	0
-12年目	H 30	0.6496	2	2	1	0
-11年目	H 31	0.6246	2	2	1	0
-10年目	H 32	0.6006	2	1	1	0
-9年目	H 33	0.5775	2	1	1	0
-8年目	H 34	0.5553	2	1	1	0
-7年目	H 35	0.5339	2	1	1	0
-6年目	H 36	0.5134	2	1	1	0
-5年目	H 37	0.4936	2	1	1	0
-4年目	H 38	0.4746	2	1	1	0
-3年目	H 39	0.4564	2	1	1	0
-2年目	H 40	0.4388	2	1	1	0
-1年目	H 41	0.4220	2	1	1	0
完成供用開始年次	H 42	0.4057			1	1
1年目	H 43	0.3901			1	1
2年目	H 44	0.3751			1	0
3年目	H 45	0.3607			1	0
4年目	H 46	0.3468			1	0
5年目	H 47	0.3335			1	0
6年目	H 48	0.3207			1	0
7年目	H 49	0.3083			1	0
8年目	H 50	0.2965			1	0
9年目	H 51	0.2851			1	0
10年目	H 52	0.2741			1	0
11年目	H 53	0.2636			1	0
12年目	H 54	0.2534			1	0
13年目	H 55	0.2437			1	0
14年目	H 56	0.2343			1	0
15年目	H 57	0.2253			1	0
16年目	H 58	0.2166			1	0
17年目	H 59	0.2083			1	0
18年目	H 60	0.2003			1	0
19年目	H 61	0.1926	-6	-1	1	0
20年目	H 62	0.1852			1	0
21年目	H 63	0.1780			1	0
22年目	H 64	0.1712			1	0
23年目	H 65	0.1646			1	0
24年目	H 66	0.1583			1	0
25年目	H 67	0.1522			1	0
26年目	H 68	0.1463			1	0
27年目	H 69	0.1407			1	0
28年目	H 70	0.1353			1	0
29年目	H 71	0.1301			1	0
30年目	H 72	0.1251			1	0
31年目	H 73	0.1203			1	0
32年目	H 74	0.1157			1	0
33年目	H 75	0.1112			1	0
34年目	H 76	0.1069			1	0
35年目	H 77	0.1028			1	0
36年目	H 78	0.0989			1	0
37年目	H 79	0.0951			1	0
38年目	H 80	0.0914			1	0
39年目	H 81	0.0879			1	0
合計			47	34	67	20

単純事業費計

53

67

注1) 用地費は、評価対象期間最終年における用地残存価値を控除する

注2) 維持管理費は便益算出マニュアルの参考値を基本とする

便益の現在価値算定表【全事業】

箇所名：一般国道32号 綾南・綾歌・満濃バイパス

年次	年度 (基準年) H19	総走行台キロの年次別伸び率			割戻率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)	
		(四国ブロック)				乗用車	バス	小型 貨物	普通 貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	バス	小型 貨物	普通 貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)
		乗用車類	貨物車類	全車															
暫定供用開始年次	H 12	1.01054	0.99458	1.00480	1.3159	25	2	9	6	42	55	1	0	0	0	1	2	0	-1
-29年目	H 13	1.01043	0.99455	1.00478	1.2653	26	2	9	6	42	53	1	0	0	0	1	2	0	-1
-28年目	H 14	1.01032	0.99453	1.00476	1.2167	26	2	9	6	42	51	1	0	0	0	1	2	0	-1
-27年目	H 15	1.01021	0.99449	1.00473	1.1699	26	2	9	6	42	49	1	0	0	0	1	1	0	-1
暫定供用開始年次	H 16	1.01011	0.99446	1.00471	1.1249	41	3	13	9	65	74	1	0	0	0	2	2	1	1
暫定供用開始年次	H 17	1.01001	0.99443	1.00469	1.0816	42	3	13	9	67	73	1	0	0	0	2	2	1	1
-24年目	H 18	1.00991	0.99440	1.00467	1.0400	42	3	13	9	68	70	1	0	0	0	2	2	1	1
暫定供用開始年次	H 19	1.00981	0.99437	1.00465	1.0000	48	3	15	12	79	79	1	0	0	1	2	2	1	1
暫定供用開始年次	H 20	1.00972	0.99434	1.00462	0.9615	49	4	16	12	81	78	1	0	0	1	2	2	1	1
-21年目	H 21	1.00962	0.99431	1.00460	0.9246	50	4	15	12	81	75	1	0	0	1	2	2	1	1
暫定供用開始年次	H 22	1.00953	0.99427	1.00458	0.8890	55	4	18	15	91	81	1	0	0	1	2	2	1	1
-19年目	H 23	1.00451	0.99589	1.00174	0.8548	55	4	17	15	91	78	1	0	0	1	3	2	1	1
-18年目	H 24	1.00449	0.99587	1.00173	0.8219	56	4	17	15	92	75	1	0	0	1	3	2	1	1
-17年目	H 25	1.00447	0.99585	1.00173	0.7903	56	4	17	14	92	72	1	0	0	1	3	2	1	1
-16年目	H 26	1.00445	0.99583	1.00173	0.7599	56	4	17	14	92	70	1	0	0	1	3	2	1	1
-15年目	H 27	1.00443	0.99582	1.00173	0.7307	56	4	17	14	92	67	1	0	0	1	3	2	1	1
-14年目	H 28	1.00441	0.99580	1.00172	0.7026	57	4	17	14	92	65	1	0	0	1	3	2	1	1
-13年目	H 29	1.00439	0.99578	1.00172	0.6756	57	4	17	14	92	62	1	0	0	1	3	2	1	1
-12年目	H 30	1.00437	0.99576	1.00172	0.6496	57	4	17	14	92	60	1	0	0	1	3	2	1	1
-11年目	H 31	1.00435	0.99574	1.00171	0.6246	57	4	17	14	93	58	1	0	0	1	3	2	1	1
-10年目	H 32	1.00433	0.99573	1.00171	0.6006	58	4	17	14	93	56	1	0	0	1	3	2	1	1
-9年目	H 33	0.99893	0.99384	0.99739	0.5775	58	4	17	14	92	53	1	0	0	1	3	1	1	0
-8年目	H 34	0.99893	0.99380	0.99738	0.5553	58	4	17	14	92	51	1	0	0	1	2	1	1	0
-7年目	H 35	0.99893	0.99376	0.99738	0.5339	58	4	16	14	92	49	1	0	0	1	2	1	1	0
-6年目	H 36	0.99893	0.99372	0.99737	0.5134	57	4	16	14	92	47	1	0	0	1	2	1	1	0
-5年目	H 37	0.99893	0.99368	0.99736	0.4936	57	4	16	14	91	45	1	0	0	1	2	1	1	0
-4年目	H 38	0.99893	0.99364	0.99736	0.4746	57	4	16	14	91	43	1	0	0	1	2	1	1	0
-3年目	H 39	0.99893	0.99360	0.99735	0.4564	57	4	16	13	91	41	1	0	0	1	2	1	1	0
-2年目	H 40	0.99892	0.99356	0.99734	0.4388	57	4	16	13	91	40	1	0	0	1	2	1	1	0
-1年目	H 41	0.99892	0.99352	0.99734	0.4220	57	4	16	13	90	38	1	0	0	1	2	1	1	0
完成供用開始年次	H 42	0.99892	0.99348	0.99733	0.4057	59	4	16	14	94	38	1	0	0	1	2	1	1	0
1年目	H 43	0.99686	0.99447	0.99616	0.3901	59	4	16	14	94	37	1	0	0	1	2	1	1	0
2年目	H 44	0.99685	0.99444	0.99615	0.3751	59	4	16	14	93	35	1	0	0	1	2	1	1	0
3年目	H 45	0.99684	0.99441	0.99613	0.3607	59	4	16	14	93	34	1	0	0	1	2	1	1	0
4年目	H 46	0.99683	0.99438	0.99612	0.3468	59	4	16	14	93	32	1	0	0	1	2	1	1	0
5年目	H 47	0.99682	0.99435	0.99610	0.3335	58	4	16	14	92	31	1	0	0	1	2	1	1	0
6年目	H 48	0.99680	0.99432	0.99609	0.3207	58	4	16	14	92	29	1	0	0	1	2	1	1	0
7年目	H 49	0.99679	0.99428	0.99607	0.3083	58	4	16	14	92	28	1	0	0	1	2	1	1	0

便益の現在価値算定表【全事業】

箇所名：一般国道32号 綾南・綾歌・満濃バイパス

年次	年度 (基準年) H19	総走行台キロの年次別伸び率			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)	
		(四国ブロック)				乗用車	バス	小型 貨物	普通 貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	バス	小型 貨物	普通 貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)
		乗用車類	貨物車類	全車															
8年目	H 50	0.99678	0.99425	0.99605	0.2965	58	4	16	14	91	27	1	0	0	1	2	1	1	0
9年目	H 51	0.99677	0.99422	0.99604	0.2851	58	4	16	14	91	26	1	0	0	1	2	1	1	0
10年目	H 52	0.99676	0.99418	0.99602	0.2741	30	2	8	9	49	13	0	0	0	0	1	0	2	0
11年目	H 53	0.99591	0.99645	0.99607	0.2636	29	2	8	9	49	13	0	0	0	0	1	0	2	0
12年目	H 54	0.99589	0.99644	0.99605	0.2534	29	2	8	9	48	12	0	0	0	0	1	0	2	0
13年目	H 55	0.99588	0.99643	0.99603	0.2437	29	2	8	9	48	12	0	0	0	0	1	0	1	0
14年目	H 56	0.99586	0.99642	0.99602	0.2343	14	1	5	6	26	6	0	0	0	0	1	0	0	0
15年目	H 57	0.99584	0.99640	0.99600	0.2253	13	1	5	6	24	5	0	0	0	0	0	0	0	0
16年目	H 58	0.99582	0.99639	0.99599	0.2166	13	1	5	5	24	5	0	0	0	0	0	0	0	0
17年目	H 59	0.99581	0.99638	0.99597	0.2083	7	1	3	3	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0
18年目	H 60	0.99579	0.99636	0.99595	0.2003	7	0	2	3	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0
19年目	H 61	0.99577	0.99635	0.99594	0.1926	7	0	2	3	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0
20年目	H 62	0.99575	0.99634	0.99592	0.1852	2	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21年目	H 63	0.99573	0.99632	0.99562	0.1780	2	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22年目	H 64	0.99572	0.99631	0.99560	0.1712	2	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23年目	H 65	0.99570	0.99630	0.99558	0.1646	2	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24年目	H 66	0.99568	0.99628	0.99556	0.1583	2	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25年目	H 67	0.99566	0.99627	0.99554	0.1522	2	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26年目	H 68	0.99564	0.99625	0.99552	0.1463	2	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
27年目	H 69	0.99562	0.99624	0.99550	0.1407	2	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
28年目	H 70	0.99560	0.99623	0.99548	0.1353	2	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29年目	H 71	0.99558	0.99621	0.99546	0.1301	2	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30年目	H 72	0.99556	0.99620	0.99544	0.1251	2	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31年目	H 73	0.99554	0.99618	0.99542	0.1203	2	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32年目	H 74	0.99552	0.99617	0.99539	0.1157	2	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33年目	H 75	0.99550	0.99615	0.99537	0.1112	2	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34年目	H 76	0.99548	0.99614	0.99535	0.1069	2	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35年目	H 77	0.99546	0.99612	0.99533	0.1028	2	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36年目	H 78	0.99544	0.99611	0.99531	0.0989	2	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37年目	H 79	0.99542	0.99609	0.99529	0.0951	2	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38年目	H 80	0.99540	0.99608	0.99526	0.0914	2	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39年目	H 81	0.99538	0.99606	0.99524	0.0879	2	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計						2316	163	681	587	3747	2211	51	2	16	27	96	59	43	19

便益の現在価値算定表【残事業】

箇所名：一般国道32号 綾南・綾歌・満濃バイパス

年次	年度 (基準年) H19	総走行台キロの年次別伸び率			割戻率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)	
		(四国ブロック)				乗用車	バス	小型 貨物	普通 貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	バス	小型 貨物	普通 貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)
		乗用車類	貨物車類	全車															
暫定供用開始年次	H 20	1.00972	0.99434	1.00462	0.9615	0	0	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.08	-0.08
-21年目	H 21	1.00962	0.99431	1.00460	0.9246	1	0	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.08	-0.08
暫定供用開始年次	H 22	1.00953	0.99427	1.00458	0.8890	5	0	2	3	11	10	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	-0.06	-0.06
-19年目	H 23	1.00451	0.99589	1.00174	0.8548	5	0	2	3	11	9	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	-0.06	-0.05
-18年目	H 24	1.00449	0.99587	1.00173	0.8219	5	0	2	3	11	9	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	-0.06	-0.05
-17年目	H 25	1.00447	0.99585	1.00173	0.7903	5	0	2	3	11	9	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	-0.06	-0.05
-16年目	H 26	1.00445	0.99583	1.00173	0.7599	5	0	2	3	11	8	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	-0.06	-0.05
-15年目	H 27	1.00443	0.99582	1.00173	0.7307	6	0	2	3	11	8	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	-0.06	-0.05
-14年目	H 28	1.00441	0.99580	1.00172	0.7026	6	0	2	3	11	8	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	-0.06	-0.04
-13年目	H 29	1.00439	0.99578	1.00172	0.6756	6	0	2	3	11	7	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	-0.06	-0.04
-12年目	H 30	1.00437	0.99576	1.00172	0.6496	6	0	2	3	11	7	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	-0.06	-0.04
-11年目	H 31	1.00435	0.99574	1.00171	0.6246	6	0	2	3	11	7	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	-0.06	-0.04
-10年目	H 32	1.00433	0.99573	1.00171	0.6006	6	0	2	3	11	7	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	-0.06	-0.04
-9年目	H 33	0.99893	0.99384	0.99739	0.5775	6	0	2	3	11	6	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	-0.06	-0.04
-8年目	H 34	0.99893	0.99380	0.99738	0.5553	6	0	2	3	11	6	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	-0.06	-0.04
-7年目	H 35	0.99893	0.99376	0.99738	0.5339	6	0	2	2	11	6	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	-0.06	-0.03
-6年目	H 36	0.99893	0.99372	0.99737	0.5134	6	0	2	2	11	6	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	-0.06	-0.03
-5年目	H 37	0.99893	0.99368	0.99736	0.4936	6	0	2	2	11	5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	-0.06	-0.03
-4年目	H 38	0.99893	0.99364	0.99736	0.4746	6	0	2	2	11	5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	-0.06	-0.03
-3年目	H 39	0.99893	0.99360	0.99735	0.4564	6	0	2	2	11	5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	-0.06	-0.03
-2年目	H 40	0.99892	0.99356	0.99734	0.4388	6	0	2	2	11	5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	-0.06	-0.03
-1年目	H 41	0.99892	0.99352	0.99734	0.4220	6	0	2	2	11	4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	-0.06	-0.03
完成供用開始年次	H 42	0.99892	0.99348	0.99733	0.4057	8	1	3	3	15	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.22	0.09
1年目	H 43	0.99686	0.99447	0.99616	0.3901	8	1	3	3	15	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.22	0.08
2年目	H 44	0.99685	0.99444	0.99615	0.3751	8	1	3	3	15	5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.22	0.08
3年目	H 45	0.99684	0.99441	0.99613	0.3607	8	1	3	3	14	5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.22	0.08
4年目	H 46	0.99683	0.99438	0.99612	0.3468	8	1	3	3	14	5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.21	0.07
5年目	H 47	0.99682	0.99435	0.99610	0.3335	8	1	3	3	14	5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.21	0.07
6年目	H 48	0.99680	0.99432	0.99609	0.3207	8	1	3	3	14	5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.21	0.07
7年目	H 49	0.99679	0.99428	0.99607	0.3083	8	1	3	3	14	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.21	0.07
8年目	H 50	0.99678	0.99425	0.99605	0.2965	8	1	3	3	14	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.21	0.06
9年目	H 51	0.99677	0.99422	0.99604	0.2851	8	1	3	3	14	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.21	0.06
10年目	H 52	0.99676	0.99418	0.99602	0.2741	8	1	3	3	14	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.21	0.06
11年目	H 53	0.99591	0.99645	0.99607	0.2636	8	1	3	3	14	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.21	0.05
12年目	H 54	0.99589	0.99644	0.99605	0.2534	7	1	3	3	14	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.21	0.05
13年目	H 55	0.99588	0.99643	0.99603	0.2437	7	1	3	3	14	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.21	0.05
14年目	H 56	0.99586	0.99642	0.99602	0.2343	7	1	3	3	14	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.21	0.05

便益の現在価値算定表【残事業】

箇所名：一般国道32号 綾南・綾歌・満濃バイパス

年次	年度 (基準年) H19	総走行台キロの年次別伸び率			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)	
		(四国ブロック)				乗用車	バス	小型 貨物	普通 貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	バス	小型 貨物	普通 貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)
		乗用車類	貨物車類	全車															
15年目	H 57	0.99584	0.99640	0.99600	0.2253	7	1	3	3	14	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.21	0.05
16年目	H 58	0.99582	0.99639	0.99599	0.2166	7	1	3	3	14	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.20	0.04
17年目	H 59	0.99581	0.99638	0.99597	0.2083	7	1	3	3	14	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.20	0.04
18年目	H 60	0.99579	0.99636	0.99595	0.2003	7	0	2	3	13	3	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.1	0.28	0.06
19年目	H 61	0.99577	0.99635	0.99594	0.1926	7	0	2	3	12	2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.1	0.28	0.05
20年目	H 62	0.99575	0.99634	0.99592	0.1852	2	0	1	1	4	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.26	0.05
21年目	H 63	0.99573	0.99632	0.99590	0.1780	2	0	1	1	4	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.26	0.05
22年目	H 64	0.99572	0.99631	0.99589	0.1712	2	0	1	1	4	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.26	0.04
23年目	H 65	0.99570	0.99630	0.99587	0.1646	2	0	1	1	4	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.26	0.04
24年目	H 66	0.99568	0.99628	0.99585	0.1583	2	0	1	1	4	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.04
25年目	H 67	0.99566	0.99627	0.99584	0.1522	2	0	1	1	4	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.04
26年目	H 68	0.99564	0.99625	0.99582	0.1463	2	0	1	1	4	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.04
27年目	H 69	0.99562	0.99624	0.99580	0.1407	2	0	1	1	4	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.04
28年目	H 70	0.99560	0.99623	0.99578	0.1353	2	0	1	1	4	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.03
29年目	H 71	0.99558	0.99621	0.99577	0.1301	2	0	1	1	4	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.03
30年目	H 72	0.99556	0.99620	0.99575	0.1251	2	0	1	1	4	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.03
31年目	H 73	0.99554	0.99618	0.99573	0.1203	2	0	1	1	4	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.03
32年目	H 74	0.99552	0.99617	0.99571	0.1157	2	0	1	1	4	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.03
33年目	H 75	0.99550	0.99615	0.99569	0.1112	2	0	1	1	4	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.24	0.03
34年目	H 76	0.99548	0.99614	0.99567	0.1069	2	0	1	1	4	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.24	0.03
35年目	H 77	0.99546	0.99612	0.99566	0.1028	2	0	1	1	4	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.24	0.02
36年目	H 78	0.99544	0.99611	0.99564	0.0989	2	0	1	1	3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.24	0.02
37年目	H 79	0.99542	0.99609	0.99562	0.0951	2	0	1	1	3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.24	0.02
38年目	H 80	0.99540	0.99608	0.99560	0.0914	2	0	1	1	3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.24	0.02
39年目	H 81	0.99538	0.99606	0.99558	0.0879	2	0	1	1	3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.24	0.02
合計						302	22	112	135	570	229	1.4	0.2	1.9	5.0	8.4	4.1	7.89	0.94
