


再評価結果（平成30年度事業継続箇所）

担当課：道路局環境安全課
担当課長名：森山 誠二

事業名：高規格幹線道路 I C アクセス道路 主要地方道 <small>つらうらりゆうがさま</small> 土浦竜ヶ崎線	事業区分：地方道	事業主体：茨城県			
起終点：自：茨城県阿見町実穀地内 <small>あみまちじつこく</small> 至：茨城県牛久市岡見町地内 <small>うしくしおかみちよう</small>		延長：3.93km			
事業概要：主要地方道土浦竜ヶ崎線は土浦市と龍ヶ崎市を結ぶ主要な幹線道路である。牛久市内の住宅団地の開発に伴う交通渋滞の緩和および地域の活性化を目的とし、阿見町実穀地内～牛久市岡見町地内までの延長約3.93kmを整備するものである。					
H8年度事業化	H8年度都市計画決定	用地未着手			
工事未着手					
全体事業費	約41億円	事業進捗率	0%	供用済延長	0km
計画交通量	17,500台				
費用対効果分析結果	B/C (事業全体)	2.6	総費用 (残事業/事業全体) 37/37億円 (事業費：35/35億円 維持管理費：2.4/2.4億円)	総便益 (残事業/事業全体) 97/97億円 (走行時間短縮便益：64/64億円 走行経費減少便益：19/19億円 交通事故減少便益：14/14億円)	基準年：平成29年
	(残事業)	2.6			
感度分析の結果 (事業全体) 交通量：B/C=2.3～2.9 (交通量 ±10%) (残事業) 交通量：B/C=2.3～2.9 (交通量 ±10%) 事業費：B/C=2.4～2.9 (事業費 ±10%) 事業費：B/C=2.4～2.9 (事業費 ±10%) 事業期間：B/C=2.5～2.8 (事業期間 ±20%) 事業期間：B/C=2.5～2.8 (事業期間 ±20%)					
事業の効果等 ・阿見町実穀地内周辺から圏央道牛久阿見 I C へのアクセス向上が図られる					
関係する地方公共団体等の意見 ・都市計画決定の手続きにおいて、周辺住民と合意形成を図っている。					
事業評価監視委員会の意見 ・事業継続を妥当と認める					
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 ・平成29年2月に圏央道の茨城県内区間が全線開通。 ・同12月に財政投融資を活用した整備により、県内区間を含めた東北道から東関道までの4車線化について、平成34年度から順次供用し、平成36年度には全線供用するとの見込みが示された。					
事業の進捗状況、残事業の内容等 ・用地取得率 0%、事業進捗率 0%					
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 ・用地の取得に努めるとともに、今後は早期完了を目指し、道路改良工事を推進していく。					
施設の構造や工法の変更等 ・土工の過不足について、近傍で実施している他事業と調整することにより、コスト縮減を図る。					
対応方針：事業継続					
対応方針決定の理由 事業の必要性、重要性は変化なく、費用対効果の投資効果も確保されているため。					

事業概要図

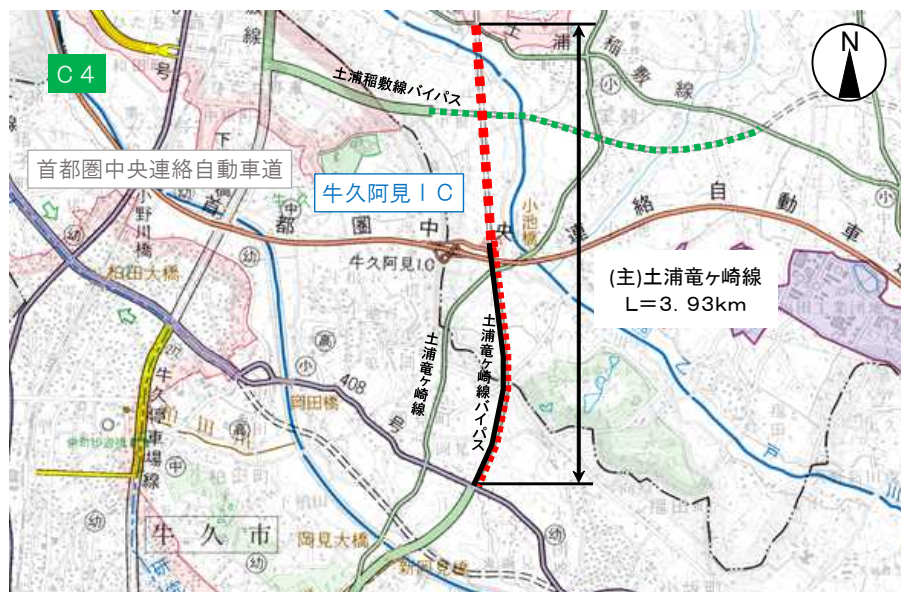

- ※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
- ※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
