

再評価結果（平成30年度事業継続箇所）

担当課：道路局 環境安全課
担当課長名：森山 誠二

事業名 高規格ICアクセス 主要地方道岐阜美山線 大学北		事業区分 地方道	事業主体 岐阜県
起終点 自：岐阜県岐阜市上城田寺西 至：岐阜県岐阜市大学北		延長	0.69 km
事業概要 主要地方道岐阜美山線は、岐阜県岐阜市を起点とし岐阜県山県市に至る幹線路線である。 当該箇所は、東海環状自動車道（仮称）岐阜インターチェンジの一次アクセス道路となっているため、同自動車道の整備にあわせて延長約0.69 kmを整備するものである。			
H26年度事業化	H8年度都市計画決定	H27年度用地着手	H28年度工事着手
全体事業費	17億円	事業進捗率	53% 供用済延長 — km
計画交通量	5,500台/日		
費用対効果分析結果	B/C (事業全体) 16.7 (残事業) 16.7	総費用 (残事業)/(事業全体) 50/50 億円 事業費：48/48 億円 維持管理費：1.7/1.7 億円	総便益 (残事業)/(事業全体) 828/828億円 走行時間短縮便益：794/794億円 走行経費減少便益：31/31 億円 交通事故減少便益：3.1/3.1 億円
感度分析の結果 (事業全体) 交通量：B/C=15.1~18.4 (交通量 ±10%) (残事業) 交通量：B/C=15.1~18.4 (交通量 ±10%) 事業費：B/C=15.1~18.4 (事業費 ±10%) 事業費：B/C=15.1~18.4 (事業費 ±10%) 事業期間：B/C=15.0~18.5 (事業期間±20%) 事業期間：B/C=15.0~18.5 (事業期間±20%)			
事業の効果等 ① 東海環状自動車道（仮称）岐阜インターチェンジへのアクセス道路整備 ・主要地方道岐阜美山線から東海環状自動車道（仮称）岐阜インターチェンジへのアクセスが確保できる。 ② 緊急輸送道路としての機能確保 ・当該区間は、完成後に第二次緊急輸送道路に位置付けられる予定であるが、当工区の整備により災害時の救援活動や支援物資等を輸送する機能の確保が図れる。 ③ 渋滞緩和 ・（仮称）岐阜インターチェンジの開通に伴い交通量の増加が推測されるが、当該区間の整備により周辺道路の渋滞緩和が図れる。			
関係する地方公共団体等の意見 ・当該工区の整備は、東海環状自動車道（仮称）岐阜インターチェンジへのアクセスに必要不可欠であるため、地元住民及び関係自治体から早期完成の強い要望がある。			
事業評価監視委員会の意見 ・事業主体の対応方針（案）「継続」を了承する。			

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

- ・平成29年度に東海環状自動車道 養老JCT～養老IC間が供用した。

事業の進捗状況、残事業の内容等

- ・用地取得率：約100%、事業進捗率：約53%

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

- ・東海環状自動車道（仮称）岐阜インターチェンジの供用にあわせて供用予定。

施設の構造や工法の変更

- ・他工事で発生した土砂を盛土部に有効利用し、コスト縮減に努めながら事業推進する。


対応方針

事業継続

対応方針決定の理由

- ・事業の必要性、重要性は変化なく、費用対効果の投資効果も確保されているため。

事業概要図

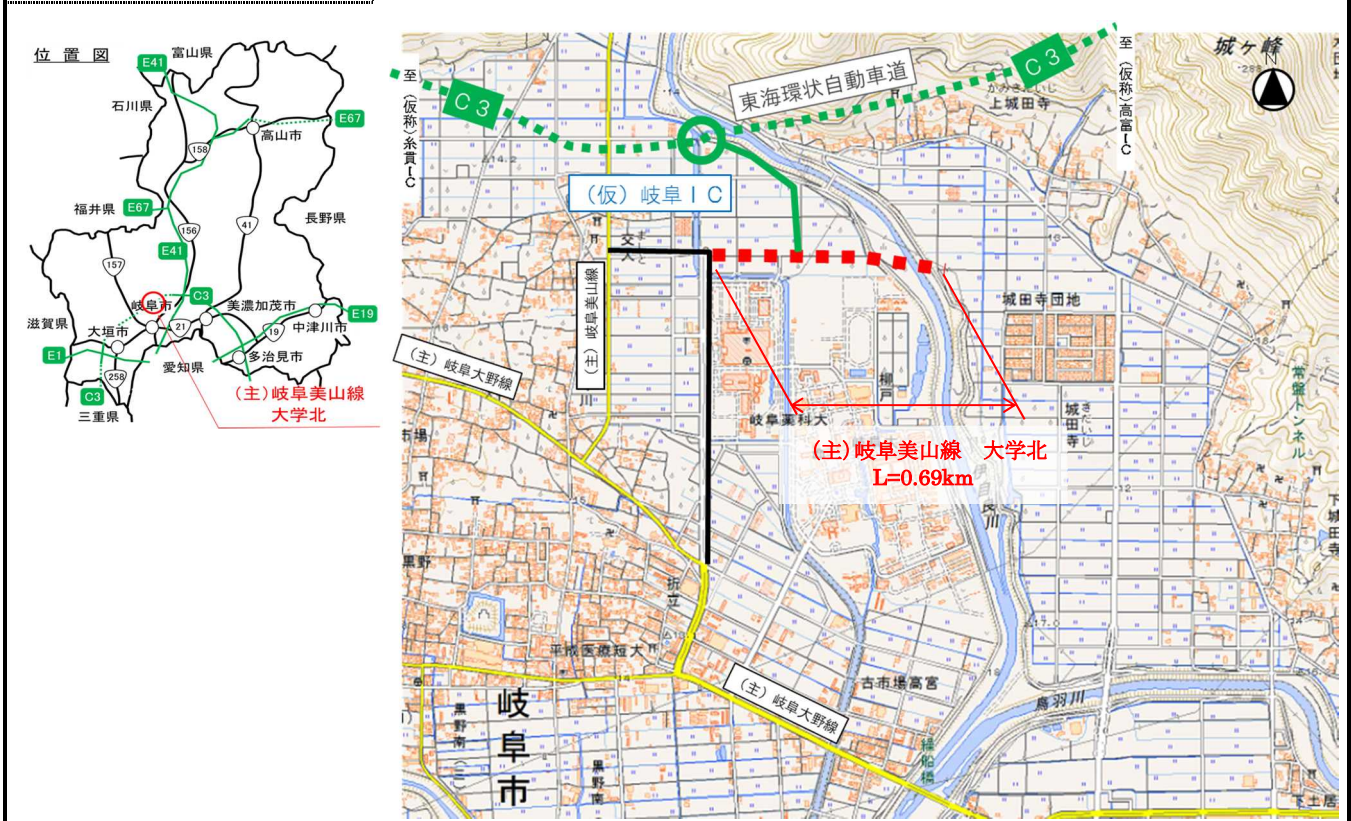

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
