

再評価結果（平成31年度事業継続箇所）


担当課：道路局 国道・技術課

担当課長名：東川 直正

事業名	一般国道4号 東埼玉道路（延伸） <small>ひがしさいたまどうろえんしん</small>	事業区分	一般国道	事業主体	国土交通省 関東地方整備局	
起終点	白：埼玉県吉川市川藤 <small>さいたまけんよしかわしかわふじ</small> 至：埼玉県春日部市水角 <small>さいたまけんかすかべしすいかく</small>			延長	8.7km	
事業概要 一般国道4号は、東京都から青森県に至る延長約860kmの主要幹線道路であり、埼玉県東部地域を南北に縦貫する主要な幹線道路として重要な役割を担っている。東埼玉道路は、埼玉県八潮市八條から春日部市下柳までの計画延長17.6kmのバイパス事業であり、平成16年度までに起点から延長5.7kmを供用したところである。東埼玉道路（延伸）は、供用中区間終点部から国道4号接続部までの一般国道4号のバイパス事業である。						
H20年度事業化		S63年度都市計画決定		H23年度用地着手		
H29年度工事着手						
全体事業費	約174億円	事業進捗率（平成30年3月末時点）	約48%	供用済延長	0km	
計画交通量	11,200～17,100台／日					
費用対効果分析結果	B/C（事業全体）	3.5	総費用（事業費）	91/178億円	総便益（事業費）	628/628億円
	（残事業）	6.9	（事業費）	70/158億円 維持管理費：21/21億円	（残事業）	564/564億円 44/44億円 20/20億円
感度分析の結果 【事業全体】交通量：B/C=3.3～3.8（交通量 ±10%）【残事業費】交通量：B/C=6.4～7.4（交通量 ±10%） 事業費：B/C=3.4～3.7（事業費 ±10%）事業費：B/C=6.4～7.5（事業費 ±10%） 事業期間：B/C=3.2～3.7（事業期間 ±20%）事業期間：B/C=6.4～7.2（事業期間 ±20%）						
事業の効果等 (1) 交通混雑の緩和および交通事故の減少 ・国道4号現道には、「首都圏渋滞ボトルネック対策協議会」により主要渋滞箇所と特定された交差点が多数存在しており、特に神明町交差点や新善町交差点での速度低下が顕著。 ・国道4号現道の事故類型別事故発生状況は、車両相互の追突事故が約6割。 ・東埼玉道路の整備により、国道4号現道の交通が当該道路に転換され、渋滞緩和、交通事故の減少が期待。 (2) 周辺地域の開発に寄与 ・東埼玉道路沿線では、土地区画整理事業や大型物流施設、大規模店舗が立地し、新規産業団地についても整備中。 ・東埼玉道路の整備は、開発事業を支援するとともに、地域経済の活性化に寄与。 (3) 地域産業の振興を支援 ・東埼玉道路沿線では、いちごやぶどう狩りができる農園が多く立地し、特に越谷市では「越谷いちご」のブランド化（都心への朝採れ直送による販売などの高付加価値化）や、観光農園の振興策を推進中。 ・東埼玉道路の整備は、観光農園の振興を支援するとともに、来訪者数の増加に寄与。						
関係する地方公共団体等の意見 ・埼玉県知事の意見： 東埼玉道路（延伸）は、国道4号の交通混雑の緩和や沿線の開発事業を支援し、県東部地域における南北軸として圏央道や外環道と連携し、本県の広域幹線道路ネットワークを形成する極めて重要な道路です。引き続きコスト縮減に十分留意しながら、早期整備に努めていただきたい。 また、本路線の機能を十分に発揮させるため、未事業化となっている自動車専用部（外環道～一般国道16号）について早期事業化するとともに、計画が具体化していない国道16号から圏央道までの区間も含め重要物流道路に指定するなどし、着実に事業進捗を図っていただきたい。						
事業評価監視委員会の意見 事業の継続を了承する。						

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 地元情勢の変化等事業を巡る社会経済情勢等に変化が見られない。	
事業の進捗状況、残事業の内容等 昭和63年度に都市計画決定、平成20年度に事業化。 平成23年度に用地取得着手し、平成29年度に工事着手。 用地取得率は約85%（平成30年3月末時点）。 工事については、全市町において改良工事や橋梁下部工事を実施中。	
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 早期完成を目指し、用地取得、工事を推進。	
施設の構造や工法の変更等 ・工事着手にあたり、平成28年に水路管理者と排水協議を行った結果、近年の局地的な集中豪雨の頻発などから、道路からの雨水流出を一時貯留する施設（調整池）が必要となった。 ・用地買収後、ボーリング未実施区間について追加ボーリングを実施。道路の圧密沈下について照査した結果、盛土（プレロード）期間が長期間となるところがあるため、圧密促進工法の追加が必要となった。	
対応方針	事業継続
対応方針決定の理由 以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。	

事業概要図

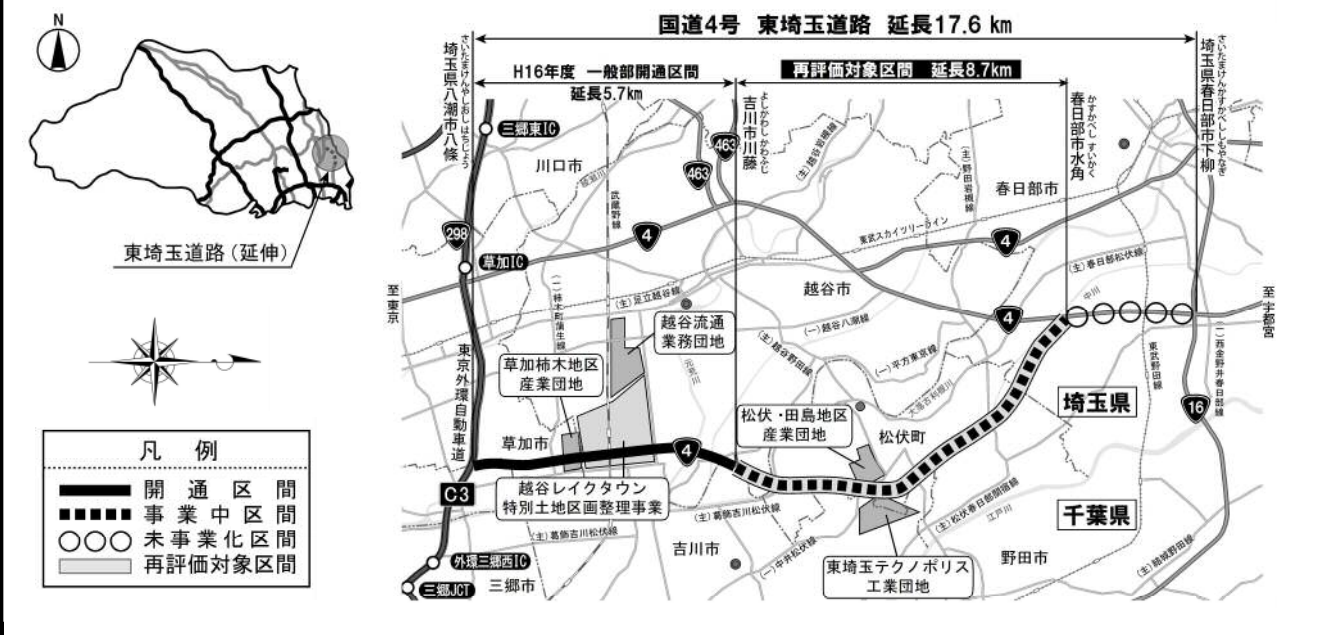

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
 ※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
