

(事後評価)

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道106号(宮古盛岡横断道路)区界～築川
事業主体	東北地方整備局

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力		
円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間(人・時間)及び削減率	区間b(当該区間／並行区間)について: 並行区間等(当該区間)の渋滞損失時間:5.1万人・時間/年(一般国道106号現道区間)⇒0.9万人・時間/年 並行区間等(当該区間)の渋滞損失削減率:約8割削減
	○ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況	
	○ 現道又は並行区間等における踏切道の除却もしくは交通改善の状況	
	● 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況	利便性の向上が見込まれるバス路線 宮古～盛岡(106急行バス)(24便/日)(上下計)
	● 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況	新幹線駅へのアクセス性が向上 宮古市～盛岡駅(新幹線駅)(整備前:122分⇒整備後:99分(23分短縮))
	● 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況	空港へのアクセス性が向上 宮古市～花巻空港(第三種空港)(整備前:139分⇒整備後:114分(25分短縮))
	物流効率化の支援	
	● 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上の状況	重要港湾(宮古港)へのアクセス性が向上 宮古港(宮古市魚市場)～盛岡南IC(整備前:123分⇒整備後:97分(26分短縮))
	● 農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況	宮古市(宮古港)が県内1位の水産品の流通の利便性が向上 (すけとうだら(県内シェア82%)、するめいか(県内シェア80%)、貝類(県内シェア97%))、 (R4水産物流調査、漁港別品目別上場水揚量)
	□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消	
都市の再生		
	○ 都市再生プロジェクトの支援に関する効果	
	○ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路が形成(又は一部形成)されたことによる効果	
	○ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果	
	○ 中心市街地内で行われたことによる効果	
	□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
	□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
	□ 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となった	

2.暮らし	国土・地域ネットワークの構築	
	☐ 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけあり	
	☒ 地域高規格道路の位置づけあり	宮古盛岡横断道路の一部を形成
	☐ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する(A'路線としての位置づけがある場合)	
	☒ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	宮古市～盛岡市間を連絡（整備前:115分⇒整備後:91分(24分短縮)）
	☐ 現道等における交通不能区間を解消	
	☐ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消	
	☒ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況	宮古市～盛岡市間を連絡（整備前:115分⇒整備後:91分(24分短縮)）
	個性ある地域の形成	
	☐ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況	
	☒ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果	当該路線は、東日本大震災からの早期復興を図る復興支援道路(太平洋と東北道を繋ぐ横断軸の強化)として位置づけ
	☒ 主要な観光地へのアクセス向上による効果	沿岸と内陸部を結ぶ周遊観光アクセスの向上(宮古市～盛岡市 整備前:115分⇒整備後:91分(24分短縮)) R5観光入込客数 盛岡市:323万人、宮古市:120万人
	☐ 新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果	
2.暮らし		
	歩行者・自転車のための生活空間の形成	
	☐ 自転車利用空間が整備されたことによる当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性向上の状況	
	☐ 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	
	☐ 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
	☐ 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	
	☒ 三次医療施設へのアクセス向上の状況	三次医療施設へのアクセス向上 宮古市～岩手県高度救命救急センター(岩手医科大学付属病院)(整備前:122分⇒整備後:93分(29分短縮))

3. 安全	安全な生活環境の確保	
	☐ 現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況	
	☐ 歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況	
	災害への備え	
	☐ 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
	☒ 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	岩手県地域防災計画にて緊急輸送道路（第1次路線）に指定
	☒ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成	一般国道106号（バイパス整備区間）
	☐ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
	☐ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消	
	☐ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消	
4. 環境	地球環境の保全	
	☒ 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：173t-CO2/年
	生活環境の改善・保全	
	☐ 現道等における自動車からのNO2排出削減率	
	☐ 現道等における自動車からのSPM排出削減率	
	☐ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況	
	☐ その他、環境や景観上の効果	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	
	☒ 関連する大規模道路事業との一体的整備の必要性または一体的整備による効果	復興支援道路の一路線となる宮古盛岡横断道路として、復興道路等と一体的に整備する必要あり
	☒ 他機関との連携プログラムに関する効果	岩手県東日本大震災津波復興計画等に位置付け
	☐ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果	

(事後評価)

様式－2

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拵・BP・その他の別
一般国道106号(宮古盛岡横断道路)	区界～築川	L=8.0km	地域高規格	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
6,800	2	東北地方整備局

①費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和6年度			
単純合計	502億円	15億円	—	517億円
基準年における 現在価値(C)	690億円	7.6億円	—	698億円

②便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和6年度			
供用年	令和3年度			
単年便益 (初年便益)	18億円	2.5億円	1.0億円	21億円
基準年における 現在価値(B)	401億円	56億円	21億円	478億円

③結果

費用便益比(B/C)	0.7
経済的純現在価値(B-C)	-220億円
経済的内部収益率(EIRR)	2.2%

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

交通状況の変化

様式－3①

事業名：一般国道106号(宮古盛岡横断道路)区界～築川

(推計時点 R22年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] :8.00km		交通量※ ¹	[台/日]	—	6,800
		走行時間※ ²	[分]	—	8
		走行時間費用※ ³	[億円/年]	—	12.09
②主な周 辺道路※ ⁴	現道 一般国道 106号 :12.90km	交通量	[台/日]	5,400	0
		走行時間	[分]	24	19
		走行時間費用	[億円/年]	27.79	0.00
	三陸沿岸 道路 :4.80km	交通量	[台/日]	10,600	10,800
		走行時間	[分]	6	6
		走行時間費用	[億円/年]	13.37	14.01
	一般国道 340号 :5.37km	交通量	[台/日]	600	600
		走行時間	[分]	8	8
		走行時間費用	[億円/年]	1.13	1.06
	(主)紫波江繫線 :5.23km	交通量	[台/日]	500	400
		走行時間	[分]	8	8
		走行時間費用	[億円/年]	0.74	0.65
③その他道路合計 :4736.00km		走行時間費用	[億円/年]	6,657.66	6,657.11

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計	4772.30km	走行時間短縮便益 [億円/年]	6,700.69	6,684.92	15.77

※1：当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2：配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3：費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4：当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：一般国道106号(宮古盛岡横断道路)区界～築川

【図面(①、②に該当する道路)】

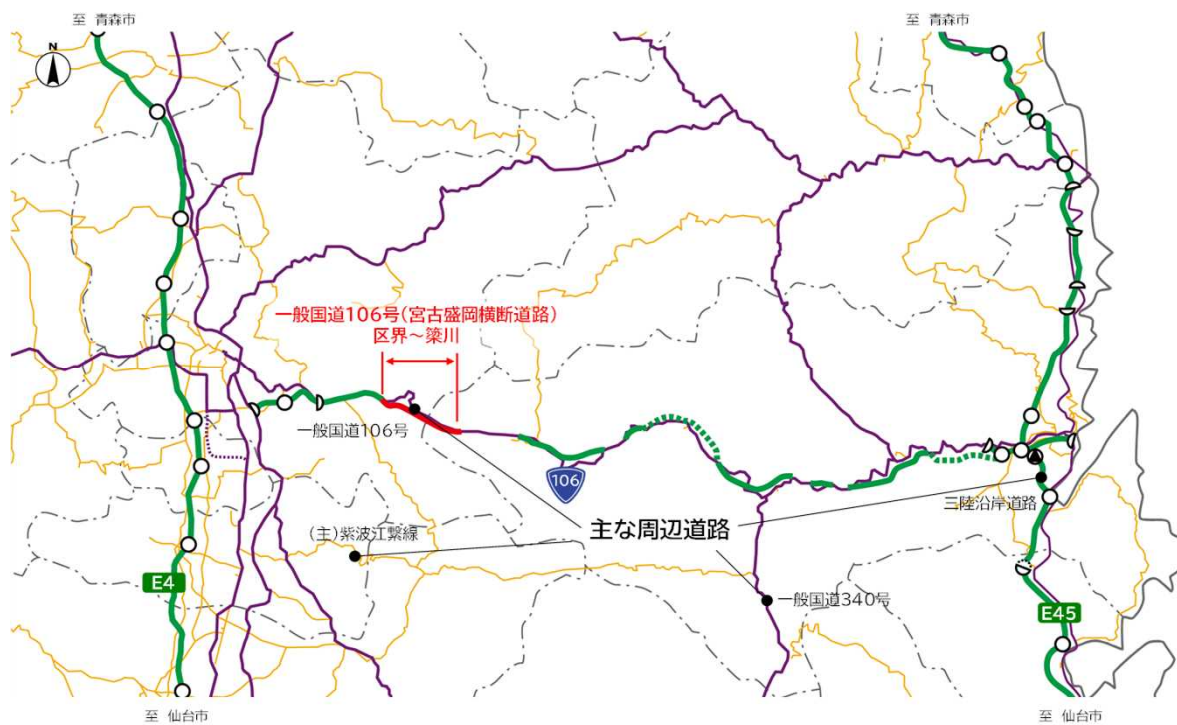

費用便益分析の条件

事業名：一般国道106号（宮古盛岡横断道路）区界～築川

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和5年12月 国土交通省 道路局 都市局)	☒		
	その他	☐		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年		
	社会的割引率	4%		
	基準年次	令和6年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	☒ (R22年)	
		複数時点での推計	☐	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計		☒
		整備の有無のいずれかのみ推計		☐ 有 ☐ 無
		いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)		☒ (H27センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)		☐
		その他()		☐
	開発交通量の考慮	無		☒
		有		☐
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	() 台トリップ/日
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分		☐
		転換率式を用いた配分		☐
		Q-V式と転換率式の併用による配分		☒
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		☐
		簡易手法		☐
		簡易手法の採択理由	小規模事業である	☐
山間部海岸部で併行道路が少ない			☐	
その他()				
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)				
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定		☒	
	採用理由を記載 交通量推計結果について、交通容量(Qmax)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。			
	最終配分の速度		☐	
	採用理由を記載			
	その他()		☐	

(3)

便益の算定

事業名：一般国道106号(宮古盛岡横断道路)区界～築川

(4)

[illegible]

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道106号(宮古盛岡横断道路)区界～築川

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.04	8.0	0.33

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-10年目	H 23	4%	1.6651	97.2	2.10	3.69				
-9年目	H 24	4%	1.6010	96.4	7.67	13.08				
-8年目	H 25	4%	1.5395	96.4	36.29	59.52				
-7年目	H 26	4%	1.4802	98.7	31.24	48.12				
-6年目	H 27	4%	1.4233	100.2	72.13	105.22				
-5年目	H 28	4%	1.3686	100.2	118.06	165.60				
-4年目	H 29	4%	1.3159	100.5	50.16	67.45				
-3年目	H 30	4%	1.2653	100.4	59.86	77.48				
-2年目	R 1	4%	1.2167	101.2	66.95	82.66				
-1年目	R 2	4%	1.1699	101.9	57.28	67.54				
供用開始年次	R 3	4%	1.1249	101.8			0.30	0.34		
1年目	R 4	4%	1.0816	102.7			0.30	0.32		
2年目	R 5	4%	1.0400	102.7			0.30	0.31		
3年目	R 6	4%	1.0000	102.7			0.30	0.30		
4年目	R 7	4%	0.9615	102.7			0.30	0.29		
5年目	R 8	4%	0.9246	102.7			0.30	0.28		
6年目	R 9	4%	0.8890	102.7			0.30	0.27		
7年目	R 10	4%	0.8548	102.7			0.30	0.26		
8年目	R 11	4%	0.8219	102.7			0.30	0.25		
9年目	R 12	4%	0.7903	102.7			0.30	0.24		
10年目	R 13	4%	0.7599	102.7			0.30	0.23		
11年目	R 14	4%	0.7307	102.7			0.30	0.22		
12年目	R 15	4%	0.7026	102.7			0.30	0.21		
13年目	R 16	4%	0.6756	102.7			0.30	0.20		
14年目	R 17	4%	0.6496	102.7			0.30	0.19		
15年目	R 18	4%	0.6246	102.7			0.30	0.19		
16年目	R 19	4%	0.6006	102.7			0.30	0.18		
17年目	R 20	4%	0.5775	102.7			0.30	0.17		
18年目	R 21	4%	0.5553	102.7			0.30	0.17		
19年目	R 22	4%	0.5339	102.7			0.30	0.16		
20年目	R 23	4%	0.5134	102.7			0.30	0.15		
21年目	R 24	4%	0.4936	102.7			0.30	0.15		
22年目	R 25	4%	0.4746	102.7			0.30	0.14		
23年目	R 26	4%	0.4564	102.7			0.30	0.14		
24年目	R 27	4%	0.4388	102.7			0.30	0.13		
25年目	R 28	4%	0.4220	102.7			0.30	0.13		
26年目	R 29	4%	0.4057	102.7			0.30	0.12		
27年目	R 30	4%	0.3901	102.7			0.30	0.12		
28年目	R 31	4%	0.3751	102.7			0.30	0.11		
29年目	R 32	4%	0.3607	102.7			0.30	0.11		
30年目	R 33	4%	0.3468	102.7			0.30	0.10		
31年目	R 34	4%	0.3335	102.7			0.30	0.10		
32年目	R 35	4%	0.3207	102.7			0.30	0.10		
33年目	R 36	4%	0.3083	102.7			0.30	0.09		
34年目	R 37	4%	0.2965	102.7			0.30	0.09		
35年目	R 38	4%	0.2851	102.7			0.30	0.09		
36年目	R 39	4%	0.2741	102.7			0.30	0.08		
37年目	R 40	4%	0.2636	102.7			0.30	0.08		
38年目	R 41	4%	0.2534	102.7			0.30	0.08		
39年目	R 42	4%	0.2437	102.7			0.30	0.07		
40年目	R 43	4%	0.2343	102.7			0.30	0.07		
41年目	R 44	4%	0.2253	102.7			0.30	0.07		
42年目	R 45	4%	0.2166	102.7			0.30	0.06		
43年目	R 46	4%	0.2083	102.7			0.30	0.06		
44年目	R 47	4%	0.2003	102.7			0.30	0.06		
45年目	R 48	4%	0.1926	102.7			0.30	0.06		
46年目	R 49	4%	0.1852	102.7			0.30	0.06		
47年目	R 50	4%	0.1780	102.7			0.30	0.05		
48年目	R 51	4%	0.1712	102.7			0.30	0.05		
49年目	R 52	4%	0.1646	102.7	-0.76	-0.13	0.30	0.05		
合 計					500.98	690.23	15.00	7.55		
単純事業費計					501.74		15.00			

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道106号(宮古盛岡横断道路)区界～築川

年次	年度 (基準年) R6	総走行台枠の年次別伸び率 (北東北ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車種	小型貨物	普通貨物	全 車				乗用車種	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車種	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R 3	0.99178	0.98150	1.00776	0.99167	4%	1.1249	101.8	7.37	4.79	5.40	17.56	19.93	1.40	0.53	0.58	2.51	2.85	1.01	1.15	21.08	23.92
1年目	R 4	0.99171	0.98116	1.00770	0.99160	4%	1.0816	102.7	7.31	4.70	5.44	17.45	18.87	1.39	0.52	0.58	2.49	2.69	1.00	1.08	20.94	22.65
2年目	R 5	0.99164	0.98079	1.00764	0.99153	4%	1.0400	102.7	7.25	4.61	5.48	17.34	18.03	1.38	0.51	0.58	2.47	2.57	0.99	1.03	20.80	21.63
3年目	R 6	0.99157	0.98042	1.00759	0.99146	4%	1.0000	102.7	7.19	4.52	5.52	17.23	17.23	1.37	0.50	0.58	2.45	2.45	0.98	0.98	20.66	20.66
4年目	R 7	0.99150	0.98003	1.00753	0.99138	4%	0.9615	102.7	7.13	4.43	5.56	17.12	16.46	1.36	0.49	0.58	2.43	2.34	0.97	0.93	20.52	19.73
5年目	R 8	0.99143	0.97962	1.00747	0.99131	4%	0.9246	102.7	7.07	4.34	5.60	17.01	15.73	1.35	0.48	0.58	2.41	2.23	0.96	0.89	20.38	18.84
6年目	R 9	0.99135	0.97920	1.00742	0.99123	4%	0.8890	102.7	7.01	4.25	5.64	16.90	15.02	1.34	0.47	0.58	2.39	2.12	0.95	0.84	20.24	17.99
7年目	R 10	0.99128	0.97875	1.00738	0.99115	4%	0.8548	102.7	6.95	4.16	5.68	16.79	14.35	1.33	0.46	0.58	2.37	2.03	0.94	0.80	20.10	17.18
8年目	R 11	0.99120	0.97829	1.00731	0.99107	4%	0.8219	102.7	6.89	4.07	5.72	16.68	13.71	1.32	0.45	0.58	2.35	1.93	0.93	0.76	19.96	16.41
9年目	R 12	0.99112	0.97781	1.00726	0.99099	4%	0.7903	102.7	6.83	3.98	5.76	16.57	13.10	1.31	0.44	0.58	2.33	1.84	0.92	0.73	19.82	15.66
10年目	R 13	0.99076	0.98557	1.00617	0.99195	4%	0.7599	102.7	6.77	3.92	5.80	16.49	12.53	1.30	0.43	0.58	2.31	1.76	0.91	0.69	19.71	14.98
11年目	R 14	0.99068	0.98535	1.00614	0.99189	4%	0.7307	102.7	6.71	3.86	5.84	16.41	11.99	1.29	0.42	0.58	2.29	1.67	0.90	0.66	19.60	14.32
12年目	R 15	0.99059	0.98514	1.00610	0.99182	4%	0.7026	102.7	6.65	3.80	5.88	16.33	11.47	1.28	0.41	0.58	2.27	1.59	0.89	0.63	19.49	13.69
13年目	R 16	0.99050	0.98491	1.00606	0.99176	4%	0.6756	102.7	6.59	3.74	5.92	16.25	10.98	1.27	0.40	0.58	2.25	1.52	0.88	0.59	19.38	13.09
14年目	R 17	0.99041	0.98468	1.00603	0.99169	4%	0.6496	102.7	6.53	3.68	5.96	16.17	10.50	1.26	0.39	0.58	2.23	1.45	0.87	0.57	19.27	12.52
15年目	R 18	0.99032	0.98444	1.00599	0.99162	4%	0.6246	102.7	6.47	3.62	6.00	16.09	10.05	1.25	0.38	0.58	2.21	1.38	0.86	0.54	19.16	11.97
16年目	R 19	0.99022	0.98420	1.00595	0.99155	4%	0.6006	102.7	6.41	3.56	6.04	16.01	9.62	1.24	0.37	0.58	2.19	1.32	0.85	0.51	19.05	11.44
17年目	R 20	0.99012	0.98394	1.00592	0.99147	4%	0.5775	102.7	6.35	3.50	6.08	15.93	9.20	1.23	0.36	0.58	2.17	1.25	0.84	0.49	18.94	10.94
18年目	R 21	0.99003	0.98368	1.00588	0.99140	4%	0.5553	102.7	6.29	3.44	6.12	15.85	8.80	1.22	0.35	0.58	2.15	1.19	0.83	0.46	18.83	10.46
19年目	R 22	0.98993	0.98341	1.00585	0.99133	4%	0.5339	102.7	6.23	3.38	6.16	15.77	8.42	1.21	0.34	0.58	2.13	1.14	0.82	0.44	18.72	9.99
20年目	R 23	0.98966	0.99107	0.99980	0.99174	4%	0.5134	102.7	6.17	3.35	6.16	15.68	8.05	1.20	0.34	0.58	2.12	1.09	0.81	0.42	18.61	9.55
21年目	R 24	0.98955	0.99099	0.99980	0.99168	4%	0.4936	102.7	6.11	3.32	6.16	15.59	7.70	1.19	0.34	0.58	2.11	1.04	0.80	0.39	18.50	9.13
22年目	R 25	0.98944	0.99091	0.99980	0.99161	4%	0.4746	102.7	6.05	3.29	6.16	15.50	7.36	1.18	0.34	0.58	2.10	1.00	0.79	0.37	18.39	8.73
23年目	R 26	0.98932	0.99082	0.99980	0.99153	4%	0.4564	102.7	5.99	3.26	6.16	15.41	7.03	1.17	0.34	0.58	2.09	0.95	0.78	0.36	18.28	8.34
24年目	R 27	0.98921	0.99074	0.99980	0.99146	4%	0.4388	102.7	5.93	3.23	6.16	15.32	6.72	1.16	0.34	0.58	2.08	0.91	0.77	0.34	18.17	7.97
25年目	R 28	0.98908	0.99065	0.99980	0.99139	4%	0.4220	102.7	5.87	3.20	6.16	15.23	6.43	1.15	0.34	0.58	2.07	0.87	0.76	0.32	18.06	7.62
26年目	R 29	0.98897	0.99056	0.99980	0.99131	4%	0.4057	102.7	5.81	3.17	6.16	15.14	6.14	1.14	0.34	0.58	2.06	0.84	0.75	0.30	17.95	7.28
27年目	R 30	0.98885	0.99047	0.99980	0.99124	4%	0.3901	102.7	5.75	3.14	6.16	15.05	5.87	1.13	0.34	0.58	2.05	0.80	0.74	0.29	17.84	6.96
28年目	R 31	0.98872	0.99038	0.99980	0.99116	4%	0.3751	102.7	5.69	3.11	6.16	14.96	5.61	1.12	0.34	0.58	2.04	0.77	0.73	0.27	17.73	6.65
29年目	R 32	0.98859	0.99029	0.99980	0.99108	4%	0.3607	102.7	5.63	3.08	6.16	14.87	5.36	1.11	0.34	0.58	2.03	0.73	0.72	0.26	17.62	6.36
30年目	R 33	0.98846	0.99019	0.99980	0.99100	4%	0.3468	102.7	5.57	3.05	6.16	14.78	5.13	1.10	0.34	0.58	2.02	0.70	0.71	0.25	17.51	6.07
31年目	R 34	0.98833	0.99009	0.99980	0.99092	4%	0.3335	102.7	5.50	3.02	6.16	14.68	4.90	1.09	0.34	0.58	2.01	0.67	0.70	0.23	17.39	5.80
32年目	R 35	0.98819	0.99000	0.99980	0.99084	4%	0.3207	102.7	5.44	2.99	6.16	14.59	4.68	1.08	0.34	0.58	2.00	0.64	0.69	0.22	17.28	5.54
33年目	R 36	0.98805	0.98989	0.99980	0.99075	4%	0.3083	102.7	5.37	2.96	6.16	14.49	4.47	1.07	0.34	0.58	1.99	0.61	0.68	0.21	17.16	5.29
34年目	R 37	0.98790	0.98979	0.99980	0.99067	4%	0.2965	102.7	5.31	2.93	6.16	14.40	4.27	1.06	0.34	0.58	1.98	0.59	0.67	0.20	17.05	5.05
35年目	R 38	0.98775	0.98969	0.99980	0.99058	4%	0.2851	102.7	5.24	2.90	6.16	14.30	4.08	1.05	0.34	0.58	1.97	0.56	0.66	0.19	16.93	4.83
36年目	R 39	0.98760	0.98958	0.99980	0.99049	4%	0.2741	102.7	5.18	2.87	6.16	14.21	3.89	1.04	0.34	0.58	1.96	0.54	0.65	0.18	16.82	4.61
37年目	R 40	0.98745	0.98947	0.99980	0.99040	4%	0.2636	102.7	5.11	2.84	6.16	14.11	3.72	1.03	0.34	0.58	1.95	0.51	0.64	0.17	16.70	4.40
38年目	R 41	0.98729	0.98936	0.99980	0.99030	4%	0.2534	102.7	5.05	2.81	6.16	14.02	3.55	1.02	0.34	0.58	1.94	0.49	0.63	0.16	16.59	4.20
39年目	R 42	0.98712	0.98924	0.99980	0.99021	4%	0.2437	102.7	4.98	2.78	6.16	13.92	3.39	1.01	0.34	0.58	1.93	0.47	0.62	0.15	16.47	4.01
40年目	R 43	0.98696	0.98912	0.99980	0.99011	4%	0.2343	102.7	4.92	2.75	6.16	13.83	3.24	1.00	0.34	0.58	1.92	0.45	0.61	0.14	16.36	3.83
41年目	R 44	0.98678	0.98901	0.99980	0.99001	4%	0.2253	102.7	4.85	2.72	6.16	13.73	3.09	0.99	0.34	0.58	1.91	0.43	0.60	0.14	16.24	3.66
42年目	R 45	0.98661	0.98888	0.99980	0.98991	4%	0.2166	102.7	4.79	2.69	6.16	13.64	2.95	0.98	0.34	0.58	1.90	0.41	0.59	0.13	16.13	3.49
43年目	R 46	0.98643	0.98876	0.99980	0.98981	4%	0.2083	102.7	4.72	2.66	6.16	13.54	2.82	0.97	0.34	0.58	1.89	0.39	0.58	0.12	16.01	3.33
44年目	R 47	0.98624	0.98863	0.99980	0.98970	4%	0.2003	102.7	4.66	2.63	6.16	13.45	2.69	0.96	0.34	0.58	1.88	0.38	0.57	0.11	15.90	3.18
45年目	R 48	0.98605	0.98850	0.99980	0.98960	4%	0.1926	102.7	4.59	2.60	6.16	13.35	2.57	0.95	0.34	0.58	1.87	0.36	0.56	0.11	15.78	3.04
46年目	R 49	0.98585	0.98837	0.99980	0.98949	4%	0.1852	102.7	4.53	2.57	6.16	13.26	2.46	0.94	0.34	0.58	1.86	0.34	0.55	0.10	15.67	2.90
47年目	R 50	0.98565	0.98823	0.99980	0.98938	4%	0.1780	102.7	4.46	2.54	6.16	13.16	2.34	0.93	0.34	0.58	1.85	0.33	0.54	0.10	15.55	2.77
48年目	R 51	0.98544	0.98809	0.99980	0.98926	4%	0.1712	102.7	4.40	2.51	6.16	13.07	2.24	0.92	0.34	0.58	1.84	0.32	0.53	0.09	15.44	2.64
49年目	R 52	0.98522	0.98794	0.99980	0.98915	4%	0.1646	102.7	4.33	2.48	6.16	12.97	2.14	0.91	0.34	0.58	1.83	0.30	0.52	0.09	15.32	2.52
合 計									294.00	167.80	300.40	762.20	400.88	57.75	18.90	29.00	105.65	55.81	38.25	21.18	906.10	477.82
