

(再評価)

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道 4 号 矢板大田原バイパス
事業区分	一般国道（二次改築）
事業主体	関東地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	【一体評価】矢板幅幅・矢板大田原バイパス・西那須野道路（一体） 全事業：費用便益比（B/C）=2.1（経済的純現在価値（B-C）=993億円、経済的内部収益率（EIRR）=7.8%） 残事業：費用便益比（B/C）=3.3（経済的純現在価値（B-C）=1,302億円、経済的内部収益率（EIRR）=14.0%） 【個別評価】矢板大田原バイパス 全事業：費用便益比（B/C）=2.2（経済的純現在価値（B-C）=426億円、経済的内部収益率（EIRR）=9.2%） 残事業：費用便益比（B/C）=2.3（経済的純現在価値（B-C）=440億円、経済的内部収益率（EIRR）=9.7%）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠
1. 活力		
円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a（費用便益分析対象区間）について 渋滞損失時間（現況）：7,952.7万人・時間/年 渋滞損失削減時間：182.6万人・時間/年（8,135.4万人・時間/年⇒7,952.7万人・時間/年） 区間b（当該区間／並行区間）について：国道4号（現道） 並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：3.5万人・時間/年（国道4号（現道）） 並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：8割削減（国道4号（現道））
	■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	対象区間（主要地方道矢板那珂川線～一般県道大田原矢板線 17.3km/h）、改善見込み（旅行速度17.3km/h⇒28.1km/h） 対象区間（矢板大田原市境～国道461号 19.9km/h）、改善見込み（旅行速度19.9km/h⇒24.3km/h）
	□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上 の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
	■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	利便性向上が見込まれるバス路線：大田原市営バス（国道4号現道に並行する区間を運行）
	■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	【一体評価】那須塩原市役所～JR宇都宮駅：117分→93分
	□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
	物流効率化の支援	
	□ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	
	■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上が見込まれる	農業を主体とする地域（矢板市）：農業産出額計（県内18位） 農業を主体とする地域（大田原市）：農業産出額計（県内2位）、米（県内1位）、豆類（県内2位）、野菜（県内2位）ねぎ・なす・トマトなど、 肉用牛（県内3位）、乳用牛（県内3位）、豚（県内3位）、鶏（県内3位） 農業を主体とする地域（那須塩原市）：農業産出額計（全国12位、県内1位）、米（県内4位）、肉用牛（県内1位）、乳用牛（全国2位、県内1位）、鶏（県内1位） ※順位は農業産出額（R4） 主な出荷先：宇都宮市中央卸売市場
	□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	

政策目標	指 標（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠
1. 活力	都市の再生	
	☐ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
	☐ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
	☒ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	「野崎工業団地土地区画整理事業」
	☐ 中心市街地内で行う事業である	
	☐ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
	☐ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
	☐ 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	
	☐ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり	
	☐ 地域高規格道路の位置づけあり	
	☐ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合）	
	☒ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	矢板市～大田原市において、当該事業区間を一部通行
	☐ 現道等における交通不能区間を解消する	
	☐ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
	☒ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	【一体評価】那須塩原市役所～宇都宮市：122分→98分
	個性ある地域の形成	
	☐ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
	☒ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	野崎工業団地（県内3位）、野崎第二工業団地（県内18位） ※順位は工業団地別製造品出荷額等
	☒ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	「道の駅 やいた」（1,556千人）、「道の駅 明治の森・黒磯」（722千人）、「道の駅 湯の香しおばら」（654千人）など、宇都宮方面から矢板市、大田原市及び那須塩原市方面へのアクセスが向上
	☐ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	
	☐ 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
	☐ 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	
	☒ 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	栃木県無電柱化推進計画（R4策定/R4～R8の5年間）に位置付けされている
	☒ 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	栃木県無電柱化推進計画（R4策定/R4～R8の5年間）に位置付けされ、新たに無電柱化を達成する
	安全で安心できるくらしの確保	
	☒ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	【一体評価】さくら市役所～那須赤十字病院救命救急センター：56分→49分

政策目標	指 標（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更）	指標チェックの根拠
3. 安全		
	安全な生活環境の確保	
	☐ 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
	☐ 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は児童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	
	☐ 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
	☒ 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	「栃木県地域防災計画」（R6.4）にて第一次緊急輸送道路に指定されている
	☒ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	代替する緊急輸送道路路線名：国道4号（現道）東北自動車道
	☐ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
	☐ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
	☐ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
4. 環境		
	地球環境の保全	
	☒ 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：2,258.9t/年
	生活環境の改善・保全	
	☒ 現道等における自動車からのNO2排出削減率	（現況） 自動車NOx・PM法対策指定地域なし （推計結果） 評価対象区間（平行区間等）：国道4号（現道） 排出削減量：11.7t/年、排出削減率：6割削減
	☒ 現道等における自動車からのSPM排出削減率	（現況） 自動車NOx・PM法対策指定地域なし （推計結果） 評価対象区間（平行区間等）：国道4号（現道） 排出削減量：0.67t/年、排出削減率：7割削減
	☒ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	現道の夜間騒音は要請限度を上回っており、バイパスに大型車等が転換することで要請限度を下回ることが期待される
	☐ その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他		
	他のプロジェクトとの関係	
	☒ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	国道4号矢板拉幅 国道4号西那須野道路
	☒ 他機関との連携プログラムに位置づけられている	「矢板市都市計画マスタープラン」（R5.3）において、道路ネットワーク整備の「広域都市間交流軸」に位置づけ 「大田原市都市計画マスタープラン」（H22.3）において、広域幹線道路として、広域的な都市交通を処理する骨格的な道路と位置づけ 「那須塩原市都市計画マスタープラン」（H21.3）において、骨格となる幹線交通網の計画的な整備の「広域幹線道路」に位置づけ 「矢板創生未来プラン 総合計画」（R3.3）において、重点的取り組み施策として、大都市等との交流基盤強化に位置づけ
	☐ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

(再評価)

様式－２

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・ＢＰ・その他の別
一般国道４号	矢板拡幅・ 矢板大田原バイパス・ 西那須野道路（一体）	L＝１９.０ km	二次改築	現拡・ＢＰ

計画交通量 （台/日）	車線数	事業主体
20,600～43,000	4	関東地方整備局

①費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和6年度			
単純合計	793億円	243億円		1,036億円
うち残事業分	566億円	243億円		809億円
基準年における 現在価値（C）	797億円	79億円		876億円
うち残事業分	488億円	79億円		567億円

②便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和6年度			
供用年	令和11年度、令和13年度、令和15年度			
単年便益 （初年便益）	29億円	2.5億円	0.73億円	33億円
基準年における 現在価値（B）	1,621億円	215億円	33億円	1,869億円
うち残事業分	1,621億円	215億円	33億円	1,869億円

③結果

【事業全体】

費用便益比（B／C）	2.1 〔4%〕	[参考] 3.2 〔2%〕	[参考] 4.0 〔1%〕
経済的純現在価値（B－C）	993億円 〔4%〕	[参考] 2,083億円 〔2%〕	[参考] 2,989億円 〔1%〕
経済的内部収益率（EIRR）	7.8%		

※〔〕内は社会的割引率

【残事業】

費用便益比（B／C）	3.3 〔4%〕	[参考] 4.7 〔2%〕	[参考] 5.6 〔1%〕
経済的純現在価値（B－C）	1,302億円 〔4%〕	[参考] 2,378億円 〔2%〕	[参考] 3,272億円 〔1%〕
経済的内部収益率（EIRR）	14.0%		

※〔〕内は社会的割引率

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	20,600～43,000 （台/日）	±10%	1.9～2.3
事業費	793億円	±10%	2.0～2.3
事業期間	27年	±20%	2.0～2.2

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	20,600～43,000 （台/日）	±10%	3.0～3.6
事業費	566億円	±10%	3.0～3.6
事業期間	8年	±20%	3.1～3.4

交通状況の変化

様式－３①

事業名：矢板拡幅・矢板大田原バイパス・西那須野道路（一体）（事業全体）

（推計時点 R22年）

			整備なし (A)	整備あり (B)		
①新設・改築道路 [矢板拡幅・矢板大田原バイパス・西那須野道路]：19.0km			交通量※ ¹	[台/日]	8,900	33,100
			走行時間※ ²	[分]	28	23
			走行時間費用※ ³	[億円/年]	53.64	147.95
②主な周辺道路	国道4号 現道 ：7.7km	交通量	[台/日]	15,600	9,300	
		走行時間	[分]	13	12	
		走行時間費用	[億円/年]	40.08	19.13	
	(主)矢板那須線 ：17.1km	交通量	[台/日]	9,000	5,600	
		走行時間	[分]	24	22	
		走行時間費用	[億円/年]	41.87	24.27	
	(主)大田原氏家線 ：18.8km	交通量	[台/日]	13,800	10,700	
		走行時間	[分]	29	26	
		走行時間費用	[億円/年]	78.68	52.95	
	(一)大田原矢板線 ：2.8km	交通量	[台/日]	7,600	6,600	
		走行時間	[分]	6	5	
		走行時間費用	[億円/年]	7.62	6.17	
	(一)西那須野下石上線 ：5.1km	交通量	[台/日]	11,400	8,600	
		走行時間	[分]	8	7	
		走行時間費用	[億円/年]	17.10	11.38	
③その他道路合計 ：2,120.8km		走行時間費用	[億円/年]	6,345.68	6,220.40	

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：2,191.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	6,584.67	6,482.25	102.42

※１： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※２： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)

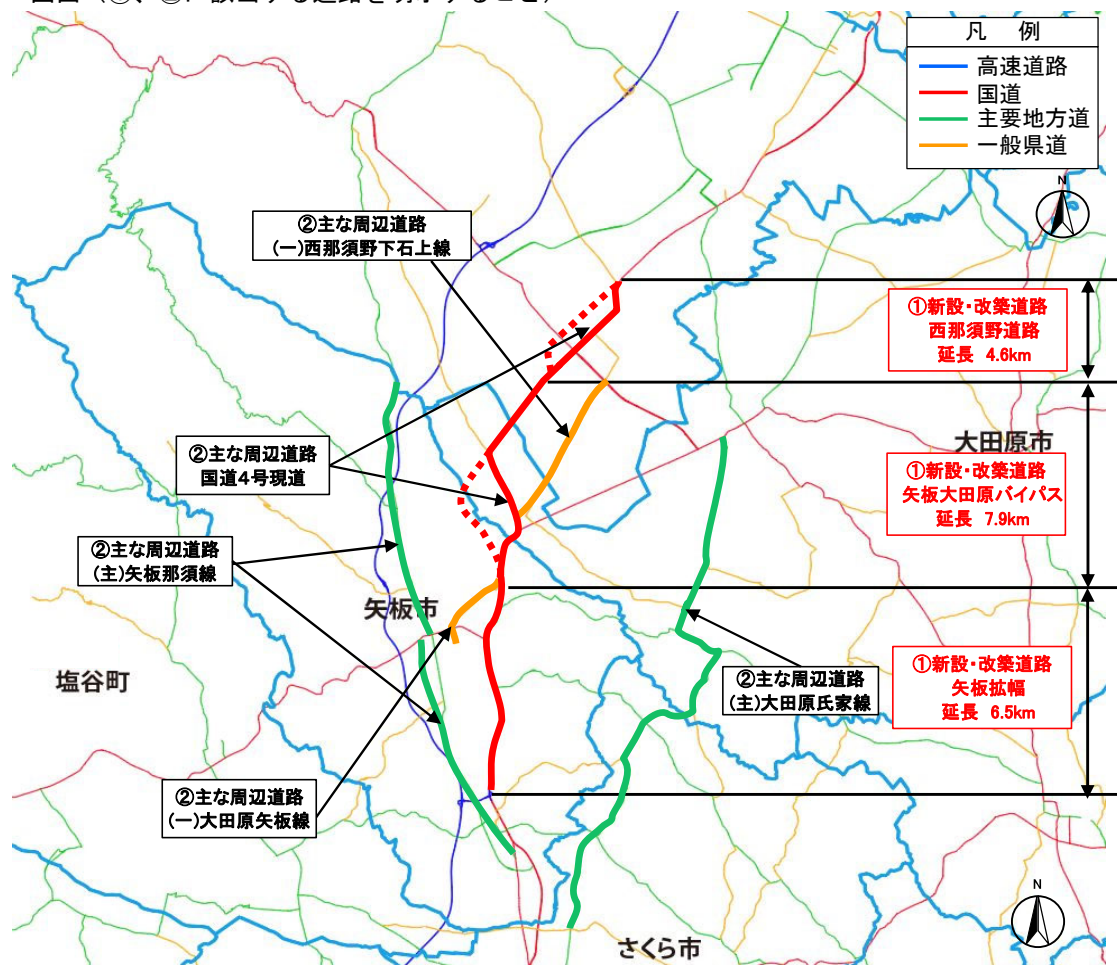

費用便益分析の条件

事業名：矢板拡幅・矢板大田原バイパス・西那須野道路（一体）

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和5年12月 国土交通省 道路局 都市局)	☒		
	その他	☐		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間		
	社会的割引率	4%		
	比較のための参考とすべき値	2%、1%		
	基準年次	令和6年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	☒ (R22)	
		複数時点での推計	☐	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	☒	
		整備の有無のいずれかのみ推計	☐ 有 ☐ 無	
		いずれかのみ推計の場合 いずれかのみ推計とした理由を記載		
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	☒ (H27センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	☐	
		その他()	☐	
	開発交通量の考慮	無	☒	
		有	☐	
		有の場合のみ 考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	() 台トリップ/日	
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	☐	
		転換率式を用いた配分	☐	
		Q-V式と転換率式の併用による配分	☒	
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	☐	
		簡易手法	☐	
		簡易手法の採択理由	小規模事業である	☐
			山間部海岸部で併行道路が少ない	☐
			その他()	
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
速度設定の考え方	その他の()	☐		
	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	☒		
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax～Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin～Qmax)の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。			
	最終配分の速度	☐		
	採用理由を記載			
その他の()		☐		

(3)

便益の算定

項目			チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない		☒	
		考慮する		☐	
		考慮する場合のみ	面的に考慮		☐
			対象路線のみ考慮		☐
			採用した休日係数		() %
			休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		
	災害等による通行止めの影響	考慮しない		☒	
		考慮する		☐	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数		() 日
			採用した通行止め日数の考え方を記載		
			とり止め交通を考慮する		☐
			とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載		
	冬期交通の影響	考慮しない		☒	
		考慮する		☐	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数		() 日
			採用した冬期日数の考え方を記載		
			冬期の走行速度と交通容量の関係設定の考え方を記載		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定		☒		
	その他 (				

事業名：矢板拡幅・矢板大田原バイパス・西那須野道路（一体）

(4)

[illegible]

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 矢板拡幅・矢板大田原バイパス・西那須野道路(一体)(事業全体)

				単価(億円)		延長(km)	単純単価(億円)			
				0.27		19.0	5.20			
年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
－23年目	H 18	4%	2.0258	103.0	0.51	1.04				
－22年目	H 19	4%	1.9479	102.1	3.00	5.88				
－21年目	H 20	4%	1.8730	101.6	3.62	6.86				
－20年目	H 21	4%	1.8009	100.3	12.56	23.15				
－19年目	H 22	4%	1.7317	98.6	10.24	18.47				
－18年目	H 23	4%	1.6651	97.2	9.46	16.64				
－17年目	H 24	4%	1.6010	96.4	19.54	33.33				
－16年目	H 25	4%	1.5395	96.4	14.45	23.69				
－15年目	H 26	4%	1.4802	98.7	10.58	16.30				
－14年目	H 27	4%	1.4233	100.2	6.60	9.63				
－13年目	H 28	4%	1.3686	100.2	2.22	3.11				
－12年目	H 29	4%	1.3159	100.5	8.58	11.54				
－11年目	H 30	4%	1.2653	100.4	15.87	20.53				
－10年目	R 1	4%	1.2167	101.2	16.71	20.64				
－9年目	R 2	4%	1.1699	101.9	16.09	18.97				
－8年目	R 3	4%	1.1249	101.8	19.56	22.19				
－7年目	R 4	4%	1.0816	102.7	30.02	32.47				
－6年目	R 5	4%	1.0400	102.7	15.57	16.19				
基準年	R 6	4%	1.0000	102.7	12.11	12.11				
－4年目	R 7	4%	0.9615	102.7	78.58	75.56				
－3年目	R 8	4%	0.9246	102.7	107.16	99.07				
－2年目	R 9	4%	0.8890	102.7	119.30	106.06				
－1年目	R 10	4%	0.8548	102.7	77.09	65.90				
供用開始年次	R 11	4%	0.8219	102.7	61.21	50.31	1.09	0.90		
1年目	R 12	4%	0.7903	102.7	55.39	43.78	1.09	0.86		
供用開始年次	R 13	4%	0.7599	102.7	29.72	22.58	2.28	1.73		
3年目	R 14	4%	0.7307	102.7	37.21	27.19	2.28	1.67		
供用開始年次	R 15	4%	0.7026	102.7			4.73	3.32		
5年目	R 16	4%	0.6756	102.7			4.73	3.19		
6年目	R 17	4%	0.6496	102.7			4.73	3.07		
7年目	R 18	4%	0.6246	102.7			4.73	2.95		
8年目	R 19	4%	0.6006	102.7			4.73	2.84		
9年目	R 20	4%	0.5775	102.7			4.73	2.73		
10年目	R 21	4%	0.5553	102.7			4.73	2.62		
11年目	R 22	4%	0.5339	102.7			4.73	2.52		
12年目	R 23	4%	0.5134	102.7			4.73	2.43		
13年目	R 24	4%	0.4936	102.7			4.73	2.33		
14年目	R 25	4%	0.4746	102.7			4.73	2.24		
15年目	R 26	4%	0.4564	102.7			4.73	2.16		
16年目	R 27	4%	0.4388	102.7			4.73	2.07		
17年目	R 28	4%	0.4220	102.7			4.73	1.99		
18年目	R 29	4%	0.4057	102.7			4.73	1.92		
19年目	R 30	4%	0.3901	102.7			4.73	1.84		
20年目	R 31	4%	0.3751	102.7			4.73	1.77		
21年目	R 32	4%	0.3607	102.7			4.73	1.71		
22年目	R 33	4%	0.3468	102.7			4.73	1.64		
23年目	R 34	4%	0.3335	102.7			4.73	1.58		
24年目	R 35	4%	0.3207	102.7			4.73	1.52		
25年目	R 36	4%	0.3083	102.7			4.73	1.46		
26年目	R 37	4%	0.2965	102.7			4.73	1.40		
27年目	R 38	4%	0.2851	102.7			4.73	1.35		
28年目	R 39	4%	0.2741	102.7			4.73	1.30		
29年目	R 40	4%	0.2636	102.7			4.73	1.25		
30年目	R 41	4%	0.2534	102.7			4.73	1.20		
31年目	R 42	4%	0.2437	102.7			4.73	1.15		
32年目	R 43	4%	0.2343	102.7			4.73	1.11		
33年目	R 44	4%	0.2253	102.7			4.73	1.06		
34年目	R 45	4%	0.2166	102.7			4.73	1.02		
35年目	R 46	4%	0.2083	102.7			4.73	0.98		
36年目	R 47	4%	0.2003	102.7			4.73	0.95		
37年目	R 48	4%	0.1926	102.7			4.73	0.91		
38年目	R 49	4%	0.1852	102.7			4.73	0.88		
39年目	R 50	4%	0.1780	102.7			4.73	0.84		
40年目	R 51	4%	0.1712	102.7			4.73	0.81		
41年目	R 52	4%	0.1646	102.7			4.73	0.78		
42年目	R 53	4%	0.1583	102.7			4.73	0.75		
43年目	R 54	4%	0.1522	102.7			4.73	0.72		
44年目	R 55	4%	0.1463	102.7			4.73	0.69		
45年目	R 56	4%	0.1407	102.7			4.73	0.67		
46年目	R 57	4%	0.1353	102.7			4.73	0.64		
47年目	R 58	4%	0.1301	102.7			4.73	0.62		
48年目	R 59	4%	0.1251	102.7			4.73	0.59		
49年目	R 60	4%	0.1203	102.7			4.73	0.57		
50年目	R 61	4%	0.1157	102.7			4.73	0.55		
51年目	R 62	4%	0.1112	102.7			4.73	0.53		
52年目	R 63	4%	0.1069	102.7			4.73	0.51		
53年目	R 64	4%	0.1028	102.7	-61.08	-6.28	4.73	0.49		
合 計					731.86	796.92	243.11	79.36		
単純事業費計					792.95		243.11			

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 矢板拡幅・矢板大田原バイパス・西那須野道路(一体)(事業全体)

				単価(億円)		延長(km)	単純単価(億円)			
				0.27		19.0	5.20			
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
－23年目	H 18	4%	1.9869	103.0	0.51	1.02				
－22年目	H 19	4%	1.9104	102.1	3.00	5.77				
－21年目	H 20	4%	1.8370	101.6	3.62	6.73				
－20年目	H 21	4%	1.7663	100.3	12.56	22.71				
－19年目	H 22	4%	1.6984	98.6	10.24	18.11				
－18年目	H 23	4%	1.6331	97.2	9.46	16.32				
－17年目	H 24	4%	1.5702	96.4	19.54	32.69				
－16年目	H 25	4%	1.5098	96.4	14.45	23.24				
－15年目	H 26	4%	1.4518	98.7	10.58	15.99				
－14年目	H 27	4%	1.3959	100.2	6.60	9.44				
－13年目	H 28	4%	1.3423	100.2	2.22	3.05				
－12年目	H 29	4%	1.2906	100.5	8.58	11.32				
－11年目	H 30	4%	1.2410	100.4	15.87	20.14				
－10年目	R 1	4%	1.1933	101.2	16.71	20.24				
－9年目	R 2	4%	1.1474	101.9	16.09	18.60				
－8年目	R 3	4%	1.1032	101.8	19.56	21.77				
－7年目	R 4	4%	1.0608	102.7	30.02	31.85				
－6年目	R 5	2%	1.0200	102.7	15.57	15.88				
基準年	R 6	2%	1.0000	102.7	12.11	12.11				
－4年目	R 7	2%	0.9804	102.7	78.58	77.04				
－3年目	R 8	2%	0.9612	102.7	107.16	103.00				
－2年目	R 9	2%	0.9423	102.7	119.30	112.42				
－1年目	R 10	2%	0.9238	102.7	77.09	71.22				
供用開始年次	R 11	2%	0.9057	102.7	61.21	55.44	1.09	0.99		
1年目	R 12	2%	0.8880	102.7	55.39	49.19	1.09	0.97		
供用開始年次	R 13	2%	0.8706	102.7	29.72	25.87	2.28	1.99		
3年目	R 14	2%	0.8535	102.7	37.21	31.76	2.28	1.95		
供用開始年次	R 15	2%	0.8368	102.7			4.73	3.96		
5年目	R 16	2%	0.8203	102.7			4.73	3.88		
6年目	R 17	2%	0.8043	102.7			4.73	3.80		
7年目	R 18	2%	0.7885	102.7			4.73	3.73		
8年目	R 19	2%	0.7730	102.7			4.73	3.65		
9年目	R 20	2%	0.7579	102.7			4.73	3.58		
10年目	R 21	2%	0.7430	102.7			4.73	3.51		
11年目	R 22	2%	0.7284	102.7			4.73	3.44		
12年目	R 23	2%	0.7142	102.7			4.73	3.38		
13年目	R 24	2%	0.7002	102.7			4.73	3.31		
14年目	R 25	2%	0.6864	102.7			4.73	3.24		
15年目	R 26	2%	0.6730	102.7			4.73	3.18		
16年目	R 27	2%	0.6598	102.7			4.73	3.12		
17年目	R 28	2%	0.6468	102.7			4.73	3.06		
18年目	R 29	2%	0.6342	102.7			4.73	3.00		
19年目	R 30	2%	0.6217	102.7			4.73	2.94		
20年目	R 31	2%	0.6095	102.7			4.73	2.88		
21年目	R 32	2%	0.5976	102.7			4.73	2.82		
22年目	R 33	2%	0.5859	102.7			4.73	2.77		
23年目	R 34	2%	0.5744	102.7			4.73	2.72		
24年目	R 35	2%	0.5631	102.7			4.73	2.66		
25年目	R 36	2%	0.5521	102.7			4.73	2.61		
26年目	R 37	2%	0.5412	102.7			4.73	2.56		
27年目	R 38	2%	0.5306	102.7			4.73	2.51		
28年目	R 39	2%	0.5202	102.7			4.73	2.46		
29年目	R 40	2%	0.5100	102.7			4.73	2.41		
30年目	R 41	2%	0.5000	102.7			4.73	2.36		
31年目	R 42	2%	0.4902	102.7			4.73	2.32		
32年目	R 43	2%	0.4806	102.7			4.73	2.27		
33年目	R 44	2%	0.4712	102.7			4.73	2.23		
34年目	R 45	2%	0.4619	102.7			4.73	2.18		
35年目	R 46	2%	0.4529	102.7			4.73	2.14		
36年目	R 47	2%	0.4440	102.7			4.73	2.10		
37年目	R 48	2%	0.4353	102.7			4.73	2.06		
38年目	R 49	2%	0.4268	102.7			4.73	2.02		
39年目	R 50	2%	0.4184	102.7			4.73	1.98		
40年目	R 51	2%	0.4102	102.7			4.73	1.94		
41年目	R 52	2%	0.4022	102.7			4.73	1.90		
42年目	R 53	2%	0.3943	102.7			4.73	1.86		
43年目	R 54	2%	0.3865	102.7			4.73	1.83		
44年目	R 55	2%	0.3790	102.7			4.73	1.79		
45年目	R 56	2%	0.3715	102.7			4.73	1.76		
46年目	R 57	2%	0.3642	102.7			4.73	1.72		
47年目	R 58	2%	0.3571	102.7			4.73	1.69		
48年目	R 59	2%	0.3501	102.7			4.73	1.66		
49年目	R 60	2%	0.3432	102.7			4.73	1.62		
50年目	R 61	2%	0.3365	102.7			4.73	1.59		
51年目	R 62	2%	0.3299	102.7			4.73	1.56		
52年目	R 63	2%	0.3234	102.7			4.73	1.53		
53年目	R 64	2%	0.3171	102.7	-61.08	-19.37	4.73	1.50		
合 計					731.86	813.53	243.11	132.67		
単純事業費計					792.95		243.11			

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 矢板拡幅・矢板大田原バイパス・西那須野道路(一体)(事業全体)

				単価(億円)		延長(km)	単純単価(億円)			
				0.27		19.0	5.20			
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
－23年目	H 18	4%	1.9674	103.0	0.51	1.01				
－22年目	H 19	4%	1.8917	102.1	3.00	5.71				
－21年目	H 20	4%	1.8190	101.6	3.62	6.66				
－20年目	H 21	4%	1.7490	100.3	12.56	22.49				
－19年目	H 22	4%	1.6817	98.6	10.24	17.93				
－18年目	H 23	4%	1.6170	97.2	9.46	16.16				
－17年目	H 24	4%	1.5548	96.4	19.54	32.37				
－16年目	H 25	4%	1.4950	96.4	14.45	23.01				
－15年目	H 26	4%	1.4375	98.7	10.58	15.83				
－14年目	H 27	4%	1.3823	100.2	6.60	9.35				
－13年目	H 28	4%	1.3291	100.2	2.22	3.02				
－12年目	H 29	4%	1.2780	100.5	8.58	11.21				
－11年目	H 30	4%	1.2288	100.4	15.87	19.94				
－10年目	R 1	4%	1.1816	101.2	16.71	20.04				
－9年目	R 2	4%	1.1361	101.9	16.09	18.42				
－8年目	R 3	4%	1.0924	101.8	19.56	21.55				
－7年目	R 4	4%	1.0504	102.7	30.02	31.54				
－6年目	R 5	1%	1.0100	102.7	15.57	15.73				
基準年	R 6	1%	1.0000	102.7	12.11	12.11				
－4年目	R 7	1%	0.9901	102.7	78.58	77.80				
－3年目	R 8	1%	0.9803	102.7	107.16	105.05				
－2年目	R 9	1%	0.9706	102.7	119.30	115.80				
－1年目	R 10	1%	0.9610	102.7	77.09	74.08				
供用開始年次	R 11	1%	0.9515	102.7	61.21	58.24	1.09	1.04		
1年目	R 12	1%	0.9420	102.7	55.39	52.18	1.09	1.03		
供用開始年次	R 13	1%	0.9327	102.7	29.72	27.72	2.28	2.13		
3年目	R 14	1%	0.9235	102.7	37.21	34.36	2.28	2.11		
供用開始年次	R 15	1%	0.9143	102.7			4.73	4.32		
5年目	R 16	1%	0.9053	102.7			4.73	4.28		
6年目	R 17	1%	0.8963	102.7			4.73	4.24		
7年目	R 18	1%	0.8874	102.7			4.73	4.20		
8年目	R 19	1%	0.8787	102.7			4.73	4.15		
9年目	R 20	1%	0.8700	102.7			4.73	4.11		
10年目	R 21	1%	0.8613	102.7			4.73	4.07		
11年目	R 22	1%	0.8528	102.7			4.73	4.03		
12年目	R 23	1%	0.8444	102.7			4.73	3.99		
13年目	R 24	1%	0.8360	102.7			4.73	3.95		
14年目	R 25	1%	0.8277	102.7			4.73	3.91		
15年目	R 26	1%	0.8195	102.7			4.73	3.87		
16年目	R 27	1%	0.8114	102.7			4.73	3.84		
17年目	R 28	1%	0.8034	102.7			4.73	3.80		
18年目	R 29	1%	0.7954	102.7			4.73	3.76		
19年目	R 30	1%	0.7876	102.7			4.73	3.72		
20年目	R 31	1%	0.7798	102.7			4.73	3.69		
21年目	R 32	1%	0.7720	102.7			4.73	3.65		
22年目	R 33	1%	0.7644	102.7			4.73	3.61		
23年目	R 34	1%	0.7568	102.7			4.73	3.58		
24年目	R 35	1%	0.7493	102.7			4.73	3.54		
25年目	R 36	1%	0.7419	102.7			4.73	3.51		
26年目	R 37	1%	0.7346	102.7			4.73	3.47		
27年目	R 38	1%	0.7273	102.7			4.73	3.44		
28年目	R 39	1%	0.7201	102.7			4.73	3.40		
29年目	R 40	1%	0.7130	102.7			4.73	3.37		
30年目	R 41	1%	0.7059	102.7			4.73	3.34		
31年目	R 42	1%	0.6989	102.7			4.73	3.30		
32年目	R 43	1%	0.6920	102.7			4.73	3.27		
33年目	R 44	1%	0.6852	102.7			4.73	3.24		
34年目	R 45	1%	0.6784	102.7			4.73	3.21		
35年目	R 46	1%	0.6717	102.7			4.73	3.18		
36年目	R 47	1%	0.6650	102.7			4.73	3.14		
37年目	R 48	1%	0.6584	102.7			4.73	3.11		
38年目	R 49	1%	0.6519	102.7			4.73	3.08		
39年目	R 50	1%	0.6454	102.7			4.73	3.05		
40年目	R 51	1%	0.6391	102.7			4.73	3.02		
41年目	R 52	1%	0.6327	102.7			4.73	2.99		
42年目	R 53	1%	0.6265	102.7			4.73	2.96		
43年目	R 54	1%	0.6203	102.7			4.73	2.93		
44年目	R 55	1%	0.6141	102.7			4.73	2.90		
45年目	R 56	1%	0.6080	102.7			4.73	2.87		
46年目	R 57	1%	0.6020	102.7			4.73	2.85		
47年目	R 58	1%	0.5961	102.7			4.73	2.82		
48年目	R 59	1%	0.5902	102.7			4.73	2.79		
49年目	R 60	1%	0.5843	102.7			4.73	2.76		
50年目	R 61	1%	0.5785	102.7			4.73	2.73		
51年目	R 62	1%	0.5728	102.7			4.73	2.71		
52年目	R 63	1%	0.5671	102.7			4.73	2.68		
53年目	R 64	1%	0.5615	102.7	-61.08	-34.30	4.73	2.65		
合 計					731.86	815.00	243.11	177.41		
単純事業費計					792.95		243.11			

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 矢板拡幅・矢板大田原バイパス・西那須野道路(一体)(残事業)

箇所名: 矢板拡幅・矢板大田原バイパス・西那須野道路(一休)(残事業)							単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)	
							0.27	19.0	5.20	
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
ー4年目	R 7	4%	0.9615	102.7	78.58	75.56				
ー3年目	R 8	4%	0.9246	102.7	107.16	99.07				
ー2年目	R 9	4%	0.8890	102.7	119.30	106.06				
ー1年目	R 10	4%	0.8548	102.7	77.09	65.90				
供用開始年次	R 11	4%	0.8219	102.7	61.21	50.31	1.09	0.90		
1年目	R 12	4%	0.7903	102.7	55.39	43.78	1.09	0.86		
供用開始年次	R 13	4%	0.7599	102.7	29.72	22.58	2.28	1.73		
3年目	R 14	4%	0.7307	102.7	37.21	27.19	2.28	1.67		
供用開始年次	R 15	4%	0.7026	102.7			4.73	3.32		
5年目	R 16	4%	0.6756	102.7			4.73	3.19		
6年目	R 17	4%	0.6496	102.7			4.73	3.07		
7年目	R 18	4%	0.6246	102.7			4.73	2.95		
8年目	R 19	4%	0.6006	102.7			4.73	2.84		
9年目	R 20	4%	0.5775	102.7			4.73	2.73		
10年目	R 21	4%	0.5553	102.7			4.73	2.62		
11年目	R 22	4%	0.5339	102.7			4.73	2.52		
12年目	R 23	4%	0.5134	102.7			4.73	2.43		
13年目	R 24	4%	0.4936	102.7			4.73	2.33		
14年目	R 25	4%	0.4746	102.7			4.73	2.24		
15年目	R 26	4%	0.4564	102.7			4.73	2.16		
16年目	R 27	4%	0.4388	102.7			4.73	2.07		
17年目	R 28	4%	0.4220	102.7			4.73	1.99		
18年目	R 29	4%	0.4057	102.7			4.73	1.92		
19年目	R 30	4%	0.3901	102.7			4.73	1.84		
20年目	R 31	4%	0.3751	102.7			4.73	1.77		
21年目	R 32	4%	0.3607	102.7			4.73	1.71		
22年目	R 33	4%	0.3468	102.7			4.73	1.64		
23年目	R 34	4%	0.3335	102.7			4.73	1.58		
24年目	R 35	4%	0.3207	102.7			4.73	1.52		
25年目	R 36	4%	0.3083	102.7			4.73	1.46		
26年目	R 37	4%	0.2965	102.7			4.73	1.40		
27年目	R 38	4%	0.2851	102.7			4.73	1.35		
28年目	R 39	4%	0.2741	102.7			4.73	1.30		
29年目	R 40	4%	0.2636	102.7			4.73	1.25		
30年目	R 41	4%	0.2534	102.7			4.73	1.20		
31年目	R 42	4%	0.2437	102.7			4.73	1.15		
32年目	R 43	4%	0.2343	102.7			4.73	1.11		
33年目	R 44	4%	0.2253	102.7			4.73	1.06		
34年目	R 45	4%	0.2166	102.7			4.73	1.02		
35年目	R 46	4%	0.2083	102.7			4.73	0.98		
36年目	R 47	4%	0.2003	102.7			4.73	0.95		
37年目	R 48	4%	0.1926	102.7			4.73	0.91		
38年目	R 49	4%	0.1852	102.7			4.73	0.88		
39年目	R 50	4%	0.1780	102.7			4.73	0.84		
40年目	R 51	4%	0.1712	102.7			4.73	0.81		
41年目	R 52	4%	0.1646	102.7			4.73	0.78		
42年目	R 53	4%	0.1583	102.7			4.73	0.75		
43年目	R 54	4%	0.1522	102.7			4.73	0.72		
44年目	R 55	4%	0.1463	102.7			4.73	0.69		
45年目	R 56	4%	0.1407	102.7			4.73	0.67		
46年目	R 57	4%	0.1353	102.7			4.73	0.64		
47年目	R 58	4%	0.1301	102.7			4.73	0.62		
48年目	R 59	4%	0.1251	102.7			4.73	0.59		
49年目	R 60	4%	0.1203	102.7			4.73	0.57		
50年目	R 61	4%	0.1157	102.7			4.73	0.55		
51年目	R 62	4%	0.1112	102.7			4.73	0.53		
52年目	R 63	4%	0.1069	102.7			4.73	0.51		
53年目	R 64	4%	0.1028	102.7	-23.07	-2.37	4.73	0.49		
合 計					542.59	488.08	243.11	79.36		
単純事業費計					565.66		243.11			

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 矢板拡幅・矢板大田原バイパス・西那須野道路(一体)(残事業)

					単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)	
					0.27		19.0		5.20	
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
－4年目	R 7	2%	0.9804	102.7	78.58	77.04				
－3年目	R 8	2%	0.9612	102.7	107.16	103.00				
－2年目	R 9	2%	0.9423	102.7	119.30	112.42				
－1年目	R 10	2%	0.9238	102.7	77.09	71.22				
供用開始年次	R 11	2%	0.9057	102.7	61.21	55.44	1.09	0.99		
1年目	R 12	2%	0.8880	102.7	55.39	49.19	1.09	0.97		
供用開始年次	R 13	2%	0.8706	102.7	29.72	25.87	2.28	1.99		
3年目	R 14	2%	0.8535	102.7	37.21	31.76	2.28	1.95		
供用開始年次	R 15	2%	0.8368	102.7			4.73	3.96		
5年目	R 16	2%	0.8203	102.7			4.73	3.88		
6年目	R 17	2%	0.8043	102.7			4.73	3.80		
7年目	R 18	2%	0.7885	102.7			4.73	3.73		
8年目	R 19	2%	0.7730	102.7			4.73	3.65		
9年目	R 20	2%	0.7579	102.7			4.73	3.58		
10年目	R 21	2%	0.7430	102.7			4.73	3.51		
11年目	R 22	2%	0.7284	102.7			4.73	3.44		
12年目	R 23	2%	0.7142	102.7			4.73	3.38		
13年目	R 24	2%	0.7002	102.7			4.73	3.31		
14年目	R 25	2%	0.6864	102.7			4.73	3.24		
15年目	R 26	2%	0.6730	102.7			4.73	3.18		
16年目	R 27	2%	0.6598	102.7			4.73	3.12		
17年目	R 28	2%	0.6468	102.7			4.73	3.06		
18年目	R 29	2%	0.6342	102.7			4.73	3.00		
19年目	R 30	2%	0.6217	102.7			4.73	2.94		
20年目	R 31	2%	0.6095	102.7			4.73	2.88		
21年目	R 32	2%	0.5976	102.7			4.73	2.82		
22年目	R 33	2%	0.5859	102.7			4.73	2.77		
23年目	R 34	2%	0.5744	102.7			4.73	2.72		
24年目	R 35	2%	0.5631	102.7			4.73	2.66		
25年目	R 36	2%	0.5521	102.7			4.73	2.61		
26年目	R 37	2%	0.5412	102.7			4.73	2.56		
27年目	R 38	2%	0.5306	102.7			4.73	2.51		
28年目	R 39	2%	0.5202	102.7			4.73	2.46		
29年目	R 40	2%	0.5100	102.7			4.73	2.41		
30年目	R 41	2%	0.5000	102.7			4.73	2.36		
31年目	R 42	2%	0.4902	102.7			4.73	2.32		
32年目	R 43	2%	0.4806	102.7			4.73	2.27		
33年目	R 44	2%	0.4712	102.7			4.73	2.23		
34年目	R 45	2%	0.4619	102.7			4.73	2.18		
35年目	R 46	2%	0.4529	102.7			4.73	2.14		
36年目	R 47	2%	0.4440	102.7			4.73	2.10		
37年目	R 48	2%	0.4353	102.7			4.73	2.06		
38年目	R 49	2%	0.4268	102.7			4.73	2.02		
39年目	R 50	2%	0.4184	102.7			4.73	1.98		
40年目	R 51	2%	0.4102	102.7			4.73	1.94		
41年目	R 52	2%	0.4022	102.7			4.73	1.90		
42年目	R 53	2%	0.3943	102.7			4.73	1.86		
43年目	R 54	2%	0.3865	102.7			4.73	1.83		
44年目	R 55	2%	0.3790	102.7			4.73	1.79		
45年目	R 56	2%	0.3715	102.7			4.73	1.76		
46年目	R 57	2%	0.3642	102.7			4.73	1.72		
47年目	R 58	2%	0.3571	102.7			4.73	1.69		
48年目	R 59	2%	0.3501	102.7			4.73	1.66		
49年目	R 60	2%	0.3432	102.7			4.73	1.62		
50年目	R 61	2%	0.3365	102.7			4.73	1.59		
51年目	R 62	2%	0.3299	102.7			4.73	1.56		
52年目	R 63	2%	0.3234	102.7			4.73	1.53		
53年目	R 64	2%	0.3171	102.7	-23.07	-7.32	4.73	1.50		
合 計					542.59	518.62	243.11	132.67		
単純事業費計					565.66		243.11			

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 矢板拡幅・矢板大田原バイパス・西那須野道路(一体)(残事業)

					単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)	
					0.27		19.0		5.20	
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
－4年目	R 7	1%	0.9901	102.7	78.58	77.80				
－3年目	R 8	1%	0.9803	102.7	107.16	105.05				
－2年目	R 9	1%	0.9706	102.7	119.30	115.80				
－1年目	R 10	1%	0.9610	102.7	77.09	74.08				
供用開始年次	R 11	1%	0.9515	102.7	61.21	58.24	1.09	1.04		
1年目	R 12	1%	0.9420	102.7	55.39	52.18	1.09	1.03		
供用開始年次	R 13	1%	0.9327	102.7	29.72	27.72	2.28	2.13		
3年目	R 14	1%	0.9235	102.7	37.21	34.36	2.28	2.11		
供用開始年次	R 15	1%	0.9143	102.7			4.73	4.32		
5年目	R 16	1%	0.9053	102.7			4.73	4.28		
6年目	R 17	1%	0.8963	102.7			4.73	4.24		
7年目	R 18	1%	0.8874	102.7			4.73	4.20		
8年目	R 19	1%	0.8787	102.7			4.73	4.15		
9年目	R 20	1%	0.8700	102.7			4.73	4.11		
10年目	R 21	1%	0.8613	102.7			4.73	4.07		
11年目	R 22	1%	0.8528	102.7			4.73	4.03		
12年目	R 23	1%	0.8444	102.7			4.73	3.99		
13年目	R 24	1%	0.8360	102.7			4.73	3.95		
14年目	R 25	1%	0.8277	102.7			4.73	3.91		
15年目	R 26	1%	0.8195	102.7			4.73	3.87		
16年目	R 27	1%	0.8114	102.7			4.73	3.84		
17年目	R 28	1%	0.8034	102.7			4.73	3.80		
18年目	R 29	1%	0.7954	102.7			4.73	3.76		
19年目	R 30	1%	0.7876	102.7			4.73	3.72		
20年目	R 31	1%	0.7798	102.7			4.73	3.69		
21年目	R 32	1%	0.7720	102.7			4.73	3.65		
22年目	R 33	1%	0.7644	102.7			4.73	3.61		
23年目	R 34	1%	0.7568	102.7			4.73	3.58		
24年目	R 35	1%	0.7493	102.7			4.73	3.54		
25年目	R 36	1%	0.7419	102.7			4.73	3.51		
26年目	R 37	1%	0.7346	102.7			4.73	3.47		
27年目	R 38	1%	0.7273	102.7			4.73	3.44		
28年目	R 39	1%	0.7201	102.7			4.73	3.40		
29年目	R 40	1%	0.7130	102.7			4.73	3.37		
30年目	R 41	1%	0.7059	102.7			4.73	3.34		
31年目	R 42	1%	0.6989	102.7			4.73	3.30		
32年目	R 43	1%	0.6920	102.7			4.73	3.27		
33年目	R 44	1%	0.6852	102.7			4.73	3.24		
34年目	R 45	1%	0.6784	102.7			4.73	3.21		
35年目	R 46	1%	0.6717	102.7			4.73	3.18		
36年目	R 47	1%	0.6650	102.7			4.73	3.14		
37年目	R 48	1%	0.6584	102.7			4.73	3.11		
38年目	R 49	1%	0.6519	102.7			4.73	3.08		
39年目	R 50	1%	0.6454	102.7			4.73	3.05		
40年目	R 51	1%	0.6391	102.7			4.73	3.02		
41年目	R 52	1%	0.6327	102.7			4.73	2.99		
42年目	R 53	1%	0.6265	102.7			4.73	2.96		
43年目	R 54	1%	0.6203	102.7			4.73	2.93		
44年目	R 55	1%	0.6141	102.7			4.73	2.90		
45年目	R 56	1%	0.6080	102.7			4.73	2.87		
46年目	R 57	1%	0.6020	102.7			4.73	2.85		
47年目	R 58	1%	0.5961	102.7			4.73	2.82		
48年目	R 59	1%	0.5902	102.7			4.73	2.79		
49年目	R 60	1%	0.5843	102.7			4.73	2.76		
50年目	R 61	1%	0.5785	102.7			4.73	2.73		
51年目	R 62	1%	0.5728	102.7			4.73	2.71		
52年目	R 63	1%	0.5671	102.7			4.73	2.68		
53年目	R 64	1%	0.5615	102.7	-23.07	-12.96	4.73	2.65		
合 計					542.59	532.27	243.11	177.41		
単純事業費計					565.66		243.11			

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

(再評価)

様式－2

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道4号	矢板大田原バイパス	L = 7.9 km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
31,600～43,000	4	関東地方整備局

①費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和6年度			
単純合計	365億円	122億円		488億円
うち残事業分	353億円	122億円		475億円
基準年における 現在価値 (C)	310億円	38億円		348億円
うち残事業分	296億円	38億円		335億円

②便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和6年度			
供用年	令和15年度			
単年便益 (初年便益)	47億円	6.6億円	1.0億円	54億円
基準年における 現在価値 (B)	668億円	92億円	14億円	774億円
うち残事業分	668億円	92億円	14億円	774億円

③結果

【事業全体】

費用便益比（B／C）	2.2 〔4%〕	[参考] 3.2 〔2%〕	[参考] 4.0 〔1%〕
経済的純現在価値（B－C）	426億円 〔4%〕	[参考] 891億円 〔2%〕	[参考] 1,283億円 〔1%〕
経済的内部収益率（EIRR）	9.2%		

※ 〔 〕 内は社会的割引率

【残事業】

費用便益比（B／C）	2.3 〔4%〕	[参考] 3.4 〔2%〕	[参考] 4.1 〔1%〕
経済的純現在価値（B－C）	440億円 〔4%〕	[参考] 905億円 〔2%〕	[参考] 1,296億円 〔1%〕
経済的内部収益率（EIRR）	9.7%		

※ 〔 〕 内は社会的割引率

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	31,600～43,000 （台/日）	±10%	2.0～2.4
事業費	365億円	±10%	2.0～2.4
事業期間	14年	±20%	2.0～2.3

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	31,600～43,000 （台/日）	±10%	2.1～2.5
事業費	353億円	±10%	2.1～2.5
事業期間	8年	±20%	2.1～2.4

交通状況の変化

様式－３①

事業名：矢板大田原バイパス（事業全体・残事業）

（推計時点 R22年）

				整備なし (A)	整備あり (B)
①新設・改築道路 [矢板大田原バイパス] : 7.9km	BP区間 : 5.3km	交通量※1	[台/日]	—	31,600
		走行時間※2	[分]	—	5
		走行時間費用※3	[億円/年]	—	32.93
	拡幅区間 : 2.6km	交通量	[台/日]	12,100	37,700
		走行時間	[分]	5	3
		走行時間費用	[億円/年]	13.19	24.38
②主な周辺道路	国道4号現道 : 4.3km	交通量	[台/日]	18,000	10,600
		走行時間	[分]	6	5
		走行時間費用	[億円/年]	23.15	10.90
	(主)矢板那須線 : 12.9km	交通量	[台/日]	8,600	6,600
		走行時間	[分]	19	19
		走行時間費用	[億円/年]	31.40	22.75
	(主)大田原氏家線 : 9.0km	交通量	[台/日]	14,800	12,700
		走行時間	[分]	14	13
		走行時間費用	[億円/年]	40.31	31.27
	(一)西那須野下石上線 : 6.1km	交通量	[台/日]	12,700	9,800
		走行時間	[分]	10	9
		走行時間費用	[億円/年]	23.74	16.68
③その他道路合計 : 2,151.1km		走行時間費用	[億円/年]	6,396.44	6,343.35

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 2,191.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	6,528.23	6,482.25	45.97

※１： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※２： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)

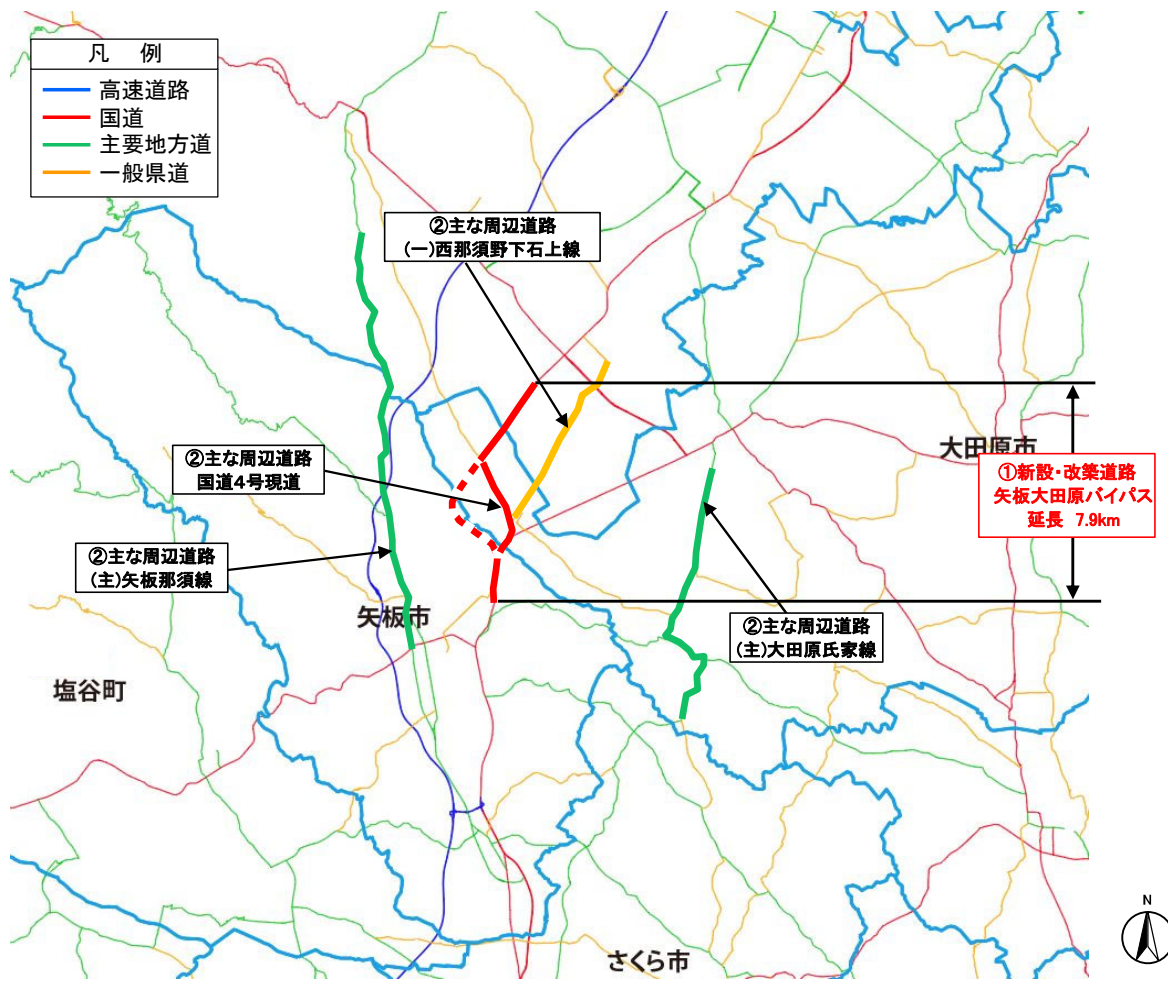

費用便益分析の条件

事業名：矢板大田原バイパス

(2)

項目		チェック欄			
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和5年12月 国土交通省 道路局 都市局)	☒			
	その他	☐			
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間			
	社会的割引率	4%			
	比較のための参考とすべき値	2%、1%			
	基準年次	令和6年			
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	☒ (R22)		
		複数時点での推計	☐		
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計		☒	
		整備の有無のいずれかのみ推計		☐ 有 ☐ 無	
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載		
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)		☒ (H27センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)		☐	
		その他()		☐	
	開発交通量の考慮	無		☒	
		有		☐	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	() 台トリップ/日	
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分		☐	
		転換率式を用いた配分		☐	
		Q-V式と転換率式の併用による配分		☒	
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		☐	
		簡易手法		☐	
		簡易手法の 採択理由	小規模事業である		☐
			山間部海岸部で併行道路が少ない		☐
			その他()		
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)				
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定		☒		
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax～Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin～Qmax)の路線等が混在 した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を 用いた。				
	最終配分の速度		☐		
	採用理由を記載				
	その他()		☐		

(3)

	項目	チェック欄		
便 益 の 算 定	休日交通の影響	考慮しない	☒	
		考慮する	☐	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	☐
			対象路線のみ考慮	☐
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	☒	
		考慮する	☐	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	☐
	冬期交通の影響	考慮しない	☒	
		考慮する	☐	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	☒	
その他 ()		☐		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	☒		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	☐		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	☒		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	☐		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	☒		
	中央分離帯の有無を考慮しない	☐		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	☒		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	☐		
その他				

(4)

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：矢板大田原バイパス(事業全体)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.34	7.9	2.69

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－14年目	R 1	4%	1.2167	101.2	0.91	1.12				
－13年目	R 2	4%	1.1699	101.9	1.82	2.14				
－12年目	R 3	4%	1.1249	101.8	1.82	2.06				
－11年目	R 4	4%	1.0816	102.7	3.74	4.04				
－10年目	R 5	4%	1.0400	102.7	1.91	1.99				
基準年	R 6	4%	1.0000	102.7	2.26	2.26				
－8年目	R 7	4%	0.9615	102.7	39.00	37.50				
－7年目	R 8	4%	0.9246	102.7	49.75	46.00				
－6年目	R 9	4%	0.8890	102.7	52.34	46.53				
－5年目	R 10	4%	0.8548	102.7	34.54	29.52				
－4年目	R 11	4%	0.8219	102.7	56.02	46.04				
－3年目	R 12	4%	0.7903	102.7	54.37	42.97				
－2年目	R 13	4%	0.7599	102.7	29.72	22.58				
－1年目	R 14	4%	0.7307	102.7	37.21	27.19				
供用開始年次	R 15	4%	0.7026	102.7			2.45	1.72		
1年目	R 16	4%	0.6756	102.7			2.45	1.65		
2年目	R 17	4%	0.6496	102.7			2.45	1.59		
3年目	R 18	4%	0.6246	102.7			2.45	1.53		
4年目	R 19	4%	0.6006	102.7			2.45	1.47		
5年目	R 20	4%	0.5775	102.7			2.45	1.41		
6年目	R 21	4%	0.5553	102.7			2.45	1.36		
7年目	R 22	4%	0.5339	102.7			2.45	1.31		
8年目	R 23	4%	0.5134	102.7			2.45	1.26		
9年目	R 24	4%	0.4936	102.7			2.45	1.21		
10年目	R 25	4%	0.4746	102.7			2.45	1.16		
11年目	R 26	4%	0.4564	102.7			2.45	1.12		
12年目	R 27	4%	0.4388	102.7			2.45	1.07		
13年目	R 28	4%	0.4220	102.7			2.45	1.03		
14年目	R 29	4%	0.4057	102.7			2.45	0.99		
15年目	R 30	4%	0.3901	102.7			2.45	0.95		
16年目	R 31	4%	0.3751	102.7			2.45	0.92		
17年目	R 32	4%	0.3607	102.7			2.45	0.88		
18年目	R 33	4%	0.3468	102.7			2.45	0.85		
19年目	R 34	4%	0.3335	102.7			2.45	0.82		
20年目	R 35	4%	0.3207	102.7			2.45	0.78		
21年目	R 36	4%	0.3083	102.7			2.45	0.75		
22年目	R 37	4%	0.2965	102.7			2.45	0.72		
23年目	R 38	4%	0.2851	102.7			2.45	0.70		
24年目	R 39	4%	0.2741	102.7			2.45	0.67		
25年目	R 40	4%	0.2636	102.7			2.45	0.64		
26年目	R 41	4%	0.2534	102.7			2.45	0.62		
27年目	R 42	4%	0.2437	102.7			2.45	0.60		
28年目	R 43	4%	0.2343	102.7			2.45	0.57		
29年目	R 44	4%	0.2253	102.7			2.45	0.55		
30年目	R 45	4%	0.2166	102.7			2.45	0.53		
31年目	R 46	4%	0.2083	102.7			2.45	0.51		
32年目	R 47	4%	0.2003	102.7			2.45	0.49		
33年目	R 48	4%	0.1926	102.7			2.45	0.47		
34年目	R 49	4%	0.1852	102.7			2.45	0.45		
35年目	R 50	4%	0.1780	102.7			2.45	0.44		
36年目	R 51	4%	0.1712	102.7			2.45	0.42		
37年目	R 52	4%	0.1646	102.7			2.45	0.40		
38年目	R 53	4%	0.1583	102.7			2.45	0.39		
39年目	R 54	4%	0.1522	102.7			2.45	0.37		
40年目	R 55	4%	0.1463	102.7			2.45	0.36		
41年目	R 56	4%	0.1407	102.7			2.45	0.34		
42年目	R 57	4%	0.1353	102.7			2.45	0.33		
43年目	R 58	4%	0.1301	102.7			2.45	0.32		
44年目	R 59	4%	0.1251	102.7			2.45	0.31		
45年目	R 60	4%	0.1203	102.7			2.45	0.29		
46年目	R 61	4%	0.1157	102.7			2.45	0.28		
47年目	R 62	4%	0.1112	102.7			2.45	0.27		
48年目	R 63	4%	0.1069	102.7			2.45	0.26		
49年目	R 64	4%	0.1028	102.7	-19.42	-2.00	2.45	0.25		
合 計					345.98	309.96	122.27	38.39	0.00	0.00
単純事業費計					365.40		122.27		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：矢板大田原バイパス(事業全体)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.34	7.9	2.69

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－14年目	R 1	4%	1.1933	101.2	0.91	1.10				
－13年目	R 2	4%	1.1474	101.9	1.82	2.10				
－12年目	R 3	4%	1.1032	101.8	1.82	2.02				
－11年目	R 4	4%	1.0608	102.7	3.74	3.96				
－10年目	R 5	2%	1.0200	102.7	1.91	1.95				
基準年	R 6	2%	1.0000	102.7	2.26	2.26				
－8年目	R 7	2%	0.9804	102.7	39.00	38.24				
－7年目	R 8	2%	0.9612	102.7	49.75	47.82				
－6年目	R 9	2%	0.9423	102.7	52.34	49.32				
－5年目	R 10	2%	0.9238	102.7	34.54	31.91				
－4年目	R 11	2%	0.9057	102.7	56.02	50.74				
－3年目	R 12	2%	0.8880	102.7	54.37	48.28				
－2年目	R 13	2%	0.8706	102.7	29.72	25.87				
－1年目	R 14	2%	0.8535	102.7	37.21	31.76				
供用開始年次	R 15	2%	0.8368	102.7			2.45	2.05		
1年目	R 16	2%	0.8203	102.7			2.45	2.01		
2年目	R 17	2%	0.8043	102.7			2.45	1.97		
3年目	R 18	2%	0.7885	102.7			2.45	1.93		
4年目	R 19	2%	0.7730	102.7			2.45	1.89		
5年目	R 20	2%	0.7579	102.7			2.45	1.85		
6年目	R 21	2%	0.7430	102.7			2.45	1.82		
7年目	R 22	2%	0.7284	102.7			2.45	1.78		
8年目	R 23	2%	0.7142	102.7			2.45	1.75		
9年目	R 24	2%	0.7002	102.7			2.45	1.71		
10年目	R 25	2%	0.6864	102.7			2.45	1.68		
11年目	R 26	2%	0.6730	102.7			2.45	1.65		
12年目	R 27	2%	0.6598	102.7			2.45	1.61		
13年目	R 28	2%	0.6468	102.7			2.45	1.58		
14年目	R 29	2%	0.6342	102.7			2.45	1.55		
15年目	R 30	2%	0.6217	102.7			2.45	1.52		
16年目	R 31	2%	0.6095	102.7			2.45	1.49		
17年目	R 32	2%	0.5976	102.7			2.45	1.46		
18年目	R 33	2%	0.5859	102.7			2.45	1.43		
19年目	R 34	2%	0.5744	102.7			2.45	1.40		
20年目	R 35	2%	0.5631	102.7			2.45	1.38		
21年目	R 36	2%	0.5521	102.7			2.45	1.35		
22年目	R 37	2%	0.5412	102.7			2.45	1.32		
23年目	R 38	2%	0.5306	102.7			2.45	1.30		
24年目	R 39	2%	0.5202	102.7			2.45	1.27		
25年目	R 40	2%	0.5100	102.7			2.45	1.25		
26年目	R 41	2%	0.5000	102.7			2.45	1.22		
27年目	R 42	2%	0.4902	102.7			2.45	1.20		
28年目	R 43	2%	0.4806	102.7			2.45	1.18		
29年目	R 44	2%	0.4712	102.7			2.45	1.15		
30年目	R 45	2%	0.4619	102.7			2.45	1.13		
31年目	R 46	2%	0.4529	102.7			2.45	1.11		
32年目	R 47	2%	0.4440	102.7			2.45	1.09		
33年目	R 48	2%	0.4353	102.7			2.45	1.06		
34年目	R 49	2%	0.4268	102.7			2.45	1.04		
35年目	R 50	2%	0.4184	102.7			2.45	1.02		
36年目	R 51	2%	0.4102	102.7			2.45	1.00		
37年目	R 52	2%	0.4022	102.7			2.45	0.98		
38年目	R 53	2%	0.3943	102.7			2.45	0.96		
39年目	R 54	2%	0.3865	102.7			2.45	0.95		
40年目	R 55	2%	0.3790	102.7			2.45	0.93		
41年目	R 56	2%	0.3715	102.7			2.45	0.91		
42年目	R 57	2%	0.3642	102.7			2.45	0.89		
43年目	R 58	2%	0.3571	102.7			2.45	0.87		
44年目	R 59	2%	0.3501	102.7			2.45	0.86		
45年目	R 60	2%	0.3432	102.7			2.45	0.84		
46年目	R 61	2%	0.3365	102.7			2.45	0.82		
47年目	R 62	2%	0.3299	102.7			2.45	0.81		
48年目	R 63	2%	0.3234	102.7			2.45	0.79		
49年目	R 64	2%	0.3171	102.7	-19.42	-6.16	2.45	0.78		
合 計					345.98	331.17	122.27	65.59	0.00	0.00

単純事業費計	365.40	122.27	0.00
--------	--------	--------	------

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 矢板大田原バイパス(事業全体)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.34	7.9	2.69

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
－14年目	R 1	4%	1.1816	101.2	0.91	1.09				
－13年目	R 2	4%	1.1361	101.9	1.82	2.08				
－12年目	R 3	4%	1.0924	101.8	1.82	2.00				
－11年目	R 4	4%	1.0504	102.7	3.74	3.92				
－10年目	R 5	1%	1.0100	102.7	1.91	1.93				
基準年	R 6	1%	1.0000	102.7	2.26	2.26				
－8年目	R 7	1%	0.9901	102.7	39.00	38.62				
－7年目	R 8	1%	0.9803	102.7	49.75	48.77				
－6年目	R 9	1%	0.9706	102.7	52.34	50.80				
－5年目	R 10	1%	0.9610	102.7	34.54	33.19				
－4年目	R 11	1%	0.9515	102.7	56.02	53.30				
－3年目	R 12	1%	0.9420	102.7	54.37	51.22				
－2年目	R 13	1%	0.9327	102.7	29.72	27.72				
－1年目	R 14	1%	0.9235	102.7	37.21	34.36				
供用開始年次	R 15	1%	0.9143	102.7			2.45	2.24		
1年目	R 16	1%	0.9053	102.7			2.45	2.21		
2年目	R 17	1%	0.8963	102.7			2.45	2.19		
3年目	R 18	1%	0.8874	102.7			2.45	2.17		
4年目	R 19	1%	0.8787	102.7			2.45	2.15		
5年目	R 20	1%	0.8700	102.7			2.45	2.13		
6年目	R 21	1%	0.8613	102.7			2.45	2.11		
7年目	R 22	1%	0.8528	102.7			2.45	2.09		
8年目	R 23	1%	0.8444	102.7			2.45	2.06		
9年目	R 24	1%	0.8360	102.7			2.45	2.04		
10年目	R 25	1%	0.8277	102.7			2.45	2.02		
11年目	R 26	1%	0.8195	102.7			2.45	2.00		
12年目	R 27	1%	0.8114	102.7			2.45	1.98		
13年目	R 28	1%	0.8034	102.7			2.45	1.96		
14年目	R 29	1%	0.7954	102.7			2.45	1.95		
15年目	R 30	1%	0.7876	102.7			2.45	1.93		
16年目	R 31	1%	0.7798	102.7			2.45	1.91		
17年目	R 32	1%	0.7720	102.7			2.45	1.89		
18年目	R 33	1%	0.7644	102.7			2.45	1.87		
19年目	R 34	1%	0.7568	102.7			2.45	1.85		
20年目	R 35	1%	0.7493	102.7			2.45	1.83		
21年目	R 36	1%	0.7419	102.7			2.45	1.81		
22年目	R 37	1%	0.7346	102.7			2.45	1.80		
23年目	R 38	1%	0.7273	102.7			2.45	1.78		
24年目	R 39	1%	0.7201	102.7			2.45	1.76		
25年目	R 40	1%	0.7130	102.7			2.45	1.74		
26年目	R 41	1%	0.7059	102.7			2.45	1.73		
27年目	R 42	1%	0.6989	102.7			2.45	1.71		
28年目	R 43	1%	0.6920	102.7			2.45	1.69		
29年目	R 44	1%	0.6852	102.7			2.45	1.68		
30年目	R 45	1%	0.6784	102.7			2.45	1.66		
31年目	R 46	1%	0.6717	102.7			2.45	1.64		
32年目	R 47	1%	0.6650	102.7			2.45	1.63		
33年目	R 48	1%	0.6584	102.7			2.45	1.61		
34年目	R 49	1%	0.6519	102.7			2.45	1.59		
35年目	R 50	1%	0.6454	102.7			2.45	1.58		
36年目	R 51	1%	0.6391	102.7			2.45	1.56		
37年目	R 52	1%	0.6327	102.7			2.45	1.55		
38年目	R 53	1%	0.6265	102.7			2.45	1.53		
39年目	R 54	1%	0.6203	102.7			2.45	1.52		
40年目	R 55	1%	0.6141	102.7			2.45	1.50		
41年目	R 56	1%	0.6080	102.7			2.45	1.49		
42年目	R 57	1%	0.6020	102.7			2.45	1.47		
43年目	R 58	1%	0.5961	102.7			2.45	1.46		
44年目	R 59	1%	0.5902	102.7			2.45	1.44		
45年目	R 60	1%	0.5843	102.7			2.45	1.43		
46年目	R 61	1%	0.5785	102.7			2.45	1.41		
47年目	R 62	1%	0.5728	102.7			2.45	1.40		
48年目	R 63	1%	0.5671	102.7			2.45	1.39		
49年目	R 64	1%	0.5615	102.7	-19.42	-10.90	2.45	1.37		
合 計					345.98	340.37	122.27	88.52	0.00	0.00

単純事業費計	365.40	122.27	0.00
--------	--------	--------	------

- 注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)
- 注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：矢板大田原バイパス(残事業)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.34	7.9	2.69

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－8年目	R 7	4%	0.9615	102.7	39.00	37.50				
－7年目	R 8	4%	0.9246	102.7	49.75	46.00				
－6年目	R 9	4%	0.8890	102.7	52.34	46.53				
－5年目	R 10	4%	0.8548	102.7	34.54	29.52				
－4年目	R 11	4%	0.8219	102.7	56.02	46.04				
－3年目	R 12	4%	0.7903	102.7	54.37	42.97				
－2年目	R 13	4%	0.7599	102.7	29.72	22.58				
－1年目	R 14	4%	0.7307	102.7	37.21	27.19				
供用開始年次	R 15	4%	0.7026	102.7			2.45	1.72		
1年目	R 16	4%	0.6756	102.7			2.45	1.65		
2年目	R 17	4%	0.6496	102.7			2.45	1.59		
3年目	R 18	4%	0.6246	102.7			2.45	1.53		
4年目	R 19	4%	0.6006	102.7			2.45	1.47		
5年目	R 20	4%	0.5775	102.7			2.45	1.41		
6年目	R 21	4%	0.5553	102.7			2.45	1.36		
7年目	R 22	4%	0.5339	102.7			2.45	1.31		
8年目	R 23	4%	0.5134	102.7			2.45	1.26		
9年目	R 24	4%	0.4936	102.7			2.45	1.21		
10年目	R 25	4%	0.4746	102.7			2.45	1.16		
11年目	R 26	4%	0.4564	102.7			2.45	1.12		
12年目	R 27	4%	0.4388	102.7			2.45	1.07		
13年目	R 28	4%	0.4220	102.7			2.45	1.03		
14年目	R 29	4%	0.4057	102.7			2.45	0.99		
15年目	R 30	4%	0.3901	102.7			2.45	0.95		
16年目	R 31	4%	0.3751	102.7			2.45	0.92		
17年目	R 32	4%	0.3607	102.7			2.45	0.88		
18年目	R 33	4%	0.3468	102.7			2.45	0.85		
19年目	R 34	4%	0.3335	102.7			2.45	0.82		
20年目	R 35	4%	0.3207	102.7			2.45	0.78		
21年目	R 36	4%	0.3083	102.7			2.45	0.75		
22年目	R 37	4%	0.2965	102.7			2.45	0.72		
23年目	R 38	4%	0.2851	102.7			2.45	0.70		
24年目	R 39	4%	0.2741	102.7			2.45	0.67		
25年目	R 40	4%	0.2636	102.7			2.45	0.64		
26年目	R 41	4%	0.2534	102.7			2.45	0.62		
27年目	R 42	4%	0.2437	102.7			2.45	0.60		
28年目	R 43	4%	0.2343	102.7			2.45	0.57		
29年目	R 44	4%	0.2253	102.7			2.45	0.55		
30年目	R 45	4%	0.2166	102.7			2.45	0.53		
31年目	R 46	4%	0.2083	102.7			2.45	0.51		
32年目	R 47	4%	0.2003	102.7			2.45	0.49		
33年目	R 48	4%	0.1926	102.7			2.45	0.47		
34年目	R 49	4%	0.1852	102.7			2.45	0.45		
35年目	R 50	4%	0.1780	102.7			2.45	0.44		
36年目	R 51	4%	0.1712	102.7			2.45	0.42		
37年目	R 52	4%	0.1646	102.7			2.45	0.40		
38年目	R 53	4%	0.1583	102.7			2.45	0.39		
39年目	R 54	4%	0.1522	102.7			2.45	0.37		
40年目	R 55	4%	0.1463	102.7			2.45	0.36		
41年目	R 56	4%	0.1407	102.7			2.45	0.34		
42年目	R 57	4%	0.1353	102.7			2.45	0.33		
43年目	R 58	4%	0.1301	102.7			2.45	0.32		
44年目	R 59	4%	0.1251	102.7			2.45	0.31		
45年目	R 60	4%	0.1203	102.7			2.45	0.29		
46年目	R 61	4%	0.1157	102.7			2.45	0.28		
47年目	R 62	4%	0.1112	102.7			2.45	0.27		
48年目	R 63	4%	0.1069	102.7			2.45	0.26		
49年目	R 64	4%	0.1028	102.7	-19.42	-2.00	2.45	0.25		
合 計					333.53	296.34	122.27	38.39	0.00	0.00
単純事業費計					352.95		122.27		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 矢板大田原バイパス(残事業)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.34	7.9	2.69

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－8年目	R 7	2%	0.9804	102.7	39.00	38.24				
－7年目	R 8	2%	0.9612	102.7	49.75	47.82				
－6年目	R 9	2%	0.9423	102.7	52.34	49.32				
－5年目	R 10	2%	0.9238	102.7	34.54	31.91				
－4年目	R 11	2%	0.9057	102.7	56.02	50.74				
－3年目	R 12	2%	0.8880	102.7	54.37	48.28				
－2年目	R 13	2%	0.8706	102.7	29.72	25.87				
－1年目	R 14	2%	0.8535	102.7	37.21	31.76				
供用開始年次	R 15	2%	0.8368	102.7			2.45	2.05		
1年目	R 16	2%	0.8203	102.7			2.45	2.01		
2年目	R 17	2%	0.8043	102.7			2.45	1.97		
3年目	R 18	2%	0.7885	102.7			2.45	1.93		
4年目	R 19	2%	0.7730	102.7			2.45	1.89		
5年目	R 20	2%	0.7579	102.7			2.45	1.85		
6年目	R 21	2%	0.7430	102.7			2.45	1.82		
7年目	R 22	2%	0.7284	102.7			2.45	1.78		
8年目	R 23	2%	0.7142	102.7			2.45	1.75		
9年目	R 24	2%	0.7002	102.7			2.45	1.71		
10年目	R 25	2%	0.6864	102.7			2.45	1.68		
11年目	R 26	2%	0.6730	102.7			2.45	1.65		
12年目	R 27	2%	0.6598	102.7			2.45	1.61		
13年目	R 28	2%	0.6468	102.7			2.45	1.58		
14年目	R 29	2%	0.6342	102.7			2.45	1.55		
15年目	R 30	2%	0.6217	102.7			2.45	1.52		
16年目	R 31	2%	0.6095	102.7			2.45	1.49		
17年目	R 32	2%	0.5976	102.7			2.45	1.46		
18年目	R 33	2%	0.5859	102.7			2.45	1.43		
19年目	R 34	2%	0.5744	102.7			2.45	1.40		
20年目	R 35	2%	0.5631	102.7			2.45	1.38		
21年目	R 36	2%	0.5521	102.7			2.45	1.35		
22年目	R 37	2%	0.5412	102.7			2.45	1.32		
23年目	R 38	2%	0.5306	102.7			2.45	1.30		
24年目	R 39	2%	0.5202	102.7			2.45	1.27		
25年目	R 40	2%	0.5100	102.7			2.45	1.25		
26年目	R 41	2%	0.5000	102.7			2.45	1.22		
27年目	R 42	2%	0.4902	102.7			2.45	1.20		
28年目	R 43	2%	0.4806	102.7			2.45	1.18		
29年目	R 44	2%	0.4712	102.7			2.45	1.15		
30年目	R 45	2%	0.4619	102.7			2.45	1.13		
31年目	R 46	2%	0.4529	102.7			2.45	1.11		
32年目	R 47	2%	0.4440	102.7			2.45	1.09		
33年目	R 48	2%	0.4353	102.7			2.45	1.06		
34年目	R 49	2%	0.4268	102.7			2.45	1.04		
35年目	R 50	2%	0.4184	102.7			2.45	1.02		
36年目	R 51	2%	0.4102	102.7			2.45	1.00		
37年目	R 52	2%	0.4022	102.7			2.45	0.98		
38年目	R 53	2%	0.3943	102.7			2.45	0.96		
39年目	R 54	2%	0.3865	102.7			2.45	0.95		
40年目	R 55	2%	0.3790	102.7			2.45	0.93		
41年目	R 56	2%	0.3715	102.7			2.45	0.91		
42年目	R 57	2%	0.3642	102.7			2.45	0.89		
43年目	R 58	2%	0.3571	102.7			2.45	0.87		
44年目	R 59	2%	0.3501	102.7			2.45	0.86		
45年目	R 60	2%	0.3432	102.7			2.45	0.84		
46年目	R 61	2%	0.3365	102.7			2.45	0.82		
47年目	R 62	2%	0.3299	102.7			2.45	0.81		
48年目	R 63	2%	0.3234	102.7			2.45	0.79		
49年目	R 64	2%	0.3171	102.7	-19.42	-6.16	2.45	0.78		
合 計					333.53	317.77	122.27	65.59	0.00	0.00
単純事業費計					352.95		122.27		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 矢板大田原バイパス(残事業)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.34	7.9	2.69

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－8年目	R 7	1%	0.9901	102.7	39.00	38.62				
－7年目	R 8	1%	0.9803	102.7	49.75	48.77				
－6年目	R 9	1%	0.9706	102.7	52.34	50.80				
－5年目	R 10	1%	0.9610	102.7	34.54	33.19				
－4年目	R 11	1%	0.9515	102.7	56.02	53.30				
－3年目	R 12	1%	0.9420	102.7	54.37	51.22				
－2年目	R 13	1%	0.9327	102.7	29.72	27.72				
－1年目	R 14	1%	0.9235	102.7	37.21	34.36				
供用開始年次	R 15	1%	0.9143	102.7			2.45	2.24		
1年目	R 16	1%	0.9053	102.7			2.45	2.21		
2年目	R 17	1%	0.8963	102.7			2.45	2.19		
3年目	R 18	1%	0.8874	102.7			2.45	2.17		
4年目	R 19	1%	0.8787	102.7			2.45	2.15		
5年目	R 20	1%	0.8700	102.7			2.45	2.13		
6年目	R 21	1%	0.8613	102.7			2.45	2.11		
7年目	R 22	1%	0.8528	102.7			2.45	2.09		
8年目	R 23	1%	0.8444	102.7			2.45	2.06		
9年目	R 24	1%	0.8360	102.7			2.45	2.04		
10年目	R 25	1%	0.8277	102.7			2.45	2.02		
11年目	R 26	1%	0.8195	102.7			2.45	2.00		
12年目	R 27	1%	0.8114	102.7			2.45	1.98		
13年目	R 28	1%	0.8034	102.7			2.45	1.96		
14年目	R 29	1%	0.7954	102.7			2.45	1.95		
15年目	R 30	1%	0.7876	102.7			2.45	1.93		
16年目	R 31	1%	0.7798	102.7			2.45	1.91		
17年目	R 32	1%	0.7720	102.7			2.45	1.89		
18年目	R 33	1%	0.7644	102.7			2.45	1.87		
19年目	R 34	1%	0.7568	102.7			2.45	1.85		
20年目	R 35	1%	0.7493	102.7			2.45	1.83		
21年目	R 36	1%	0.7419	102.7			2.45	1.81		
22年目	R 37	1%	0.7346	102.7			2.45	1.80		
23年目	R 38	1%	0.7273	102.7			2.45	1.78		
24年目	R 39	1%	0.7201	102.7			2.45	1.76		
25年目	R 40	1%	0.7130	102.7			2.45	1.74		
26年目	R 41	1%	0.7059	102.7			2.45	1.73		
27年目	R 42	1%	0.6989	102.7			2.45	1.71		
28年目	R 43	1%	0.6920	102.7			2.45	1.69		
29年目	R 44	1%	0.6852	102.7			2.45	1.68		
30年目	R 45	1%	0.6784	102.7			2.45	1.66		
31年目	R 46	1%	0.6717	102.7			2.45	1.64		
32年目	R 47	1%	0.6650	102.7			2.45	1.63		
33年目	R 48	1%	0.6584	102.7			2.45	1.61		
34年目	R 49	1%	0.6519	102.7			2.45	1.59		
35年目	R 50	1%	0.6454	102.7			2.45	1.58		
36年目	R 51	1%	0.6391	102.7			2.45	1.56		
37年目	R 52	1%	0.6327	102.7			2.45	1.55		
38年目	R 53	1%	0.6265	102.7			2.45	1.53		
39年目	R 54	1%	0.6203	102.7			2.45	1.52		
40年目	R 55	1%	0.6141	102.7			2.45	1.50		
41年目	R 56	1%	0.6080	102.7			2.45	1.49		
42年目	R 57	1%	0.6020	102.7			2.45	1.47		
43年目	R 58	1%	0.5961	102.7			2.45	1.46		
44年目	R 59	1%	0.5902	102.7			2.45	1.44		
45年目	R 60	1%	0.5843	102.7			2.45	1.43		
46年目	R 61	1%	0.5785	102.7			2.45	1.41		
47年目	R 62	1%	0.5728	102.7			2.45	1.40		
48年目	R 63	1%	0.5671	102.7			2.45	1.39		
49年目	R 64	1%	0.5615	102.7	-19.42	-10.90	2.45	1.37		
合 計					333.53	327.07	122.27	88.52	0.00	0.00
単純事業費計					352.95		122.27		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：矢板大田原バイパス(事業全体・残事業)

年次	年度 (基準年) R6	総走行台キロの年次別伸び率 (関東内陸ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)				
		乗用車類	普通貨物車	小型貨物車	全 車				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値			
供用開始年次	R 15	0.99676	1.00932	0.98997	0.99765	4%	0.7026	102.7	35.34	6.12	5.29	46.75	32.84	6.17	0.04	0.38	6.58	4.62	1.00	0.70	54.32	38.17			
1年目	R 16	0.99675	1.00924	0.98987	0.99764	4%	0.6756	102.7	35.23	6.17	5.24	46.64	31.51	6.15	0.04	0.37	6.56	4.43	0.99	0.67	54.19	36.61			
2年目	R 17	0.99674	1.00915	0.98977	0.99764	4%	0.6496	102.7	35.11	6.23	5.18	46.53	30.22	6.13	0.04	0.37	6.53	4.24	0.99	0.64	54.05	35.11			
3年目	R 18	0.99673	1.00907	0.98966	0.99763	4%	0.6246	102.7	35.00	6.29	5.13	46.42	28.99	6.11	0.04	0.36	6.51	4.07	0.99	0.62	53.92	33.68			
4年目	R 19	0.99671	1.00899	0.98955	0.99762	4%	0.6006	102.7	34.88	6.35	5.08	46.31	27.81	6.09	0.04	0.36	6.49	3.90	0.99	0.59	53.78	32.30			
5年目	R 20	0.99670	1.00891	0.98944	0.99762	4%	0.5775	102.7	34.77	6.40	5.02	46.19	26.68	6.07	0.04	0.36	6.46	3.73	0.98	0.57	53.64	30.98			
6年目	R 21	0.99669	1.00883	0.98933	0.99761	4%	0.5553	102.7	34.65	6.46	4.97	46.08	25.59	6.05	0.04	0.35	6.44	3.58	0.98	0.55	53.51	29.71			
7年目	R 22	0.99176	0.99995	0.99215	0.99329	4%	0.5339	102.7	34.54	6.52	4.92	45.97	24.55	6.03	0.04	0.35	6.42	3.43	0.98	0.52	53.37	28.49			
8年目	R 23	0.99169	0.99995	0.99209	0.99325	4%	0.5134	102.7	34.25	6.52	4.88	45.65	23.44	5.98	0.04	0.35	6.36	3.27	0.97	0.50	52.99	27.20			
9年目	R 24	0.99162	0.99995	0.99203	0.99320	4%	0.4936	102.7	33.97	6.52	4.84	45.33	22.37	5.93	0.04	0.34	6.31	3.12	0.97	0.48	52.60	25.97			
10年目	R 25	0.99155	0.99995	0.99196	0.99315	4%	0.4746	102.7	33.69	6.52	4.80	45.00	21.36	5.88	0.04	0.34	6.26	2.97	0.96	0.46	52.22	24.79			
11年目	R 26	0.99148	0.99995	0.99190	0.99311	4%	0.4564	102.7	33.40	6.52	4.76	44.68	20.39	5.83	0.04	0.34	6.21	2.83	0.95	0.44	51.84	23.66			
12年目	R 27	0.99140	0.99995	0.99183	0.99306	4%	0.4388	102.7	33.12	6.52	4.72	44.36	19.46	5.78	0.04	0.34	6.16	2.70	0.95	0.42	51.46	22.58			
13年目	R 28	0.99133	0.99995	0.99176	0.99301	4%	0.4220	102.7	32.83	6.51	4.69	44.03	18.58	5.73	0.04	0.33	6.10	2.58	0.94	0.40	51.07	21.55			
14年目	R 29	0.99125	0.99995	0.99169	0.99296	4%	0.4057	102.7	32.55	6.51	4.65	43.71	17.73	5.68	0.04	0.33	6.05	2.47	0.93	0.38	50.69	20.57			
15年目	R 30	0.99118	0.99995	0.99162	0.99291	4%	0.3901	102.7	32.26	6.51	4.61	43.38	16.93	5.63	0.04	0.33	6.00	2.34	0.93	0.36	50.31	19.63			
16年目	R 31	0.99110	0.99995	0.99155	0.99286	4%	0.3751	102.7	31.98	6.51	4.57	43.06	16.15	5.58	0.04	0.32	5.95	2.23	0.92	0.35	49.93	18.73			
17年目	R 32	0.99102	0.99995	0.99148	0.99281	4%	0.3607	102.7	31.69	6.51	4.53	42.74	15.41	5.53	0.04	0.32	5.89	2.13	0.91	0.33	49.54	17.87			
18年目	R 33	0.99094	0.99995	0.99141	0.99276	4%	0.3468	102.7	31.41	6.51	4.49	42.41	14.71	5.48	0.04	0.32	5.84	2.03	0.91	0.31	49.16	17.05			
19年目	R 34	0.99085	0.99995	0.99133	0.99270	4%	0.3335	102.7	31.12	6.51	4.45	42.09	14.04	5.43	0.04	0.32	5.79	1.93	0.90	0.30	48.78	16.27			
20年目	R 35	0.99077	0.99995	0.99126	0.99265	4%	0.3207	102.7	30.84	6.51	4.42	41.77	13.39	5.38	0.04	0.31	5.74	1.84	0.89	0.29	48.40	15.52			
21年目	R 36	0.99068	0.99995	0.99118	0.99259	4%	0.3083	102.7	30.55	6.51	4.38	41.44	12.78	5.33	0.04	0.31	5.68	1.75	0.89	0.27	48.01	14.80			
22年目	R 37	0.99060																							

便益の現在価値算定表

箇所名：矢板大田原バイパス(事業全体・残事業)

年次	年度 (基準年) R6	総走行台キロの年次別伸び率 (関東内陸ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)				
		乗用車類	普通貨物車	小型貨物車	全 車				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値			
供用開始年次	R 15	0.99676	1.00932	0.98997	0.99765	2%	0.8368	102.7	35.34	6.12	5.29	46.75	39.12	6.17	0.04	0.38	6.58	5.51	1.00	0.83	54.32	45.46			
1年目	R 16	0.99675	1.00924	0.98987	0.99764	2%	0.8203	102.7	35.23	6.17	5.24	46.64	38.26	6.15	0.04	0.37	6.56	5.38	0.99	0.82	54.19	44.45			
2年目	R 17	0.99674	1.00915	0.98977	0.99764	2%	0.8043	102.7	35.11	6.23	5.18	46.53	37.42	6.13	0.04	0.37	6.53	5.26	0.99	0.80	54.05	43.47			
3年目	R 18	0.99673	1.00907	0.98966	0.99763	2%	0.7885	102.7	35.00	6.29	5.13	46.42	36.60	6.11	0.04	0.36	6.51	5.13	0.99	0.78	53.92	42.51			
4年目	R 19	0.99671	1.00899	0.98955	0.99762	2%	0.7730	102.7	34.88	6.35	5.08	46.31	35.80	6.09	0.04	0.36	6.49	5.02	0.99	0.76	53.78	41.57			
5年目	R 20	0.99670	1.00891	0.98944	0.99762	2%	0.7579	102.7	34.77	6.40	5.02	46.19	35.01	6.07	0.04	0.36	6.46	4.90	0.98	0.75	53.64	40.65			
6年目	R 21	0.99669	1.00883	0.98933	0.99761	2%	0.7430	102.7	34.65	6.46	4.97	46.08	34.24	6.05	0.04	0.35	6.44	4.79	0.98	0.73	53.51	39.76			
7年目	R 22	0.99176	0.99995	0.99215	0.99329	2%	0.7284	102.7	34.54	6.52	4.92	45.97	33.49	6.03	0.04	0.35	6.42	4.67	0.98	0.71	53.37	38.88			
8年目	R 23	0.99169	0.99995	0.99209	0.99325	2%	0.7142	102.7	34.25	6.52	4.88	45.65	32.60	5.98	0.04	0.35	6.36	4.55	0.97	0.69	52.99	37.84			
9年目	R 24	0.99162	0.99995	0.99203	0.99320	2%	0.7002	102.7	33.97	6.52	4.84	45.33	31.74	5.93	0.04	0.34	6.31	4.42	0.97	0.68	52.60	36.83			
10年目	R 25	0.99155	0.99995	0.99196	0.99315	2%	0.6864	102.7	33.69	6.52	4.80	45.00	30.89	5.88	0.04	0.34	6.26	4.30	0.96	0.66	52.22	35.85			
11年目	R 26	0.99148	0.99995	0.99190	0.99311	2%	0.6730	102.7	33.40	6.52	4.76	44.68	30.07	5.83	0.04	0.34	6.21	4.18	0.95	0.64	51.84	34.89			
12年目	R 27	0.99140	0.99995	0.99183	0.99306	2%	0.6598	102.7	33.12	6.52	4.72	44.36	29.26	5.78	0.04	0.34	6.16	4.06	0.95	0.62	51.46	33.95			
13年目	R 28	0.99133	0.99995	0.99176	0.99301	2%	0.6468	102.7	32.83	6.51	4.69	44.03	28.48	5.73	0.04	0.33	6.10	3.95	0.94	0.61	51.07	33.04			
14年目	R 29	0.99125	0.99995	0.99169	0.99296	2%	0.6342	102.7	32.55	6.51	4.65	43.71	27.72	5.68	0.04	0.33	6.05	3.84	0.93	0.59	50.69	32.15			
15年目	R 30	0.99118	0.99995	0.99162	0.99291	2%	0.6217	102.7	32.26	6.51	4.61	43.38	26.97	5.63	0.04	0.33	6.00	3.73	0.93	0.58	50.31	31.28			
16年目	R 31	0.99110	0.99995	0.99155	0.99286	2%	0.6095	102.7	31.98	6.51	4.57	43.06	26.25	5.58	0.04	0.32	5.95	3.62	0.92	0.56	49.93	30.43			
17年目	R 32	0.99102	0.99995	0.99148	0.99281	2%	0.5976	102.7	31.69	6.51	4.53	42.74	25.54	5.53	0.04	0.32	5.89	3.52	0.91	0.55	49.54	29.61			
18年目	R 33	0.99094	0.99995	0.99141	0.99276	2%	0.5859	102.7	31.41	6.51	4.49	42.41	24.85	5.48	0.04	0.32	5.84	3.42	0.91	0.53	49.16	28.80			
19年目	R 34	0.99085	0.99995	0.99133	0.99270	2%	0.5744	102.7	31.12	6.51	4.45	42.09	24.18	5.43	0.04	0.32	5.79	3.32	0.90	0.52	48.78	28.02			
20年目	R 35	0.99077	0.99995	0.99126	0.99265	2%	0.5631	102.7	30.84	6.51	4.42	41.77	23.52	5.38	0.04	0.31	5.74	3.23	0.89	0.50	48.40	27.25			
21年目	R 36	0.99068	0.99995	0.99118	0.99259	2%	0.5521	102.7	30.55	6.51	4.38	41.44	22.88	5.33	0.04	0.31	5.68	3.14	0.89	0.49	48.01	26.51			

便益の現在価値算定表

箇所名：矢板大田原バイパス(事業全体・残事業)

年次	年度 (基準年) R6	総走行台キロの年次別伸び率 (関東内陸ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)				
		乗用車類	普通貨物車	小型貨物車	全 車				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値			
供用開始年次	R 15	0.99676	1.00932	0.98997	0.99765	1%	0.9143	102.7	35.34	6.12	5.29	46.75	42.74	6.17	0.04	0.38	6.58	6.02	1.00	0.91	54.32	49.67			
1年目	R 16	0.99675	1.00924	0.98987	0.99764	1%	0.9053	102.7	35.23	6.17	5.24	46.64	42.22	6.15	0.04	0.37	6.56	5.94	0.99	0.90	54.19	49.06			
2年目	R 17	0.99674	1.00915	0.98977	0.99764	1%	0.8963	102.7	35.11	6.23	5.18	46.53	41.70	6.13	0.04	0.37	6.53	5.86	0.99	0.89	54.05	48.45			
3年目	R 18	0.99673	1.00907	0.98966	0.99763	1%	0.8874	102.7	35.00	6.29	5.13	46.42	41.19	6.11	0.04	0.36	6.51	5.78	0.99	0.88	53.92	47.85			
4年目	R 19	0.99671	1.00899	0.98955	0.99762	1%	0.8787	102.7	34.88	6.35	5.08	46.31	40.69	6.09	0.04	0.36	6.49	5.70	0.99	0.87	53.78	47.25			
5年目	R 20	0.99670	1.00891	0.98944	0.99762	1%	0.8700	102.7	34.77	6.40	5.02	46.19	40.19	6.07	0.04	0.36	6.46	5.62	0.98	0.86	53.64	46.67			
6年目	R 21	0.99669	1.00883	0.98933	0.99761	1%	0.8613	102.7	34.65	6.46	4.97	46.08	39.69	6.05	0.04	0.35	6.44	5.55	0.98	0.85	53.51	46.09			
7年目	R 22	0.99176	0.99995	0.99215	0.99329	1%	0.8528	102.7	34.54	6.52	4.92	45.97	39.21	6.03	0.04	0.35	6.42	5.47	0.98	0.84	53.37	45.51			
8年目	R 23	0.99169	0.99995	0.99209	0.99325	1%	0.8444	102.7	34.25	6.52	4.88	45.65	38.55	5.98	0.04	0.35	6.36	5.37	0.97	0.82	52.99	44.74			
9年目	R 24	0.99162	0.99995	0.99203	0.99320	1%	0.8360	102.7	33.97	6.52	4.84	45.33	37.89	5.93	0.04	0.34	6.31	5.28	0.97	0.81	52.60	43.98			
10年目	R 25	0.99155	0.99995	0.99196	0.99315	1%	0.8277	102.7	33.69	6.52	4.80	45.00	37.25	5.88	0.04	0.34	6.26	5.18	0.96	0.79	52.22	43.23			
11年目	R 26	0.99148	0.99995	0.99190	0.99311	1%	0.8195	102.7	33.40	6.52	4.76	44.68	36.62	5.83	0.04	0.34	6.21	5.09	0.95	0.78	51.84	42.48			
12年目	R 27	0.99140	0.99995	0.99183	0.99306	1%	0.8114	102.7	33.12	6.52	4.72	44.36	35.99	5.78	0.04	0.34	6.16	4.99	0.95	0.77	51.46	41.75			
13年目	R 28	0.99133	0.99995	0.99176	0.99301	1%	0.8034	102.7	32.83	6.51	4.69	44.03	35.37	5.73	0.04	0.33	6.10	4.90	0.94	0.76	51.07	41.03			
14年目	R 29	0.99125	0.99995	0.99169	0.99296	1%	0.7954	102.7	32.55	6.51	4.65	43.71	34.77	5.68	0.04	0.33	6.05	4.81	0.93	0.74	50.69	40.32			
15年目	R 30	0.99118	0.99995	0.99162	0.99291	1%	0.7876	102.7	32.26	6.51	4.61	43.38	34.17	5.63	0.04	0.33	6.00	4.72	0.93	0.73	50.31	39.62			
16年目	R 31	0.99110	0.99995	0.99155	0.99286	1%	0.7798	102.7	31.98	6.51	4.57	43.06	33.58	5.58	0.04	0.32	5.95	4.64	0.92	0.72	49.93	38.93			
17年目	R 32	0.99102	0.99995	0.99148	0.99281	1%	0.7720	102.7	31.69	6.51	4.53	42.74	33.00	5.53	0.04	0.32	5.89	4.55	0.91	0.71	49.54	38.25			
18年目	R 33	0.99094	0.99995	0.99141	0.99276	1%	0.7644	102.7	31.41	6.51	4.49	42.41	32.42	5.48	0.04	0.32	5.84	4.46	0.91	0.69	49.16	37.58			
19年目	R 34	0.99085	0.99995	0.99133	0.99270	1%	0.7568	102.7	31.12	6.51	4.45	42.09	31.86	5.43	0.04	0.32	5.79	4.38	0.90	0.68	48.78	36.92			
20年目	R 35	0.99077	0.99995	0.99126	0.99265	1%	0.7493	102.7	30.84	6.51	4.42	41.77	31.30	5.38	0.04	0.31	5.74	4.30	0.89	0.67	48.40	36.27			
21年目	R 36	0.99068	0.99995	0.99118	0.99259	1%	0.7419	102.7	30.55	6.51	4.38	41.44	30.75	5.33	0.04	0.31	5.68	4.22	0.89	0.66	48.01	35.62			
22年目																									
