

(1) 下水管

- ・調査が必要と判断された下水管（延長約68km）について、概略点検を実施し、4月27日までに終了。
- ・概略点検では、2,424箇所のマンホールを開けて流下状況を確認。断層のズレにより管渠の破断が4箇所確認されたが、4箇所すべてに仮設ポンプを設置して対応済。以上により、流下機能は確保。
- ・概略点検により、詳細調査が必要と判断された約4kmについては、テレビカメラ等による調査を実施し、5月26日までに終了。被災延長は約2km。

・下水管破断箇所1(写真①)

断層のズレにより下水管が破断した箇所について、仮設ポンプを設置して対応済



・下水管破断箇所2(写真②)

仮設ポンプを設置して対応済




・下水管破断箇所3(写真③)

仮設ポンプを設置して対応済



阿蘇市下水道整備区域図

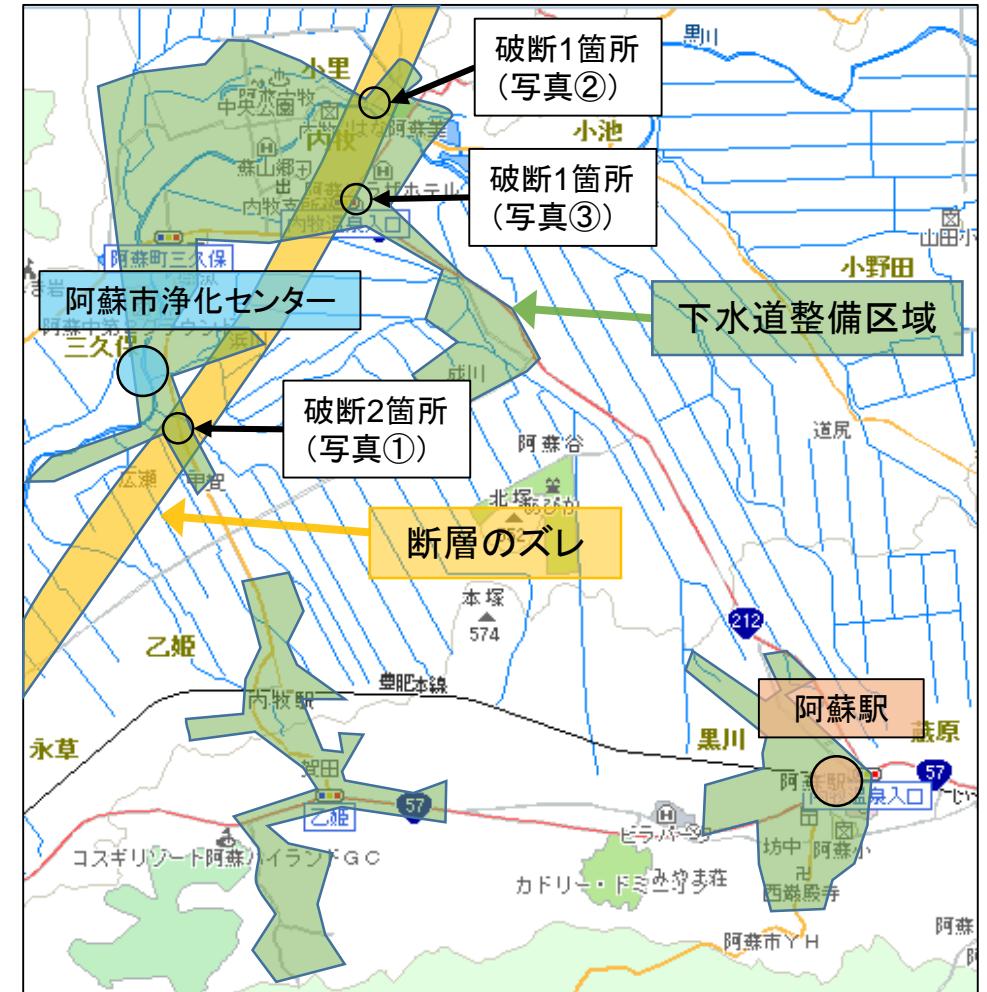

(2) 下水処理場（阿蘇市浄化センター）

- ・一部に被害があるものの、いずれも軽微な被害であり、処理機能を確保済。現在通常運転中。
