

令和6年7月25日からの東北地方の大雨における河川の対応状況

令和6年7月31日06:00時点

※速報であり、数値等は今後変わることがある。国土交通省 水管理・国土保全局

- 国管理の子吉川水系子吉川、石沢川（秋田県由利本荘市）、最上川水系最上川（山形県新庄市、戸沢村）、鮭川（山形県戸沢村）の2水系4河川、4県（岩手県、秋田県、山形県、宮城県）管理の11水系32河川で浸水被害が発生（概ね浸水解消済み）。
- このうち、子吉川水系子吉川、石沢川、最上川水系最上川、新田川、野尻川、米代川水系五反沢川の計14箇所（国3箇所、秋田県6箇所、山形県5箇所）で堤防の決壊や欠損を確認。緊急応急復旧工事については、準備が整い、水位が低下し安全が確認されたところから順次着手。国管理の子吉川水系子吉川、石沢川では、水防活動等のための基準水位を引き下げて運用中。
- 排水機場3箇所（山形県酒田市、戸沢村）でポンプ設備の故障が発生（背後地の浸水解消済み）。施設復旧までの代替として、排水ポンプ車を配備済み。
- 63ダムで洪水調節（事前放流を含む）を実施。このうち、32ダムは事前放流の基準に達し、容量を確保（利水ダムは25ダム）。
- 1ダムで緊急放流（非常用洪水吐きからの越流）に移行。1ダムで特別防災操作（通常の洪水調節よりも大幅に流量を抑制する操作）を実施。

秋田県内における河川の状況

【浸水被害】

国管理河川（子吉川水系子吉川、石沢川） 概ね浸水解消

① 子吉川水系子吉川浸水状況 ② 子吉川水系石沢川浸水状況

県管理河川（5水系8河川） 概ね浸水解消

③ 雄物川水系上雄川浸水状況 ④ 雄物川水系小友川浸水状況

【施設被害】

国管理河川（子吉川水系子吉川、石沢川） 緊急応急復旧工事中

⑤ 子吉川水系石沢川 国管理区間>左岸1.0km 約60m ⑥ 子吉川水系子吉川 約70m

県管理河川（2水系2河川） 緊急応急復旧工事中

⑦ 秋田県管理区間>左岸3km 子吉川水系石沢川 約50m ⑧ 子吉川水系石沢川

岩手県内における河川の状況

【浸水被害】

県管理河川（1水系1河川） 概ね浸水解消

子吉川水系の浸水状況

1箇所（五反沢川）

2箇所（子吉川、石沢川） 1~2 5~8

5箇所（石沢川）

最上川水系の浸水状況

4箇所（新田川）

1箇所（野尻川）

1箇所（最上川）

宮城県内における河川の状況

【浸水被害】

県管理河川（2水2河川） 概ね浸水解消

山形県内における河川の状況

【浸水被害】

国管理河川（最上川水系最上川、鮭川） 概ね浸水解消

⑨ 最上川水系最上川浸水状況 ⑩ 最上川水系鮭川浸水状況

県管理河川（4水系21河川） 概ね浸水解消

⑪ 谷川水系荒瀬川浸水状況 ⑫ 日向川水系日向川浸水状況

【施設被害】

国管理河川（最上川水系最上川） 緊急応急復旧工事中

⑬ 最上川水系最上川欠損状況 約100m

県管理河川（1水系2河川） 緊急応急復旧工事中

⑭ 新田川 約100m ⑮ 野尻川

● 氾濫(堤防決壊)(国) ▲ 氾濫(堤防欠損)(国) ● 氾濫(溢水・越水)(国)
× 氾濫(堤防決壊)(県) ● 氾濫(溢水・越水)(県)

子吉川水系 (秋田県由利本荘市) の堤防決壊箇所の緊急応急復旧工事について

令和6年7月30日 17:00時点
国土交通省 水管理・国土保全局

- 子吉川水系子吉川、石沢川の堤防決壊箇所の緊急応急復旧工事を実施中。



7月25日 被災確認




国管理区間

子吉川(本川)

- 7月26日 大型土嚢の製作に着手
- 7月27日 仮設道路整備に着手
- 7月29日～ 荒締切盛土(岩ズリ)施工

石沢川(支川)


- 7月26日 根固めブロック工に着手
- 7月27日 荒締切盛土(岩ズリ)施工
- 7月29日～ 大型連結ブロックの設置

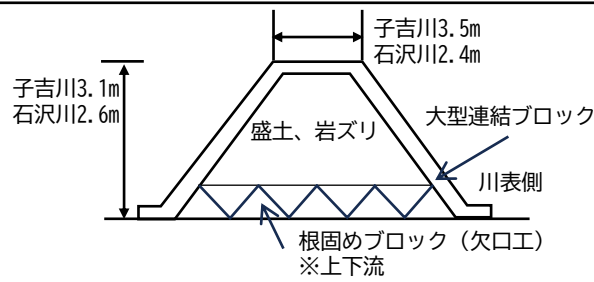

緊急復旧断面(国施工)



子吉川(本川)
荒締切盛土(岩ズリ)
施工中




石沢川(支川)
法面整形、
大型連結ブロック設置

秋田県管理区間

※右岸側1箇所で大土嚢設置に着手
残る3箇所は仮設道路整備中

石沢川(支川)左岸側


- 7月25日 大型土嚢製作に着手
- 7月26日 仮設道路整備に着手
- 7月29日 堤防決壊箇所の大型土嚢設置に着手
- 7月30日 堤防決壊箇所の大型土嚢設置



応急対策内容(県施工)



● 最上水系最上川の堤防欠損 (国管理区間／左岸45.3kp)、最上川水系鮭川の堤防亀裂 (国管理区間／右岸6.3kp) の緊急応急復旧工事を実施中。

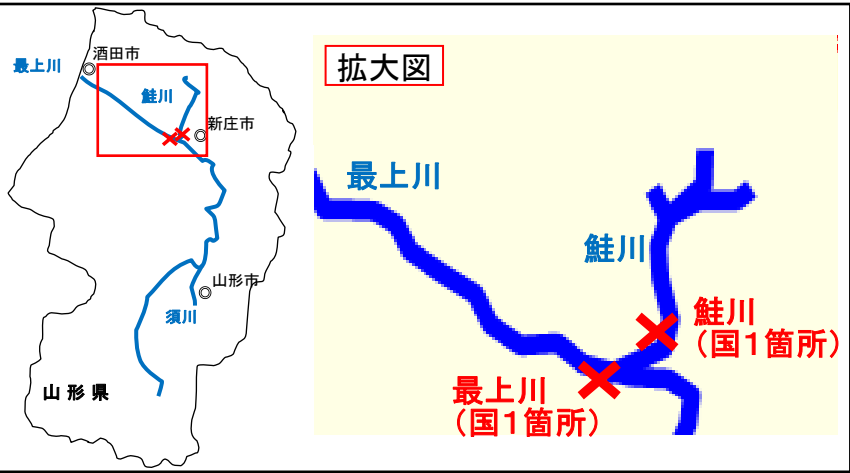

7月26日 被災確認
堤防欠損 L=100m



7月25日 被災確認
堤防亀裂(裏法崩れ) L=70m


国管理区間

最上川(本川)


- 7月27日 堤防法面と欠損箇所にシート張りを施工、堤防復旧に支障となる既設構造物を撤去
- 7月29日 堤防復旧の盛土工
- 7月30日～大型連結ブロック設置

鮭川(支川)


- 7月27日 施工ヤード造成に着手
- 7月28日 表法面へ大型連結ブロック設置
- 7月29日 川裏亀裂箇所盛土工
- 7月30日～川裏法面の大型連結ブロック設置

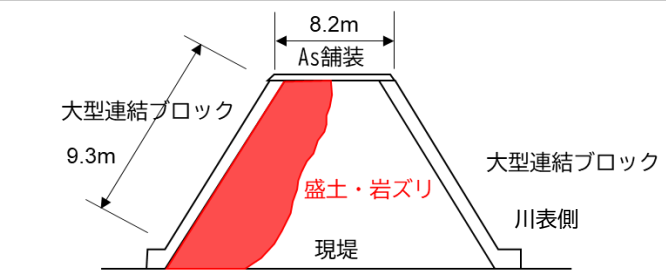

緊急復旧断面



緊急復旧断面

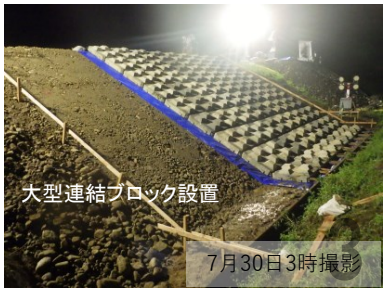


子吉川水系 (秋田県由利本荘市) 、最上川水系 (山形県最上郡戸沢村) 緊急応急復旧工事 (直轄)


令和6年7月30日 17:00時点

国土交通省 水管理・国土保全局


■秋田県・山形県 位置図

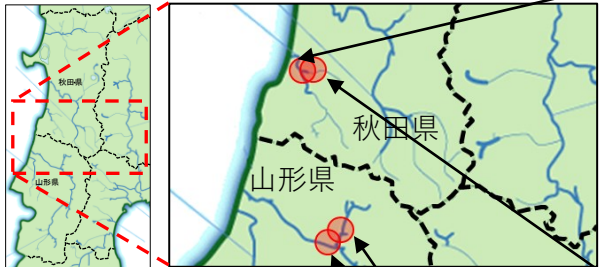

こよしがわ こよしがわ
子吉川水系子吉川
ゆりほんじょうし
(秋田県由利本荘市)
堤防決壊L=約70m
進捗率 35%

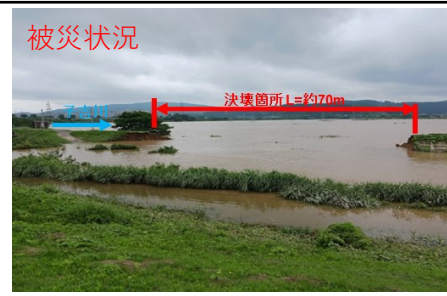


■子吉川水系堤防決壊箇所緊急復旧断面

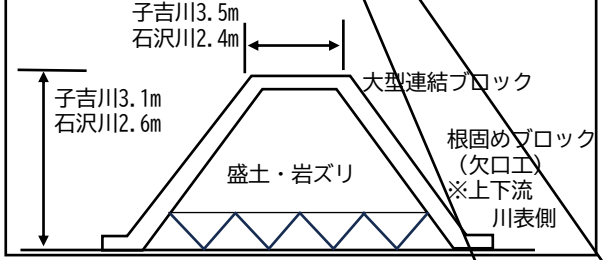


こよしがわ いしざわがわ
子吉川水系石沢川
ゆりほんじょうし
(秋田県由利本荘市)
堤防決壊L=約60m
進捗率 80%




■鮭川堤防亀裂(裏法崩れ)箇所緊急復旧断面

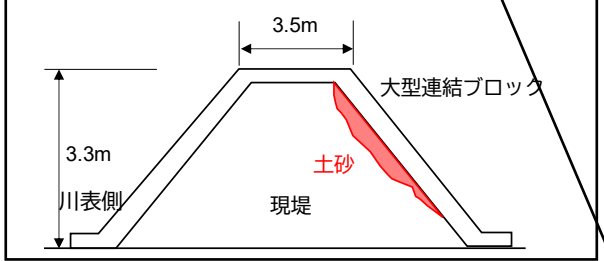

もがみがわ さけがわ
最上川水系鮭川
もがみぐんとざわむら
(山形県最上郡戸沢村)
堤防亀裂(裏法崩れ)
L=約70m
進捗率 65%

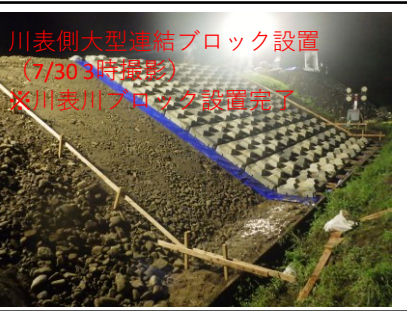

■最上川堤防欠損箇所緊急復旧断面

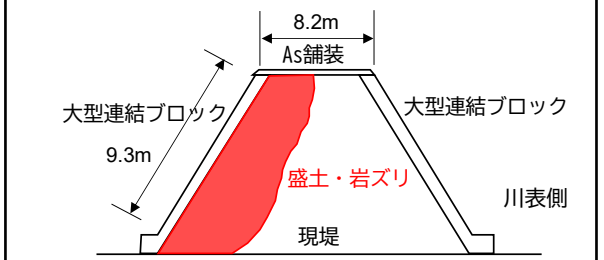

もがみがわ もがみがわ
最上川水系最上川
もがみぐんとざわむら
(山形県最上郡戸沢村)
堤防欠損L=約100m
進捗率 45%




【秋田県、山形県】水道施設の被害状況等について

令和6年7月31日


8:00時点

県	市町村・事業者名	断水戸数（戸）		断水期間	被害状況	応急給水状況 応援要請	復旧対応状況	復旧見通し
		最大	現在					
秋田県	かみこあにむら 上小阿仁村	126	126	7/26～	河川氾濫により水道管破損	実施中	浄水場の稼働確認済み 河川部局において決壊箇所へ 大型土のう設置予定 仮復旧方法を検討中	未定
	ゆりほんじょうし 由利本荘市	64	0	7/24～30	土砂崩れによる水道管破損	終了	仮復旧工事完了	7/30復旧済
	よこてし 横手市	20	0	7/25～29	水道管破損（継手外れ）	終了	仮復旧工事完了	7/29復旧済
	にかほ市	3	0	7/24～29	河川増水による添架管破損	終了	仮復旧工事完了	7/29復旧済
山形県	さかたし 酒田市	252	252	7/25～	橋梁落橋、道路崩落による水道管破損 一部、状況確認中	実施中	状況確認に向けて 道路部局と情報共有実施中	未定
		11	11	7/25～	河川増水による水管橋損傷	実施中	仮復旧方法を検討中	未定
		825	0	7/25～27	河川増水による水管橋損傷	終了	仮復旧工事完了	7/27復旧済
	さげがわむら 鮭川村	1,132	118	7/26～	河川氾濫、土砂崩れによる水道管破損	実施中	仮復旧工事实施中	未定
	まむろがわまち 真室川町	380	0	7/25～28	水源地ポンプ設備冠水 土砂崩れによる水道管破損	実施中	仮復旧工事完了	7/28復旧済
	とざわむら 戸沢村	2	0	7/26～29	地すべりによる水道管損傷	終了	仮復旧工事完了	7/29復旧済
合計		2,805	507					

●水道施設の被災状況等

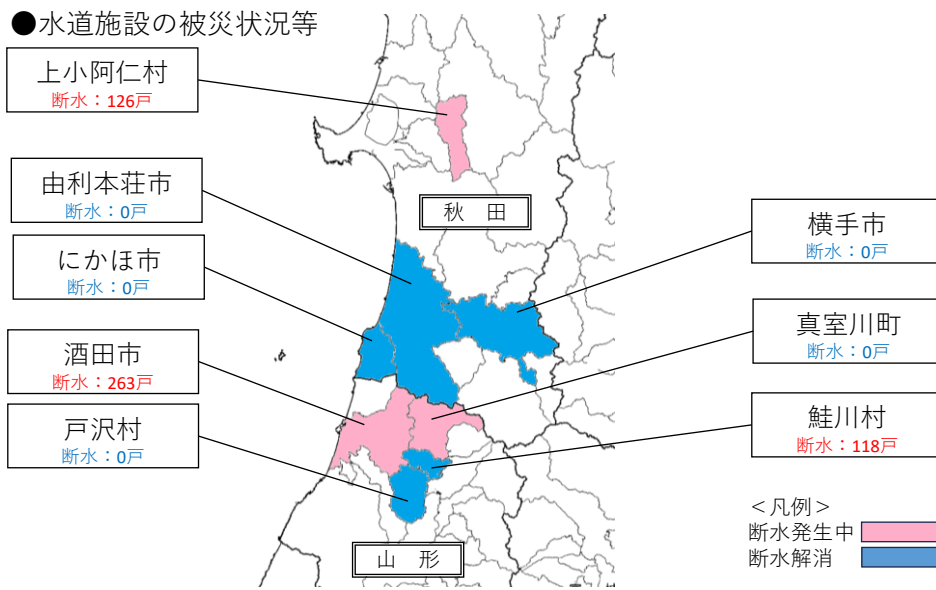

●被災状況等

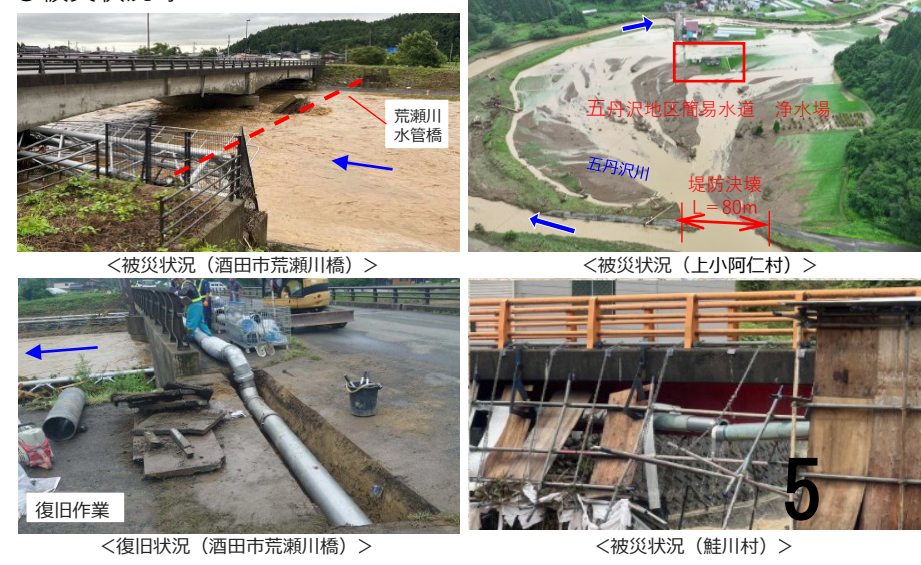

【秋田県、山形県】下水道施設の被害状況等について

●被害のあった下水道施設

県	市町村名	施設名	被害時の状況	現在の対応状況
秋田県	かみこあにむら 上小阿仁村	マンホールポンプ 1基	浸水により異常確認	点検実施により復旧済み
山形県	さかたし 酒田市	やはた 八幡浄化センター	浸水により機能停止	仮設ポンプの設置や簡易処理の実施により機能確保済み
		まつやま 松山浄化センター	浸水により機能停止	揚水機能の復旧や簡易処理の実施により機能確保済み
	とざわむら 戸沢村	ふるくち 古口浄化センター	浸水により機能停止	ポンプ操作盤の応急対応により機能確保済み
	ゆさまち 遊佐町	管路（污水）	一部破損	影響範囲は1軒（避難中のため汚水の発生なし） 町道や護岸の復旧にあわせて復旧予定

●被害のあった下水道施設の位置

< 凡例 >


下水処理場



マンホールポンプ



管路

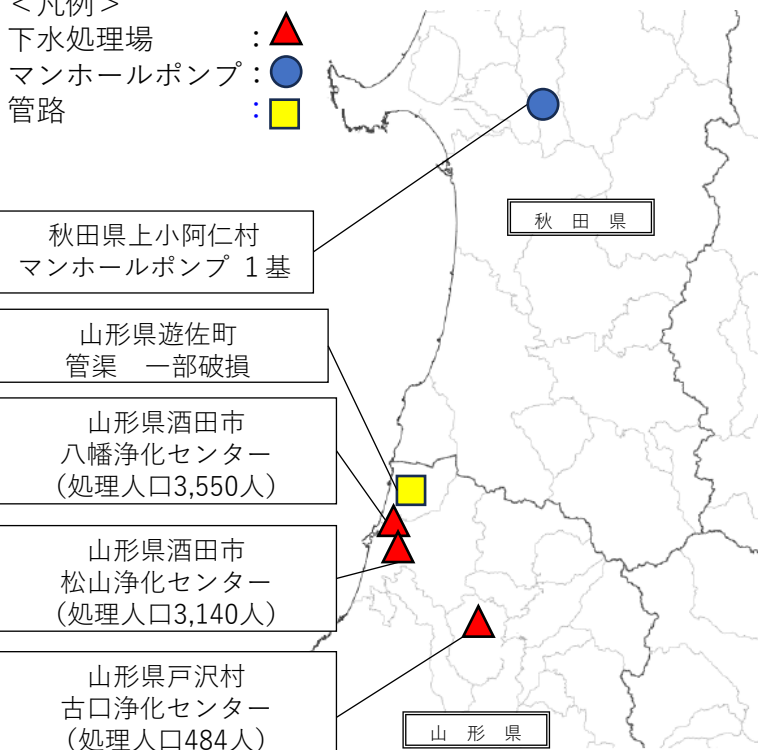

●山形県酒田市八幡浄化センターの被災状況と応急対応状況



浸水した曝気ブロワ

●山形県酒田市松山浄化センターの被災状況と応急復旧状況



浸水した浄化センター内



揚水機能の復旧確認

7月25日からの大雨による土砂災害発生状況

土砂災害発生件数

47件

- 土石流等 : 5件
- 地すべり : 3件
- がけ崩れ : 39件

【被害状況】

※山形県は人家被害確認中
人的被害 : 負傷者 1名
人家被害 : 一部損壊 7戸

7/29 さつぽろし とよひらくにしおか
がけ崩れ 北海道札幌市豊平区西岡



7/25 まいばらし いぶき
土石流等 滋賀県米原市伊吹



7/26 もがみぐんとざわむらまつざか
土石流等 山形県最上郡戸沢村松坂





7/26 さかたし くさつ
地すべり 山形県酒田市草津



7/26 もがみぐんふながたまちふながた
がけ崩れ 山形県最上郡舟形町舟形



発生件数内訳		
山形県	38件	
秋田県	5件	
岩手県	2件	
北海道	1件	
滋賀県	1件	

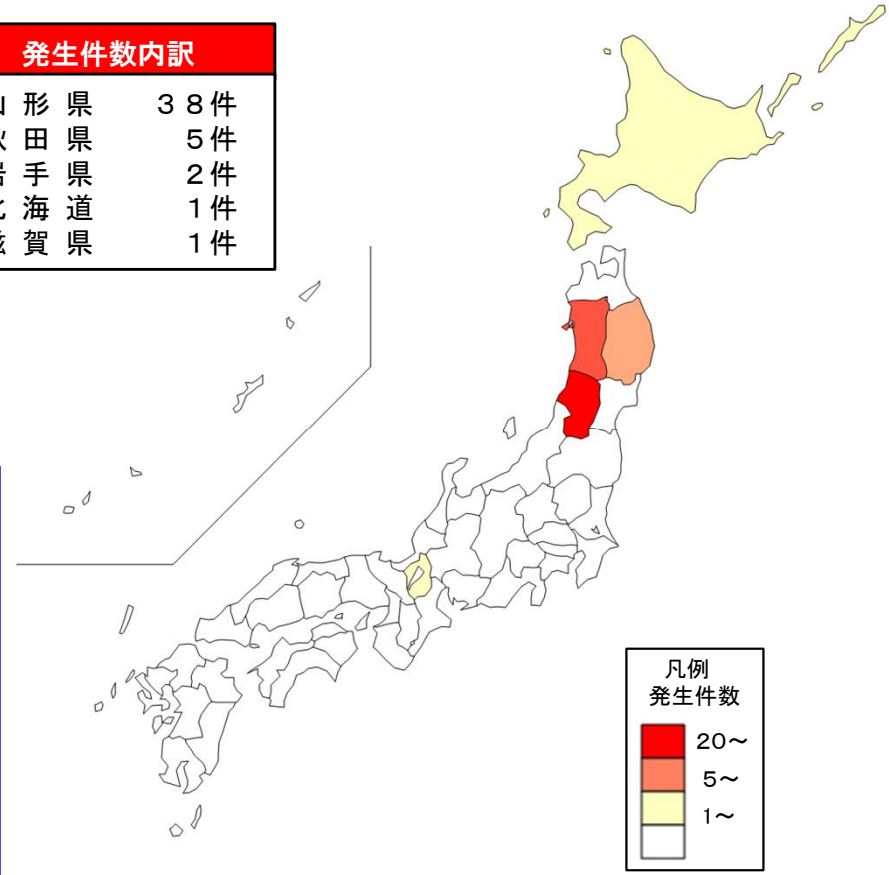

7/26 よこてし ますだまちおきのふくろ
がけ崩れ 秋田県横手市増田町荻袋



7/26 いちのせきし ましば
がけ崩れ 岩手県一関市真柴



240731_0700時点
国土交通省 道路局

【凡例】

・被災	災:	
・被災+孤立	:	
・完了	:	



写真②
国道47号被災・復旧状況



写真③
国道344号被災状況(酒田市下青沢)



被災による通行止め区間 240731 0700 時点

路線	高速道路	直轄国道	補助国道	都道府県道	備考
秋田県	1路線 1区間	なし	3路線 3区間	8区間	孤立 解消
山形県	1路線 1区間	2路線 5区間	1路線 2区間	25区間	孤立 解消

注記)

- ・通行止め箇所は、補助国道以上を示している。
- ・地方道は、孤立箇所の発生要因となっている箇所のみ図示。

7月25日から大雨による鉄道の主な被害状況について

○施設被害により、山形新幹線を含め、秋田・山形・岩手県内の2事業者4路線で運転見合わせ中

運転見合わせ路線

【新幹線：1事業者1路線】

- ・JR東日本
山形新幹線（奥羽線）
山形駅～新庄駅間

【在来線：2事業者4路線】

- ・JR東日本
奥羽線 村山駅～院内駅間
陸羽東線 鳴子温泉駅～新庄駅間
大船渡線 一ノ関駅～気仙沼駅間
- ・秋田内陸縦貫鉄道
秋田内陸線 鷹巣駅～比立内駅間

JR東日本 奥羽線（被災箇所 調査中）

運休（7/25～）：村山駅～院内駅間

運転再開時期

- ・村山駅～大石田駅間：8月1日
- ・大石田駅～新庄駅間：8月中旬頃
- ・新庄駅～院内駅間：未定

土砂流出・電柱倒壊等



※写真はJR東日本提供

※奥羽線に乗り入れている山形新幹線は
山形駅～新庄駅間で運転見合わせ中
運転再開時期

- ・山形駅～大石田駅間：8月1日
- ・大石田駅～新庄駅間：8月中旬頃
- 代行輸送：大石田駅～新庄駅間：8月1日～

- : 運休区間
- : 再開区間
- ✕ : 写真の被害箇所
- × : 他の被害箇所



秋田内陸縦貫鉄道 秋田内陸線（被災6箇所）

運休（7/25～）：鷹巣駅～比立内駅間

運転再開時期

- ・鷹巣駅～阿仁合駅間：8月上旬頃
- ・阿仁合駅～比立内駅間：8月中旬頃

土砂流入等



※写真は秋田内陸縦貫鉄道提供

JR東日本 大船渡線（被災1箇所）

運休（7/26～）：一ノ関駅～気仙沼駅間

運転再開時期：未定

土砂流出



※写真はJR東日本提供

JR東日本 陸羽東線（被災箇所 調査中）

運休（7/25～）：鳴子温泉駅～新庄駅間

運転再開時期：未定

【都市局】 令和6年7月25日からの大雨による被災状況

【施設名】仁賀保墓園
【被害状況】法面の小崩落



法面小崩落(仁賀保墓園)

【施設名】最上川下流緑地
【被害状況】土砂堆積

【施設名】松山河川運動公園
【被害状況】流木、ごみ堆積


【施設名】臼ヶ沢農村公園
【被害状況】法面崩落、フェンス破損



法面一部崩落(東平田さくら公園)

【施設名】東平田さくら公園
【被害状況】法面一部崩落等

【施設名】最上川寒河江緑地
【被害状況】土砂堆積

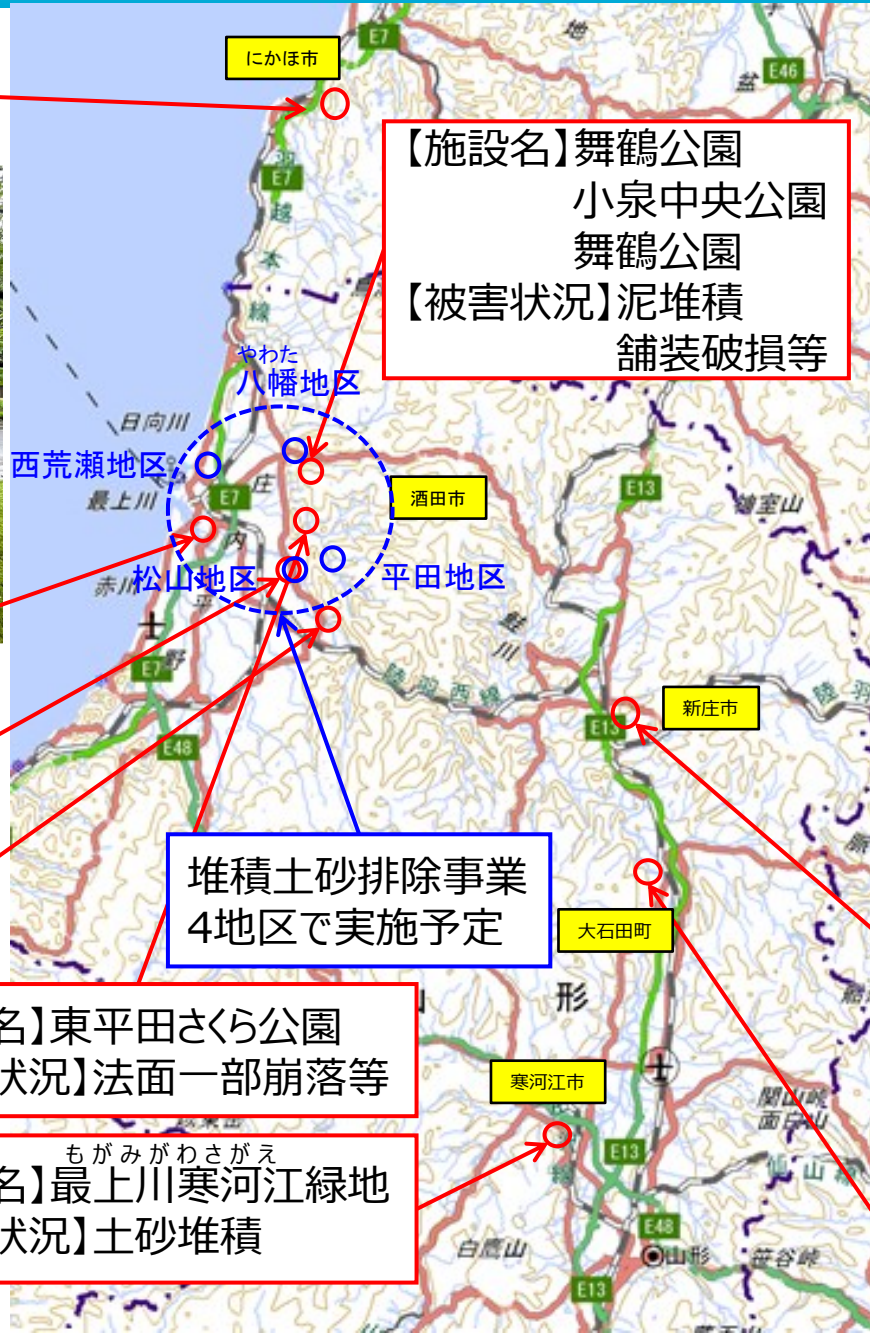

【施設名】舞鶴公園
小泉中央公園
舞鶴公園
【被害状況】泥堆積
舗装破損等

堆積土砂排除事業
4地区で実施予定

※いずれも人的被害無し



土砂流出(八幡公園)



土砂堆積(新田川河川公園)

【施設名】八幡公園
【被害状況】土砂流出

【施設名】新田川河川公園
【被害状況】土砂堆積

【施設名】下川原公園
【被害状況】一部冠水

国土交通省職員の対応状況

総数【126名】（のべ482人日）

リエゾン 23名

被災状況調査班等 103名

東北地整	63名
関東地整	43名
中部地整	20名

 上小阿仁村【2名】
リエゾン（東北地整） 2名

上小阿仁村


 秋田県庁【2名】
リエゾン（東北地整） 2名

秋田市

 由利本荘市【6名】
リエゾン（東北地整） 2名
先遣調査班 4名

由利本荘市

大仙市

横手市


 酒田市【26名】
リエゾン（東北地整） 2名
先遣調査班 8名
被災状況調査班（河川） 8名
被災状況調査班（道路） 8名

 鮭川村【22名】
リエゾン（東北地整） 2名
被災状況調査班（河川） 8名
被災状況調査班（道路） 8名
被災状況調査班（ドローン） 4名

遊佐町

酒田市

庄内町

鮭川村

新庄市

大蔵村

戸沢村

舟形町

最上町

 新庄市【10名】
リエゾン（東北地整） 2名
先遣調査班 4名
応急対策班 4名

 最上町【6名】
リエゾン（東北地整） 2名
先遣調査班 4名

 舟形町【10名】
リエゾン（東北地整） 2名
先遣調査班 4名
被災状況調査班（河川砂防） 4名

 戸沢村【19名】
リエゾン（東北地整） 3名
先遣調査班 4名
被災状況調査班（河川砂防） 12名

 大蔵村【8名】
被災状況調査班（河川砂防） 8名

山形市

 山形県庁【2名】
リエゾン（東北地整） 2名

 東北地方整備局災害対策本部【7名】
関東先遣班 3名
中部先遣隊 4名



災害対策車稼働状況等位置図(秋田、湯沢、能代)

青字は自治体支援

令和6年7月31日7時30分現在

- ・内水排除箇所 0箇所
(自治体支援箇所 0箇所)
- ・排水ポンプ車 0台
- ・照明車 0台
- ・待機支援車 0台

活動中	撤収
待機中	

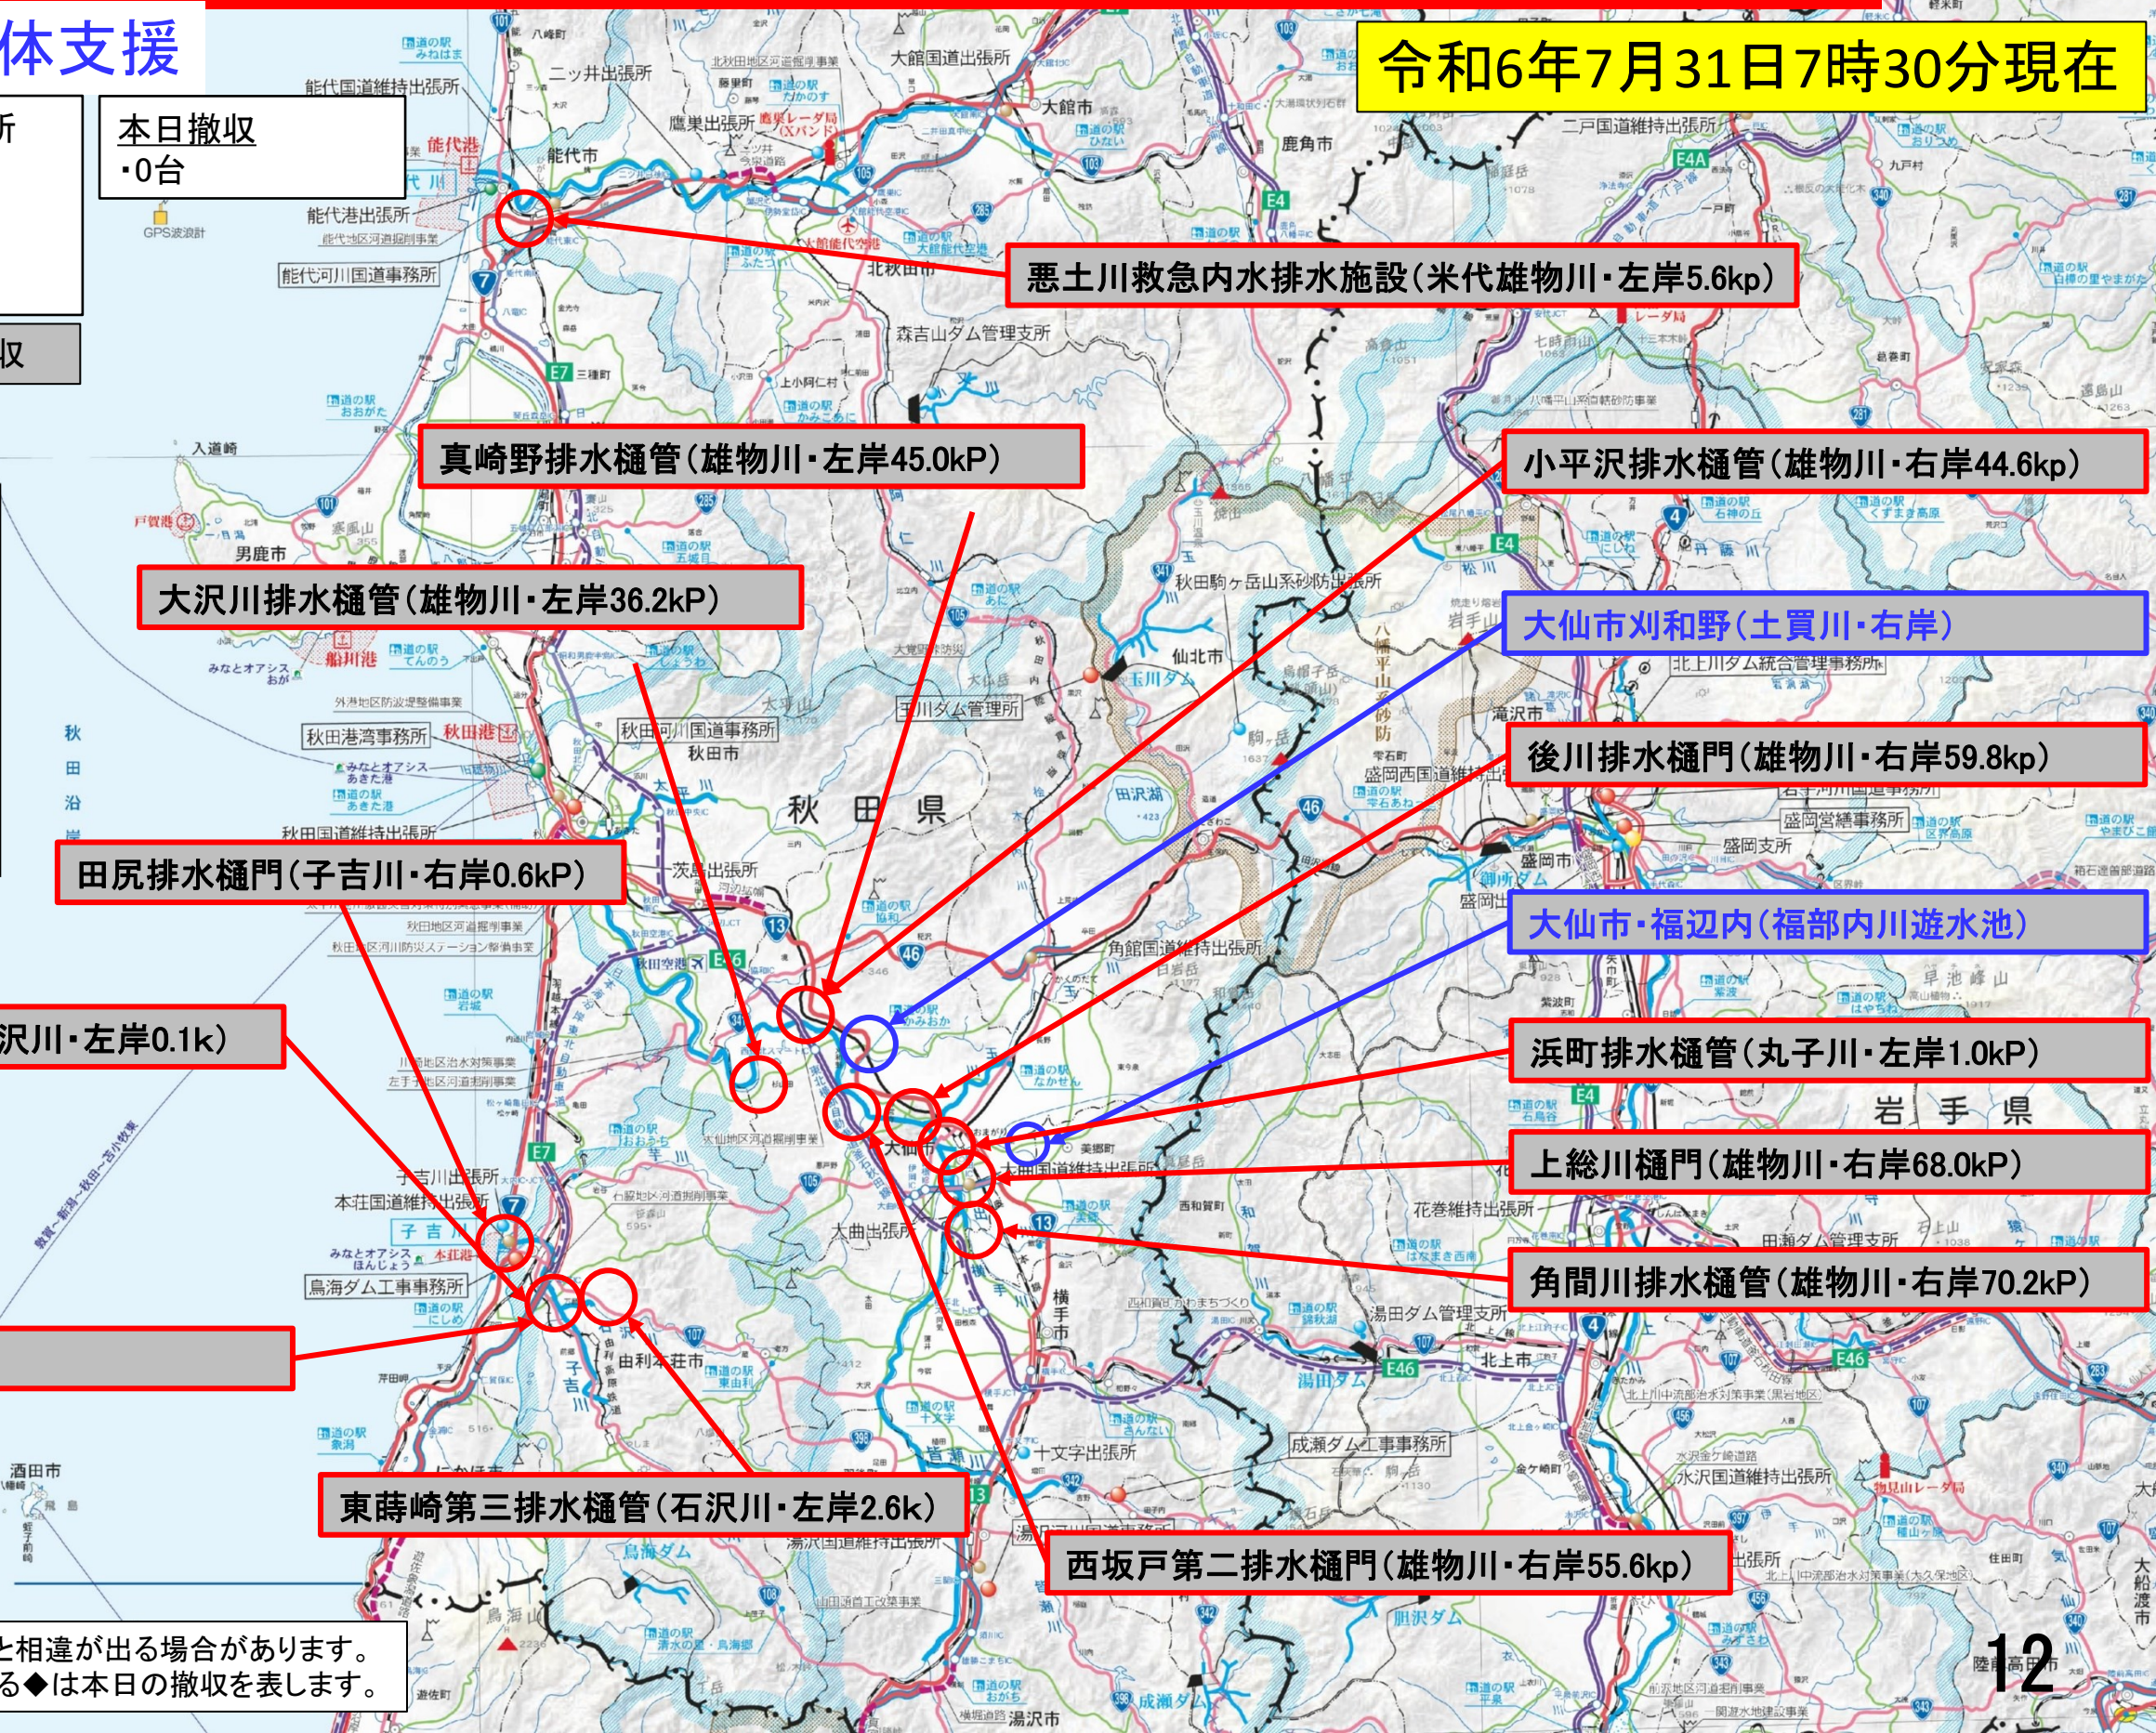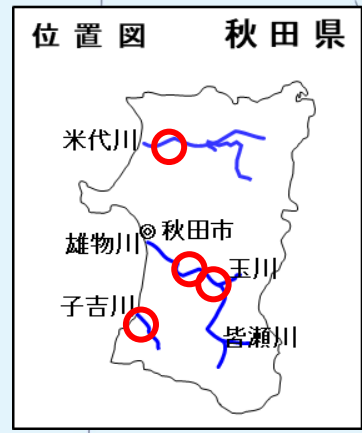

本日撤収
・0台

悪土川救急内水排水施設(米代雄物川・左岸5.6kp)

真崎野排水樋管(雄物川・左岸45.0kp)

小平沢排水樋管(雄物川・右岸44.6kp)

大沢川排水樋管(雄物川・左岸36.2kp)

大仙市刈和野(土買川・右岸)

後川排水樋門(雄物川・右岸59.8kp)

田尻排水樋門(子吉川・右岸0.6kp)

大仙市・福辺内(福部内川遊水池)

妻屋下排水樋管(石沢川・左岸0.1k)

浜町排水樋管(丸子川・左岸1.0kp)

上総川樋門(雄物川・右岸68.0kp)

子吉川防災ST

角間川排水樋管(雄物川・右岸70.2kp)

東蒔崎第三排水樋管(石沢川・左岸2.6k)

西坂戸第二排水樋門(雄物川・右岸55.6kp)

(注)速報ですので現場と相違が出る場合があります。
(注)箇所名の先頭にある◆は本日の撤収を表します。


災害対策車稼働状況等位置図(山形)

青字は自治体支援

令和6年7月31日7時30分現在

- ・内水排除箇所 0箇所
(自治体支援箇所 0箇所)
- ・排水ポンプ車 16台
- ・照明車 3台

活動中	撤収
待機中	

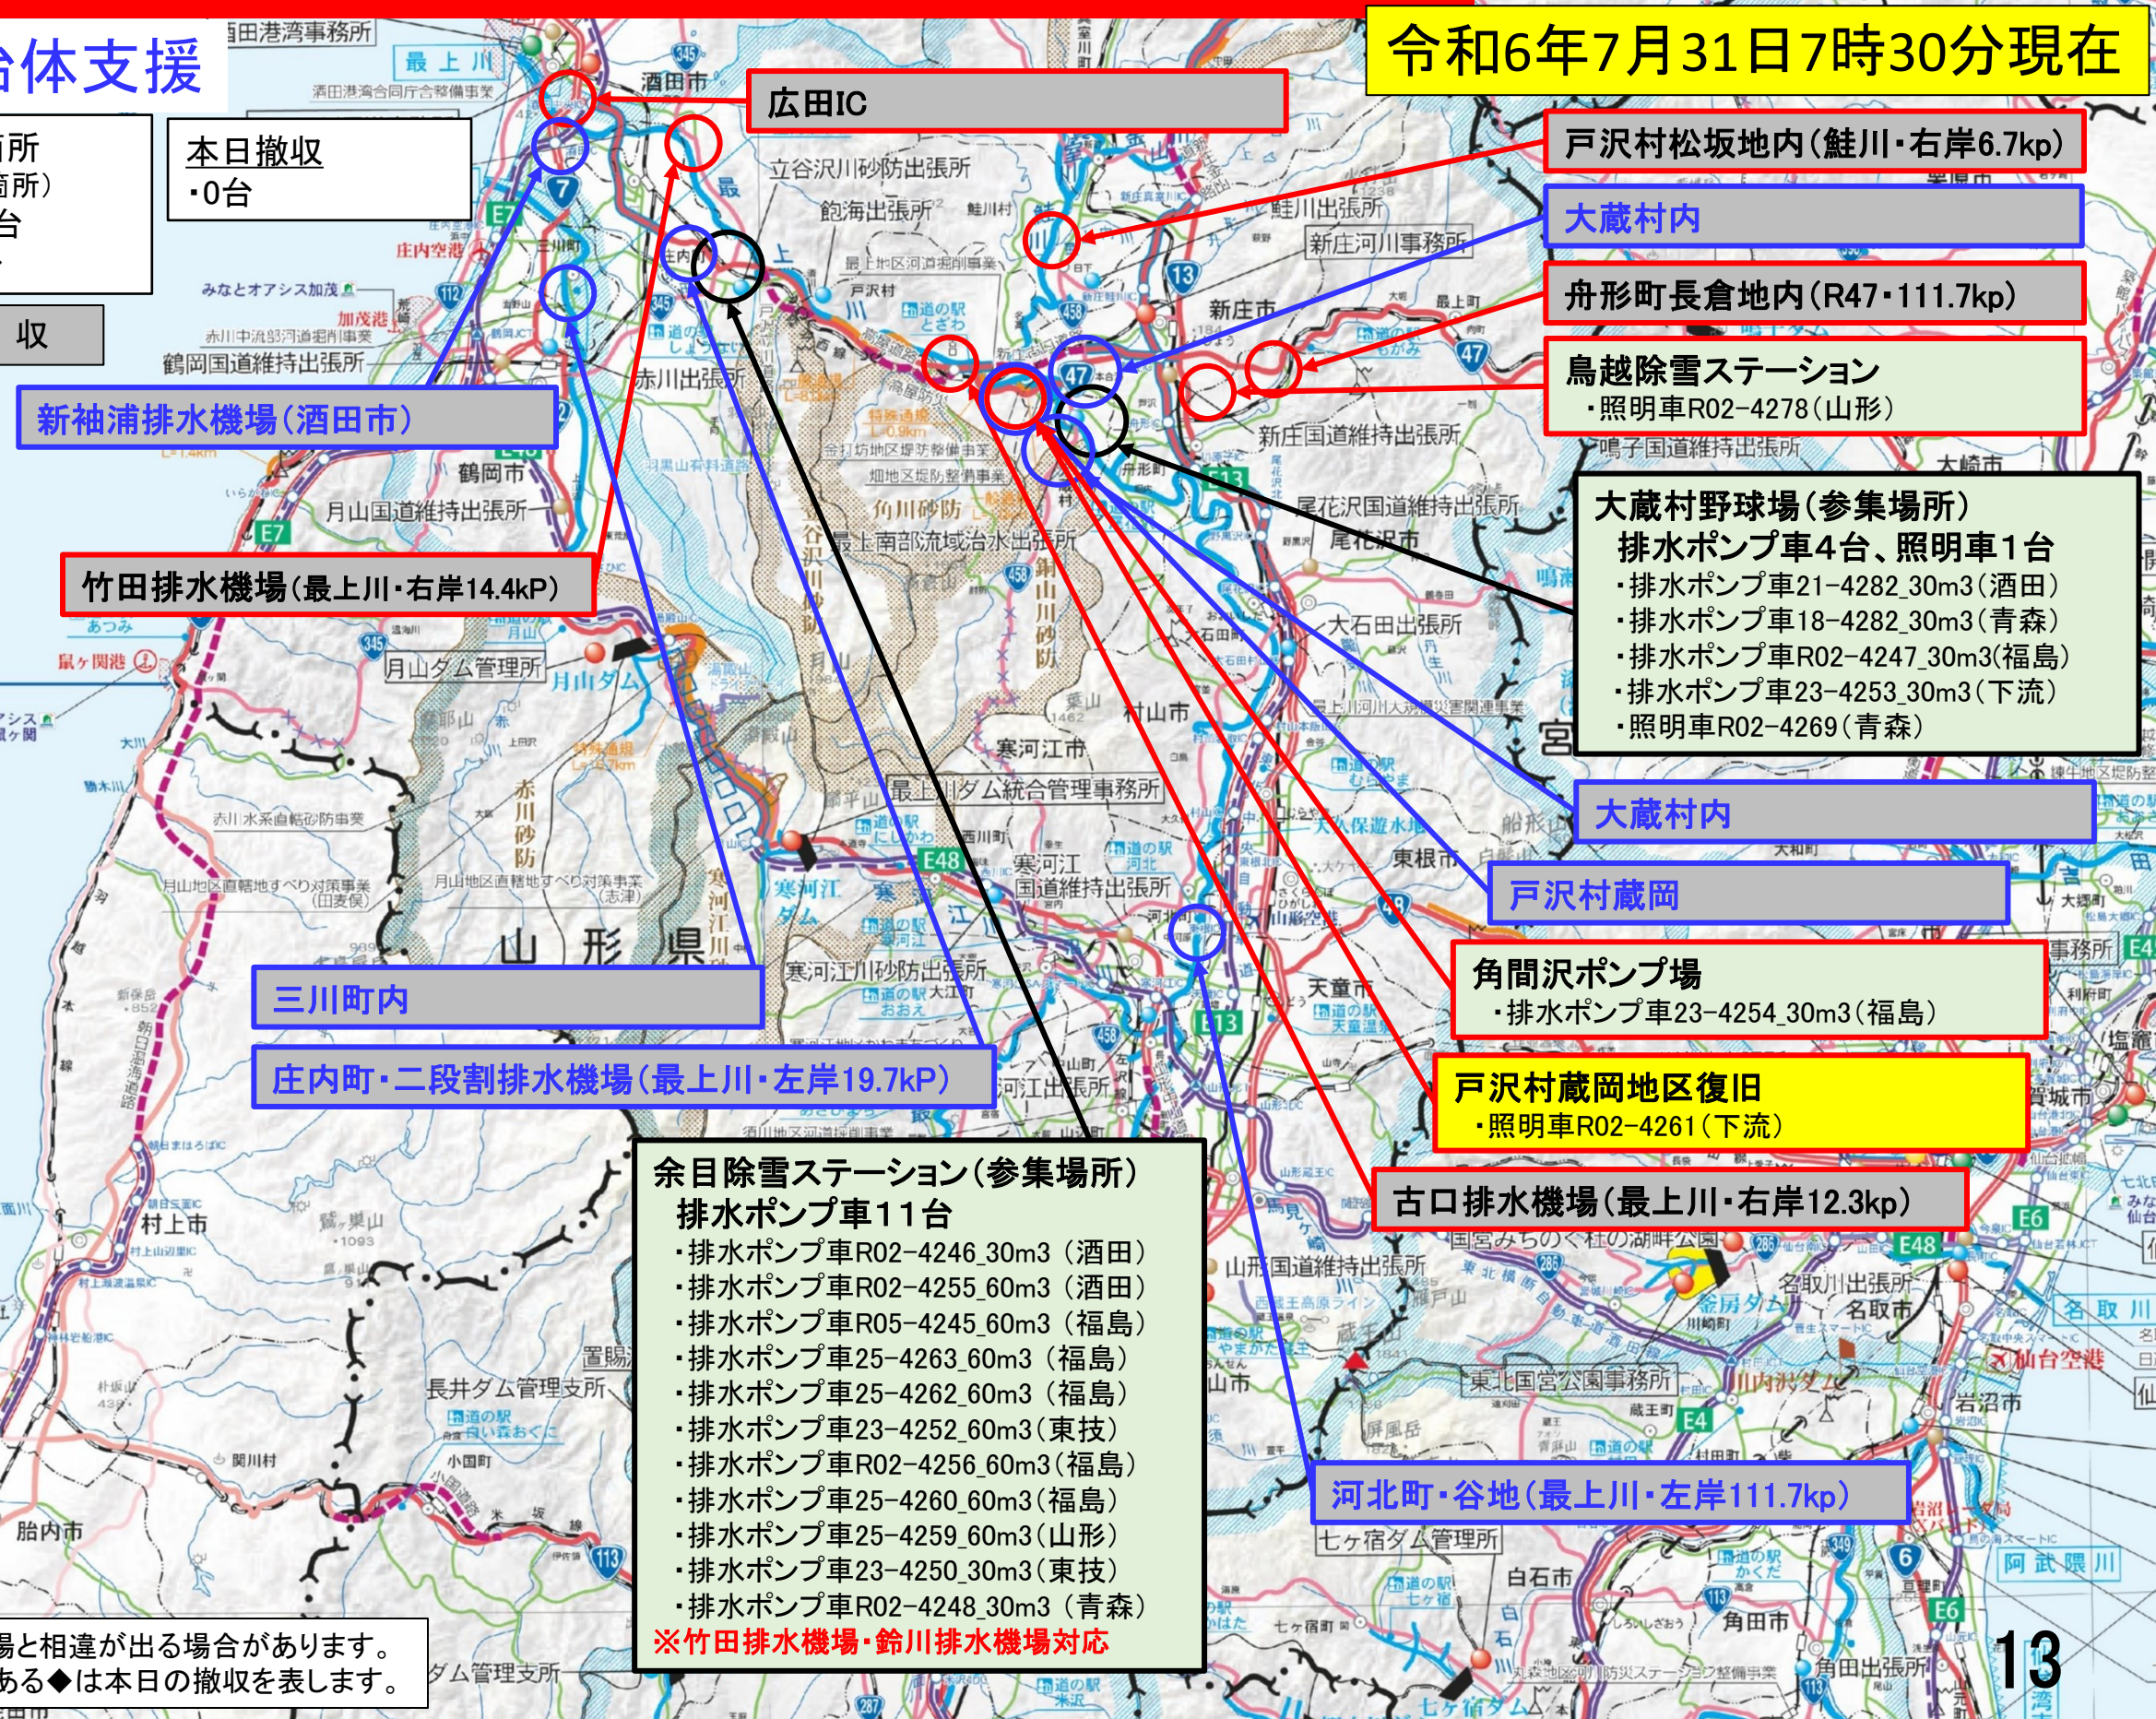

(注) 速報ですので現場と相違が出る場合があります。
(注) 箇所名の先頭にある◆は本日の撤収を表します。
