


<被害の状況等>

1. 台風第25号は、大型で強い勢力で伊豆諸島や関東甲信地方に接近した。関東甲信地方では21日の24時間降水量がこれまでの観測史上1位や9月の1位を更新し、19日から21日までの総雨量は伊豆諸島で800ミリ、静岡県で500ミリ、千葉県で450ミリを超えるなど記録的な大雨となった。
2. 国管理河川では、現時点で河川の氾濫による被害情報なし。
県管理河川では、千葉県管理の14河川において浸水を確認。北印旛沼・北印旛沼（角川集水路）・長門川にて3地点4箇所の堤防決壊が発生（応急復旧着手済）。
その他、千葉県管理の86箇所、神奈川県管理の1箇所で護岸の変状などを確認（**応急対策完了**）。
3. ダムについては、9ダムで洪水調節を実施。

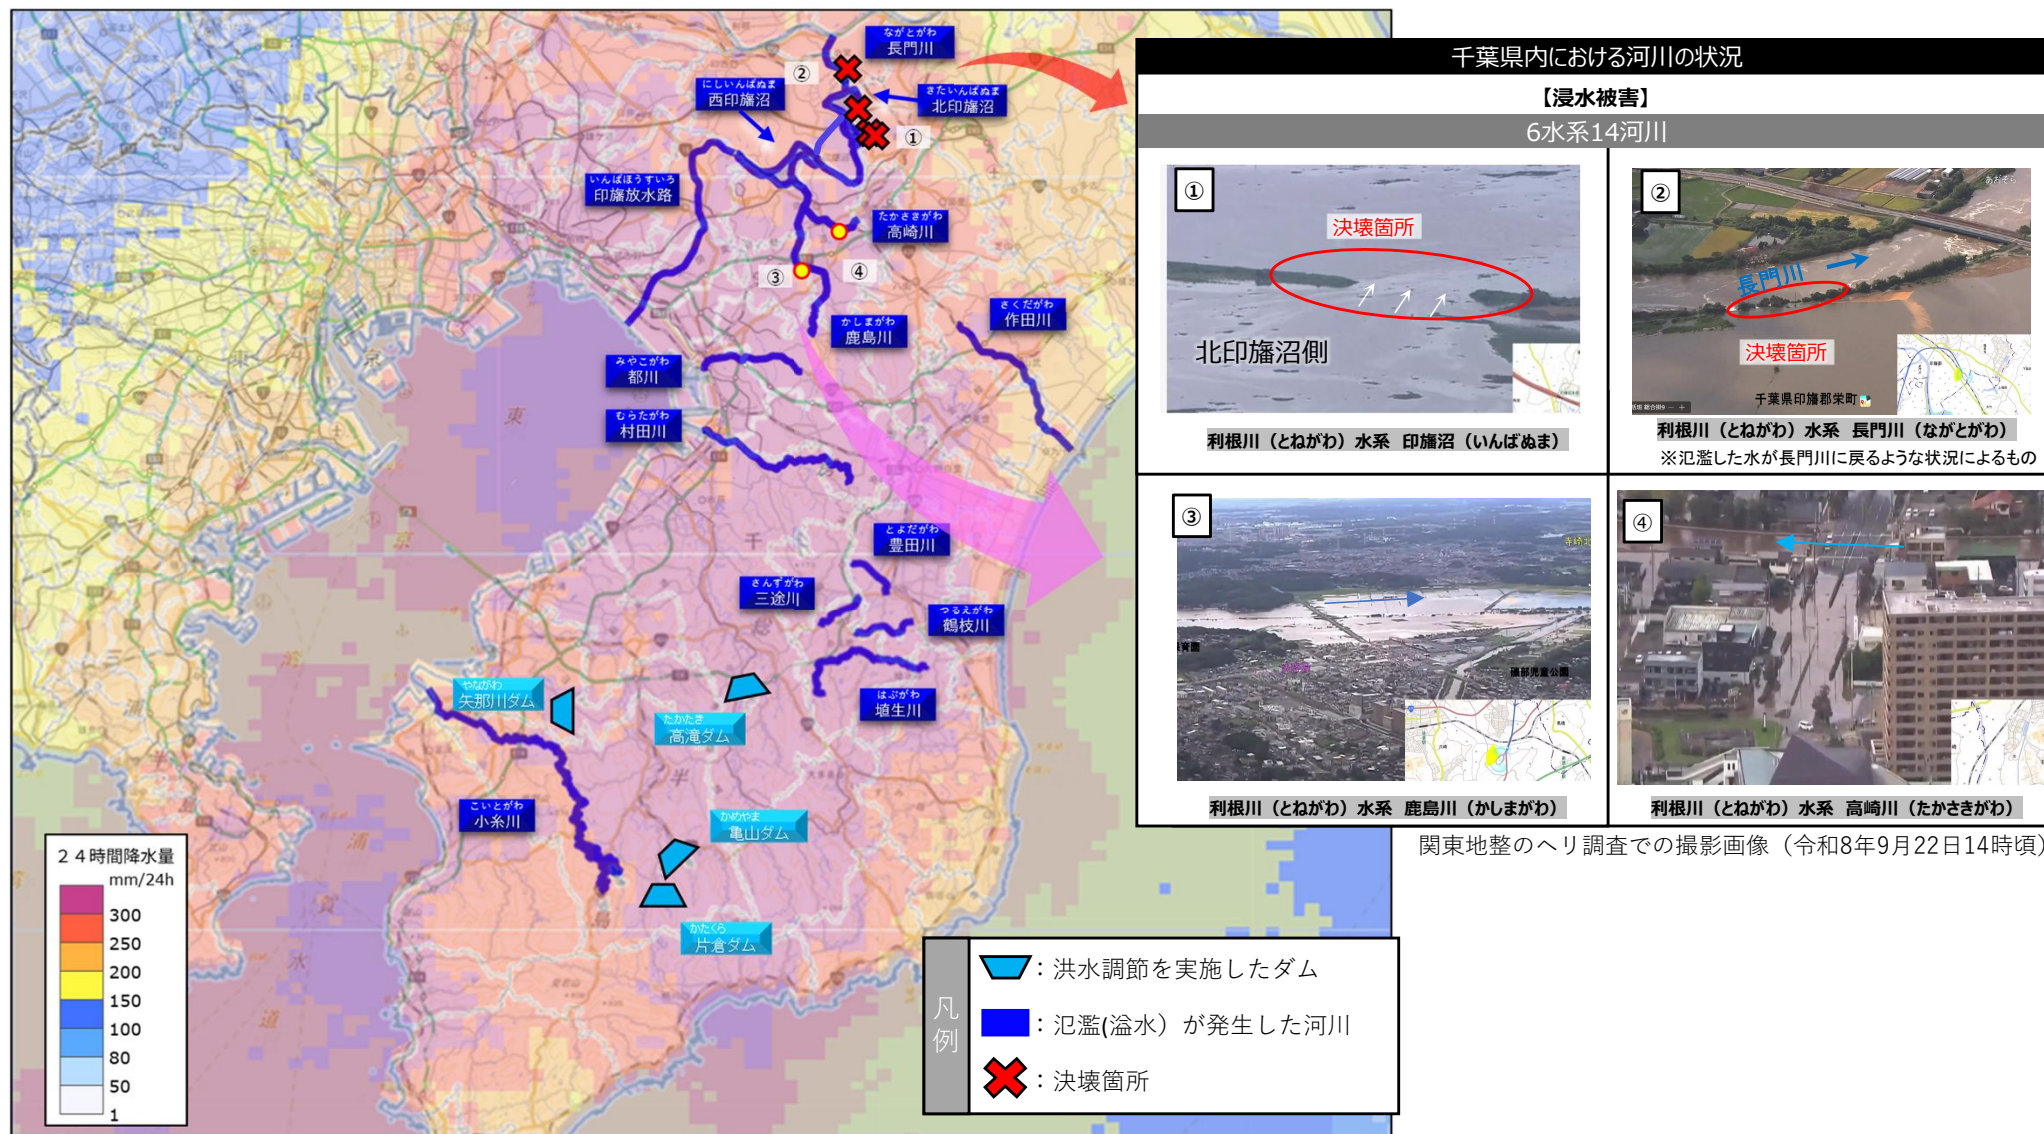


印旛沼、鹿島川・高崎川の浸水被害（R8. 9台風25号出水）

- 北印旛沼・北印旛沼（角川集水路）・長門川※¹にて3地点4箇所の堤防決壊が発生。
（※¹：長門川の箇所は氾濫した水が長門川に戻るような状況によるもの）
- 北印旛沼4.83m、西印旛沼5.04m※²、高崎川鍋木観測所6.25mの水位を観測。
（※²：観測史上最高水位）

凡例
■：あおぞら号での撮影画像（令和8年9月22日14時頃）を基に浸水範囲を国土地理院にて作成＜速報版＞
■：あおぞら号での撮影画像（令和8年10月1日16時頃）を基に浸水範囲を国土地理院にて作成＜速報版＞
 ※撮影範囲以外の浸水区域は図化できない場合がある。

印旛排水機場（水機構）
 ＜利根川に排水（計画92m³/s）＞



大和田排水機場（水機構）
 ＜花見川に排水（計画120m³/s）＞



【令和8年台風25号】水道施設の被害状況等について

- 千葉県内7市3町、茨城県内1市で水道管の破損及び停電によるポンプ停止により断水が発生。6市3町では復旧済み。
- 断水中の2市では応急給水を実施中。

ちばし
千葉県千葉市（断水期間：9/21～22）
水道管の破損（復旧済）
断水戸数：0戸（最大断水戸数 5戸）

ながらまち
千葉県長柄町（断水期間：9/21～22）
水道管の破損（復旧済）
断水戸数：0戸（最大断水戸数 20戸）

いちはらし
千葉縣市原市（断水期間：9/22～）
停電によるポンプ停止
断水戸数：301戸（最大断水戸数 982戸）

きみつし
千葉県君津市（断水期間：9/21～9/27）
水道管の破損及び停電によるポンプ停止（復旧済）
断水戸数：0戸（最大断水戸数 2010戸）

かもがわし
千葉県鴨川市（断水期間：9/22～）
水道管の破損及び停電によるポンプ停止（停電によるポンプ停止は復旧済）
断水戸数：80戸（最大断水戸数 450戸）

きよなんまち
千葉県鋸南町（断水期間：9/22～9/26）
停電によるポンプ停止（復旧済）
断水戸数：0戸（最大断水戸数 110戸）

かみすし
茨城県神栖市（断水期間：9/21）
停電によるポンプ停止（復旧済）
断水戸数：0戸（最大断水戸数 4,700戸）


おおあみしらさとし
千葉県大網白里市（断水期間：9/22）
水道管の破損（復旧済）
断水戸数：0戸（最大断水戸数 3戸）

もばらし
千葉県茂原市（断水期間：9/22）
水道管の破損（復旧済）
断水戸数：0戸（最大断水戸数 26戸）

おおたきまち
千葉県大多喜町（断水期間：9/21～9/25）
停電によるポンプ停止（復旧済）
断水戸数：0戸（最大断水戸数 104戸）

みなみぼうそうし
千葉県南房総市（断水期間：9/21～24）
水道管の破損及び停電によるポンプ停止（復旧済）
断水戸数：0戸（最大断水戸数 660戸）

< 凡例 >
断水中
断水解消済
応急給水実施中

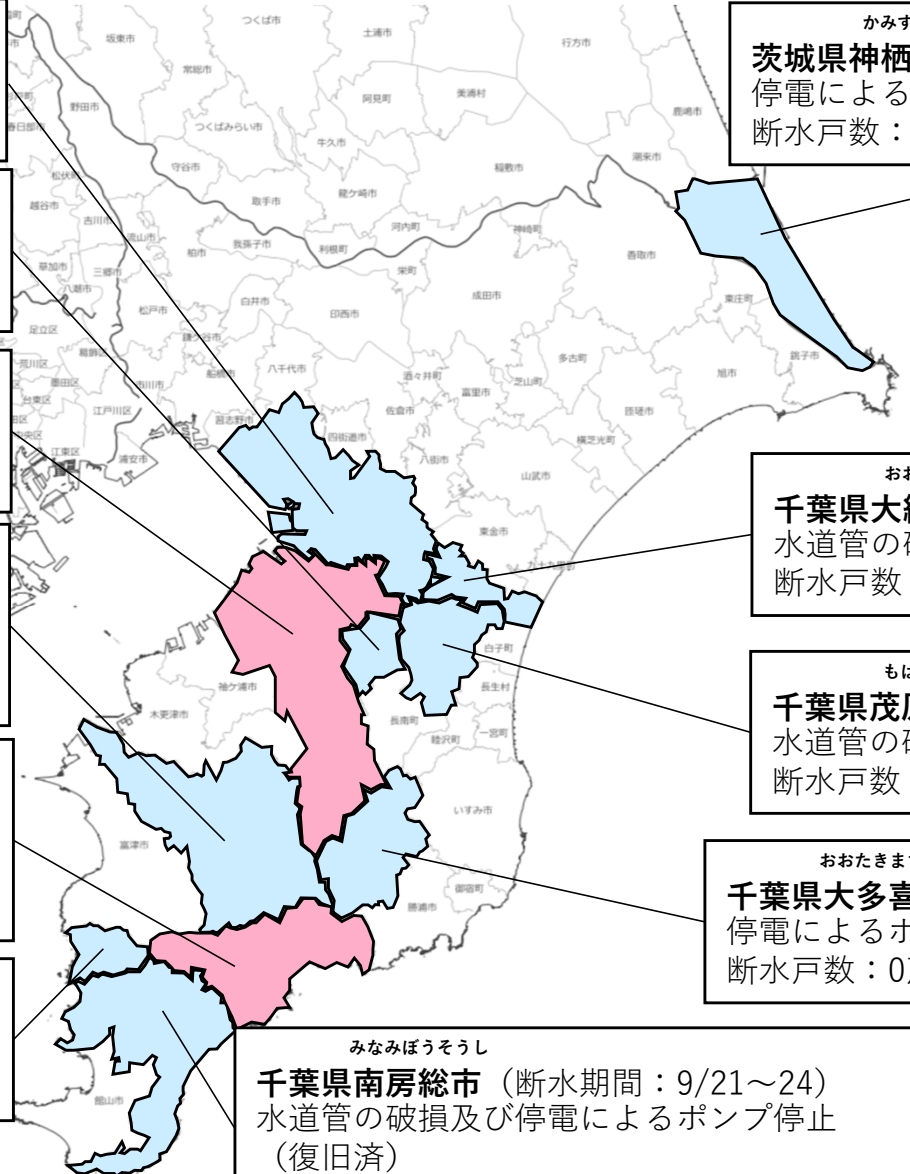

＜被災等概要＞

- 高 速 道 路:被災通行止め なし、雨量基準超過等通行止め なし
- 有 料 道 路:被災通行止め なし、雨量基準超過等通行止め なし
- 直 轄 国 道:被災通行止め 1 路線 1 区間、雨量基準超過等通行止め なし
- 補 助 国 道:被災通行止め 1 県 5 区間
- 都道府県道等:被災通行止め 5 県 5 6 区間

(路面冠水 2、倒木 4、道路損壊 4、法面崩落 39、土砂流入 3、路面陥没 3、落石 1)

・道路の土砂流入等による被災状況等

	9/21_07:00	9/22_06:00	9/22_17:00	9/23_06:00	10/1_06:00	10/2_05:00
高速道路	-	4路線17区間	3路線13区間	-	-	-
直轄国道	-	2路線2区間	1路線2区間	1路線2区間	1路線1区間	1路線1区間
補助国道	-	3県5区間	1県16区間	1県16区間	1県6区間	1県5区間
都道府県道等	2県11区間	4県37区間	4県37区間	4県90区間	6県60区間	5県56区間

○主な幹線道路（高速、有料、直轄）の被災通行止め1路線1区間、雨量超過等通行止め なし

○ライフライン（電力・通信・上下水道・鉄道）について、9月18日から連絡調整を実施

○9月24日に設置した、電力事業者、千葉県等で構成する「電力・通信の復旧に向けた関東地区連絡調整会議」において早期復旧に向けた取組を推進。千葉県等からの支援要請を受け、国による道路啓開を実施中

○停電による断水の早期復旧に向け、千葉県からの支援要請を受け、実施した国による道路啓開については10月1日に完了

○9月25日に設置した、鉄道事業者、千葉県等で構成する「JR内房線及び並走する県道287号線の災害復旧に係る事業間連携に関する地方連絡調整会議」において、早期復旧に向けた取組を推進

○9月23日に設置した、国、県をはじめ関係機関で構成する「台風第25号に伴う千葉県交通マネジメント検討会」において、通行止め区間の迂回路等の案内や交通状況に関する情報発信の取組を推進



台風25号による関東地方の被害状況等について

発生位置図



JR東日本 内房線 : 土砂等流入等	
1. 被害場所	姉ヶ崎～長浦間
2. 運休区間	姉ヶ崎～木更津間
3. 復旧見込	復旧まで少なくとも3ヶ月程度かかる見込み
4. 代行輸送	バスによる代行輸送実施に向けて調整中
5. 備考	長浦駅に必要な設備(分岐器等)を仮設することで、長浦～木更津間の運転再開を検討中

JR東日本 久留里線 : 盛土崩壊等	
1. 被害場所	平山～上総亀山間
2. 運休区間	久留里～上総亀山間
3. 復旧見込	久留里～上総亀山間 : 運転再開の見込みは立っていない
4. 代行輸送	バス・タクシーによる代行輸送実施

JR東日本 総武線 : 路盤流出等	
1. 被害場所	八街～日向間
2. 運休区間	八街～成東間
3. 復旧見込	復旧まで1ヶ月程度かかる見込み
4. 代行輸送	バスによる代行輸送実施

JR東日本 成田線 : 道床流出等	
1. 被害場所	香取～水郷間、下総橋～下総豊里間
2. 運休区間	佐原～銚子間
3. 復旧見込	10月4日(日)始発からの運転再開見込み
4. 代行輸送	バスによる代行輸送実施

小湊鉄道 : 路盤流出等	
1. 被害場所	上総牛久～上総中野間
2. 運休区間	上総牛久～上総中野間
3. 復旧見込	運転再開の見込みは立っていない
4. 代行輸送	未定

①内房線・姉ヶ崎～長浦間 土砂等流入



①内房線・姉ヶ崎～長浦間 土砂等流入



②久留里線・上総松丘～上総亀山間 盛土崩壊



③総武線・八街～日向間 路盤流出

