
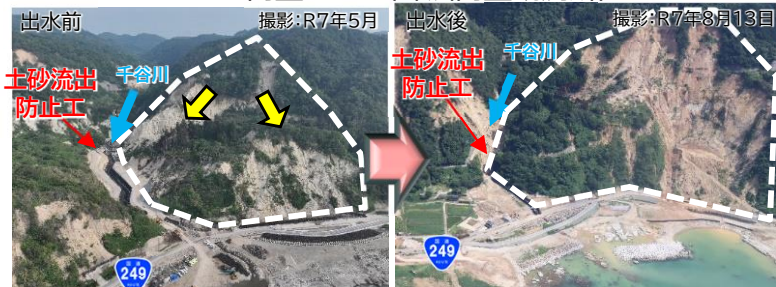


<地すべり対策:清水地区>

事業箇所：石川県珠洲市清水町 清水地区（地すべり）
 発 生 日：令和7年8月6日、10日
 降雨状況：連続雨量 182.5mm 時間最大雨量 24.5mm（8月5日0:00～8月9日0:00）※珠洲雨量観測所（気象庁）
 連続雨量 370.0mm 時間最大雨量 41.5mm（8月10日0:00～8月13日0:00）※珠洲雨量観測所（気象庁）
 施設概要：土砂流出防止工、仮設護岸工、横ボーリング工（令和7年5月完成）
 効 果：令和6年能登半島地震で発生した地すべり及び奥能登豪雨で発生した土砂流出に対し、出水期までに土砂流出防止工、仮設護岸工等を整備。8月6日の出水では土砂流出防止工により約800m³の土砂を捕捉し、その後の迅速な除石により8月10日の出水でも再度土砂を捕捉。河岸侵食に伴う地すべりの拡大防止及びR249への土砂流出防止に寄与。

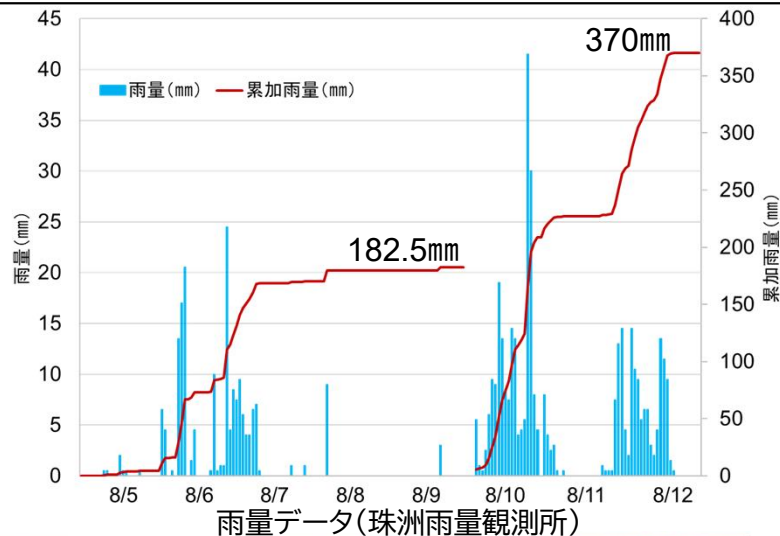

地すべりブロック全景: 変状無し

土砂流出防止工による土砂捕捉の状況

応急対策が効果を発揮し国道249号等への被害を防止

<地すべり対策:仁江地区>

事業箇所：石川県珠洲市仁江町 仁江地区（地すべり）



発 生 日：令和7年8月6日、10日

降雨状況：連続雨量 182.5mm 時間最大雨量 24.5mm(8月5日0:00～8月9日0:00)※珠洲雨量観測所（気象庁）

連続雨量 370.0mm 時間最大雨量 41.5mm(8月10日0:00～8月13日0:00)※珠洲雨量観測所（気象庁）

施設概要：土砂流出防止工、仮設護岸工（令和7年5月完成）

効 果：令和6年能登半島地震で発生した地すべり及び奥能登豪雨で発生した土砂流出に対し、出水期までに土砂流出防止工等を整備。8月6日の出水では土砂流出防止工により約500m³の土砂を捕捉し、その後の迅速な除石により8月10日の出水でも再度土砂を捕捉。R249への土砂流出防止に寄与。

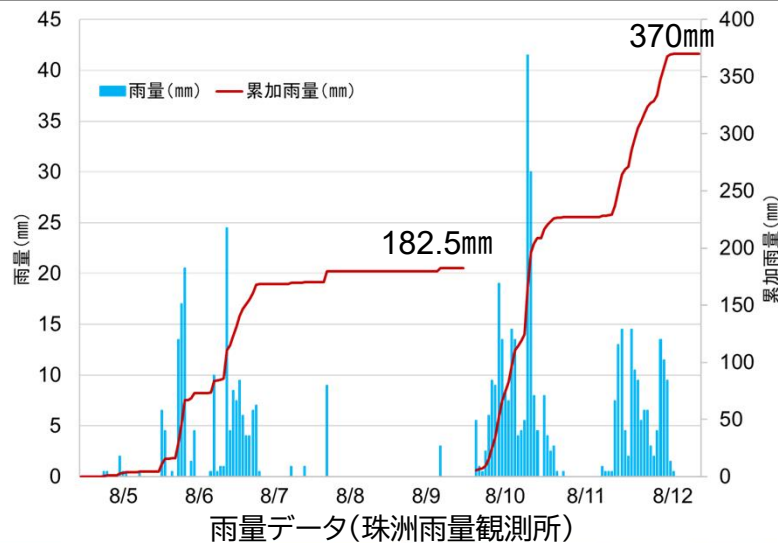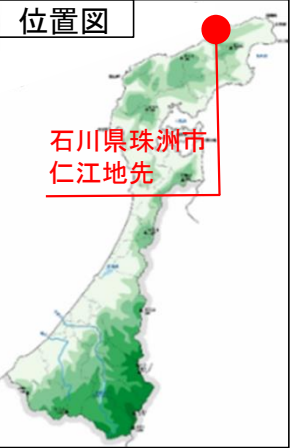

地すべりブロック全景: 変状無し





土砂流出防止工による土砂捕捉の状況

応急対策が効果を発揮し国道249号等への被害を防止

<地すべり対策:曾々木地区>

事業箇所：石川県輪島市町野町曾々木 曾々木地区（地すべり）
事 象：令和7年8月6日からの大雨
降雨状況：連続雨量 304.5mm 時間最大雨量 31.5mm（8月10日0:00～8月13日0:00）※輪島雨量観測所（気象庁）
対策概要：土砂撤去（令和7年5月完成）
効 果：令和6年能登半島地震で発生した地すべり及び奥能登豪雨で発生した土砂流出に対し、応急対策として土砂撤去を実施、R249への土砂流出防止に寄与。

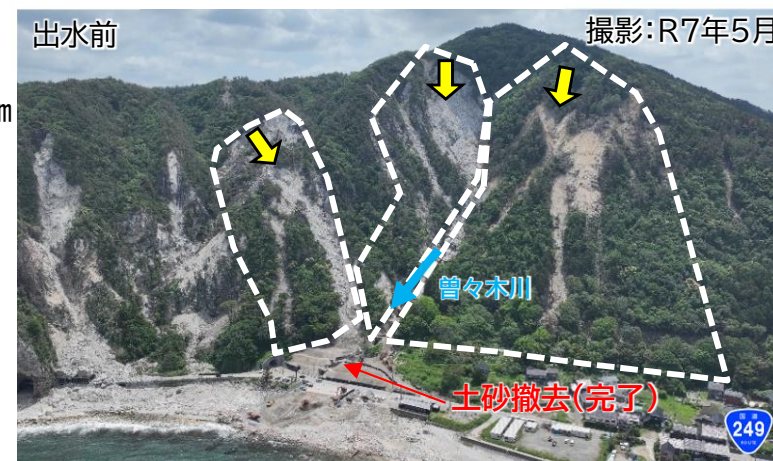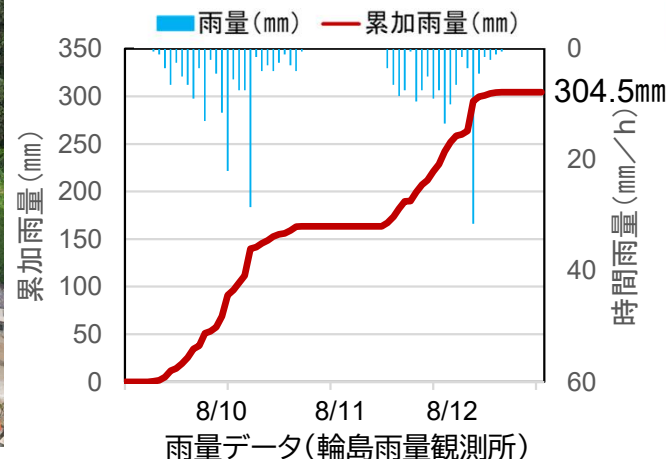

R249への土砂流出無し

＜地すべり対策：渋田地区＞

わじまし しぶたまち しぶた

事業箇所：石川県輪島市渋田町 渋田地区（地すべり）



事 象：令和7年8月6日から大雨

降雨状況：連続雨量 304.5mm 時間最大雨量 31.5mm（8月10日0:00～8月13日0:00）※輪島雨量観測所（気象庁）

施設概要：仮設護岸工（令和7年3月完成）



効 果：令和6年能登半島地震で発生した地すべり及び奥能登豪雨で発生した土砂流出・河岸侵食に対し、出水期までに応急的な対策として地すべり末端部を保護する仮設護岸工等の整備を実施。特に8月10日からは輪島雨量観測所で304.5mmの総降雨量を観測したが、応急対策施設の効果により、河岸侵食に伴う地すべりの拡大を防止。

位置図

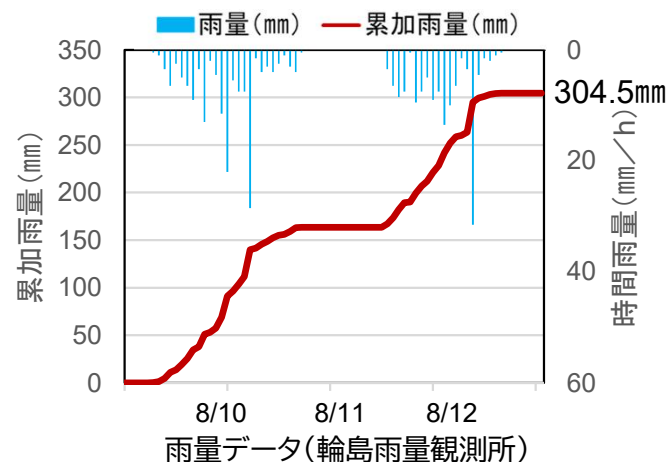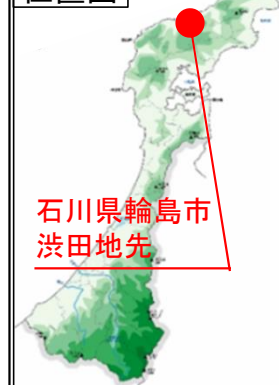


応急対策が効果を発揮し国道249号等への被害を防止 ＜地すべり対策：深見地区＞

事業箇所：石川県輪島市深見町 深見地区（地すべり）
事 象：令和7年8月6日からの大雨
降雨状況：連続雨量 304.5mm 時間最大雨量 31.5mm（8月10日0:00～8月13日0:00）※輪島雨量観測所（気象庁）
施設概要：仮設護岸工等（令和7年5月完成）
効 果：令和6年能登半島地震で発生した地すべり及び奥能登豪雨で発生した土砂流出・河岸侵食に対し、出水期までに応急的な対策として地すべり末端部を保護する仮設護岸工等の整備を実施。特に8月10日からは輪島雨量観測所で304.5mmの総降雨量を観測したが、応急対策施設の効果により、河岸侵食に伴う地すべりの拡大を防止。

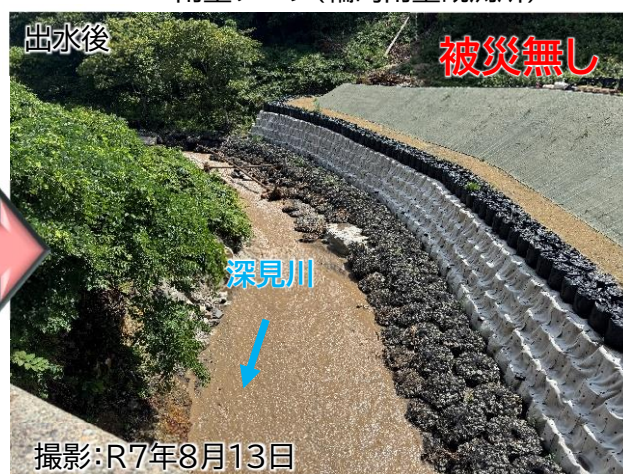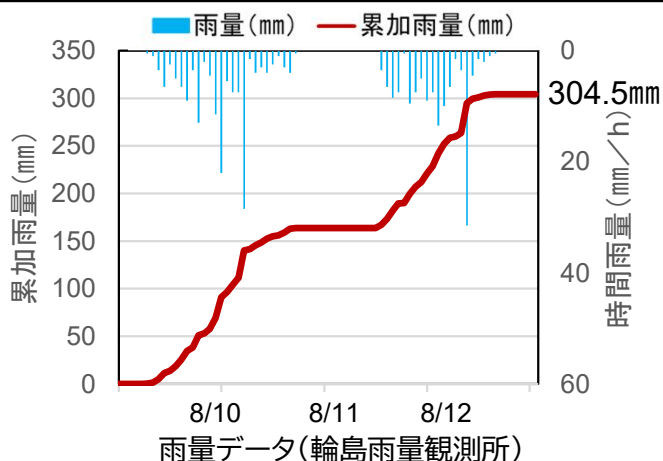


応急対策が効果を発揮し国道249号等への被害を防止 ＜地すべり対策：名舟地区＞

事業箇所：石川県輪島市名舟町 名舟地区（地すべり）
事 象：令和7年8月6日からの大雨
降雨状況：連続雨量 304.5mm 時間最大雨量 31.5mm（8月10日0:00～8月13日0:00）※輪島雨量観測所（気象庁）
施設概要：大型土のう工等（令和7年5月完成）
効 果：令和6年能登半島地震で発生した地すべり及び奥能登豪雨で発生した土砂流出に対し、出水期までに応急的な対策として大型土のう工、土砂流出防止工等を実施。特に8月10日からは輪島雨量観測所で304.5mmの総降雨量を観測したが、応急対策施設の効果により、R249への土砂流出防止に寄与。

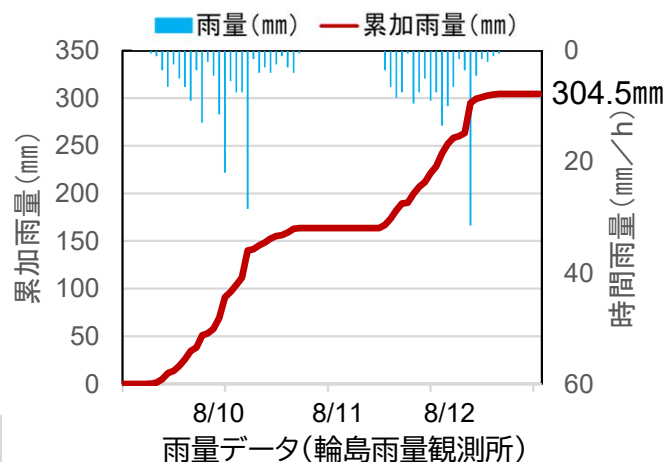

応急対策が効果を発揮し国道249号等への被害を防止 ＜地すべり対策：大野地区＞

事業箇所：石川県輪島市大野町 大野地区（地すべり）
事 象：令和7年8月6日からの大雨
降雨状況：連続雨量 304.5mm 時間最大雨量 31.5mm（8月10日0:00～8月13日0:00）※輪島雨量観測所（気象庁）
施設概要：仮設防護柵工等（令和6年11月完成）
効 果：令和6年能登半島地震で発生した地すべり及び奥能登豪雨で発生した土砂流出に対し、出水期までに応急的な対策として仮設防護柵工等の整備を実施。特に8月10日からは輪島雨量観測所で304.5mmの総降雨量を観測したが、応急対策施設の効果により、R249への土砂流出防止に寄与。

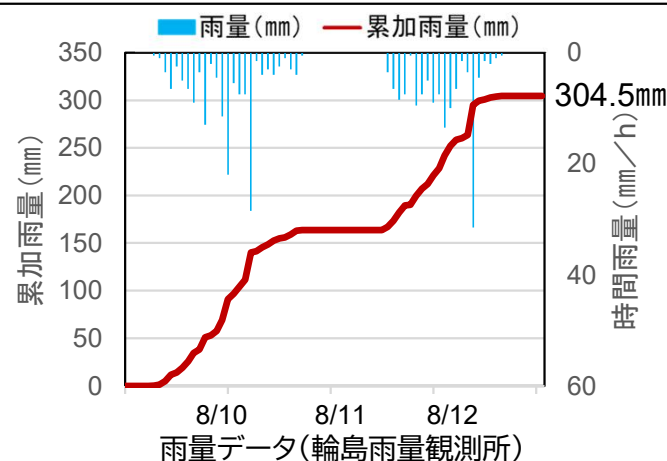

仮設防護柵工の整備状況

