


■ 東山地域案内板整備計画表

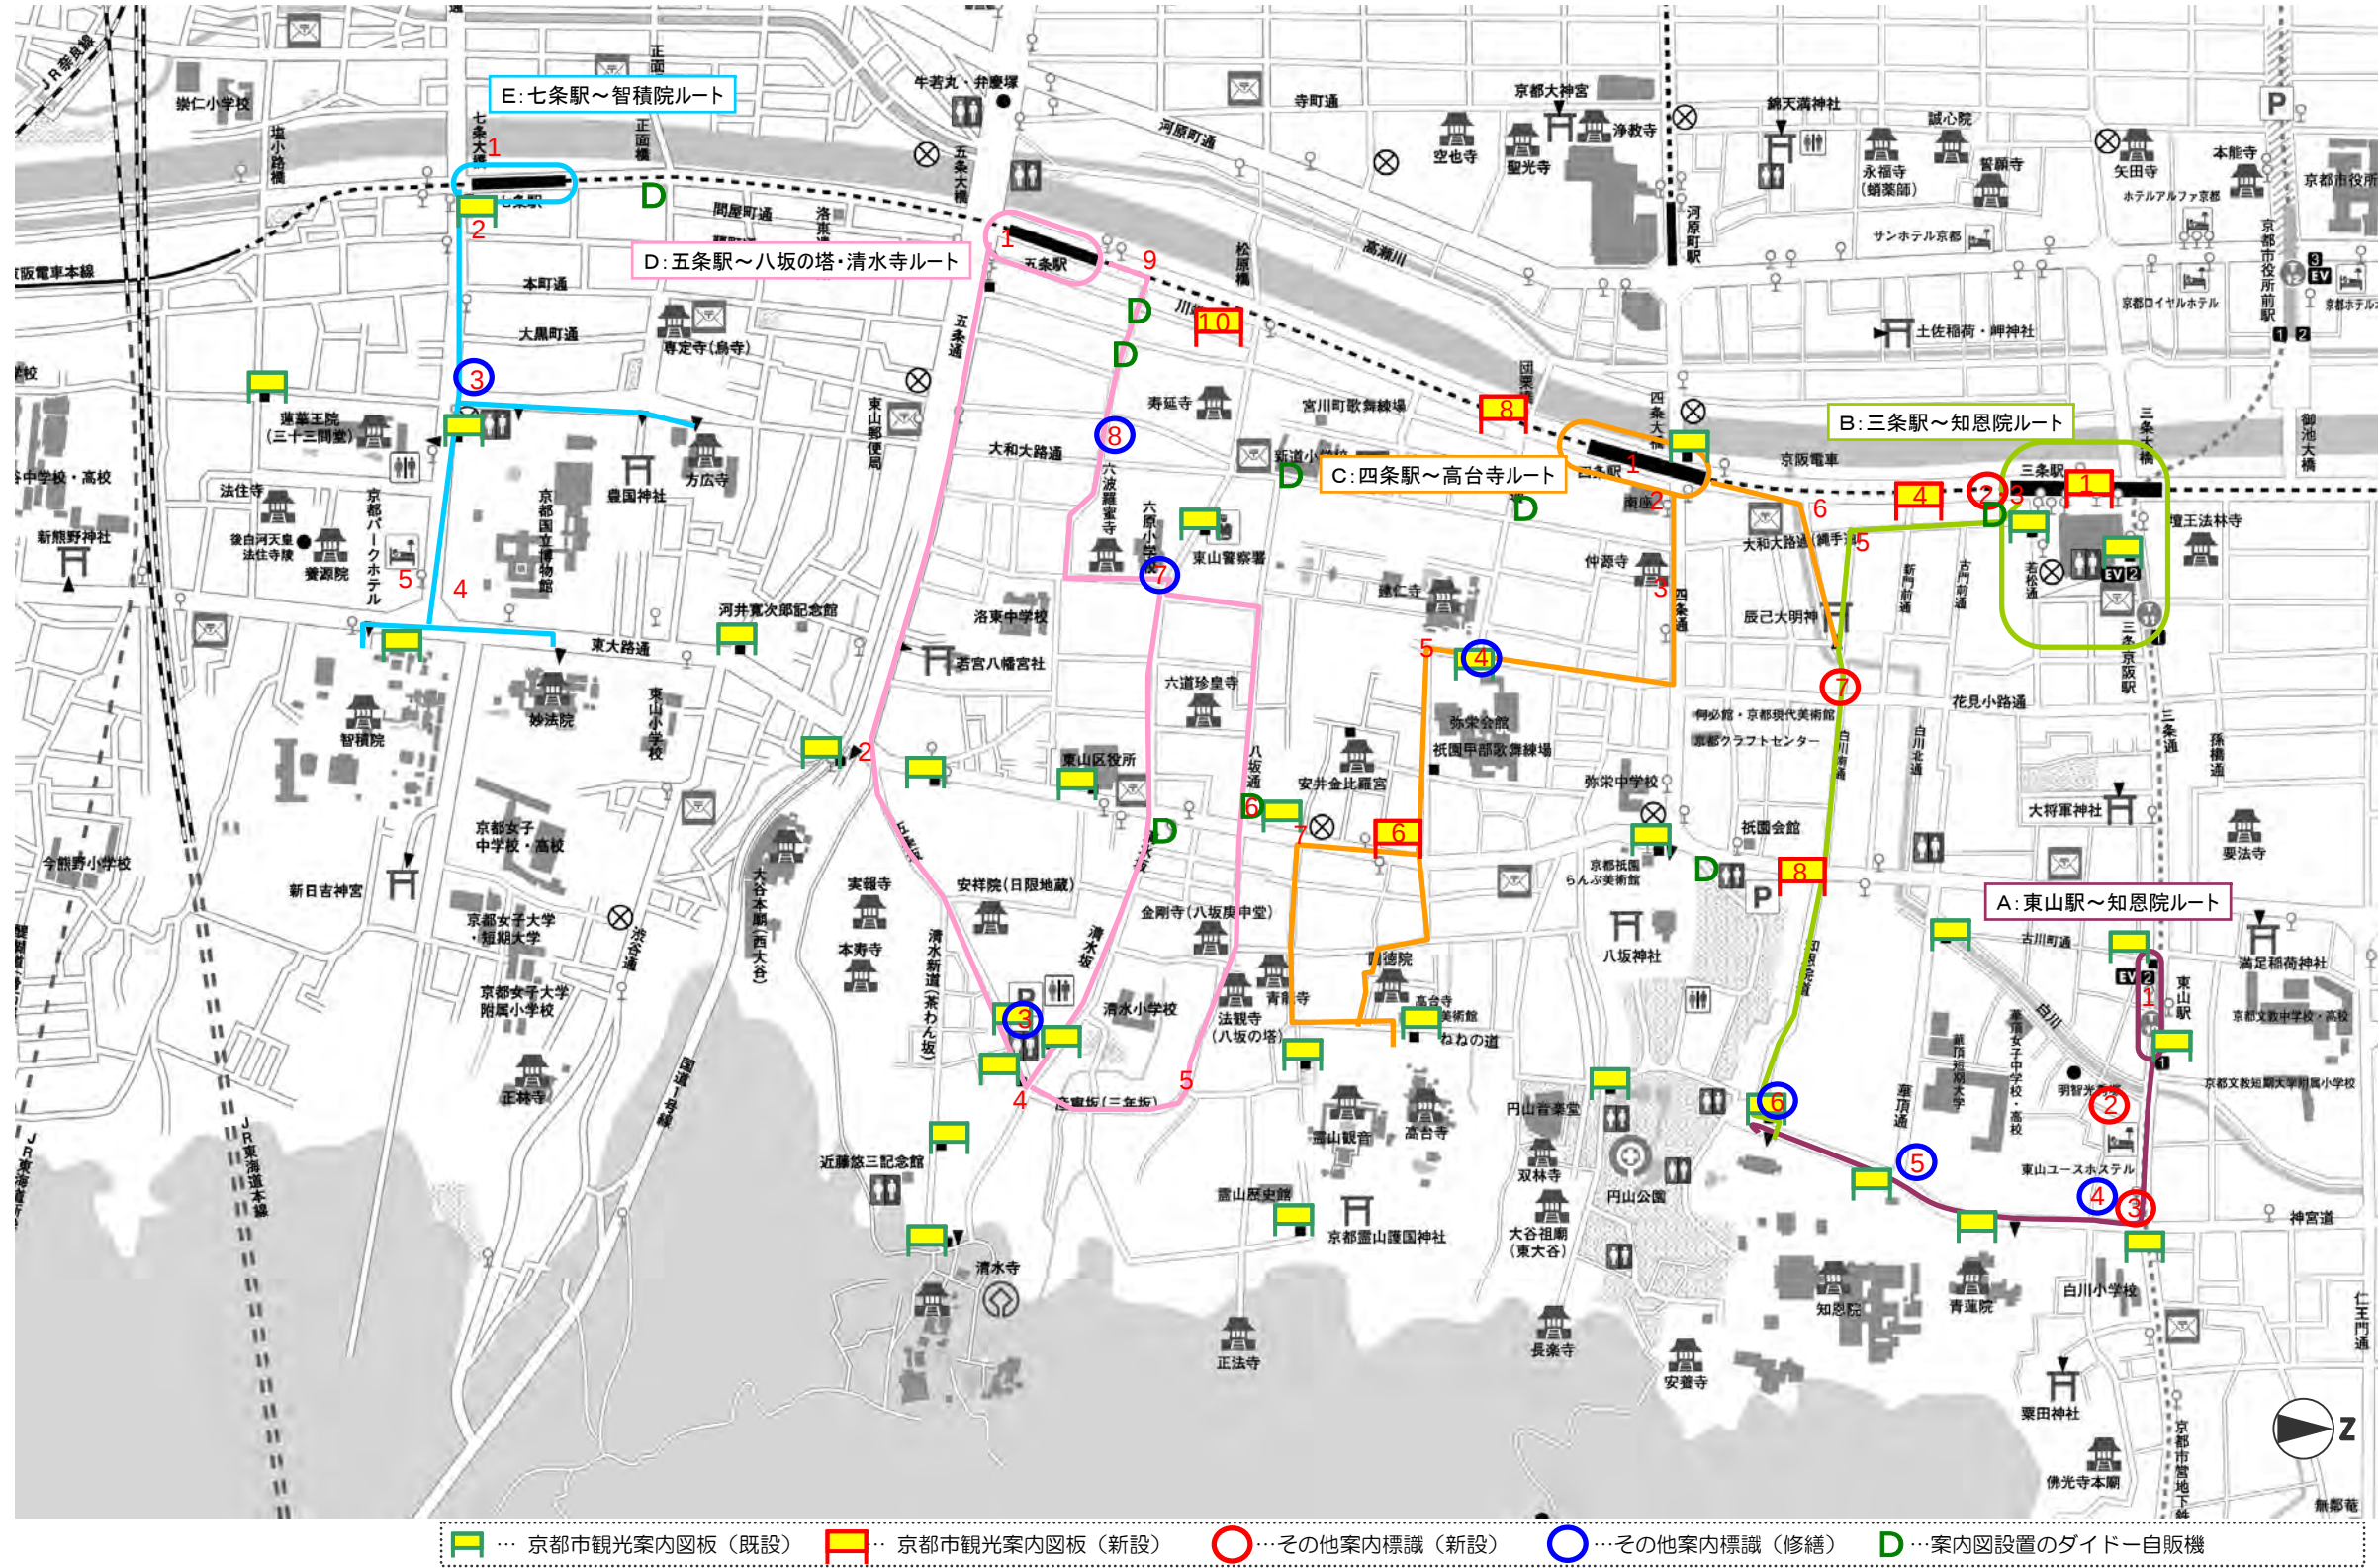

A：東山駅～知恩院ルート

地 点		現 状		整 備 内 容	優先度 A＞E	主体					整備状況	
						市	交通事業者	施設（社寺等）	地元団体	個人		
1	地下鉄東山駅構内		・ 出口は東北と西南の2箇所。三条通の南側か北側かで誘導している。 ・ 平安神宮など主要観光地が手製の印刷にて追記されている。	充実	手書き表示等の再整理	D		○				平成19年度以降に交通局による整備を検討。
2	東山YH		・ YHの側壁に京都市広報板が設置されている。 →YHの壁面や市広報板を案内表示設置場所として活用できないか。	新	案内標識（小） 壁面への設置  (イメージ は)	B	○		○			東山ユースホステルが壁面を提供し、市が案内標識を設置する。 （現在整備中・3月末完了予定）
3	三条神宮道交差点		・ 交差点周辺に主な拠点への方向案内等がなく、わかりにくい。 →電柱の側面などに簡易な方向案内表示などができないか。	新	案内標識（小） 電柱の側面などへの設置  (イメージ と)	B	○					市の電灯の側面に、市の案内標識を設置。 （現在整備中・3月末完了予定）


A：東山駅～知恩院ルート

地 点		現 状		整 備 内 容	優先度 A＞E	主体					整備状況
						市	交通事業者	施設（社寺等）	地元団体	個人	
4	三条神宮道下ル		・主要拠点の方向案内表示（日・英・ハングルの3カ国語）あり。 								

B：三条駅～知恩院ルート

地 点	現 状	整 備 内 容	優先度 A＞E	主体					整備状況		
				市	交通事業者	施設（社寺等）	地元団体	個人			
1 川端三条 南東ひろば		高山彦九郎像などもある駅南口周辺の広場に、観光案内図等は設置されていない。	新	観光案内図板 設置		A	○				歩道上に市の観光案内図板を設置。（現在整備中・3月末完了予定）
2 三条駅南口 （若松通）		京阪三条駅の南口（2番出口）から地上に出たところに方向などを示すものがない。	新	案内標識 設置		A	○				駅の壁面に設置できる場所がないため、歩道上に市の案内標識を設置。（現在整備中・3月末完了予定）
3 三条駅南口 （若松通）		京阪南ビルの側面に、方向案内表示があるが、壁面の色と近く、見づらい。また、手前に看板があり一部が隠れている。 →ビル壁面の案内表示を改善できないか。	修繕	文字盤 ビル壁面の表示の改善		C	○				京阪電鉄により検討中。

地 点	現 状	整 備 内 容	優先度 A＞E	主体					整備状況	
				市	交通事業者	施設（社寺等）	地元団体	個人		
4 新門前通交差 南西 （せせらぎの道ひろば）		・縄手通と新門前通の交差点南西にポケットパークあり。 →案内図の設置場所として活用できないか。	新	観光案内図板 設置  (イメージ い)	A	○				市のせせらぎの道ひろばに市の観光案内図板を設置。 （現在整備中・3月末完了予定）
5 新橋通入口		・新橋通は石畳舗装されており、観光客は自然と足が向くと考えられる。	新	案内標識 設置  (イメージ ほ)	C	○				来年度以降，引き続き検討。
6 白川南通大和大路通交差点		・白川南通からの突き当たりが緑地となっており、街灯などが利用出来る。	新	案内標識（小） 電灯に設置  (イメージ と)	C	○				来年度以降，引き続き検討。

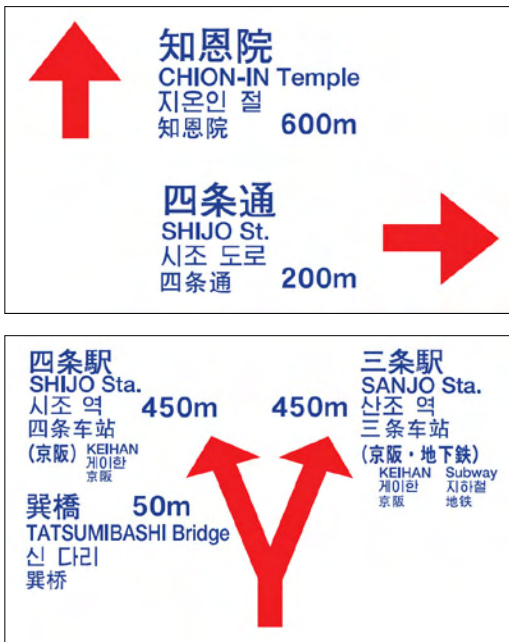地 点	現 状	整 備 内 容	優先度 A＞E	主体					整備状況	
				市	交通事業者	施設（社寺等）	地元団体	個人		
7 新橋通花見小路		・花見小路との交差に出ると、案内表示が全くなく、細い東側の道路に入ることが躊躇される。 →新橋通の西側のいずれかに、知恩院方面を示す表示が設置できないか。	新	案内標識 設置	B	○				道路上に市の案内標識を設置。 （現在整備中・3月末完了予定）
										
8 東大路 （知恩院新門前）	 	・新橋通から東大路に出ると知恩院新門が見えるため、特に表示は必要ない。 ・しかし、知恩院から駅に向かう場合は、新橋通の入口が狭く、わかりにくい。 →新門周辺に駅へのルートを示す案内表示が設置できないか。	新	案内標識 設置	A	○				知恩院が土地を提供し、市が観光案内図板を設置する。 （現在整備中・3月末完了予定）
										

C：四条駅～高台寺ルート

地 点		現 状	整 備 内 容	優先度 A＞E	主体					整備状況	
					市	交通事業者	施設（社寺等）	地元団体	個人		
1	四条駅構内	  ・構内にいくつかある案内図には、他社線の表示がない、通り名が構内の出口看板と統一されていないなど、表記の見直しが必要と思われるものもある。 →壁面のスペースなどに、主要観光拠点への経路表記などを設置できないか。	充実	既設案内図の修正 （主要観光地への経路明示）	B		○				平成１９年度以降に京阪電鉄による整備を予定。
2	四条駅南座側出口	 ・階段を上がって地上にでた地点に案内が全くなく、方向がわからなくなることも考えられる。	新	観光案内図板 設置  (イメージ い)	D	○					平成１９年度以降，引き続き検討。

地 点	現 状	整 備 内 容	優先度 A＞E	主体					整備状況		
				市	交通事業者	施設（社寺等）	地元団体	個人			
3 祇園通り	 	・四条通の両側の各所に、地元商店街設置の案内図あり。 ・地図の表記が薄くなっているものもあり、見落とされることも多いと思われる。 →図面のみを作成し直すなどにより、見やすいものに変更できないか。	修繕	商店街設置の案内図板の修正 （地図の差し替え）	C	○			○	平成19年度以降，商店街と調整予定。	
 （イメージ い）											
4 ギオンコーナー前		・市設置の観光案内図あり。 →駅や徒歩圏内の主要観光拠点への経路を明記できないか。	修繕	観光案内図板 駅等への案内追記	A	○				市の観光案内図板のデータを更新。駅への案内を追記する。 （現在整備中・3月末完了予定）	
 （イメージ い）											



(イメージ い)



(イメージ い)

地 点		現 状		整 備 内 容		優先度 A＞E	主体					整備状況
							市	交通事業者	施設（社寺等）	地元団体	個人	
5	建仁寺前		・安井北門通への曲がり角だが、建仁寺駐車場を示す矢印以外には方向を示す表記がない。 →曲がり角の側面などに、四条駅や高台寺への方向案内が表示できないか。	新	案内標識 設置  (イメージ ほか)	D	○					平成19年度以降、引き続き検討。
6	東山安井交差点		・周辺に観光案内図、方向板などは設置されていない。 →植え込みなどに、観光案内図の設置ができないか。	新	観光案内図板 植栽へ設置 	A	○					歩道の緑地帯に市の観光案内図板を設置。 (現在整備中・3月末完了予定)

地 点		現 状		整 備 内 容		優先度 A＞E	主体					整備状況
							市	交通事業者	施設（社寺等）	地元団体	個人	
7	東山高台寺山門		・山門の柱に高台寺自体の看板は多いが、周辺に駅への誘導を図る表示はない。	新	案内標識 設置  (イメージ ほ)	A	○					平成19年度以降, 引き続き検討。
8	団栗公園			新	観光案内板 設置  (イメージ い)	B	○					公園に市の観光案内図板を設置。 (現在整備中・3月末完了予定)

D：五条駅～八坂の塔・清水寺ルート

地 点	現 状	整 備 内 容	優先度 A＞E	主体					整備状況
				市	交通事業者	施設（社寺等）	地元団体	個人	
1 五条通北側出口	 ・地上へ出た地点の周辺に案内がなく、東西がわからなくなることも考えられる。 →出口の柱などのスペースに、清水寺の方向を示す表示を設置できないか。	新 案内標識（小） 出口の柱に設置	A	○	○				京阪電鉄により案内標識を設置。（3月末完了予定） ※平成18年度は五条駅出入口について整備を行い、平成19年度以降に順次他の駅を整備する予定。
2 五条坂東大路交差点	 ・大谷本廟側の植え込みに「京阪五条」の案内看板があるが、汚れていることもあり、見にくい。	修繕 案内標識 修繕・駅への案内追記	C	○					平成19年度以降，設置者を特定し，整備方法を協議する。

地 点	現 状		整備内容	優先度 A＞E	主体					整備状況
					市	交通事業者	施設（社寺等）	地元団体	個人	
3 五条坂清水坂分岐		市の観光案内図の横に方向のみ示す案内板が設置されているが、横の案内図と向きが異なるため、混乱しやすい。 →いずれかに統一できないか。	修繕 隣接する観光案内図を修正	A	○					現状の写真の隣に設置している市の観光案内図板のデータを修正。向きを合わせ、京都駅等への案内を追加する。 （現在整備中・3月末完了予定）
4 産寧坂分岐		産寧坂への分岐がわかりにくく、迷う観光客が多いため、簡単な方向案内が電柱に設置されている。	新 案内標識（小） 電柱に設置 既設の民間のものを交換	E	○				○	平成19年度以降、引き続き設置方法や景観にあったデザインを検討。



（イメージ と）

地 点		現 状		整 備 内 容		優先度 A＞E	主体					整備状況
							市	交通事業者	施設（社寺等）	地元団体	個人	
5	二年坂分岐		・「清水寺」及び「円山公園」への方向案内板が設置されているが、老朽化し字が読みづらくなっている。 →再塗装するなどが必要。	修繕	案内標識 修繕  (イメージ ほか)	A	○					平成19年度以降、引き続き設置方法や景観にあったデザインを検討。
6	東大路通八坂交通差点			新	ダイドードリンコ自動販売機へ地図の設置	A						ダイドードリンコの負担により自販機へ地図を設置，市は地図を提供する。（東山地域で計10箇所を設置） （現在整備中・3月末完了予定）
7	松原通轆轤町交差点		・「六波羅蜜寺」を示す方向看板があるが、老朽化して表記がみにくなっている。 →再塗装するなどが必要。	修繕	案内標識 修繕・距離等の追記 	A	○					市の案内標識の板面を交換。距離を追記する。 （現在整備中・3月末完了予定）

地 点	現 状	整 備 内 容	優先度 A＞E	主体					整備状況	
				市	交通事業者	施設（社寺等）	地元団体	個人		
8 柿町通（万寿寺通） 大和大路交差点		・「六波羅蜜寺」の看板あり。 →五条駅への案内も表記できないか。	修繕	案内標識 駅への案内を追記	A	○				市の案内標識の板面を交換。距離を追記する。 （現在整備中・3月末完了予定）
9 柿町通（万寿寺通） 川端突き当たり 植栽帯跡		・五条駅が近辺にあるにもかかわらず、駅への表記がない。 →五条駅への案内がどこかに設置できないか。	新	観光案内図板 設置	A	○				平成19年度以降，設置場所や設置物について引き続き検討。
10 松原公園			新	観光案内図板 設置	A	○				現在整備中・3月末完了予定



E：七条駅～智積院ルート

地 点		現 状	整備内容	優先度 A＞E	主体					整備状況		
					市	交通事業者	施設（社寺等）	地元団体	個人			
1	七条駅構内		・既成の看板に追加して、「京都国立博物館」などの出口および所要時間の案内を表示している。 ・駅周辺案内図の端に、「京都駅約1km、徒歩 15～20 分」の表示を追記している。	充実	手書き表示等の再整理	D		○				平成19年度以降，京阪電鉄による整備を予定。
2	七条通北側出口周辺		・地上に出て交差点周辺に方向を示す案内がなく、わかりにくい。	新	観光案内図板 設置  (イメージ に)	A	○	○				平成19年度以降，京阪電鉄による整備を予定。

地 点	現 状	整 備 内 容	優先度 A＞E	主体					整備状況
				市	交通事業者	施設（社寺等）	地元団体	個人	
3 三十三間堂前	 ・大和大路との交差北東に、「方広寺」の方向案内板が設置されているが、樹木に覆われて見づらくなっている。 →樹木の伐採または設置場所の変更が必要。	修繕 案内標識  (イメージ ぼ)	A	○		○			市の案内標識の板面を交換。距離を追記する。 (現在整備中・3月末完了予定)
4 東山七条交差点北西		修繕 案内標識 駅等への案内を追記  (イメージ ぼ)	B	○					平成19年度以降、整備予定。
5 東山七条交差点南西		修繕 案内標識 駅等への案内を追記  (イメージ ぼ)	B	○					平成19年度以降、整備予定。
