

II 平成27年9月関東・東北豪雨(関東地方)への派遣


○平成27年9月関東・東北豪雨により、利根川水系鬼怒川において堤防決壊や越水等が発生し、茨城県常総市では、市の面積の1/3にあたる約40km²が浸水し、約6,000棟の家屋に全壊・半壊、浸水等の甚大な被害が発生。

○鬼怒川では、降雨や河川水位の状況より甚大な被害が予測されたことから、**発災当日には北陸・中部・近畿地方整備局からTEC-FORCEの先遣隊が関東地方整備局に参集するとともに、発災前より排水ポンプ車の集結を開始し、堤防が決壊した当日には排水活動に着手。**

○さらに、中国・四国・九州地方整備局の排水ポンプ車を加えた最大51台により24時間体制で排水活動を行い、**10日間で浸水を概ね解消。**

○全国の地方整備局等からTEC-FORCEと排水ポンプ車等を派遣し、**(1)緊急排水活動、(2)被災状況調査(河川、道路、土砂災害)、(3)排水活動のための道路啓開、(4)排水路等の土砂撤去、(5)リエゾンによる茨城県及び栃木県等(2県23市町)との連絡調整を実施。**

➤TEC-FORCE：のべ2,337人・日派遣(9月9日～1月15日)

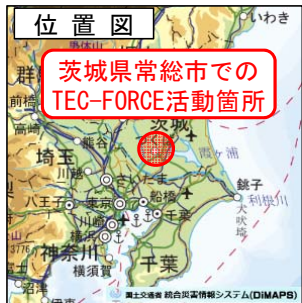

茨城県常総市の浸水状況




全国から集結した災害対策用機械



24時間体制による緊急排水活動

▼関東地方への派遣人数(のべ人数)

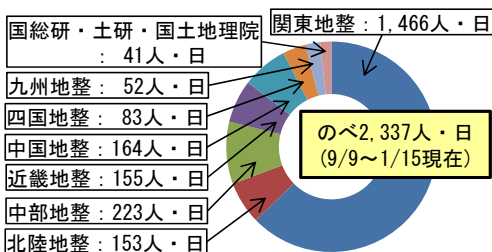

河川施設の被災状況調査



土石流箇所の被災状況調査
(栃木県日光市)



道路啓開による放置車両撤去
