

【施設効果事例】小金石地区_急傾斜地崩壊防止施設

位置図




○令和4年8月10日の大雨によりがけ崩れが発生したが、青森県による急傾斜地崩壊防止施設が整備されており崩壊土砂を捕捉。周辺人家等への被害を未然に防止した。

発生日 : 令和4年8月10日
降雨状況 : 連続雨量 333mm (8月9日1時~12日13時)
時間最大雨量 41mm (8月9日15時~16時)
発生箇所 : 青森県北津軽郡中泊町 小金石地区
捕捉量 : 約150m³

がけ崩れ発生状況

全景

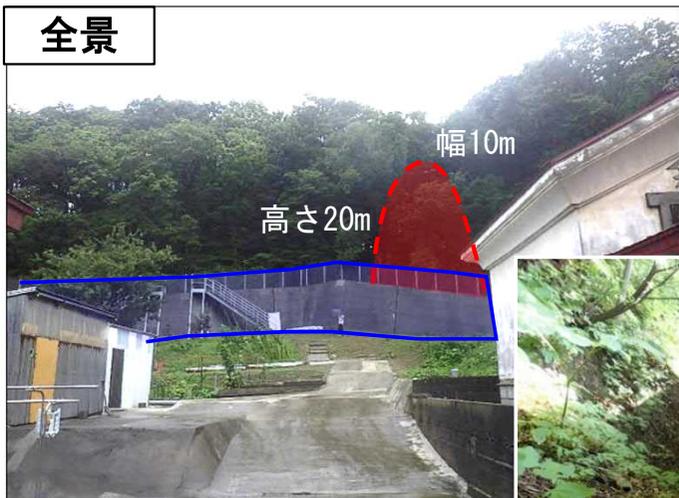

災害発生前

土砂捕捉状況



災害発生後



災害発生後

急傾斜地崩壊防止施設 (落石防護柵及び待受け擁壁)

※周辺人家 (写真奥) に被害無し
