

【施設効果事例】


祖山出谷砂防堰堤(富山県南砺市祖山)

災害発生日：令和4年7月4日
降雨状況：連続雨量 172mm (7月4日2時～4日14時)
時間最大雨量 40mm (7月4日6時～7時)
※上松尾雨量観測所
発生箇所：富山県南砺市祖山
崩壊状況：土石流捕捉量 約2,000m³
状況：台風第4号に伴う大雨により土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂及び流木を捕捉。下流の国道への被害を未然に防止し効果を発揮した。


位置図



全景

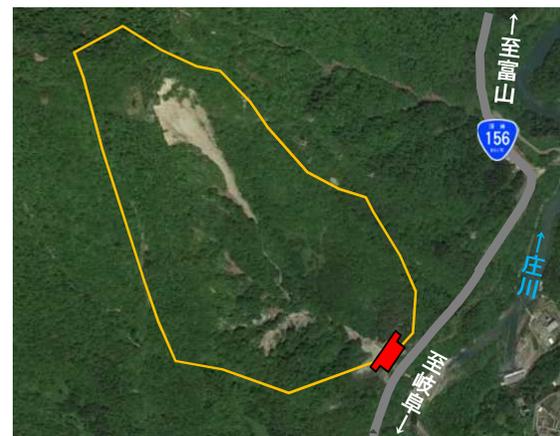

土石流発生前 (R3.12)

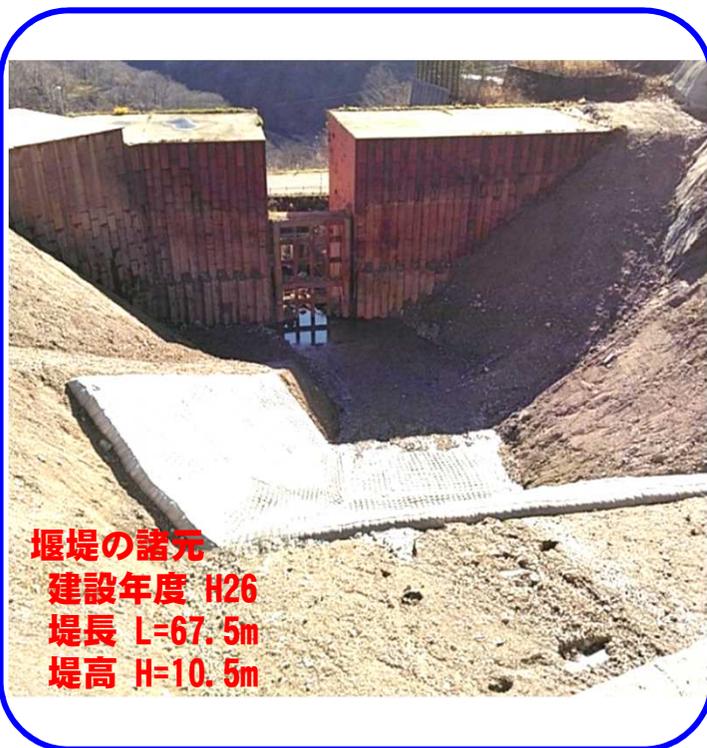

土石流発生直後 (R4.7.5)



土砂及び流木を捕捉
