


【施設効果事例】

津梅川1号砂防堰堤

にしつがるぐんふかうらまちおおまごし 国土交通省
青森県西津軽郡深浦町大間越

災害発生日：令和4年8月9日～10日
降雨状況：連続雨量 270mm
(8月9日0時～11日6時)
時間最大雨量 56mm
(8月9日9時～10時)
※大間越雨量観測所
発生箇所：青森県西津軽郡深浦町大間越
崩壊状況：土石流捕捉量 約1,200m³ (推定)
状況：令和4年8月9日からの大雨により土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており、土砂及び流木を捕捉。
下流域への被害を未然に防止し効果を発揮した。

位置図

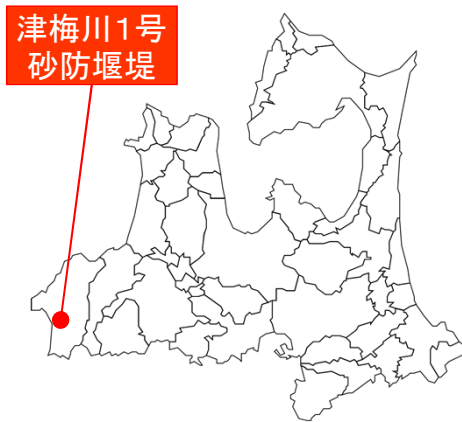

土石流発生前(令和3年6月10日撮影)



土石流発生後(令和4年8月19日撮影)

