
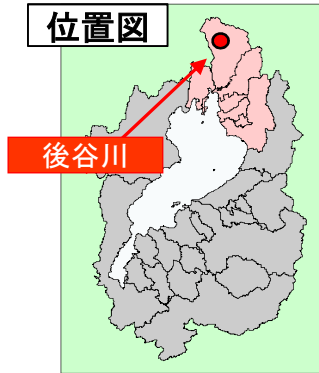


【施設効果事例】 後谷川砂防堰堤(滋賀県長浜市余呉町中河内)

うしろたにかわ

ながはまし よごちよう なかのかわち

災害発生日：令和4年8月5日
 降雨状況：連続雨量 305mm(8月4日11時～5日13時)
 時間最大雨量 69mm(8月5日6時～7時)
 ※中河内雨量観測所
 発生箇所：滋賀県長浜市余呉町中河内
 崩壊状況：土石流捕捉量 約1,500m³
 状況：8月1日から6日の前線による大雨に伴い、土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂及び流木を捕捉。下流地区への被害を未然に防止し効果を発揮した。

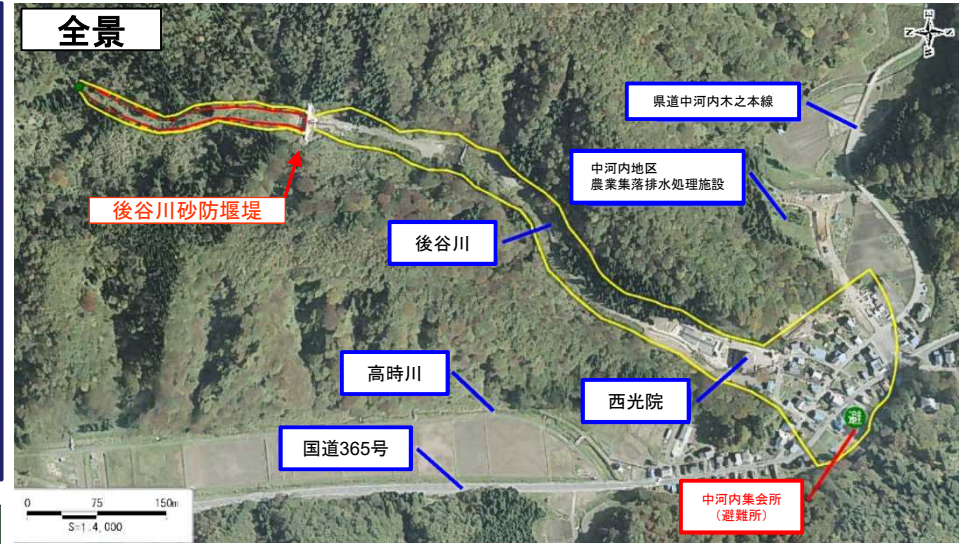

土石流発生前
(R2.6.29)

土石流発生後
(R4.8.30)

