


【施設効果事例】 すなはらさぼうえんてい りゅうぼくほそくこう  
**砂原砂防堰堤 (流木捕捉工)** (鳥取県東伯郡三朝町砂原)

完成年月 : 平成15年12月  
 災害発生日 : 令和5年8月15日  
 降雨状況 : 連続雨量 : 358mm(8月14日18時~15日23時)  
 時間最大雨量 : 42mm(8月15日16時~17時)  
 ※速報値 ※三朝雨量観測所(鳥取県)

とっとりけんとうはくぐんみささちょうすなはら  
 発生箇所 : 鳥取県東伯郡三朝町砂原  
 崩壊状況 : 流木等捕捉量 約100m<sup>3</sup>(推定値)  
 状況 : 8月14日からの台風7号に伴う大雨時に 流木等を捕捉。  
 下流域の人家等への被害を未然に防止し効果を発揮した。

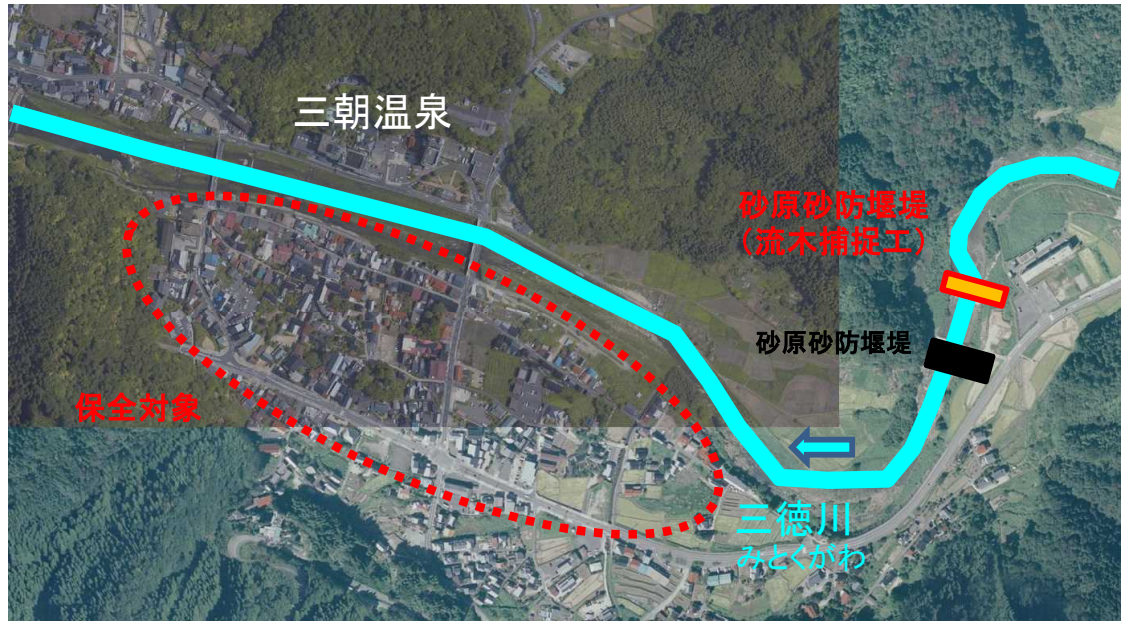

台風7号通過後(令和5年8月17日)



・流木捕捉状況

台風7号前(令和5年8月14日)



台風7号通過時(令和5年8月15日19時)

