

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

別紙1

事業名	一般国道8号 富山高岡バイパス
事業主体	北陸地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全事業：費用便益比 (B/C) = 3.3 (経済的純現在価値 (B-C) = 5,270億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 7.2%) 残事業：費用便益比 (B/C) = 1.9 (経済的純現在価値 (B-C) = 58億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 10.0%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更)	指標チェックの根拠	
1. 活力 円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a(費用便益分析対象区間)について 渋滞損失時間(整備なし)：5,123万人時間/年 渋滞損失削減時間：432万人時間/年(5,123万人時間/年 → 4,691万人時間/年) 区間b(当該区間/並行区間)について：(射水市沖塚原～射水市川口) 当該区間の渋滞損失時間：18万人時間/年(射水市沖塚原～射水市川口) 当該区間の渋滞損失削減率：約9割削減(射水市沖塚原～射水市川口)	
	■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	・対象区間(射水市鏡宮～高岡市江口) ・渋滞による余裕見込み時間が5分短縮(約12分→約7分)	
	□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上は踏切道の除却もしくは交通改善が期待される		
	□ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する		
	■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	・対象駅：新高岡駅(北陸新幹線) 対象地：射水市主要観光地(海王丸パーク) ・海王丸パーク～新高岡駅間のアクセス時間が約3分短縮(約31分→約28分)	
	□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは供用飛行場へのアクセス向上が見込まれる		
	物流効率化の支援	■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	・対象施設：伏木富山港(新湊地区) ・立体化による渋滞緩和により、物流効率化による企業の生産性向上、企業立地促進による高岡市や射水市の産業振興が期待される
		□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	
		□ 現道等における、総重量25tの車両もしくは150規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	

1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
		<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
		<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り	
		<input checked="" type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	・地域高規格道路富山高岡連絡道路としての位置づけあり
		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	・対象自治体：高岡市 日常活動圏中心都市：富山市・射水市 ・高岡市役所～富山市役所間のアクセス利便性の向上が期待される(通学通勤利用) 高岡市役所～射水市役所(新湊庁舎)間のアクセス利便性の向上が期待される(通学通勤・買い物利用)
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	・対象自治体：高岡市 日常活動圏中心都市：富山市・射水市 ・高岡市役所～富山市役所間のアクセス利便性の向上が期待される(通学通勤利用) 高岡市役所～射水市役所(新湊庁舎)間のアクセス利便性の向上が期待される(通学通勤・買い物利用)
個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する		
	<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する		
	<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	・アクセス向上が期待される観光地と年間観光入り込み数 海王丸パーク(97.9万人)・道の駅力モンパーク新湊(70.9万人) 高岡古城公園(82.2万人)・国宝瑞龍寺(15.9万人)	
	<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である		
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> バリアフリー新法に基づく特定経路が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)等の幹線道路において新たに無電柱化を達成する			
安全で安心できる暮らしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	・対象となる三次医療施設名称：厚生連高岡病院 ・アクセス向上が見込まれる地区：新湊市街地(新湊消防署管内) ・新湊市街地(新湊消防署)～厚生連高岡病院の搬送時間が約3分短縮(約29分→約26分)	

3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	・当該区間を含む国道8号が富山県の地域防災計画において、第一次緊急通行確保路線への位置づけあり
		<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
4. 環境	地球環境の保全	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	・費用便益分析対象区間のCO2排出量が削減（削減量＝約30,000t-CO2/年）
	生活環境の改善・保全	● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	・費用便益分析対象区間のNO2排出量が削減（削減量＝約77t-NOX/年・削減率＝約2%）
		● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	・費用便益分析対象区間のSPM排出量が削減（削減量＝約4t-SPM/年削減率＝約2%）
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道8号	富山高岡バイパス	L=24.8Km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
40,000~55,300	4	北陸地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成25年度		
単純合計	559億円	508億円	1,066億円
うち残事業分	57億円	29億円	86億円
基準年における 現在価値(C)	2,038億円	285億円	2,323億円
うち残事業分	54億円	11億円	65億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成25年度			
供用年	平成19年度、平成28年度			
単年便益 (初年便益)	294億円	49億円	15億円	358億円
基準年における 現在価値(B)	6,260億円	962億円	370億円	7,593億円
うち残事業分	58億円	42億円	24億円	123億円

③ 結果

費用便益比(事業全体)	3.3
経済的純現在価値(事業全体)	5,270億円
経済的内部収益率(事業全体)	7.2%
費用便益比(残事業)	1.9
経済的純現在価値(残事業)	58億円
経済的内部収益率(残事業)	10.0%

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析(事業全体を対象)

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	40,000~55,300	±10%	3.1~3.6
事業費	559億円	±10%	3.3~3.3
事業期間	50年	±20%(±1年)	—

⑤ 感度分析(残事業を対象)

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	40,000~55,300	±10%	1.9~2.2
事業費	57億円	±10%	1.7~2.1
事業期間	2年	±20%	—

交通状況の変化

様式-3①

事業名: 一般国道8号 富山高岡バイパス(事業全体)


(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [富山高岡バイパス] : 24.1km	交通量 ^{※1}	[台/日]		46,700	
	走行時間 ^{※2}	[分]		37.3	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]		314.41	
②主な周辺道路 ^{※4}	A[国道41号他] : 27.8km	交通量	[台/日]	17,300	13,100
		走行時間	[分]	59.9	54.4
		走行時間費用	[億円/年]	175.39	123.48
	B[国道415号他] : 32.9km	交通量	[台/日]	14,200	8,400
		走行時間	[分]	69.0	58.2
		走行時間費用	[億円/年]	165.88	84.81
	C[(一)姫野能町線他] : 23.0km	交通量	[台/日]	12,000	6,700
		走行時間	[分]	33.5	27.1
		走行時間費用	[億円/年]	66.74	31.49
	D[(主)富山戸出小矢部線] : 19.3km	交通量	[台/日]	8,800	7,500
		走行時間	[分]	44.3	42.0
		走行時間費用	[億円/年]	68.60	55.16
	E[(主)富山小杉線他] : 29.5km	交通量	[台/日]	19,500	15,900
		走行時間	[分]	56.9	52.1
		走行時間費用	[億円/年]	197.88	148.10
	F[国道472号他] : 33.3km	交通量	[台/日]	19,500	14,400
		走行時間	[分]	64.2	57.3
		走行時間費用	[億円/年]	215.08	148.67
	G[(一)練合宮尾線他] : 19.6km	交通量	[台/日]	10,900	4,400
		走行時間	[分]	39.6	31.7
		走行時間費用	[億円/年]	77.07	23.91
③その他道路合計: 2,738.0km	走行時間費用	[億円/年]	4,493.49	4,338.26	

			整備なし(A)	整備あり(B)	削減量 (A - B)
合計: 2,894.6km	走行時間短縮便益	[億円/年]	5,460.14	5,268.29	191.85

- ※1: 推計した所用時間と基準速度で走行した場合の所用時間との差。
- ※2: 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3: 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4: 当該事業により大きな変化が生じる道路について3~5路線程度以内で記載する。

事業名:一般国道8号 富山高岡バイパス(事業全体)

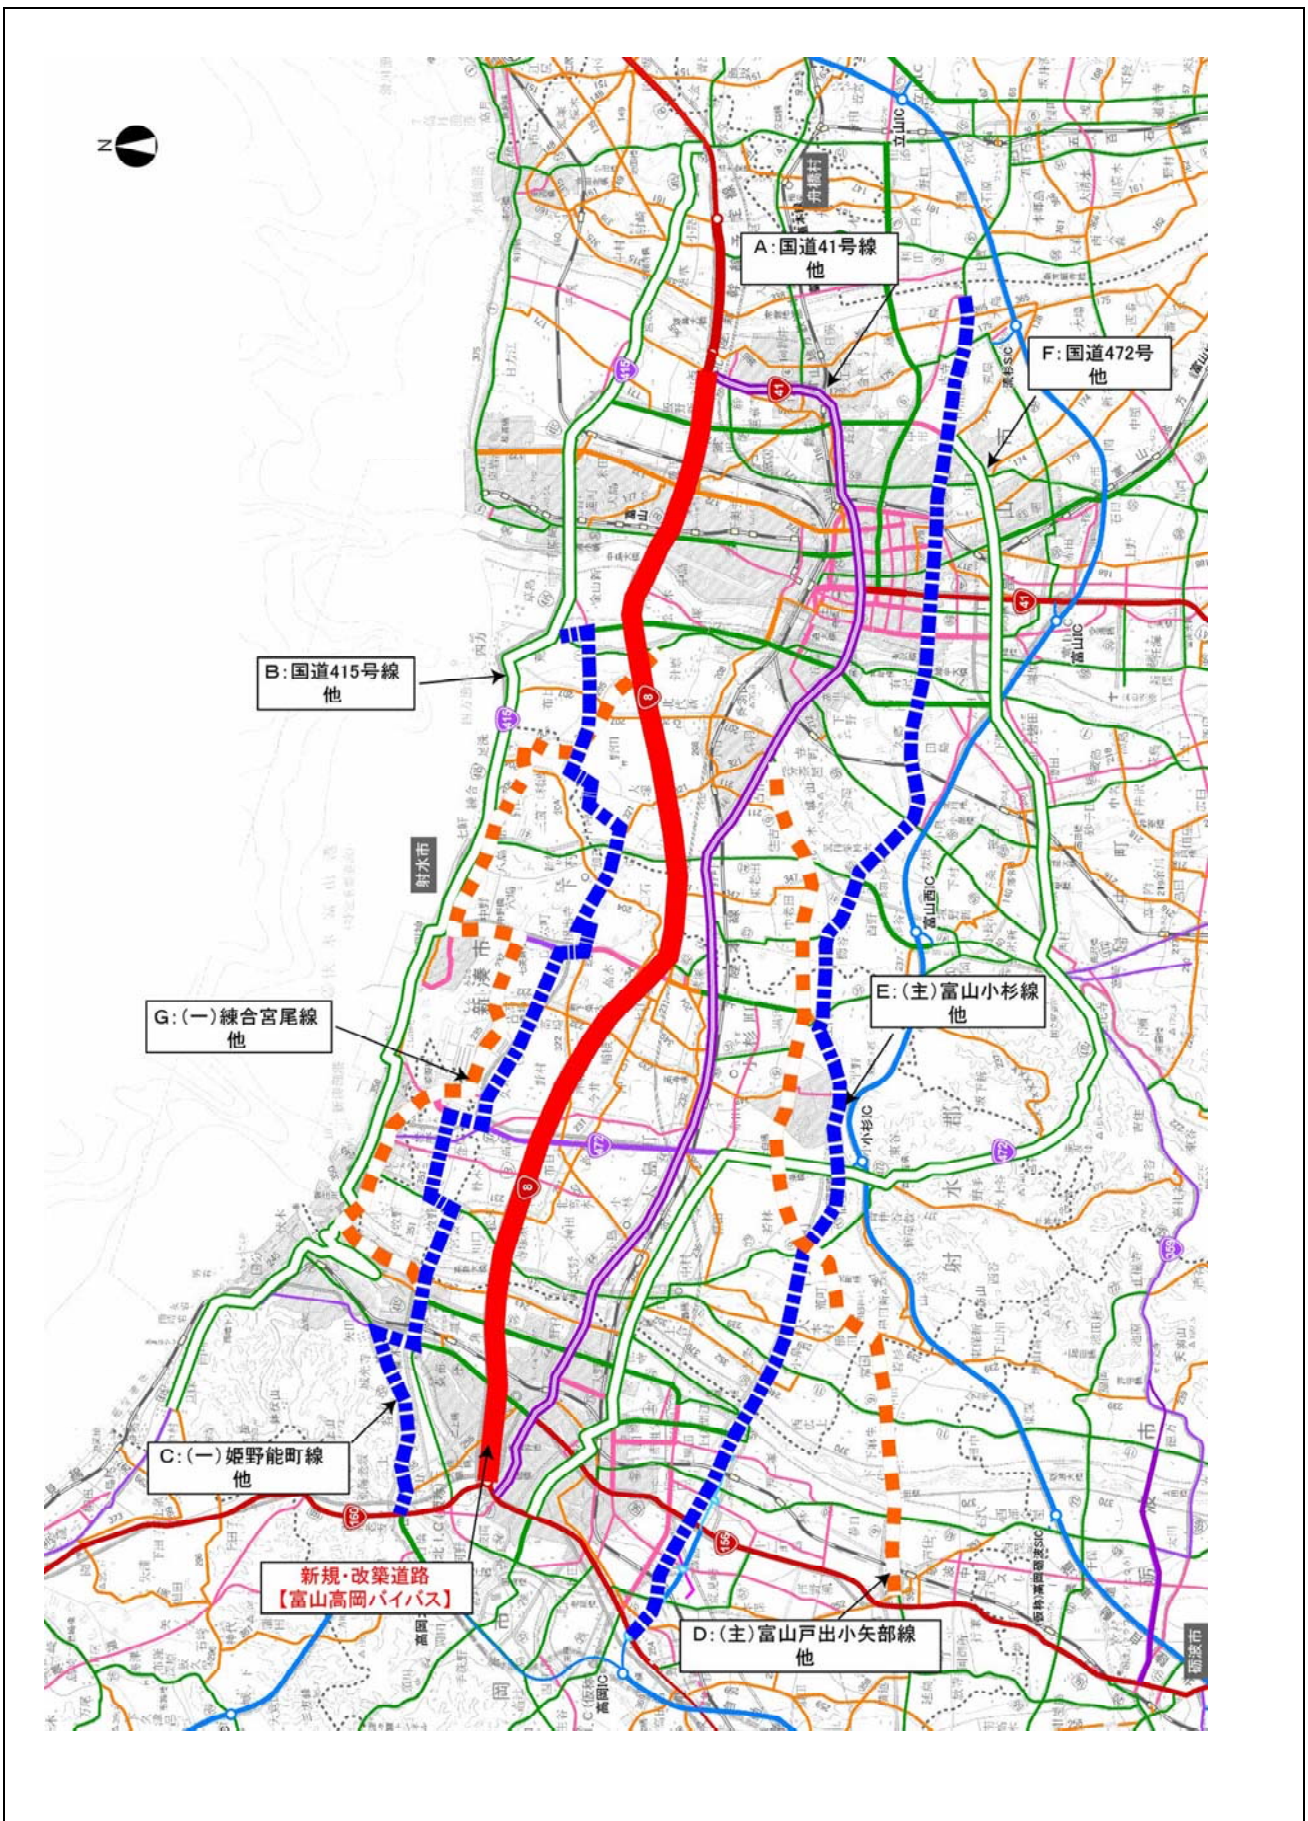

交通状況の変化

様式-3①

事業名: 一般国道8号 富山高岡バイパス(残事業)

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [富山高岡バイパス] :1.1km	交通量 ^{※1}	[台/日]	48,500	52,000	
	走行時間 ^{※2}	[分]	1.9	1.4	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	16.78	13.37	
②主な周辺道路 ^{※4}	A[(主)富山高岡線] :1.4km	交通量	[台/日]	6,600	7,200
		走行時間	[分]	2.6	2.7
		走行時間費用	[億円/年]	3.06	3.36
	B[(主)高岡青井谷線] :1.5km	交通量	[台/日]	10,600	10,400
		走行時間	[分]	3.4	3.4
		走行時間費用	[億円/年]	6.36	6.18
	C[(一)姫野能町線] :1.6km	交通量	[台/日]	7,900	6,200
		走行時間	[分]	2.3	2.2
		走行時間費用	[億円/年]	3.32	2.55
	D[国道415号] :3.8km	交通量	[台/日]	5,700	5,300
		走行時間	[分]	6.7	6.5
		走行時間費用	[億円/年]	6.86	6.19
	交通量	[台/日]			
	走行時間	[分]			
	走行時間費用	[億円/年]			
③その他道路合計: 848..km	走行時間費用	[億円/年]	2,017.94	2,019.76	

			整備なし(A)	整備あり(B)	削減量 (A - B)
合計: 857.4km	走行時間短縮便益	[億円/年]	2,054.32	2,051.42	2.90


※1: 推計した所用時間と基準速度で走行した場合の所用時間との差。

※2: 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3: 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4: 当該事業により大きな変化が生じる道路について3~5路線程度以内で記載する。

事業名:一般国道8号 富山高岡バイパス(残事業)

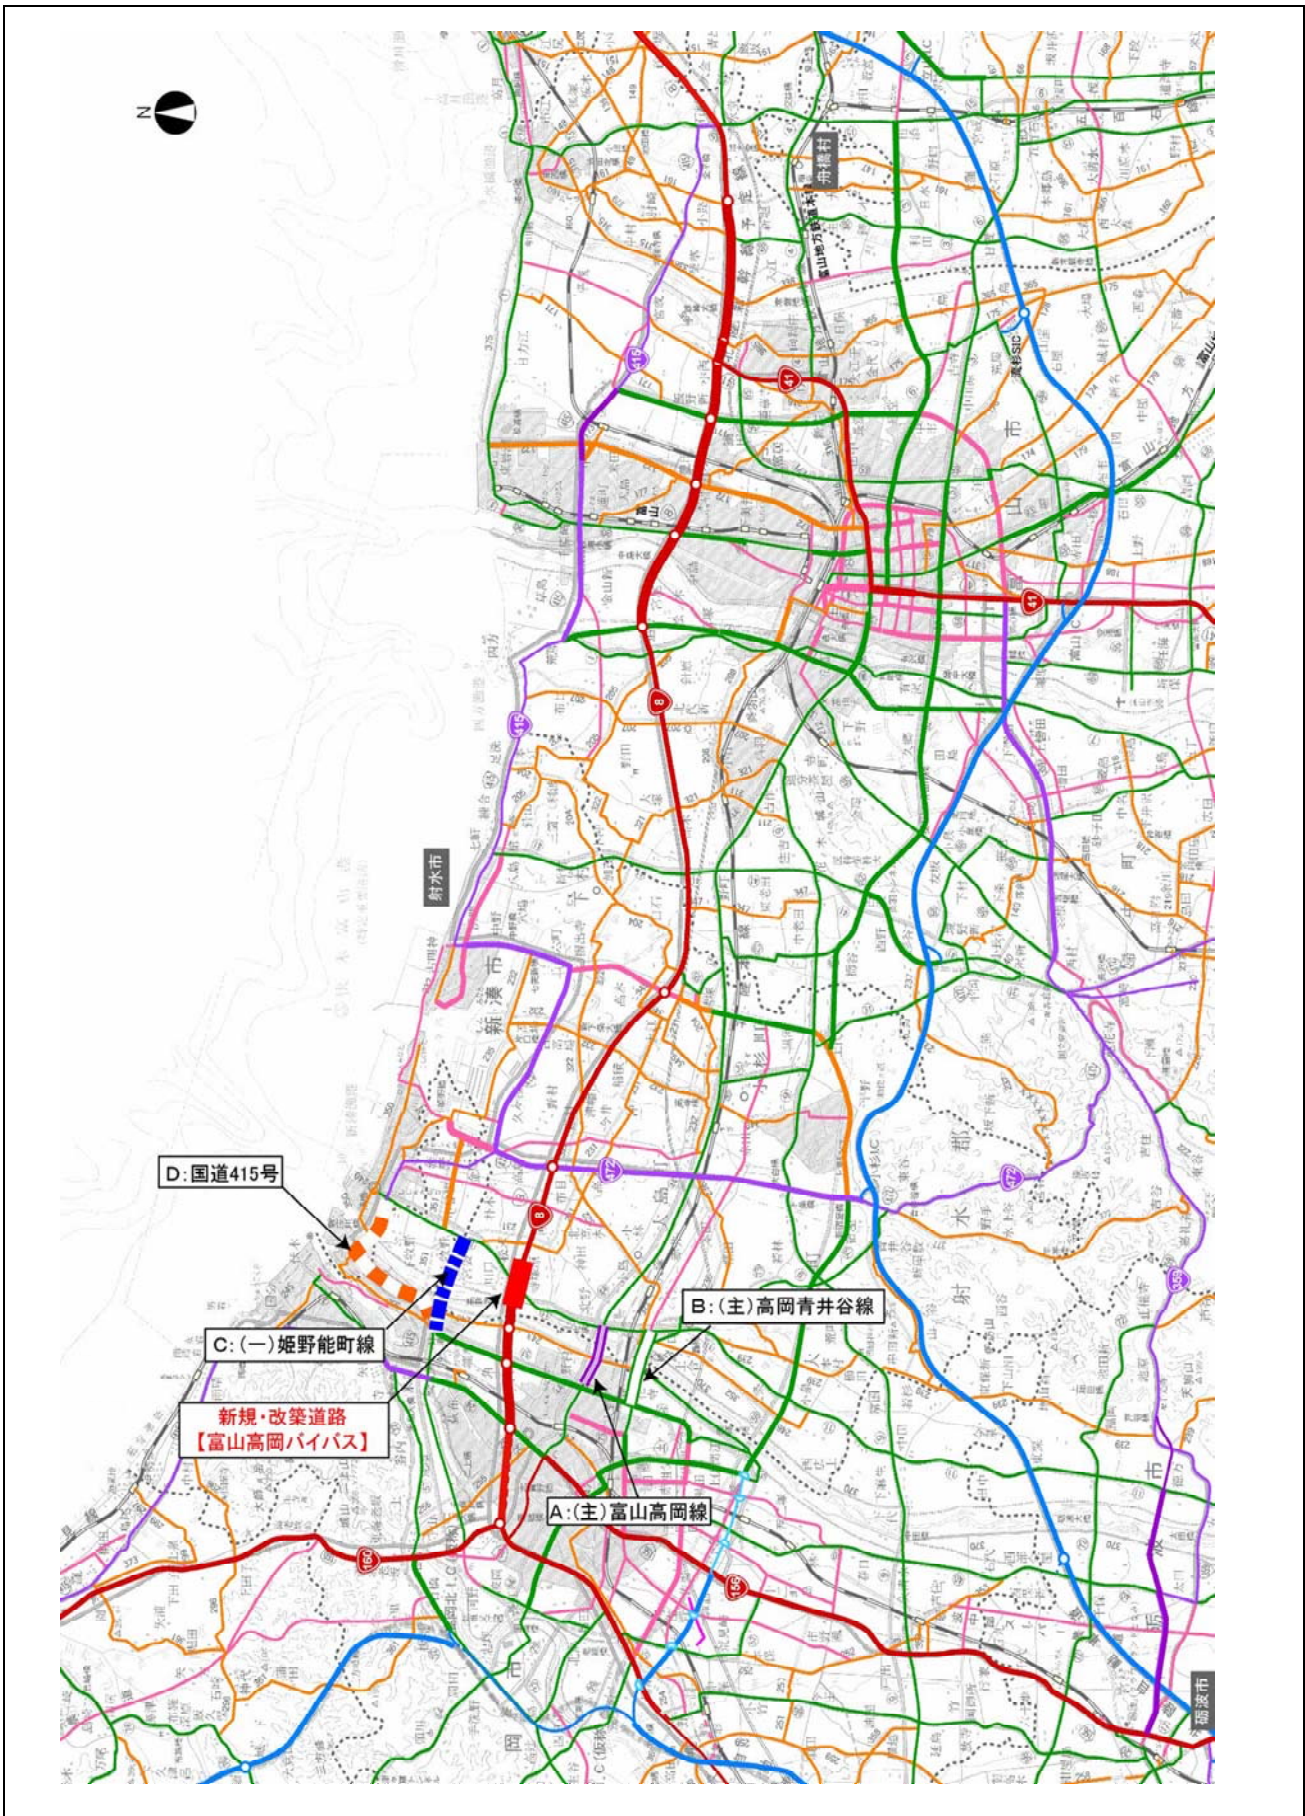

費用便益分析の条件

事業名：一般国道8号 富山高岡バイパス

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	分析対象期間	50年
	社会的割引率	4%
	基準年次	H25年
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input type="checkbox"/>
	複数時点での推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H17 H42)
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	いずれかのみ推計の場合 いずれかのみ推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17年センサス)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
	その他()	<input type="checkbox"/>
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有	<input type="checkbox"/>
	有の場合のみ 考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	()台トリップ/日
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の採択理由 小規模事業である	<input type="checkbox"/>
	山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他()		
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>
	その他(最終配分でQ ₀ を超える場合、実速度と照合し設定。)	<input checked="" type="checkbox"/>

交通流推計

(3)

項目		チェック欄	
休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
		対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
		採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載 休日係数1.1を超える月が年間で10ヶ月ある。現道における平成24年度常観交通量データにより平日休日比を集計。	() %
災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
		とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
	考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	採用した冬期日数(年あたり) 採用した冬期日数の考え方を記載 降雪が最初に観測された日から最後に観測された日までの冬期日数(88日)及び降雪日数(26日)を考慮	(88) 日
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載 通常期と冬期の速度比(降雪時19%低下、降雪時以外10%低下)を考慮	
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他 ()	<input type="checkbox"/>	
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>	
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>	
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>	
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>	
その他			

便益の算定

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道8号(事業全体)

年次	年度	割戻率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
				0.43		24.8	10.66
-41年目	S 41	6.3178	34.7	0.25	4.19		
-40年目	S 42	6.0748	36.6	2.26	34.55		
-39年目	S 43	5.8412	38.5	4.64	64.84		
-38年目	S 44	5.6165	40.8	7.54	95.60		
-37年目	S 45	5.4005	43.5	13.38	152.99		
-36年目	S 46	5.1928	45.6	16.42	172.21		
-35年目	S 47	4.9931	48.7	23.14	218.50		
-34年目	S 48	4.8010	56.1	24.84	195.79		
-33年目	S 49	4.6164	66.9	22.50	142.99		
-32年目	S 50	4.4388	70.7	18.84	108.94		
-31年目	S 51	4.2681	76.7	19.55	100.19		
-30年目	S 52	4.1039	81.3	9.78	45.47		
-29年目	S 53	3.9461	84.7	7.14	30.64		
-28年目	S 54	3.7943	86.9	11.70	47.05		
-27年目	S 55	3.6484	92.4	2.76	10.04		
-26年目	S 56	3.5081	94.8	3.60	12.27		
-25年目	S 57	3.3731	95.8	10.40	33.73		
-24年目	S 58	3.2434	96.8	12.40	38.27		
-23年目	S 59	3.1187	98.7	9.80	28.52		
-22年目	S 60	2.9987	99.5	16.70	46.35		
-21年目	S 61	2.8834	101.2	17.70	46.45		
-20年目	S 62	2.7725	101.0	26.20	66.24		
-19年目	S 63	2.6658	101.5	11.60	28.06		
-18年目	H 1	2.5633	104.2	1.46	3.31		
-17年目	H 2	2.4647	106.5	1.26	2.69		
-16年目	H 3	2.3699	109.1	0.49	0.98		
-15年目	H 4	2.2788	110.6	1.36	2.58		
-14年目	H 5	2.1911	110.9	4.27	7.77		
-13年目	H 6	2.1068	110.8	0.58	1.02		
-12年目	H 7	2.0258	109.9	0.49	0.83		
-11年目	H 8	1.9479	109.5	1.59	2.61		
-10年目	H 9	1.8730	110.4	0.19	0.30		
-9年目	H 10	1.8009	109.9	9.51	14.35		
-8年目	H 11	1.7317	108.4	19.17	28.20		
-7年目	H 12	1.6651	107.2	20.05	28.68		
-6年目	H 13	1.6010	105.7	20.62	28.77		
-5年目	H 14	1.5395	103.8	16.07	21.95		
-4年目	H 15	1.4802	102.3	21.89	29.17		
-3年目	H 16	1.4233	101.0	16.50	21.42		
-2年目	H 17	1.3686	99.6	12.73	16.11		
-1年目	H 18	1.3159	98.7	7.93	9.74		
供用開始年次	H 19	1.2653	97.6	9.25	11.04	10.16	12.13
1年目	H 20	1.2167	96.8	4.47	5.17	10.16	11.76
2年目	H 21	1.1699	95.6	4.65	5.24	10.16	11.45
3年目	H 22	1.1249	93.7	2.84	3.14	10.16	11.23
4年目	H 23	1.0816	92.1	3.63	3.93	10.16	10.98
5年目	H 24	1.0400	92.1	10.90	11.34	10.16	10.56
6年目	H 25	1.0000	92.1	16.19	16.19	10.16	10.16
7年目	H 26	0.9615	92.1	23.81	22.89	10.16	9.77
8年目	H 27	0.9246	92.1	33.52	30.99	10.16	9.39
9年目	H 28	0.8890	92.1			10.16	9.03
10年目	H 29	0.8548	92.1			10.16	8.68
11年目	H 30	0.8219	92.1			10.16	8.35
12年目	H 31	0.7903	92.1			10.16	8.03
13年目	H 32	0.7599	92.1			10.16	7.72
14年目	H 33	0.7307	92.1			10.16	7.42
15年目	H 34	0.7026	92.1			10.16	7.14
16年目	H 35	0.6756	92.1			10.16	6.86
17年目	H 36	0.6496	92.1			10.16	6.60
18年目	H 37	0.6246	92.1			10.16	6.34
19年目	H 38	0.6006	92.1			10.16	6.10
20年目	H 39	0.5775	92.1			10.16	5.86
21年目	H 40	0.5553	92.1			10.16	5.64
22年目	H 41	0.5339	92.1			10.16	5.42
23年目	H 42	0.5134	92.1			10.16	5.21

24年目	H	43	0.4936	92.1			10.16	5.01
25年目	H	44	0.4746	92.1			10.16	4.82
26年目	H	45	0.4564	92.1			10.16	4.64
27年目	H	46	0.4388	92.1			10.16	4.46
28年目	H	47	0.4220	92.1			10.16	4.29
29年目	H	48	0.4057	92.1			10.16	4.12
30年目	H	49	0.3901	92.1			10.16	3.96
31年目	H	50	0.3751	92.1			10.16	3.81
32年目	H	51	0.3607	92.1			10.16	3.66
33年目	H	52	0.3468	92.1			10.16	3.52
34年目	H	53	0.3335	92.1			10.16	3.39
35年目	H	54	0.3207	92.1			10.16	3.26
36年目	H	55	0.3083	92.1			10.16	3.13
37年目	H	56	0.2965	92.1			10.16	3.01
38年目	H	57	0.2851	92.1			10.16	2.90
39年目	H	58	0.2741	92.1			10.16	2.78
40年目	H	59	0.2636	92.1			10.16	2.68
41年目	H	60	0.2534	92.1			10.16	2.57
42年目	H	61	0.2437	92.1			10.16	2.47
43年目	H	62	0.2343	92.1			10.16	2.38
44年目	H	63	0.2253	92.1			10.16	2.29
45年目	H	64	0.2166	92.1			10.16	2.20
46年目	H	65	0.2083	92.1			10.16	2.12
47年目	H	66	0.2003	92.1			10.16	2.03
48年目	H	67	0.1926	92.1			10.16	1.96
49年目	H	68	0.1852	92.1	-73.19	-16.53	10.16	1.88
合計					485.37	2037.74	507.81	285.15

単純事業費計		558.56		507.81
--------	--	--------	--	--------

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道8号 残事業

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-3年目	H 25	1.0000	92.1				
-2年目	H 26	0.9615	92.1	23.81	22.89		
-1年目	H 27	0.9246	92.1	33.52	30.99		
供用開始年次	H 28	0.8890	92.1			0.58	0.51
1年目	H 29	0.8548	92.1			0.58	0.49
2年目	H 30	0.8219	92.1			0.58	0.47
3年目	H 31	0.7903	92.1			0.58	0.46
4年目	H 32	0.7599	92.1			0.58	0.44
5年目	H 33	0.7307	92.1			0.58	0.42
6年目	H 34	0.7026	92.1			0.58	0.40
7年目	H 35	0.6756	92.1			0.58	0.39
8年目	H 36	0.6496	92.1			0.58	0.37
9年目	H 37	0.6246	92.1			0.58	0.36
10年目	H 38	0.6006	92.1			0.58	0.35
11年目	H 39	0.5775	92.1			0.58	0.33
12年目	H 40	0.5553	92.1			0.58	0.32
13年目	H 41	0.5339	92.1			0.58	0.31
14年目	H 42	0.5134	92.1			0.58	0.30
15年目	H 43	0.4936	92.1			0.58	0.28
16年目	H 44	0.4746	92.1			0.58	0.27
17年目	H 45	0.4564	92.1			0.58	0.26
18年目	H 46	0.4388	92.1			0.58	0.25
19年目	H 47	0.4220	92.1			0.58	0.24
20年目	H 48	0.4057	92.1			0.58	0.23
21年目	H 49	0.3901	92.1			0.58	0.22
22年目	H 50	0.3751	92.1			0.58	0.22
23年目	H 51	0.3607	92.1			0.58	0.21
24年目	H 52	0.3468	92.1			0.58	0.20
25年目	H 53	0.3335	92.1			0.58	0.19
26年目	H 54	0.3207	92.1			0.58	0.18
27年目	H 55	0.3083	92.1			0.58	0.18
28年目	H 56	0.2965	92.1			0.58	0.17
29年目	H 57	0.2851	92.1			0.58	0.16
30年目	H 58	0.2741	92.1			0.58	0.16
31年目	H 59	0.2636	92.1			0.58	0.15
32年目	H 60	0.2534	92.1			0.58	0.15
33年目	H 61	0.2437	92.1			0.58	0.14
34年目	H 62	0.2343	92.1			0.58	0.13
35年目	H 63	0.2253	92.1			0.58	0.13
36年目	H 64	0.2166	92.1			0.58	0.12
37年目	H 65	0.2083	92.1			0.58	0.12
38年目	H 66	0.2003	92.1			0.58	0.12
39年目	H 67	0.1926	92.1			0.58	0.11
40年目	H 68	0.1852	92.1			0.58	0.11
41年目	H 69	0.1780	92.1			0.58	0.10
42年目	H 70	0.1712	92.1			0.58	0.10
43年目	H 71	0.1646	92.1			0.58	0.09
44年目	H 72	0.1583	92.1			0.58	0.09
45年目	H 73	0.1522	92.1			0.58	0.09
46年目	H 74	0.1463	92.1			0.58	0.08
47年目	H 75	0.1407	92.1			0.58	0.08
48年目	H 76	0.1353	92.1			0.58	0.08
49年目	H 77	0.1301	92.1	0.00	0.00	0.58	0.07
合計				57.33	53.89	28.81	11.44
単純事業費計				57.33		28.81	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道8号（事業全体）

年次	年度 (基準年) H25	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					交通事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	割引率4%
供用開始年次	H 19					1.2653	97.6000	205.61	45.94	42.46	294.01	351.06	31.80	6.83	10.12	48.75	58.21	15.39	18.38	358.16	427.65
1年目	H 20	0.99480	0.98385	0.97787	0.99086	1.2167	96.8000	204.55	45.20	41.52	291.26	337.16	31.64	6.72	9.90	48.25	55.86	15.25	17.65	354.77	410.67
2年目	H 21	0.99477	0.98359	0.97737	0.99077	1.1699	95.6000	203.48	44.46	40.58	288.51	325.16	31.47	6.61	9.67	47.75	53.82	15.11	17.03	351.38	396.01
3年目	H 22	0.99475	0.98331	0.97684	0.99069	1.1249	93.7000	202.41	43.71	39.64	285.76	315.95	31.31	6.50	9.45	47.25	52.25	14.97	16.55	347.99	384.75
4年目	H 23	0.99472	0.98303	0.97629	0.99060	1.0816	92.1000	201.34	42.97	38.70	283.01	306.11	31.14	6.39	9.22	46.75	50.57	14.83	16.04	344.60	372.71
5年目	H 24	0.99469	0.98273	0.97572	0.99051	1.0400	92.1000	200.27	42.23	37.76	280.26	291.47	30.98	6.28	9.00	46.25	48.11	14.69	15.28	341.20	354.85
6年目	H 25	0.99466	0.98243	0.97511	0.99042	1.0000	92.1000	199.20	41.49	36.82	277.51	277.51	30.81	6.17	8.78	45.76	45.76	14.55	14.55	337.81	337.81
7年目	H 26	0.99463	0.98212	0.97448	0.99033	0.9615	92.1000	198.13	40.75	35.88	274.76	264.19	30.65	6.06	8.55	45.26	43.51	14.41	13.85	334.42	321.56
8年目	H 27	0.99460	0.98179	0.97381	0.99023	0.9246	92.1000	197.06	40.00	34.94	272.01	251.49	30.48	5.95	8.33	44.76	41.38	14.27	13.19	331.03	306.05
9年目	H 28	0.99457	0.98145	0.97310	0.99014	0.8890	92.1000	154.02	32.20	30.31	216.53	192.49	22.36	4.03	4.98	31.37	27.89	13.90	12.35	261.80	232.74
10年目	H 29	0.99454	0.98110	0.97236	0.99004	0.8548	92.1000	153.18	31.59	29.48	214.24	183.13	22.23	3.96	4.84	31.03	26.53	13.76	11.76	259.03	221.42
11年目	H 30	0.99451	0.98074	0.97157	0.98994	0.8219	92.1000	152.33	30.98	28.64	211.95	174.21	22.11	3.88	4.71	30.70	25.23	13.62	11.19	256.27	210.64
12年目	H 31	0.99448	0.98036	0.97074	0.98984	0.7903	92.1000	151.49	30.37	27.80	209.67	165.70	21.99	3.80	4.57	30.36	24.00	13.48	10.65	253.51	200.35
13年目	H 32	0.99445	0.97997	0.96986	0.98973	0.7599	92.1000	150.65	29.76	26.96	207.38	157.59	21.87	3.73	4.43	30.03	22.82	13.34	10.14	250.75	190.55
14年目	H 33	0.99588	0.98583	0.98106	0.99285	0.7307	92.1000	150.03	29.34	26.45	205.83	150.40	21.78	3.67	4.35	29.80	21.77	13.25	9.68	248.87	181.85
15年目	H 34	0.99586	0.98563	0.98070	0.99280	0.7026	92.1000	149.41	28.92	25.94	204.27	143.52	21.69	3.62	4.26	29.57	20.78	13.15	9.24	247.00	173.54
16年目	H 35	0.99585	0.98542	0.98032	0.99275	0.6756	92.1000	148.79	28.50	25.43	202.72	136.95	21.60	3.57	4.18	29.35	19.82	13.06	8.82	245.12	165.60
17年目	H 36	0.99583	0.98520	0.97992	0.99270	0.6496	92.1000	148.17	28.08	24.92	201.17	130.68	21.51	3.52	4.10	29.12	18.91	12.96	8.42	243.25	158.01
18年目	H 37	0.99581	0.98498	0.97951	0.99264	0.6246	92.1000	147.55	27.66	24.41	199.62	124.68	21.42	3.46	4.01	28.89	18.05	12.87	8.04	241.37	150.76
19年目	H 38	0.99579	0.98475	0.97908	0.99259	0.6006	92.1000	146.93	27.23	23.90	198.06	118.95	21.33	3.41	3.93	28.66	17.22	12.77	7.67	239.50	143.84
20年目	H 39	0.99578	0.98452	0.97864	0.99253	0.5775	92.1000	146.31	26.81	23.39	196.51	113.48	21.24	3.36	3.84	28.44	16.42	12.68	7.32	237.62	137.22
21年目	H 40	0.99576	0.98427	0.97817	0.99248	0.5553	92.1000	145.69	26.39	22.88	194.96	108.25	21.15	3.30	3.76	28.21	15.66	12.58	6.99	235.75	130.90
22年目	H 41	0.99574	0.98402	0.97768	0.99242	0.5339	92.1000	145.07	25.97	22.37	193.40	103.26	21.06	3.25	3.68	27.98	14.94	12.48	6.67	233.87	124.87
23年目	H 42	0.99572	0.98376	0.97717	0.99236	0.5134	92.1000	144.45	25.55	21.86	191.85	98.49	20.97	3.20	3.59	27.76	14.25	12.39	6.36	232.00	119.10
24年目	H 43	0.99077	0.99335	1.00200	0.99205	0.4936	92.1000	143.11	25.38	21.90	190.39	93.98	20.77	3.18	3.60	27.55	13.60	12.29	6.07	230.23	113.65
25年目	H 44	0.99069	0.99330	1.00200	0.99199	0.4746	92.1000	141.78	25.21	21.94	188.93	89.68	20.58	3.16	3.61	27.34	12.98	12.19	5.79	228.47	108.44
26年目	H 45	0.99060	0.99326	1.00200	0.99193	0.4564	92.1000	140.45	25.04	21.99	187.47	85.56	20.39	3.13	3.61	27.14	12.38	12.09	5.52	226.70	103.46
27年目	H 46	0.99051	0.99321	1.00199	0.99186	0.4388	92.1000	139.12	24.87	22.03	186.01	81.63	20.19	3.11	3.62	26.93	11.82	12.00	5.26	224.94	98.71
28年目	H 47	0.99042	0.99316	1.00199	0.99179	0.4220	92.1000	137.78	24.70	22.08	184.56	77.87	20.00	3.09	3.63	26.72	11.27	11.90	5.02	223.17	94.17
29年目	H 48	0.99033	0.99312	1.00198	0.99173	0.4057	92.1000	136.45	24.53	22.12	183.10	74.29	19.81	3.07	3.64	26.51	10.76	11.80	4.79	221.41	89.83
30年目	H 49	0.99023	0.99307	1.00198	0.99166	0.3901	92.1000	135.12	24.36	22.16	181.64	70.86	19.61	3.05	3.64	26.31	10.26	11.70	4.56	219.64	85.69
31年目	H 50	0.99014	0.99302	1.00198	0.99159	0.3751	92.1000	133.79	24.19	22.21	180.18	67.59	19.42	3.03	3.65	26.10	9.79	11.60	4.35	217.88	81.73
32年目	H 51	0.99004	0.99297	1.00197	0.99152	0.3607	92.1000	132.45	24.02	22.25	178.72	64.46	19.23	3.01	3.66	25.89	9.34	11.50	4.15	216.11	77.95
33年目	H 52	0.98994	0.99292	1.00197	0.99144	0.3468	92.1000	131.12	23.85	22.29	177.26	61.48	19.03	2.99	3.66	25.68	8.91	11.40	3.96	214.35	74.34
34年目	H 53	0.98984	0.99287	1.00196	0.99137	0.3335	92.1000	129.79	23.68	22.34	175.80	58.63	18.84	2.96	3.67	25.48	8.50	11.31	3.77	212.59	70.89
35年目	H 54	0.98973	0.99282	1.00196	0.99129	0.3207	92.1000	128.46	23.51	22.38	174.34	55.90	18.65	2.94	3.68	25.27	8.10	11.21	3.59	210.82	67.60
36年目	H 55	0.98963	0.99277	1.00196	0.99122	0.3083	92.1000	127.12	23.34	22.43	172.89	53.30	18.45	2.92	3.69	25.06	7.73	11.11	3.43	209.06	64.46
37年目	H 56	0.98952	0.99272	1.00195	0.99114	0.2965	92.1000	125.79	23.17	22.47	171.43	50.82	18.26	2.90	3.69	24.85	7.37	11.01	3.26	207.29	61.45
38年目	H 57	0.98941	0.99266	1.00195	0.99106	0.2851	92.1000	124.46	23.00	22.51	169.97	48.45	18.07	2.88	3.70	24.65	7.03	10.91	3.11	205.53	58.59
39年目	H 58	0.98929	0.99261	1.00194	0.99098	0.2741	92.1000	123.13	22.83	22.56	168.51	46.19	17.87	2.86	3.71	24.44	6.70	10.81	2.96	203.76	55.85
40年目	H 59	0.98918	0.99255	1.00194	0.99090	0.2636	92.1000	121.79	22.66	22.60	167.05	44.03	17.68	2.84	3.71	24.23	6.39	10.72	2.82	202.00	53.24
41年目	H 60	0.98906	0.99250	1.00194	0.99081	0.2534	92.1000	120.46	22.49	22.64	165.59	41.96	17.49	2.82	3.72	24.02	6.09	10.62	2.69	200.23	50.74
42年目	H 61	0.98894	0.99244	1.00193	0.99073	0.2437	92.1000	119.13	22.32	22.69	164.13	39.99	17.29	2.79	3.73	23.82	5.80	10.52	2.56	198.47	48.36
43年目	H 62	0.98881	0.99238	1.00193	0.99064	0.2343	92.1000	117.80	22.15	22.73	162.68	38.11	17.10	2.77	3.74	23.61	5.53	10.42	2.44	196.70	46.09
44年目	H 63	0.98870	0.99233	1.00193	0.99056	0.2253	92.1000	116.46	21.98	22.78	161.22	36.32	16.90	2.75	3.74	23.40	5.27	10.32	2.33	194.94	43.92
45年目	H 64	0.98858	0.99227	1.00192	0.99048	0.2166	92.1000	115.13	21.81	22.82	159.76	34.61	16.71	2.73	3.75						

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道8号（残事業）

年次	年度 (基準年) H25	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸ブロック)				割引率 (A)	デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					交通事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 28					0.8890	92.1000	2.05	0.42	0.90	3.37	2.99	1.70	0.20	0.54	2.44	2.17	1.38	1.23	7.18	6.39
1年目	H 29	0.99454	0.98110	0.97236	0.99004	0.8548	92.1000	2.04	0.41	0.87	3.32	2.84	1.69	0.20	0.52	2.41	2.06	1.36	1.17	7.10	6.07
2年目	H 30	0.99451	0.98074	0.97157	0.98994	0.8219	92.1000	2.03	0.41	0.85	3.28	2.70	1.68	0.19	0.51	2.38	1.96	1.35	1.11	7.01	5.76
3年目	H 31	0.99448	0.98036	0.97074	0.98984	0.7903	92.1000	2.02	0.40	0.82	3.24	2.56	1.67	0.19	0.49	2.35	1.86	1.34	1.06	6.93	5.47
4年目	H 32	0.99445	0.97997	0.96986	0.98973	0.7599	92.1000	2.00	0.39	0.80	3.19	2.43	1.66	0.18	0.48	2.33	1.77	1.32	1.01	6.84	5.20
5年目	H 33	0.99588	0.98583	0.98106	0.99285	0.7307	92.1000	2.00	0.38	0.78	3.16	2.31	1.66	0.18	0.47	2.31	1.69	1.31	0.96	6.78	4.96
6年目	H 34	0.99586	0.98563	0.98070	0.99280	0.7026	92.1000	1.99	0.38	0.77	3.13	2.20	1.65	0.18	0.46	2.29	1.61	1.30	0.92	6.73	4.73
7年目	H 35	0.99585	0.98542	0.98032	0.99275	0.6756	92.1000	1.98	0.37	0.75	3.11	2.10	1.64	0.18	0.45	2.27	1.53	1.30	0.87	6.67	4.51
8年目	H 36	0.99583	0.98520	0.97992	0.99270	0.6496	92.1000	1.97	0.37	0.74	3.08	2.00	1.63	0.17	0.44	2.25	1.46	1.29	0.84	6.61	4.30
9年目	H 37	0.99581	0.98498	0.97951	0.99264	0.6246	92.1000	1.96	0.36	0.72	3.05	1.90	1.63	0.17	0.43	2.23	1.39	1.28	0.80	6.56	4.10
10年目	H 38	0.99579	0.98475	0.97908	0.99259	0.6006	92.1000	1.96	0.36	0.71	3.02	1.81	1.62	0.17	0.42	2.21	1.33	1.27	0.76	6.50	3.90
11年目	H 39	0.99578	0.98452	0.97864	0.99253	0.5775	92.1000	1.95	0.35	0.69	2.99	1.73	1.61	0.17	0.42	2.20	1.27	1.26	0.73	6.44	3.72
12年目	H 40	0.99576	0.98427	0.97817	0.99248	0.5553	92.1000	1.94	0.35	0.68	2.96	1.64	1.61	0.16	0.41	2.18	1.21	1.25	0.69	6.39	3.55
13年目	H 41	0.99574	0.98402	0.97768	0.99242	0.5339	92.1000	1.93	0.34	0.66	2.93	1.57	1.60	0.16	0.40	2.16	1.15	1.24	0.66	6.33	3.38
14年目	H 42	0.99572	0.98376	0.97717	0.99236	0.5134	92.1000	1.92	0.33	0.65	2.90	1.49	1.59	0.16	0.39	2.14	1.10	1.23	0.63	6.27	3.22
15年目	H 43	0.99077	0.99335	1.00200	0.99205	0.4936	92.1000	1.90	0.33	0.65	2.88	1.42	1.58	0.16	0.39	2.12	1.05	1.22	0.60	6.23	3.07
16年目	H 44	0.99069	0.99330	1.00200	0.99199	0.4746	92.1000	1.89	0.33	0.65	2.87	1.36	1.56	0.16	0.39	2.11	1.00	1.21	0.57	6.19	2.94
17年目	H 45	0.99060	0.99326	1.00200	0.99193	0.4564	92.1000	1.87	0.33	0.65	2.85	1.30	1.55	0.15	0.39	2.09	0.96	1.20	0.55	6.14	2.80
18年目	H 46	0.99051	0.99321	1.00199	0.99186	0.4388	92.1000	1.85	0.33	0.65	2.83	1.24	1.53	0.15	0.39	2.08	0.91	1.19	0.52	6.10	2.68
19年目	H 47	0.99042	0.99316	1.00199	0.99179	0.4220	92.1000	1.83	0.32	0.65	2.81	1.19	1.52	0.15	0.39	2.06	0.87	1.18	0.50	6.06	2.55
20年目	H 48	0.99033	0.99312	1.00198	0.99173	0.4057	92.1000	1.82	0.32	0.65	2.79	1.13	1.51	0.15	0.39	2.05	0.83	1.17	0.47	6.01	2.44
21年目	H 49	0.99023	0.99307	1.00198	0.99166	0.3901	92.1000	1.80	0.32	0.66	2.77	1.08	1.49	0.15	0.39	2.03	0.79	1.16	0.45	5.97	2.33
22年目	H 50	0.99014	0.99302	1.00198	0.99159	0.3751	92.1000	1.78	0.32	0.66	2.75	1.03	1.48	0.15	0.39	2.02	0.76	1.15	0.43	5.92	2.22
23年目	H 51	0.99004	0.99297	1.00197	0.99152	0.3607	92.1000	1.76	0.31	0.66	2.74	0.99	1.46	0.15	0.40	2.01	0.72	1.14	0.41	5.88	2.12
24年目	H 52	0.98994	0.99292	1.00197	0.99144	0.3468	92.1000	1.74	0.31	0.66	2.72	0.94	1.45	0.15	0.40	1.99	0.69	1.13	0.39	5.84	2.02
25年目	H 53	0.98984	0.99287	1.00196	0.99137	0.3335	92.1000	1.73	0.31	0.66	2.70	0.90	1.43	0.15	0.40	1.98	0.66	1.12	0.37	5.79	1.93
26年目	H 54	0.98973	0.99282	1.00196	0.99129	0.3207	92.1000	1.71	0.31	0.66	2.68	0.86	1.42	0.15	0.40	1.96	0.63	1.11	0.36	5.75	1.84
27年目	H 55	0.98963	0.99277	1.00196	0.99122	0.3083	92.1000	1.69	0.31	0.66	2.66	0.82	1.40	0.14	0.40	1.95	0.60	1.10	0.34	5.71	1.76
28年目	H 56	0.98952	0.99272	1.00195	0.99114	0.2965	92.1000	1.67	0.30	0.66	2.64	0.78	1.39	0.14	0.40	1.93	0.57	1.09	0.32	5.66	1.68
29年目	H 57	0.98941	0.99266	1.00195	0.99106	0.2851	92.1000	1.66	0.30	0.67	2.62	0.75	1.37	0.14	0.40	1.92	0.55	1.08	0.31	5.62	1.60
30年目	H 58	0.98929	0.99261	1.00194	0.99098	0.2741	92.1000	1.64	0.30	0.67	2.60	0.71	1.36	0.14	0.40	1.90	0.52	1.07	0.29	5.58	1.53
31年目	H 59	0.98918	0.99255	1.00194	0.99090	0.2636	92.1000	1.62	0.30	0.67	2.59	0.68	1.34	0.14	0.40	1.89	0.50	1.06	0.28	5.53	1.46
32年目	H 60	0.98906	0.99250	1.00194	0.99081	0.2534	92.1000	1.60	0.29	0.67	2.57	0.65	1.33	0.14	0.40	1.87	0.47	1.05	0.27	5.49	1.39
33年目	H 61	0.98894	0.99244	1.00193	0.99073	0.2437	92.1000	1.59	0.29	0.67	2.55	0.62	1.31	0.14	0.40	1.86	0.45	1.04	0.25	5.45	1.33
34年目	H 62	0.98881	0.99238	1.00193	0.99064	0.2343	92.1000	1.57	0.29	0.67	2.53	0.59	1.30	0.14	0.40	1.84	0.43	1.03	0.24	5.40	1.27
35年目	H 63	0.98870	0.99233	1.00193	0.99056	0.2253	92.1000	1.55	0.29	0.67	2.51	0.57	1.28	0.14	0.40	1.83	0.41	1.02	0.23	5.36	1.21
36年目	H 64	0.98858	0.99227	1.00192	0.99048	0.2166	92.1000	1.53	0.29	0.67	2.49	0.54	1.27	0.13	0.41	1.81	0.39	1.01	0.22	5.32	1.15
37年目	H 65	0.98847	0.99222	1.00192	0.99040	0.2083	92.1000	1.51	0.28	0.68	2.47	0.52	1.26	0.13	0.41	1.80	0.37	1.00	0.21	5.27	1.10
38年目	H 66	0.98835	0.99216	1.00192	0.99032	0.2003	92.1000	1.50	0.28	0.68	2.46	0.49	1.24	0.13	0.41	1.78	0.36	0.99	0.20	5.23	1.05
39年目	H 67	0.98824	0.99211	1.00191	0.99023	0.1926	92.1000	1.48	0.28	0.68	2.44	0.47	1.23	0.13	0.41	1.77	0.34	0.98	0.19	5.19	1.00
40年目	H 68	0.98812	0.99205	1.00191	0.99015	0.1852	92.1000	1.46	0.28	0.68	2.42	0.45	1.21	0.13	0.41	1.75	0.32	0.98	0.18	5.14	0.95
41年目	H 69	0.98801	0.99200	1.00191	0.99007	0.1780	92.1000	1.44	0.27	0.68	2.40	0.43	1.20	0.13	0.41	1.74	0.31	0.97	0.17	5.10	0.91
42年目	H 70	0.98789	0.99194	1.00190	0.98999	0.1712	92.1000	1.43	0.27	0.68	2.38	0.41	1.18	0.13	0.41	1.72	0.29	0.96	0.16	5.06	0.87
43年目	H 71	0.98778	0.99189	1.00190	0.98991	0.1646	92.1000	1.41	0.27	0.68	2.36	0.39	1.17	0.13	0.41	1.71	0.28	0.95	0.16	5.02	0.83
44年目	H 72	0.98767	0.99184	1.00190	0.98983	0.1583	92.1000	1.39	0.27	0.69	2.35	0.37	1.15	0.13	0.41	1.69	0.27	0.94	0.15	4.97	0.79
45年目	H 73	0.98755	0.99178	1.00189	0.98975	0.1522	92.1000	1.37	0.27	0.69	2.33	0.35	1.14	0.13	0.41	1.68	0.26	0.93	0.14	4.93	0.75
46年目	H 74	0.98744	0.99173	1.00189	0.98967	0.1463	92.1000	1.36	0.26	0.69	2.31	0.34	1.13	0.12	0.41	1.66	0.24	0.92	0.13	4.89	0.72
47年目	H 75	0.98732	0.99167	1.00189	0.98959	0.1407	92.1000	1.34	0.26	0.69	2.29	0.32	1.11	0.12	0.41	1.65	0.23	0.91	0.13	4.85	0.68
48年目	H 76	0.98721	0.99162	1.00188	0.98950	0.1353	92.1000	1.32	0.26	0.69	2.27	0.31	1.10	0.12	0.41	1.63	0.22	0.90	0.12	4.80	0.65
49年目	H 77	0.98709	0.99156	1.00188	0.98942	0.1301	92.1000	1.31	0.26	0.69	2.25	0.29	1.08	0.12	0.42	1.62	0.21	0.89	0.12	4.76	0.62
合計								85.85	15.94	34.82	136.62	57.57	71.18	7.53	20.91	99.61	42.03	56.33	23.87	292.57	123.47

様式記入上の留意点

1. 再評価の場合、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。
