

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	釧路中標津道路（一般国道272号） 上別保道路
事業主体	北海道開発局

●事業の効果や必要性の評価評価に対応する事後評価項目

政策目標	指標（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更）	指標チェックの根拠	
1. 活力	円滑なモビリティの確保	<input type="radio"/> 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率	
		<input type="radio"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況	
		<input type="radio"/> 現道又は並行区間等における踏切道の除却もしくは交通改善の状況	
		<input type="radio"/> 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況	
		<input type="radio"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況	
		<input type="radio"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況	
	物流効率化の支援	<input type="radio"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上の状況	
		<input checked="" type="radio"/> 農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況	・農林水産業を主体とする地域：羅臼町、標津町、別海町、中標津町 ・主な出荷品：水産品（ほたて貝・さけの水揚量：3.8万t（R3））、生乳（出荷量：6.8万t（R3））、飼料 ・主な出荷先：水産品（釧路市内の水産加工工場や苫小牧港、函館水産加工工場等から道外）、生乳（釧路港や苫小牧港から道外）、飼料（釧路港から後背圏）
		<input type="checkbox"/> 現道等における総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消	
	都市の再生	<input type="radio"/> 都市再生プロジェクトの支援に関する効果	
		<input type="radio"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路が形成（又は一部形成）されたことによる効果	
		<input type="radio"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果	
<input type="radio"/> 中心市街地内で行われたことによる効果			
<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である			
<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上			
<input type="checkbox"/> 対象区間が事業実施前に連絡道路がなかった住宅地開発（300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上）への連絡道路となった			

1. 活力	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり	
		<input checked="" type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	対象路線：釧路中標津道路の一部を形成
		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間が解消	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間が解消	
		<input type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況	
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況	
		<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果	
		<input type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上による効果	
<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果			
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車利用空間が整備されたことによる当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性向上の状況	
		<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化された	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において新たに無電柱化を達成	
安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上の状況	対象自治体名：中標津町、標津町、羅臼町 対象となる三次医療施設：市立釧路総合病院、二次医療施設：釧路孝仁会記念病院、釧路労災病院、釧路赤十字病院、道東勤医協釧路協立病院	
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況	急カーブ（11箇所）や急勾配（3箇所）の線形不良区間が解消されたほか、死傷事故件数が約5割減少するなど、道路交通の安全性向上に寄与 （死傷事故平均件数 開通前（H8～H27）：1.3件/年 → 開通後（R1～R3）：0.7件/年）
		<input type="checkbox"/> 歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落が解消	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	第一次緊急輸送道路として位置づけあり
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成	代替する緊急輸送道路：国道44号 代替する区間：帯広・道央方面～厚岸・根室方面間
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間が解消	

4. 環境	地球環境の 保全	○ 対象道路の整備により、削減される自動車からのCO2排出量	
	生活環境の 改善・保全	○ 現道等における自動車からのNO2排出削減率	
		○ 現道等における自動車からのSPM排出削減率	
		○ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況	
		○ その他、環境や景観上の効果	
5. その他	他のプロジェクト との関係	○ 関連する大規模道路事業との一体的整備の必要性または一体的整備による効果	
		○ 他機関との連携プログラムに関する効果	
	その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>● その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果</li> </ul>	<p>【地吹雪に起因する交通障害の緩和】</p> <p>整備効果：地吹雪等を起因とした通行止めの回避  (開通前 (H16-H30)：通行規制5回、総通行規制時間111.3時間→開通後 (R1-R4)：通行規制0回、総通行規制時間0時間)</p>

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拵・BP・その他の別
釧路中標津道路 (一般国道272号)	上別保道路	L=7.8Km	地域高規格	B P

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
5,700~6,000	2	北海道開発局

## ① 費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和5年度			
単純合計	50億円	15億円		65億円
基準年における 現在価値(C)	77億円	8.1億円		85億円

## ② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和5年度			
供用年	令和元年度			
単年便益 (初年便益)	5.8億円	0.62億円	0.03億円	6.5億円
基準年における 現在価値(B)	139億円	15億円	0.70億円	155億円

## ③ 結果

費用便益比(B / C)	1.8
経済的純現在価値(B - C)	70億円
経済的内部収益率(EIRR)	7.5%

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

## 交通状況の変化

事業名: 上別保道路


(推計時点 R22年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 7.8km	交通量	[台/日]	0	5,900	
	走行時間	[分]	0.0	7.9	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	9.69	
②主な 周辺道路	現道: 国道272号 8.9km	交通量	[台/日]	4,600	0
		走行時間	[分]	12.6	0.0
		走行時間費用	[億円/年]	12.02	0.00
	国道44号 13.8km	交通量	[台/日]	7,400	6,300
		走行時間	[分]	31.7	29.5
		走行時間費用	[億円/年]	47.28	37.27
	国道391号 22.1km	交通量	[台/日]	7,800	7,700
		走行時間	[分]	34.2	33.9
		走行時間費用	[億円/年]	52.21	50.87
③その他道路合計 26,372.6km		走行時間費用	[億円/年]	20,149.37	20,157.86

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計: 26,425.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	20,260.88	20,255.69	5.19

事業名:上別保道路

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)】

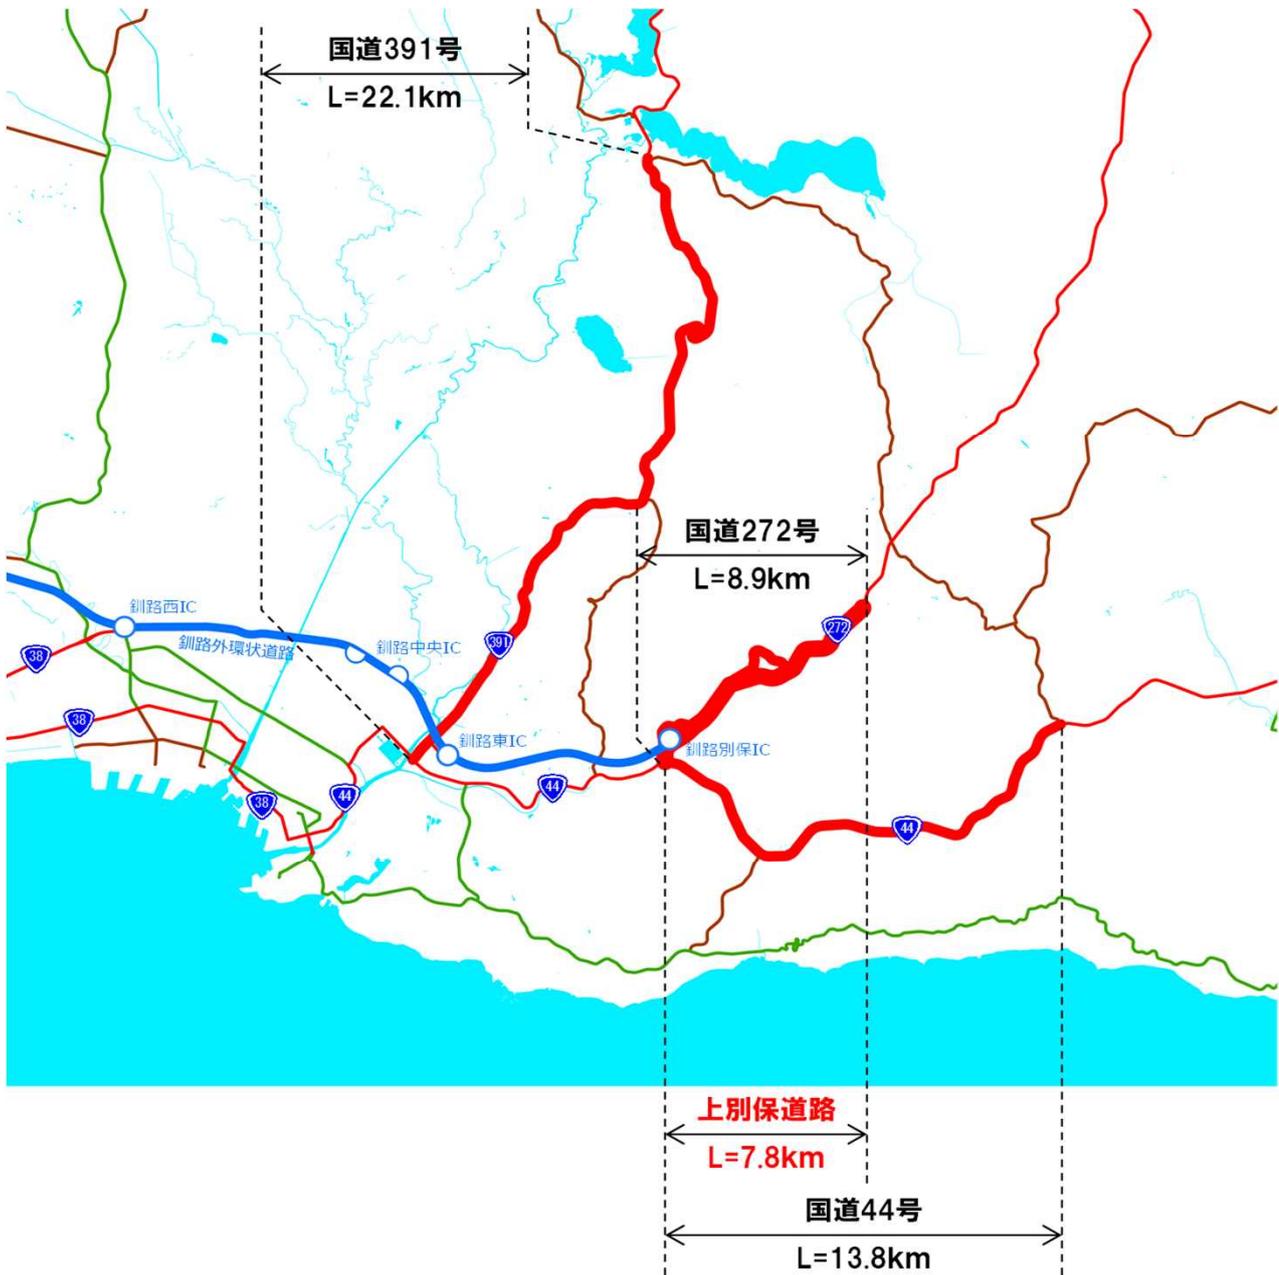

## 費用便益分析の条件

事業名:上別保道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)	■	
	その他	□	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和5年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	■(R22)	
	複数時点での推計	□	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	■	
	整備の有無のいずれかのみ推計	□有 □無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	■ (H27センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	□	
	その他( )	□	
開発交通量の考慮	無	■	
	有	□	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ( )台トリップ/日 考慮した理由を記載	
交通 配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	□	
	転換率式を用いた配分	□	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	■	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	□	
	簡易手法	□	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	□
		山間部海岸部で併行道路が少ない	□
		その他( )	
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
その他( )	□		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	■	
	採用理由を記載 交通容量未満・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の生ずる加重平均速度を用いた。		
	最終配分の速度	□	
	採用理由を記載		
その他( )	□		

事業名: 上別保道路

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数	( )%
	休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載			
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	( )日
			採用した通行止め日数の考え方を記載	
とり止め交通を考慮する		<input type="checkbox"/>		
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載				
冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>		
	考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する場合のみ	採用した冬期日数	(95)日	
		採用した冬期日数の考え方を記載		
		当該地域の直近3か年(令和2年~令和4年)における最低気温0°C以下かつ積雪1cm以上を満たす日数とし、95日と設定		
冬期の走行速度と交通容量の関係				
設定の考え方を記載				
Vmax、Vminについて低減				
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ( )	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				



## 費用の現在価値算定表

				維持管理費の単純価値の算出(消費税相当額含む)					
箇所名: 釧路中標津道路(一般国道272号) 上別保道路				単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)			
				0.044	7.8	0.34			
年次	年度	割引率 4.0%	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-12年目	H 19	1.8730	102.10	0.96	1.80				
-11年目	H 20	1.8009	101.60	0.77	1.39				
-10年目	H 21	1.7317	100.30	2.92	5.14				
- 9年目	H 22	1.6651	98.60	1.56	2.68				
- 8年目	H 23	1.6010	97.20	4.94	8.28				
- 7年目	H 24	1.5395	96.40	9.61	15.62				
- 6年目	H 25	1.4802	96.40	10.37	16.21				
- 5年目	H 26	1.4233	98.70	1.33	1.95				
- 4年目	H 27	1.3686	100.20	9.45	13.14				
- 3年目	H 28	1.3159	100.20	4.54	6.07				
- 2年目	H 29	1.2653	100.50	1.92	2.46				
- 1年目	H 30	1.2167	100.40	1.39	1.71				
供用開始年次	R 1	1.1699	101.20	0.18	0.21	0.31	0.36		
1年目	R 2	1.1249	101.90			0.31	0.35		
2年目	R 3	1.0816	101.80			0.31	0.33		
3年目	R 4	1.0400	101.80			0.31	0.32		
4年目	R 5	1.0000	101.80			0.31	0.31		
5年目	R 6	0.9615	101.80			0.31	0.30		
6年目	R 7	0.9246	101.80			0.31	0.29		
7年目	R 8	0.8890	101.80			0.31	0.27		
8年目	R 9	0.8548	101.80			0.31	0.26		
9年目	R 10	0.8219	101.80			0.31	0.25		
10年目	R 11	0.7903	101.80			0.31	0.24		
11年目	R 12	0.7599	101.80			0.31	0.23		
12年目	R 13	0.7307	101.80			0.31	0.23		
13年目	R 14	0.7026	101.80			0.31	0.22		
14年目	R 15	0.6756	101.80			0.31	0.21		
15年目	R 16	0.6496	101.80			0.31	0.20		
16年目	R 17	0.6246	101.80			0.31	0.19		
17年目	R 18	0.6006	101.80			0.31	0.19		
18年目	R 19	0.5775	101.80			0.31	0.18		
19年目	R 20	0.5553	101.80			0.31	0.17		
20年目	R 21	0.5339	101.80			0.31	0.17		
21年目	R 22	0.5134	101.80			0.31	0.16		
22年目	R 23	0.4936	101.80			0.31	0.15		
23年目	R 24	0.4746	101.80			0.31	0.15		
24年目	R 25	0.4564	101.80			0.31	0.14		
25年目	R 26	0.4388	101.80			0.31	0.14		
26年目	R 27	0.4220	101.80			0.31	0.13		
27年目	R 28	0.4057	101.80			0.31	0.13		
28年目	R 29	0.3901	101.80			0.31	0.12		
29年目	R 30	0.3751	101.80			0.31	0.12		
30年目	R 31	0.3607	101.80			0.31	0.11		
31年目	R 32	0.3468	101.80			0.31	0.11		
32年目	R 33	0.3335	101.80			0.31	0.10		
33年目	R 34	0.3207	101.80			0.31	0.10		
34年目	R 35	0.3083	101.80			0.31	0.10		
35年目	R 36	0.2965	101.80			0.31	0.09		
36年目	R 37	0.2851	101.80			0.31	0.09		
37年目	R 38	0.2741	101.80			0.31	0.08		
38年目	R 39	0.2636	101.80			0.31	0.08		
39年目	R 40	0.2534	101.80			0.31	0.08		
40年目	R 41	0.2437	101.80			0.31	0.08		
41年目	R 42	0.2343	101.80			0.31	0.07		
42年目	R 43	0.2253	101.80			0.31	0.07		
43年目	R 44	0.2166	101.80			0.31	0.07		
44年目	R 45	0.2083	101.80			0.31	0.06		
45年目	R 46	0.2003	101.80			0.31	0.06		
46年目	R 47	0.1926	101.80			0.31	0.06		
47年目	R 48	0.1852	101.80			0.31	0.06		
48年目	R 49	0.1780	101.80			0.31	0.06		
49年目	R 50	0.1712	101.80	-0.15	-0.03	0.31	0.05		
合計				49.79	76.63	15.45	8.08	0.00	0.00
単純事業費計				49.93		15.45		0.00	

注1) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名: 釧路中標津道路(一般国道272号)上別保道路

年次	年度 (基準年) R5	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				割引率 4.0% (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 ①~③	現在価値 割引率4.0%
供用開始年次	R 1	0.99538	0.97730	0.99872	0.99328	1.1699	101.20	3.24	0.62	1.96	5.83	6.86	0.20	0.06	0.36	0.62	0.73	0.03	0.04	6.48	7.62
1年目	R 2	0.99536	0.97677	0.99872	0.99324	1.1249	101.90	3.23	0.61	1.96	5.80	6.51	0.20	0.06	0.36	0.62	0.69	0.03	0.03	6.44	7.24
2年目	R 3	0.99534	0.97622	0.99871	0.99319	1.0816	101.80	3.21	0.60	1.96	5.76	6.23	0.20	0.05	0.36	0.61	0.67	0.03	0.03	6.41	6.93
3年目	R 4	0.99531	0.97564	0.99871	0.99314	1.0400	101.80	3.20	0.58	1.95	5.73	5.96	0.20	0.05	0.36	0.61	0.64	0.03	0.03	6.37	6.63
4年目	R 5	0.99529	0.97503	0.99871	0.99310	1.0000	101.80	3.18	0.57	1.95	5.70	5.70	0.20	0.05	0.36	0.61	0.61	0.03	0.03	6.34	6.34
5年目	R 6	0.99527	0.97439	0.99871	0.99305	0.9615	101.80	3.17	0.55	1.95	5.67	5.45	0.20	0.05	0.36	0.61	0.58	0.03	0.03	6.30	6.06
6年目	R 7	0.99525	0.97372	0.99871	0.99300	0.9246	101.80	3.15	0.54	1.95	5.64	5.21	0.20	0.05	0.36	0.60	0.56	0.03	0.03	6.27	5.80
7年目	R 8	0.99523	0.97301	0.99871	0.99295	0.8890	101.80	3.14	0.52	1.94	5.61	4.98	0.20	0.05	0.36	0.60	0.53	0.03	0.03	6.24	5.54
8年目	R 9	0.99520	0.97226	0.99870	0.99290	0.8548	101.80	3.12	0.51	1.94	5.57	4.76	0.20	0.05	0.36	0.60	0.51	0.03	0.02	6.20	5.30
9年目	R 10	0.99518	0.97147	0.99870	0.99285	0.8219	101.80	3.11	0.50	1.94	5.54	4.55	0.20	0.05	0.35	0.60	0.49	0.03	0.02	6.17	5.07
10年目	R 11	0.99516	0.97063	0.99870	0.99280	0.7903	101.80	3.09	0.48	1.94	5.51	4.35	0.20	0.04	0.35	0.59	0.47	0.03	0.02	6.13	4.85
11年目	R 12	0.99401	0.98507	0.99820	0.99354	0.7599	101.80	3.08	0.47	1.93	5.48	4.16	0.19	0.04	0.35	0.59	0.45	0.03	0.02	6.10	4.63
12年目	R 13	0.99397	0.98484	0.99820	0.99349	0.7307	101.80	3.06	0.46	1.93	5.45	3.98	0.19	0.04	0.35	0.59	0.43	0.03	0.02	6.07	4.43
13年目	R 14	0.99393	0.98461	0.99820	0.99345	0.7026	101.80	3.04	0.45	1.93	5.42	3.81	0.19	0.04	0.35	0.59	0.41	0.03	0.02	6.03	4.24
14年目	R 15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	0.6756	101.80	3.02	0.45	1.92	5.39	3.64	0.19	0.04	0.35	0.58	0.39	0.03	0.02	6.00	4.06
15年目	R 16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	0.6496	101.80	3.00	0.44	1.92	5.36	3.48	0.19	0.04	0.35	0.58	0.38	0.03	0.02	5.97	3.88
16年目	R 17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	0.6246	101.80	2.98	0.43	1.92	5.33	3.33	0.19	0.04	0.35	0.58	0.36	0.03	0.02	5.94	3.71
17年目	R 18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	0.6006	101.80	2.96	0.43	1.91	5.31	3.19	0.19	0.04	0.35	0.58	0.35	0.03	0.02	5.91	3.55
18年目	R 19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	0.5775	101.80	2.95	0.42	1.91	5.28	3.05	0.19	0.04	0.35	0.57	0.33	0.03	0.02	5.88	3.39
19年目	R 20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	0.5553	101.80	2.93	0.41	1.91	5.25	2.91	0.18	0.04	0.35	0.57	0.32	0.03	0.01	5.84	3.25
20年目	R 21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	0.5339	101.80	2.91	0.41	1.90	5.22	2.79	0.18	0.04	0.35	0.57	0.30	0.03	0.01	5.81	3.10
21年目	R 22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	0.5134	101.80	2.89	0.40	1.90	5.19	2.66	0.18	0.04	0.35	0.57	0.29	0.03	0.01	5.78	2.97
22年目	R 23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	0.4936	101.80	2.87	0.40	1.90	5.16	2.55	0.18	0.04	0.35	0.56	0.28	0.03	0.01	5.75	2.84
23年目	R 24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	0.4746	101.80	2.84	0.39	1.90	5.13	2.43	0.18	0.04	0.35	0.56	0.27	0.03	0.01	5.72	2.71
24年目	R 25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	0.4564	101.80	2.82	0.39	1.90	5.10	2.33	0.18	0.04	0.35	0.56	0.26	0.03	0.01	5.69	2.60
25年目	R 26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	0.4388	101.80	2.79	0.39	1.89	5.07	2.23	0.18	0.04	0.35	0.56	0.24	0.03	0.01	5.65	2.48
26年目	R 27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	0.4220	101.80	2.77	0.38	1.89	5.04	2.13	0.17	0.03	0.35	0.56	0.23	0.02	0.01	5.62	2.37
27年目	R 28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	0.4057	101.80	2.74	0.38	1.89	5.01	2.03	0.17	0.03	0.35	0.55	0.22	0.02	0.01	5.59	2.27
28年目	R 29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	0.3901	101.80	2.72	0.38	1.89	4.98	1.94	0.17	0.03	0.35	0.55	0.22	0.02	0.01	5.56	2.17
29年目	R 30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	0.3751	101.80	2.69	0.37	1.89	4.95	1.86	0.17	0.03	0.35	0.55	0.21	0.02	0.01	5.53	2.07
30年目	R 31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	0.3607	101.80	2.67	0.37	1.89	4.92	1.78	0.17	0.03	0.35	0.55	0.20	0.02	0.01	5.49	1.98
31年目	R 32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	0.3468	101.80	2.64	0.37	1.89	4.89	1.70	0.17	0.03	0.35	0.55	0.19	0.02	0.01	5.46	1.89
32年目	R 33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	0.3335	101.80	2.61	0.36	1.89	4.86	1.62	0.17	0.03	0.34	0.54	0.18	0.02	0.01	5.43	1.81
33年目	R 34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	0.3207	101.80	2.59	0.36	1.88	4.83	1.55	0.16	0.03	0.34	0.54	0.17	0.02	0.01	5.40	1.73
34年目	R 35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	0.3083	101.80	2.56	0.36	1.88	4.80	1.48	0.16	0.03	0.34	0.54	0.17	0.02	0.01	5.37	1.65
35年目	R 36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	0.2965	101.80	2.54	0.35	1.88	4.78	1.42	0.16	0.03	0.34	0.54	0.16	0.02	0.01	5.34	1.58
36年目	R 37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	0.2851	101.80	2.51	0.35	1.88	4.75	1.35	0.16	0.03	0.34	0.53	0.15	0.02	0.01	5.30	1.51
37年目	R 38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	0.2741	101.80	2.49	0.35	1.88	4.72	1.29	0.16	0.03	0.34	0.53	0.15	0.02	0.01	5.27	1.44
38年目	R 39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	0.2636	101.80	2.46	0.34	1.88	4.69	1.24	0.16	0.03	0.34	0.53	0.14	0.02	0.01	5.24	1.38
39年目	R 40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	0.2534	101.80	2.44	0.34	1.88	4.66	1.18	0.15	0.03	0.34	0.53	0.13	0.02	0.01	5.21	1.32
40年目	R 41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	0.2437	101.80	2.41	0.34	1.88	4.63	1.13	0.15	0.03	0.34	0.53	0.13	0.02	0.01	5.18	1.26
41年目	R 42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	0.2343	101.80	2.39	0.33	1.87	4.60	1.08	0.15	0.03	0.34	0.52	0.12	0.02	0.01	5.14	1.21
42年目	R 43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	0.2253	101.80	2.36	0.33	1.87	4.57	1.03	0.15	0.03	0.34	0.52	0.12	0.02	0.00	5.11	1.15
43年目	R 44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	0.2166	101.80	2.34	0.33	1.87	4.54	0.98	0.15	0.03	0.34	0.52	0.11	0.02	0.00	5.08	1.10
44年目	R 45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	0.2083	101.80	2.31	0.32	1.87	4.51	0.94	0.15	0.03	0.34	0.52	0.11	0.02	0.00	5.05	1.05
45年目	R 46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	0.2003	101.80	2.29	0.32	1.87	4.48	0.90	0.14	0.03	0.34	0.52	0.10	0.02	0.00	5.02	1.00
46年目	R 47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	0.1926	101.80	2.26	0.32	1.87	4.45	0.86	0.14	0.03	0.34	0.51	0.10	0.02	0.00	4.98	0.96
47年目	R 48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	0.1852	101.80	2.24	0.31	1.87	4.42	0.82	0.14	0.03	0.34	0.51	0.09	0.02	0.00	4.95	0.92
48年目	R 49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	0.1780	101.80	2.21	0.31	1.87	4.39										
