

(再評価)

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道158号 大野油坂道路 (大野・大野東区間)
事業主体	近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<ul style="list-style-type: none"> ■ 便益が費用を上回っている 	全事業：費用便益比 (B/C) = 1.7 (経済的純現在価値 (B-C) = 156億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 7.7%) 残事業：費用便益比 (B/C) = 1.9 (経済的純現在価値 (B-C) = 183億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 9.2%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	<ul style="list-style-type: none"> ■ 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率 	区間a (費用便益分析対象区間) について 渋滞損失時間 (現況) : 78528万人・時間/年 渋滞損失削減時間 : 33万人・時間/年 (145425万人・時間/年⇒145392万人・時間/年) 区間b (当該区間/並行区間) について : 一般国道158号 一般国道157号 (県) 五条方松原出勝山線 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失時間 : 11万人・時間/年 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失削減率 : 8割削減
		<ul style="list-style-type: none"> □ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される 	
		<ul style="list-style-type: none"> □ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上での踏切道の除却もしくは交通改善が期待される 	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 	大野市市営バス (和泉線、白山線)
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる 	大野市 (旧和泉村役場) ~ 福井駅 (所要時間 : 67分→61分)
		<ul style="list-style-type: none"> □ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 	
	物流効率化の支援	<ul style="list-style-type: none"> □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる 	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる 	大野市 (さといも)、主な出荷先 福井市 (福井市中央卸売市場)、岐阜市 (岐阜市中央卸売市場)	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する 	総重量25tの車両・ISO規格背高海上コンテナ輸送車 通行規制 (国道158号 (大野市中津川~東市布間))	

1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
		<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
		<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	長野県松本市～福井県福井市間(中部縦貫自動車道の一部を構成)
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	大野市(旧和泉村役場)～大野市(所要時間:34分→33分)
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	越前美濃街道広域観光交流の支援、越前おおの観光戦略ビジョン、大野市和泉地区化石保全活用計画、越前おおのブランド戦略
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	大野まちなか観光(年間観光客入込数:883千人/年 H30年)、九頭竜湖(年間観光客入込数:291千人/年 H30年)
		<input type="checkbox"/> 特別立法に基づく事業である	
		<input checked="" type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	道の駅「結の故郷」
		<input type="checkbox"/> 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業である	
	2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる
<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される			
無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり		
	<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)等の幹線道路において新たに無電柱化を達成する		
安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	大野市(旧和泉村役場)～福井県立病院(所要時間:65分→59分)	

3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量が100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	道路防災情報Webマップ（緊急輸送道路）
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	国道158号（大野市中津川～大野市下唯野区間）
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	
<input type="checkbox"/> 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する			
<input type="checkbox"/> 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす			
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量:6039.07t-CO2/年
	生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	(推計結果) 評価対象区間(現道/平行区間等):一般国道158号 一般国道157号(県)五条方松原出勝山線 排出削減量:13.4t/年、排出削減率:7割削減 (バイパス事業の場合)バイパス等についてNOx排出増加量:15.05t/年
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	(推計結果) 評価対象区間(現道/平行区間等):一般国道158号 一般国道157号(県)五条方松原出勝山線 排出削減量:0.77t/年、排出削減率:7割削減 (バイパス事業の場合)バイパス等についてSPM排出増加量:0.82t/年
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	
		<input checked="" type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	中部縦貫自動車道の一部であり、隣接する永平寺大野道路(L=26.4km、全線開通済)、油坂峠道路(L=11.3km、全線開通済)と一体的に整備する必要がある
		<input checked="" type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	第五次大野市総合計画 後期基本計画(中部縦貫自動車道の整備促進) 大野市都市マスタープラン(中部縦貫自動車道の整備促進) 福井県民の将来ビジョン(中部縦貫自動車道の整備促進) 福井ふるさと元氣宣言(中部縦貫自動車道の整備促進) 道路の中期計画(近畿地方版)(高規格道路の整備)
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

(再評価)

様式-2

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道158号	中部縦貫自動車道	L=61.4km	高規格	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
12,900	2、4	近畿地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	令和1年度		
単純合計	3,531億円	903億円	4,434億円
うち残事業分	1,717億円	729億円	2,447億円
基準年における 現在価値(C)	4,066億円	304億円	4,371億円
うち残事業分	1,502億円	236億円	1,738億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和1年度			
供用年	平成6年度、平成19年度、平成21年度、平成25年度、平成27年度、平成30年度、令和5年度、令和6年度、令和7年度、令和10年度			
単年便益 (初年便益)	4.7億円	0.32億円	0.21億円	5.3億円
基準年における 現在価値(B)	3,991億円	560億円	100億円	4,651億円
うち残事業分	1,652億円	214億円	27億円	1,893億円

注) 「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。

③ 結 果

費用便益比（事業全体）	1.1
経済的純現在価値（事業全体）	280億円
経済的内部収益率（事業全体）	4.4%
費用便益比（残事業）	1.1
経済的純現在価値（残事業）	155億円
経済的内部収益率（残事業）	4.8%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	12,900台/日	±10%	0.89~1.3
事業費	1,717億円	±10%	1.03~1.1
事業期間	8年	±20%	0.97~1.1

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	12,900台/日	±10%	0.94~1.3
事業費	1,717億円	±10%	1.00~1.2
事業期間	8年	±20%	1.03~1.1

交通状況の変化

様式-3①

事業名：中部縦貫自動車道（事業全体）

（推計時点 令和12年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 (61.4km)	交通量 ^{※1}	[台/日]	0	12,900	
	走行時間 ^{※2}	[分]	0	61	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	0.00	147.68	
②主な周辺道路 ^{※4}	一般国道 416号 (20.7km)	交通量	[台/日]	15,900	9,500
		走行時間	[分]	43	34
		走行時間費用	[億円/年]	123.79	59.49
	一般国道 158号 (85.0km)	交通量	[台/日]	6,500	3,800
		走行時間	[分]	143	131
		走行時間費用	[億円/年]	167.99	84.53
	一般国道 157号 (11.3km)	交通量	[台/日]	6,200	5,000
		走行時間	[分]	16	16
		走行時間費用	[億円/年]	18.16	13.65
	(主) 勝山 丸岡線 (9.2km)	交通量	[台/日]	1,400	600
		走行時間	[分]	16	16
		走行時間費用	[億円/年]	4.20	1.85
	(県) 五条方 松原出勝山 線 (6.6km)	交通量	[台/日]	600	0
		走行時間	[分]	9	0
		走行時間費用	[億円/年]	1.06	0.00
③その他道路合計 (26,493.3km)	走行時間費用	[億円/年]	90,839.26	90,665.60	

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：26,687.5km	走行時間短縮便益	[億円/年]	91,154.46	90,972.80	181.66

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること



交通状況の変化

様式－3①

事業名：中部縦貫自動車道（残事業）

（推計時点 令和12年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 (61.4km)	交通量 ^{※1}	[台/日]	9,800	12,900	
	走行時間 ^{※2}	[分]	24	61	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	41.99	147.68	
②主な周辺道路 ^{※4}	一般国道416号 (20.7km)	交通量	[台/日]	10,700	9,500
		走行時間	[分]	36	34
		走行時間費用	[億円/年]	69.23	59.49
	一般国道158号 (85.0km)	交通量	[台/日]	5,600	3,800
		走行時間	[分]	142	131
		走行時間費用	[億円/年]	140.32	84.53
	一般国道157号 (11.3km)	交通量	[台/日]	5,700	5,000
		走行時間	[分]	16	16
		走行時間費用	[億円/年]	15.85	13.65
	(主)勝山丸岡線 (9.2km)	交通量	[台/日]	600	600
		走行時間	[分]	16	16
		走行時間費用	[億円/年]	1.68	1.85
	(県)五条方松原出勝山線 (6.6km)	交通量	[台/日]	200	0
		走行時間	[分]	9	0
		走行時間費用	[億円/年]	0.37	0.00
③その他道路合計 (26,493.3km)	走行時間費用	[億円/年]	90,803.51	90,665.60	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：26,687.5km	走行時間短縮便益	[億円/年]	91,072.95	90,972.80	100.15

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること



費用便益分析の条件

事業名：中部縦貫自動車道

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	令和1年
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (令和12年)
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H22全国道路・街路 交通情勢調査)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
	その他()	<input type="checkbox"/>
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有	<input type="checkbox"/>
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載 ()台トリップ/日
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定	<input type="checkbox"/>
	採用理由を記載	
	最終配分の速度	<input checked="" type="checkbox"/>
	採用理由を記載	分割回毎の極端な速度差が生じないBPR関数の適用に併せて、最終速度を採用。
その他()	<input type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

項目		チェック欄	
休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
		対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
		採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
	考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載 過去10年の実績値より算出	(11) 日
		とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他 ()	<input type="checkbox"/>	
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>	
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>	
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>	
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>	
その他			

便益の算定

費用の現在価値算定表(事業全体)

		維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)					
		単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)	
		0.37		61.4		22.50	
年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-38年目	H 2	3.1187	113.3	0.97	2.75		
-37年目	H 3	2.9987	116.0	1.01	2.69		
-36年目	H 4	2.8834	117.6	1.11	2.80		
-35年目	H 5	2.7725	117.9	2.94	7.13		
部分供用開始	H 6	2.6658	117.8	12.51	29.15		
部分1年目	H 7	2.5633	117.1	16.00	36.07		
部分2年目	H 8	2.4647	116.6	13.12	28.57		
部分3年目	H 9	2.3699	117.5	34.97	72.65		
部分4年目	H 10	2.2788	116.9	40.91	82.14		
部分5年目	H 11	2.1911	115.2	51.19	100.28		
部分6年目	H 12	2.1068	113.8	61.10	116.50		
部分7年目	H 13	2.0258	112.4	50.49	93.74		
部分8年目	H 14	1.9479	110.5	33.87	61.50		
部分9年目	H 15	1.8730	109.0	43.72	77.38		
部分10年目	H 16	1.8009	107.9	51.76	88.98		
部分11年目	H 17	1.7317	106.7	36.78	61.49		
部分12年目	H 18	1.6651	105.9	44.76	72.49		
部分13年目	H 19	1.6010	105.0	88.64	139.21		
部分14年目	H 20	1.5395	104.4	74.43	113.04		
部分15年目	H 21	1.4802	103.0	80.90	119.75		
部分16年目	H 22	1.4233	101.3	103.36	149.58		
部分17年目	H 23	1.3686	99.8	81.09	114.54		
部分18年目	H 24	1.3159	99.0	123.97	169.72		
部分19年目	H 25	1.2653	99.0	82.05	108.01		
部分20年目	H 26	1.2167	101.5	71.08	87.77		
部分21年目	H 27	1.1699	103.0	36.73	42.97		
部分22年目	H 28	1.1249	102.8	87.01	98.07		
部分23年目	H 29	1.0816	103.0	128.62	139.11		
部分24年目	H 30	1.0400	103.0	161.24	167.68		
部分25年目	R 1	1.0000	103.0	196.95	196.95		
部分26年目	R 2	0.9615	103.0	256.15	246.29		
部分27年目	R 3	0.9246	103.0	319.77	295.66		
部分28年目	R 4	0.8890	103.0	356.11	316.58		
部分供用開始	R 5	0.8548	103.0	351.04	300.07		
部分供用開始	R 6	0.8219	103.0	280.03	230.15		
部分供用開始	R 7	0.7903	103.0	18.18	14.37		
部分32年目	R 8	0.7599	103.0	72.73	55.27		
部分33年目	R 9	0.7307	103.0	63.32	46.27		
供用開始年次	R 10	0.7026	103.0			20.45	14.37
1年目	R 11	0.6756	103.0			20.45	13.82
2年目	R 12	0.6496	103.0			20.45	13.29
3年目	R 13	0.6246	103.0			20.45	12.78
4年目	R 14	0.6006	103.0			20.45	12.29
5年目	R 15	0.5775	103.0			20.45	11.81
6年目	R 16	0.5553	103.0			20.45	11.36
7年目	R 17	0.5339	103.0			20.45	10.92
8年目	R 18	0.5134	103.0			20.45	10.50
9年目	R 19	0.4936	103.0			20.45	10.10
10年目	R 20	0.4746	103.0			20.45	9.71
11年目	R 21	0.4564	103.0			20.45	9.34
12年目	R 22	0.4388	103.0			20.45	8.98
13年目	R 23	0.4220	103.0			20.45	8.63
14年目	R 24	0.4057	103.0			20.45	8.30
15年目	R 25	0.3901	103.0			20.45	7.98
16年目	R 26	0.3751	103.0			20.10	7.54
17年目	R 27	0.3607	103.0			20.10	7.25
18年目	R 28	0.3468	103.0			20.10	6.97
19年目	R 29	0.3335	103.0			20.10	6.70
20年目	R 30	0.3207	103.0			20.10	6.45
21年目	R 31	0.3083	103.0			20.10	6.20
22年目	R 32	0.2965	103.0			20.10	5.96
23年目	R 33	0.2851	103.0			20.10	5.73
24年目	R 34	0.2741	103.0			20.10	5.51
25年目	R 35	0.2636	103.0			20.10	5.30
26年目	R 36	0.2534	103.0			20.10	5.09
27年目	R 37	0.2437	103.0			20.10	4.90
28年目	R 38	0.2343	103.0			20.10	4.71
29年目	R 39	0.2253	103.0			19.82	4.47
30年目	R 40	0.2166	103.0			19.82	4.29
31年目	R 41	0.2083	103.0			18.26	3.80
32年目	R 42	0.2003	103.0			18.26	3.66
33年目	R 43	0.1926	103.0			18.26	3.52
34年目	R 44	0.1852	103.0			18.26	3.38
35年目	R 45	0.1780	103.0			16.72	2.98
36年目	R 46	0.1712	103.0			16.72	2.86
37年目	R 47	0.1646	103.0			16.28	2.68
38年目	R 48	0.1583	103.0			16.28	2.58
39年目	R 49	0.1522	103.0			16.28	2.48
40年目	R 50	0.1463	103.0			15.24	2.23
41年目	R 51	0.1407	103.0			15.24	2.14
42年目	R 52	0.1353	103.0			15.24	2.06
43年目	R 53	0.1301	103.0			15.24	1.98
44年目	R 54	0.1251	103.0	-15.13	-1.89	15.24	1.91
45年目	R 55	0.1203	103.0	-30.20	-3.63	15.24	1.83
46年目	R 56	0.1157	103.0	-1.89	-0.22	10.12	1.17
47年目	R 57	0.1112	103.0			6.07	0.68
48年目	R 58	0.1069	103.0			6.07	0.65
49年目	R 59	0.1028	103.0	-148.37	-15.25	6.07	0.62
合計				3335.00	4066.38	903.29	304.46
単純事業費計				3530.59		903.29	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)
 注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道158号 中部縦貫自動車道

				単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)	
				0.27	61.4	16.76	
年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-8年目	R 2	0.9615	103.0	256.15	246.29		
-7年目	R 3	0.9246	103.0	319.77	295.66		
-6年目	R 4	0.8890	103.0	356.11	316.58		
部分供用開始	R 5	0.8548	103.0	351.04	300.07		
部分供用開始	R 6	0.8219	103.0	280.03	230.15		
部分供用開始	R 7	0.7903	103.0	18.18	14.37		
部分3年目	R 8	0.7599	103.0	72.73	55.27		
部分4年目	R 9	0.7307	103.0	63.32	46.27		
供用開始年次	R 10	0.7026	103.0			15.24	10.71
1年目	R 11	0.6756	103.0			15.24	10.29
2年目	R 12	0.6496	103.0			15.24	9.90
3年目	R 13	0.6246	103.0			15.24	9.52
4年目	R 14	0.6006	103.0			15.24	9.15
5年目	R 15	0.5775	103.0			15.24	8.80
6年目	R 16	0.5553	103.0			15.24	8.46
7年目	R 17	0.5339	103.0			15.24	8.13
8年目	R 18	0.5134	103.0			15.24	7.82
9年目	R 19	0.4936	103.0			15.24	7.52
10年目	R 20	0.4746	103.0			15.24	7.23
11年目	R 21	0.4564	103.0			15.24	6.95
12年目	R 22	0.4388	103.0			15.24	6.69
13年目	R 23	0.4220	103.0			15.24	6.43
14年目	R 24	0.4057	103.0			15.24	6.18
15年目	R 25	0.3901	103.0			15.24	5.94
16年目	R 26	0.3751	103.0			15.24	5.72
17年目	R 27	0.3607	103.0			15.24	5.50
18年目	R 28	0.3468	103.0			15.24	5.28
19年目	R 29	0.3335	103.0			15.24	5.08
20年目	R 30	0.3207	103.0			15.24	4.89
21年目	R 31	0.3083	103.0			15.24	4.70
22年目	R 32	0.2965	103.0			15.24	4.52
23年目	R 33	0.2851	103.0			15.24	4.34
24年目	R 34	0.2741	103.0			15.24	4.18
25年目	R 35	0.2636	103.0			15.24	4.02
26年目	R 36	0.2534	103.0			15.24	3.86
27年目	R 37	0.2437	103.0			15.24	3.71
28年目	R 38	0.2343	103.0			15.24	3.57
29年目	R 39	0.2253	103.0			15.24	3.43
30年目	R 40	0.2166	103.0			15.24	3.30
31年目	R 41	0.2083	103.0			15.24	3.17
32年目	R 42	0.2003	103.0			15.24	3.05
33年目	R 43	0.1926	103.0			15.24	2.93
34年目	R 44	0.1852	103.0			15.24	2.82
35年目	R 45	0.1780	103.0			15.24	2.71
36年目	R 46	0.1712	103.0			15.24	2.61
37年目	R 47	0.1646	103.0			15.24	2.51
38年目	R 48	0.1583	103.0			15.24	2.41
39年目	R 49	0.1522	103.0			15.24	2.32
40年目	R 50	0.1463	103.0			15.24	2.23
41年目	R 51	0.1407	103.0			15.24	2.14
42年目	R 52	0.1353	103.0			15.24	2.06
43年目	R 53	0.1301	103.0			15.24	1.98
44年目	R 54	0.1251	103.0	0.00	0.00	15.24	1.91
45年目	R 55	0.1203	103.0	-21.73	-2.61	15.24	1.83
46年目	R 56	0.1157	103.0	-0.74	-0.09	10.12	1.17
47年目	R 57	0.1112	103.0			6.07	0.68
48年目	R 58	0.1069	103.0			6.07	0.65
49年目	R 59	0.1028	103.0	0.00	0.00	6.07	0.62
合計				1694.85	1501.96	729.21	235.62
単純事業費計					1717.32		729.21

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表 (事業全体)

箇所名: 一般国道156号 中部縦貫自動車道

年次	年度 (基準年) R1	総走行台枠の年次別伸び率 (並設内除ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間便益 (億円)				走行経費便益 (億円)				事故減少便益 (億円)			合計		
		乗用車種	小型貨物	普通貨物	全車			費用車種	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 (1×A)	費用車種	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (2×A)	③	現在価値 (3×A)	便益合計 (1~3)	現在価値 (割引率)
部分供用開始	H 6	0.99803	0.99546	1.01518	0.99970	2.6658	117.8	2.75	1.06	0.91	4.72	11.01	0.24	0.01	0.07	0.32	0.74	0.21	0.49	5.25	12.24
部分1年目	H 7	0.99802	0.99544	1.01496	0.99970	2.5633	117.1	2.75	1.05	0.93	4.73	10.65	0.24	0.01	0.07	0.32	0.72	0.21	0.47	5.25	11.85
部分2年目	H 8	0.99802	0.99541	1.01474	0.99970	2.4647	116.6	2.74	1.05	0.94	4.73	10.30	0.23	0.01	0.07	0.32	0.69	0.21	0.46	5.26	11.45
部分3年目	H 9	0.99802	0.99539	1.01452	0.99970	2.3698	115.9	2.73	1.04	0.93	4.73	9.93	0.23	0.01	0.07	0.32	0.66	0.21	0.44	5.26	10.93
部分4年目	H 10	0.99801	0.99537	1.01431	0.99970	2.2788	115.9	2.73	1.04	0.97	4.74	9.51	0.23	0.01	0.07	0.32	0.64	0.21	0.42	5.27	10.58
部分5年目	H 11	0.99801	0.99535	1.01411	0.99970	2.1911	115.2	2.72	1.03	0.98	4.74	9.29	0.23	0.01	0.08	0.32	0.63	0.21	0.41	5.27	10.33
部分6年目	H 12	0.99800	0.99533	1.01392	0.99970	2.1068	113.8	2.72	1.03	1.00	4.74	9.05	0.23	0.01	0.08	0.32	0.61	0.21	0.40	5.28	10.06
部分7年目	H 13	0.99800	0.99531	1.01372	0.99970	2.0258	112.4	2.71	1.03	1.01	4.75	8.81	0.23	0.01	0.08	0.32	0.60	0.21	0.39	5.28	9.80
部分8年目	H 14	0.99800	0.99528	1.01354	0.99970	1.9479	110.5	2.71	1.02	1.02	4.75	8.63	0.23	0.01	0.08	0.32	0.59	0.21	0.38	5.28	9.59
部分9年目	H 15	0.99799	0.99526	1.01336	0.99970	1.8730	109.0	2.70	1.02	1.04	4.75	8.42	0.23	0.01	0.08	0.32	0.57	0.21	0.37	5.29	9.36
部分10年目	H 16	0.99799	0.99524	1.01318	0.99970	1.8009	107.9	2.70	1.01	1.05	4.76	8.18	0.23	0.01	0.08	0.32	0.56	0.21	0.36	5.29	9.10
部分11年目	H 17	0.99798	0.99522	1.01301	0.99970	1.7317	106.7	2.69	1.01	1.06	4.76	7.96	0.23	0.01	0.08	0.32	0.54	0.21	0.35	5.30	8.85
部分12年目	H 18	0.99798	0.99519	1.01284	0.99970	1.6651	105.9	2.69	1.00	1.08	4.77	7.72	0.23	0.01	0.08	0.32	0.53	0.21	0.34	5.30	8.58
部分供用開始	H 19	0.99798	0.99517	1.01268	0.99970	1.6010	105.0	2.69	1.01	1.11	4.78	7.49	0.23	0.01	0.10	0.32	0.52	0.21	0.33	5.31	8.33
部分14年目	H 20	0.99797	0.99515	1.01252	0.99970	1.5395	104.4	2.69	1.01	1.12	4.78	7.27	0.23	0.01	0.10	0.32	0.51	0.21	0.32	5.31	8.08
部分供用開始	H 21	0.99797	0.99512	1.01237	0.99970	1.4802	103.0	2.68	1.02	1.14	4.79	7.06	0.23	0.01	0.11	0.32	0.50	0.21	0.31	5.32	7.84
部分16年目	H 22	0.99797	0.99510	1.01222	0.99970	1.4233	101.3	2.67	1.02	1.15	4.80	6.85	0.23	0.01	0.12	0.32	0.49	0.21	0.30	5.33	7.61
部分17年目	H 23	0.99797	0.99508	1.01207	0.99970	1.3686	99.3	2.67	1.02	1.16	4.80	6.65	0.23	0.01	0.12	0.32	0.48	0.21	0.29	5.34	7.39
部分18年目	H 24	1.00128	0.99632	1.01512	1.00024	1.3159	99.0	2.67	1.01	1.17	4.81	6.45	0.23	0.01	0.13	0.32	0.47	0.21	0.28	5.35	7.17
部分供用開始	H 25	0.99248	0.98754	1.00601	0.99323	1.2653	99.0	2.61	1.03	1.16	4.78	6.25	0.23	0.01	0.13	0.32	0.46	0.21	0.27	5.36	6.95
部分20年目	H 26	0.99248	0.98754	1.00601	0.99323	1.2653	99.0	2.61	1.03	1.16	4.78	6.25	0.23	0.01	0.13	0.32	0.46	0.21	0.27	5.36	6.95
部分22年目	H 27	0.99307	0.98807	1.00625	0.99382	1.1699	103.0	2.57	1.03	1.17	4.79	6.05	0.23	0.01	0.13	0.32	0.45	0.21	0.26	5.37	6.74
部分24年目	H 28	0.99460	0.98957	1.00763	0.99536	1.1249	102.5	2.57	1.03	1.17	4.80	5.85	0.23	0.01	0.13	0.32	0.44	0.21	0.25	5.38	6.53
部分26年目	H 29	0.99616	0.99110	1.00968	0.99692	1.0818	103.0	2.49	1.02	1.16	4.80	5.65	0.23	0.01	0.13	0.32	0.43	0.21	0.24	5.39	6.33
部分供用開始	H 30	0.99694	0.99185	1.00968	0.99770	1.0400	103.0	2.48	1.03	1.17	4.81	5.45	0.23	0.01	0.13	0.32	0.42	0.21	0.23	5.40	6.13
部分25年目	R 1	0.99920	0.99407	1.01180	0.99996	1.0000	103.0	4.13	14.26	26.32	81.71	81.71	5.74	1.51	5.39	12.64	12.64	2.61	2.61	96.96	96.96
部分26年目	R 2	0.99915	0.98700	1.00675	0.99809	0.9615	103.0	4.10	14.18	26.63	81.91	81.91	5.73	1.50	5.45	12.69	12.69	2.61	2.61	97.20	93.46
部分27年目	R 3	0.99915	0.98683	1.00671	0.99809	0.9246	103.0	4.06	13.99	26.81	81.87	79.69	5.73	1.48	5.49	12.70	11.74	2.60	2.41	97.17	89.84
部分28年目	R 4	0.99915	0.98665	1.00666	0.99808	0.8890	103.0	4.03	13.81	26.99	81.83	77.75	5.72	1.46	5.53	12.71	11.30	2.60	2.31	97.14	86.35
部分供用開始	R 5	0.99915	0.98647	1.00662	0.99808	0.8546	103.0	4.02	13.79	27.01	81.79	75.89	5.71	1.45	5.57	12.72	10.87	2.59	2.22	97.10	83.87
部分供用開始	R 6	0.99915	0.98628	1.00658	0.99808	0.8219	103.0	4.01	13.71	27.14	81.74	74.11	5.70	1.44	5.61	12.73	10.44	2.58	2.15	97.01	81.39
部分供用開始	R 7	0.99914	0.98609	1.00653	0.99807	0.7903	103.0	4.00	13.64	27.21	81.69	72.44	5.70	1.43	5.65	12.74	10.01	2.57	2.10	96.92	78.91
部分32年目	R 8	0.99914	0.98590	1.00649	0.99807	0.7599	103.0	4.00	13.57	27.28	81.64	70.77	5.70	1.42	5.69	12.75	9.58	2.56	2.05	96.83	76.42
部分33年目	R 9	0.99914	0.98570	1.00645	0.99806	0.7307	103.0	4.00	13.51	27.35	81.60	69.04	5.70	1.41	5.73	12.76	9.17	2.55	2.00	96.74	73.94
供用開始年次	R 10	0.99914	0.98549	1.00641	0.99806	0.7026	103.0	4.00	13.45	27.42	81.56	67.31	5.70	1.40	5.77	12.77	8.76	2.54	1.95	96.65	71.46
1年目	R 11	0.99914	0.98528	1.00637	0.99806	0.6756	103.0	3.99	13.39	27.49	81.52	65.58	5.70	1.39	5.80	12.78	8.35	2.53	1.90	96.56	69.00
2年目	R 12	0.99917	0.99076	0.99901	0.99806	0.6496	103.0	3.98	13.33	27.56	81.48	63.85	5.70	1.38	5.83	12.79	7.94	2.52	1.85	96.47	66.57
3年目	R 13	0.99910	0.99067	0.99900	0.99806	0.6246	103.0	3.98	13.27	27.63	81.43	62.12	5.70	1.37	5.86	12.80	7.53	2.51	1.80	96.38	64.14
4年目	R 14	0.99913	0.99059	0.99900	0.99806	0.6006	103.0	3.97	13.21	27.69	81.39	60.39	5.70	1.36	5.89	12.81	7.13	2.50	1.75	96.29	61.71
5年目	R 15	0.99917	0.99050	0.99900	0.99806	0.5775	103.0	3.97	13.15	27.76	81.34	58.66	5.70	1.35	5.92	12.82	6.73	2.49	1.70	96.20	59.29
6年目	R 16	0.99917	0.99041	0.99899	0.99806	0.5553	103.0	3.97	13.09	27.82	81.30	56.93	5.70	1.34	5.95	12.83	6.33	2.48	1.65	96.11	56.87
7年目	R 17	0.99913	0.99031	0.99899	0.99807	0.5339	103.0	3.97	13.03	27.88	81.26	55.20	5.70	1.33	5.98	12.84	5.93	2.47	1.60	96.02	54.41
8年目	R 18	0.99916	0.99022	0.99898	0.99807	0.5134	103.0	3.97	12.97	27.94	81.21	53.47	5.70	1.32	6.01	12.85	5.53	2.46	1.55	95.93	51.95
9年目	R 19	0.99914	0.99012	0.99898	0.99807	0.4936	103.0	3.97	12.91	28.00	81.17	51.74	5.70	1.31	6.04	12.86	5.13	2.45	1.50	95.84	49.48
10年目	R 20	0.99914	0.99002	0.99898	0.99807	0.4746	103.0	3.97	12.85	28.06	81.13	50.01	5.70	1.30	6.07	12.87	4.73	2.44	1.45	95.75	47.03
11年目	R 21	0.99913	0.98992	0.99897	0.99807	0.4564	103.0	3.97	12.79	28.12	81.08	48.28	5.70	1.29	6.10	12.88	4.33	2.43	1.40	95.66	44.58
12年目	R 22	0.99916	0.98982	0.99897	0.99806	0.4388	103.0	3.97	12.73	28.17	81.04	46.55	5.70	1.28	6.13	12.89	3.93	2.42	1.35	95.57	42.13
13年目	R 23	0.99919	0.98971	0.99896	0.99806	0.4220	103.0	3.97	12.67	28.22	81.00	44.82	5.70	1.27	6.16	12.90	3.53	2.41	1.30	95.48	39.68
14年目	R 24	0																			

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名： 一般国道158号 中部縦貫自動車道

年次	年度 (基準年) R1	総走行台キロの年次別伸び率 (近畿内陸ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間便益 (億円)					走行経費便益 (億円)					事故減少便益 (億円)			合 計 (億円)		
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 (①)×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (②)×(A)	③	現在価値 (③)×(A)	便益合計 (①~③)		現在価値 割引率4%	
																				①~③	①~③		
部分供用開始	R 5	0.99915	0.98647	1.00662	0.99808	0.8548	103.0	6.72	2.08	5.00	13.80	11.80	0.79	0.26	0.83	1.87	1.60	0.15	0.13	15.83	13.53		
部分供用開始	R 6	0.99915	0.98628	1.00658	0.99808	0.8219	103.0	21.51	4.82	19.12	45.46	37.36	2.66	0.63	3.49	6.77	5.57	0.58	0.48	52.81	43.41		
部分供用開始	R 7	0.99914	0.98609	1.00653	0.99807	0.7903	103.0	39.49	8.95	35.55	83.99	66.38	4.67	0.85	4.71	10.22	8.08	1.26	0.99	95.47	75.45		
部分3年目	R 8	0.99914	0.98590	1.00649	0.99807	0.7599	103.0	39.46	8.83	35.78	84.07	63.88	4.66	0.84	4.74	10.24	7.78	1.25	0.95	95.56	72.62		
部分4年目	R 9	0.99914	0.98570	1.00645	0.99806	0.7307	103.0	39.42	8.70	36.02	84.14	61.48	4.66	0.83	4.77	10.25	7.49	1.25	0.91	95.65	69.89		
供用開始年次	R 10	0.99914	0.98549	1.00641	0.99806	0.7026	103.0	49.20	11.32	39.53	100.06	70.30	4.99	1.15	6.65	12.79	8.99	1.69	1.18	114.54	80.47		
1年目	R 11	0.99914	0.98528	1.00637	0.99806	0.6756	103.0	49.16	11.16	39.79	100.10	67.63	4.99	1.13	6.70	12.82	8.66	1.68	1.14	114.60	77.42		
2年目	R 12	0.99197	0.99076	0.99801	0.99265	0.6496	103.0	49.11	10.99	40.04	100.15	65.06	4.98	1.11	6.74	12.84	8.34	1.68	1.09	114.67	74.49		
3年目	R 13	0.99190	0.99067	0.99800	0.99259	0.6246	103.0	48.72	10.89	39.96	99.57	62.19	4.94	1.10	6.73	12.77	7.98	1.67	1.04	114.01	71.21		
4年目	R 14	0.99183	0.99059	0.99800	0.99254	0.6006	103.0	48.33	10.79	39.88	99.00	59.46	4.90	1.09	6.71	12.71	7.63	1.65	0.99	113.36	68.09		
5年目	R 15	0.99177	0.99050	0.99800	0.99248	0.5775	103.0	47.93	10.69	39.80	98.42	56.84	4.86	1.08	6.70	12.65	7.30	1.64	0.95	112.71	65.09		
6年目	R 16	0.99170	0.99041	0.99799	0.99242	0.5553	103.0	47.54	10.59	39.72	97.85	54.33	4.82	1.07	6.69	12.58	6.99	1.63	0.90	112.06	62.23		
7年目	R 17	0.99163	0.99031	0.99799	0.99237	0.5339	103.0	47.14	10.48	39.64	97.27	51.93	4.78	1.06	6.67	12.52	6.68	1.62	0.86	111.41	59.48		
8年目	R 18	0.99156	0.99022	0.99798	0.99231	0.5134	103.0	46.75	10.38	39.56	96.69	49.64	4.74	1.05	6.66	12.46	6.39	1.60	0.82	110.75	56.86		
9年目	R 19	0.99149	0.99012	0.99798	0.99225	0.4936	103.0	46.35	10.28	39.48	96.12	47.44	4.70	1.04	6.65	12.39	6.12	1.59	0.79	110.10	54.35		
10年目	R 20	0.99141	0.99002	0.99798	0.99219	0.4746	103.0	45.96	10.18	39.40	95.54	45.34	4.66	1.03	6.63	12.33	5.85	1.58	0.75	109.45	51.94		
11年目	R 21	0.99134	0.98992	0.99797	0.99213	0.4564	103.0	45.56	10.08	39.32	94.97	43.34	4.62	1.02	6.62	12.26	5.60	1.57	0.72	108.80	49.66		
12年目	R 22	0.99126	0.98982	0.99797	0.99206	0.4388	103.0	45.17	9.98	39.24	94.39	41.42	4.58	1.01	6.60	12.20	5.35	1.56	0.68	108.15	47.45		
13年目	R 23	0.99119	0.98971	0.99796	0.99200	0.4220	103.0	44.77	9.88	39.16	93.81	39.59	4.54	1.00	6.59	12.14	5.12	1.54	0.65	107.49	45.36		
14年目	R 24	0.99111	0.98961	0.99796	0.99194	0.4057	103.0	44.38	9.77	39.08	93.24	37.83	4.50	0.99	6.58	12.07	4.90	1.53	0.62	106.84	43.35		
15年目	R 25	0.99103	0.98950	0.99796	0.99187	0.3901	103.0	43.99	9.67	39.00	92.66	36.15	4.46	0.98	6.56	12.01	4.68	1.52	0.59	106.19	41.42		
16年目	R 26	0.99095	0.98939	0.99795	0.99180	0.3751	103.0	43.59	9.57	38.93	92.09	34.54	4.42	0.97	6.55	11.95	4.48	1.51	0.56	105.54	39.59		
17年目	R 27	0.99086	0.98927	0.99795	0.99174	0.3607	103.0	43.20	9.47	38.85	91.51	33.01	4.38	0.96	6.54	11.88	4.29	1.49	0.54	104.89	37.83		
18年目	R 28	0.99078	0.98916	0.99794	0.99167	0.3468	103.0	42.80	9.37	38.77	90.93	31.54	4.34	0.95	6.52	11.82	4.10	1.48	0.51	104.23	36.15		
19年目	R 29	0.99069	0.98904	0.99794	0.99160	0.3335	103.0	42.41	9.27	38.69	90.36	30.13	4.30	0.94	6.51	11.75	3.92	1.47	0.49	103.58	34.54		
20年目	R 30	0.99061	0.98892	0.99793	0.99153	0.3207	103.0	42.01	9.16	38.61	89.78	28.79	4.26	0.93	6.50	11.69	3.75	1.46	0.47	102.93	33.01		
21年目	R 31	0.99052	0.98879	0.99793	0.99145	0.3083	103.0	41.62	9.06	38.53	89.21	27.50	4.22	0.92	6.48	11.63	3.58	1.44	0.45	102.28	31.53		
22年目	R 32	0.99043	0.98867	0.99793	0.99138	0.2965	103.0	41.22	8.96	38.45	88.63	26.28	4.18	0.91	6.47	11.56	3.43	1.43	0.42	101.63	30.13		
23年目	R 33	0.99034	0.98854	0.99792	0.99130	0.2851	103.0	40.83	8.86	38.37	88.05	25.10	4.14	0.90	6.46	11.50	3.28	1.42	0.40	100.97	28.79		
24年目	R 34	0.99024	0.98840	0.99792	0.99123	0.2741	103.0	40.43	8.76	38.29	87.48	23.98	4.10	0.89	6.44	11.44	3.13	1.41	0.39	100.32	27.50		
25年目	R 35	0.99014	0.98827	0.99791	0.99115	0.2636	103.0	40.04	8.66	38.21	86.90	22.91	4.06	0.88	6.43	11.37	3.00	1.39	0.37	99.67	26.27		
26年目	R 36	0.99005	0.98813	0.99791	0.99107	0.2534	103.0	39.64	8.55	38.13	86.33	21.88	4.02	0.87	6.42	11.31	2.87	1.38	0.35	99.02	25.09		
27年目	R 37	0.98995	0.98798	0.99790	0.99099	0.2437	103.0	39.25	8.45	38.05	85.75	20.90	3.98	0.86	6.40	11.24	2.74	1.37	0.33	98.37	23.97		
28年目	R 38	0.98984	0.98784	0.99790	0.99091	0.2343	103.0	38.86	8.35	37.97	85.18	19.96	3.94	0.85	6.39	11.18	2.62	1.36	0.32	97.71	22.89		
29年目	R 39	0.98974	0.98769	0.99790	0.99083	0.2253	103.0	38.46	8.25	37.89	84.60	19.06	3.90	0.84	6.38	11.12	2.50	1.35	0.30	97.06	21.87		
30年目	R 40	0.98963	0.98754	0.99789	0.99074	0.2166	103.0	38.07	8.15	37.81	84.02	18.20	3.86	0.83	6.36	11.05	2.39	1.33	0.29	96.41	20.88		
31年目	R 41	0.98953	0.98738	0.99789	0.99065	0.2083	103.0	37.67	8.05	37.73	83.45	17.38	3.82	0.82	6.35	10.99	2.29	1.32	0.28	95.76	19.95		
32年目	R 42	0.98941	0.98722	0.99788	0.99057	0.2003	103.0	37.28	7.95	37.65	82.87	16.60	3.78	0.81	6.34	10.93	2.19	1.31	0.26	95.11	19.05		
33年目	R 43	0.98930	0.98705	0.99788	0.99048	0.1926	103.0	36.88	7.84	37.57	82.30	15.85	3.74	0.80	6.32	10.86	2.09	1.30	0.25	94.45	18.19		
34年目	R 44	0.98919	0.98688	0.99787	0.99039	0.1852	103.0	36.49	7.74	37.49	81.72	15.13	3.70	0.79	6.31	10.80	2.00	1.28	0.24	93.80	17.37		
35年目	R 45	0.98907	0.98671	0.99787	0.99029	0.1780	103.0	36.09	7.64	37.41	81.14	14.44	3.66	0.77	6.30	10.73	1.91	1.27	0.23	93.15	16.58		
36年目	R 46	0.98895	0.98653	0.99786	0.99020	0.1712	103.0	35.70	7.54	37.33	80.57	13.79	3.62	0.76	6.28	10.67	1.83	1.26	0.22	92.50	15.84		
37年目	R 47	0.98882	0.98634	0.99786	0.99010	0.1646	103.0	35.30	7.44	37.25	79.99	13.17	3.58	0.75	6.27	10.61	1.75	1.25	0.21	91.85	15.12		
38年目	R 48	0.98870	0.98615	0.99785	0.99000	0.1583	103.0	34.91	7.34	37.17	79.42	12.57	3.54	0.74	6.26	10.54	1.67	1.23	0.20	91.19	14.44		
39年目	R 49	0.98857	0.98596	0.99785	0.98990	0.1522	103.0	34.51	7.23	37.09	78.84	12.00	3.50	0.73	6.24	10.48	1.59	1.22	0.19	90.54	13.78		
40年目	R 50	0.98844	0.98576	0.99785	0.98980	0.1463	103.0	34.12	7.13	37.01	78.26	11.45	3.46	0.72	6.23	10.42	1.52	1.21	0.18	89.89	13.15		
41年目	R 51	0.98830	0.98555	0.99784	0.98969	0.1407	103.0	33.73	7.03	36.93	77.69	10.93	3.42	0.71	6.22	10.35	1.46	1.20	0.17	89.24	12.56		
42年目	R 52	0.98816	0.98534	0.99784	0.98958	0.1353	103.0	33.33	6.93	36.85	77.11	10.43	3.38	0.70	6.20	10.29	1.39	1.18	0.16	88.58	11.99		
43年目	R 53	0.98802	0.98513	0.99783	0.98947	0.1301	103.0	32.94	6.83	36.77	76.54	9.96	3.34	0.69	6.19	10.22	1.33	1.17	0.15	87.93	11.44		
44年目	R 54	0.98787	0.98490	0.99783	0.98936	0.1251	103.0	32.54	6.73	36.69	75.96	9.50	3.30	0.68	6.18	10.16	1.27	1.16	0.15	87.28	10.92		
45年目	R 55	0.98773	0.98467	0.99782	0.98925	0.1203	103.0	27.77	5.49	31.83	65.09	7.83	2.75	0.53	5.37	8.65	1.04	1.05	0.13	74.79	9.00		
46年目	R 56	0.98757	0.98443	0.99782	0.98913	0.1157	103.0	17.92	3.90	18.40	40.21	4.65	1.51	0.32	2.84	4.67	0.54	0.75	0.09	45.63	5.28		
47年目	R 57	0.98742	0.98418	0.99781	0.98901	0.1112																	

(再評価)

様式 - 2

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・ その他の別
一般国道158号	大野油坂道路 (大野・大野東 区間)	L = 5.5km	高規格	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
9,100	2車線	近畿地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	令和1年度		
単純合計	224億円	74億円	298億円
うち残事業分	197億円	74億円	271億円
基準年における 現在価値 (C)	200億円	27億円	227億円
うち残事業分	173億円	27億円	200億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和1年度			
供用年	令和6年度			
単年便益 (初年便益)	20億円	1.7億円	0.91億円	22億円
基準年における 現在価値 (B)	339億円	29億円	15億円	383億円
うち残事業分	339億円	29億円	15億円	383億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	1.7
経済的純現在価値（事業全体）	156億円
経済的内部収益率（事業全体）	7.7%
費用便益比（残事業）	1.9
経済的純現在価値（残事業）	183億円
経済的内部収益率（残事業）	9.2%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	9,100台/日	±10%	1.5~1.9
事業費	197億円	±10%	1.6~1.8
事業期間	4年	±20%	1.6~1.7

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	9,100台/日	±10%	1.7~2.2
事業費	197億円	±10%	1.8~2.1
事業期間	4年	±20%	1.9~2.0

交通状況の変化

様式-3①

事業名：大野油坂道路（大野・大野東区間）（事業全体）


（推計時点 令和12年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 (5.5km)	交通量 ^{※1}	[台/日]	0	9,100	
	走行時間 ^{※2}	[分]	0	6	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	0.00	10.94	
②主な周辺道路 ^{※4}	一般国道158号 (4.7km)	交通量	[台/日]	8,000	5,000
		走行時間	[分]	8	7
		走行時間費用	[億円/年]	12.41	5.76
	一般国道157号 (3.7km)	交通量	[台/日]	8,500	5,600
		走行時間	[分]	4	4
		走行時間費用	[億円/年]	6.92	4.23
	(県)五条方松原出勝山線 (6.6km)	交通量	[台/日]	900	0
		走行時間	[分]	9	0
		走行時間費用	[億円/年]	1.71	0.00
		交通量	[台/日]	0	0
		走行時間	[分]	0	0
		走行時間費用	[億円/年]	0.00	0.00
	交通量	[台/日]	0	0	
	走行時間	[分]	0	0	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	0.00	
③その他道路合計 (26,667.0km)	走行時間費用	[億円/年]	90,971.52	90,951.95	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：26,687.5km	走行時間短縮便益	[億円/年]	90,992.56	90,972.87	19.69

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面 (①、②)に該当する道路を明示すること

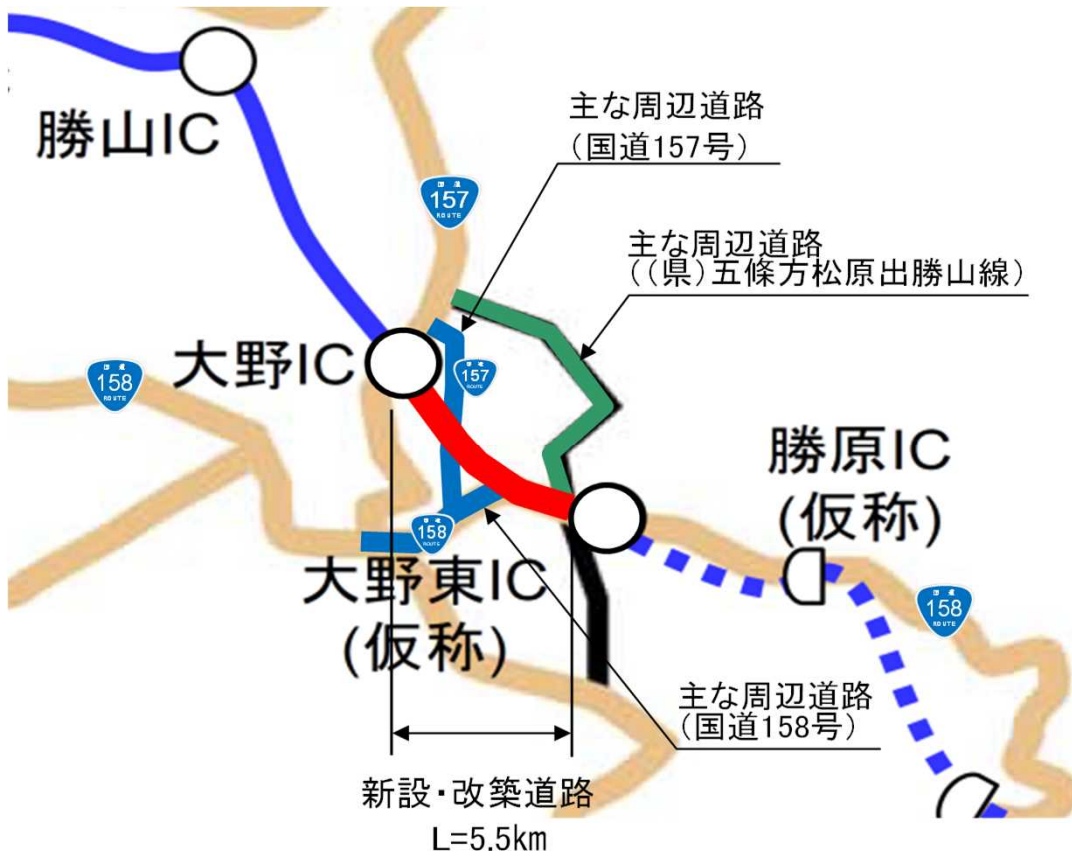

交通状況の変化

様式-3①

事業名：大野油坂道路（大野・大野東区間）（残事業）


（推計時点 令和12年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 (5.5km)	交通量 ^{※1}	[台/日]	0	9,100	
	走行時間 ^{※2}	[分]	0	6	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	0.00	10.94	
②主な周辺道路 ^{※4}	一般国道158号 (4.7km)	交通量	[台/日]	8,000	5,000
		走行時間	[分]	8	7
		走行時間費用	[億円/年]	12.41	5.76
	一般国道157号 (3.7km)	交通量	[台/日]	8,500	5,600
		走行時間	[分]	4	4
		走行時間費用	[億円/年]	6.92	4.23
	(県)五条方松原出勝山線 (6.6km)	交通量	[台/日]	900	0
		走行時間	[分]	9	0
		走行時間費用	[億円/年]	1.71	0.00
		交通量	[台/日]	0	0
		走行時間	[分]	0	0
		走行時間費用	[億円/年]	0.00	0.00
	交通量	[台/日]	0	0	
	走行時間	[分]	0	0	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	0.00	
③その他道路合計 (26,667.0km)	走行時間費用	[億円/年]	90,971.52	90,951.95	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：26,687.5km	走行時間短縮便益	[億円/年]	90,992.56	90,972.87	19.69

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面 (①、②)に該当する道路を明示すること

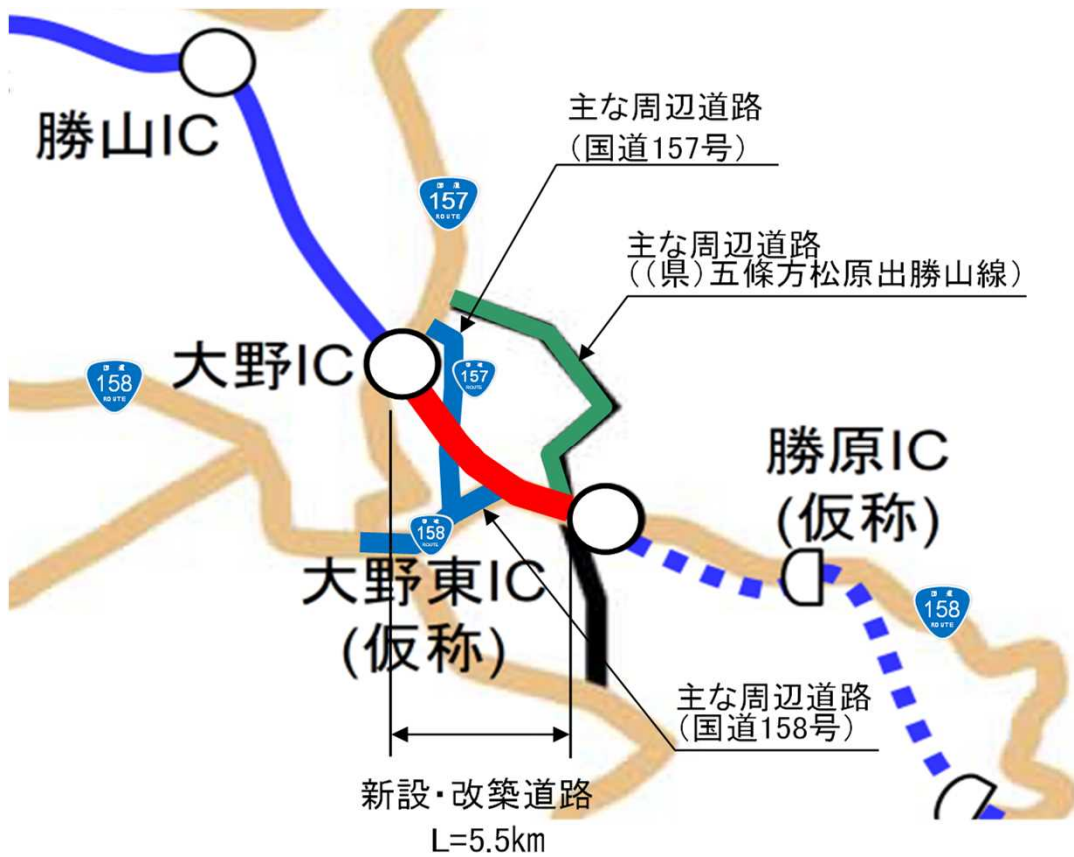

費用便益分析の条件

事業名：大野油坂道路(大野・大野東区間)

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	令和1年
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (令和12年)
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H22全国道路・街路 交通情勢調査)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
	その他()	<input type="checkbox"/>
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有	<input type="checkbox"/>
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載 ()台トリップ/日
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>
	最終配分の速度	<input checked="" type="checkbox"/>
	採用理由を記載 分割回毎の極端な速度差が生じないBPR関数の適用に併せて、最終速度を採用。	
	その他()	<input type="checkbox"/>

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
	採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		() %	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載 過去10年の実績値より算出	(1) 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
考慮する		<input type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表(事業全体)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 一般国道158号 大野油坂道路(大野・大野東区間)

				単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)	
				0.30	5.5	1.63	
年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-9年目	H 27	1.1699	103.0	0.85	1.00		
-8年目	H 28	1.1249	102.8	1.85	2.09		
-7年目	H 29	1.0816	103.0	3.70	4.01		
-6年目	H 30	1.0400	103.0	8.34	8.67		
-5年目	R 1	1.0000	103.0	12.66	12.66		
-4年目	R 2	0.9615	103.0	23.38	22.48		
-3年目	R 3	0.9246	103.0	32.47	30.02		
-2年目	R 4	0.8890	103.0	73.34	65.20		
-1年目	R 5	0.8548	103.0	67.40	57.61		
供用開始年次	R 6	0.8219	103.0			1.48	1.22
1年目	R 7	0.7903	103.0			1.48	1.17
2年目	R 8	0.7599	103.0			1.48	1.13
3年目	R 9	0.7307	103.0			1.48	1.08
4年目	R 10	0.7026	103.0			1.48	1.04
5年目	R 11	0.6756	103.0			1.48	1.00
6年目	R 12	0.6496	103.0			1.48	0.96
7年目	R 13	0.6246	103.0			1.48	0.93
8年目	R 14	0.6006	103.0			1.48	0.89
9年目	R 15	0.5775	103.0			1.48	0.86
10年目	R 16	0.5553	103.0			1.48	0.82
11年目	R 17	0.5339	103.0			1.48	0.79
12年目	R 18	0.5134	103.0			1.48	0.76
13年目	R 19	0.4936	103.0			1.48	0.73
14年目	R 20	0.4746	103.0			1.48	0.70
15年目	R 21	0.4564	103.0			1.48	0.68
16年目	R 22	0.4388	103.0			1.48	0.65
17年目	R 23	0.4220	103.0			1.48	0.63
18年目	R 24	0.4057	103.0			1.48	0.60
19年目	R 25	0.3901	103.0			1.48	0.58
20年目	R 26	0.3751	103.0			1.48	0.56
21年目	R 27	0.3607	103.0			1.48	0.53
22年目	R 28	0.3468	103.0			1.48	0.51
23年目	R 29	0.3335	103.0			1.48	0.49
24年目	R 30	0.3207	103.0			1.48	0.48
25年目	R 31	0.3083	103.0			1.48	0.46
26年目	R 32	0.2965	103.0			1.48	0.44
27年目	R 33	0.2851	103.0			1.48	0.42
28年目	R 34	0.2741	103.0			1.48	0.41
29年目	R 35	0.2636	103.0			1.48	0.39
30年目	R 36	0.2534	103.0			1.48	0.38
31年目	R 37	0.2437	103.0			1.48	0.36
32年目	R 38	0.2343	103.0			1.48	0.35
33年目	R 39	0.2253	103.0			1.48	0.33
34年目	R 40	0.2166	103.0			1.48	0.32
35年目	R 41	0.2083	103.0			1.48	0.31
36年目	R 42	0.2003	103.0			1.48	0.30
37年目	R 43	0.1926	103.0			1.48	0.29
38年目	R 44	0.1852	103.0			1.48	0.27
39年目	R 45	0.1780	103.0			1.48	0.26
40年目	R 46	0.1712	103.0			1.48	0.25
41年目	R 47	0.1646	103.0			1.48	0.24
42年目	R 48	0.1583	103.0			1.48	0.23
43年目	R 49	0.1522	103.0			1.48	0.23
44年目	R 50	0.1463	103.0			1.48	0.22
45年目	R 51	0.1407	103.0			1.48	0.21
46年目	R 52	0.1353	103.0			1.48	0.20
47年目	R 53	0.1301	103.0			1.48	0.19
48年目	R 54	0.1251	103.0			1.48	0.19
49年目	R 55	0.1203	103.0	-30.20	-3.63	1.48	0.18
合計				193.80	200.11	74.09	27.22
単純事業費計				224.00		74.09	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 一般国道158号 大野油坂道路(大野・大野東区間)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.30	5.5	1.63

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-4年目	R 2	0.9615	103.0	23.38	22.48		
-3年目	R 3	0.9246	103.0	32.47	30.02		
-2年目	R 4	0.8890	103.0	73.34	65.20		
-1年目	R 5	0.8548	103.0	67.40	57.61		
供用開始年次	R 6	0.8219	103.0			1.48	1.22
1年目	R 7	0.7903	103.0			1.48	1.17
2年目	R 8	0.7599	103.0			1.48	1.13
3年目	R 9	0.7307	103.0			1.48	1.08
4年目	R 10	0.7026	103.0			1.48	1.04
5年目	R 11	0.6756	103.0			1.48	1.00
6年目	R 12	0.6496	103.0			1.48	0.96
7年目	R 13	0.6246	103.0			1.48	0.93
8年目	R 14	0.6006	103.0			1.48	0.89
9年目	R 15	0.5775	103.0			1.48	0.86
10年目	R 16	0.5553	103.0			1.48	0.82
11年目	R 17	0.5339	103.0			1.48	0.79
12年目	R 18	0.5134	103.0			1.48	0.76
13年目	R 19	0.4936	103.0			1.48	0.73
14年目	R 20	0.4746	103.0			1.48	0.70
15年目	R 21	0.4564	103.0			1.48	0.68
16年目	R 22	0.4388	103.0			1.48	0.65
17年目	R 23	0.4220	103.0			1.48	0.63
18年目	R 24	0.4057	103.0			1.48	0.60
19年目	R 25	0.3901	103.0			1.48	0.58
20年目	R 26	0.3751	103.0			1.48	0.56
21年目	R 27	0.3607	103.0			1.48	0.53
22年目	R 28	0.3468	103.0			1.48	0.51
23年目	R 29	0.3335	103.0			1.48	0.49
24年目	R 30	0.3207	103.0			1.48	0.48
25年目	R 31	0.3083	103.0			1.48	0.46
26年目	R 32	0.2965	103.0			1.48	0.44
27年目	R 33	0.2851	103.0			1.48	0.42
28年目	R 34	0.2741	103.0			1.48	0.41
29年目	R 35	0.2636	103.0			1.48	0.39
30年目	R 36	0.2534	103.0			1.48	0.38
31年目	R 37	0.2437	103.0			1.48	0.36
32年目	R 38	0.2343	103.0			1.48	0.35
33年目	R 39	0.2253	103.0			1.48	0.33
34年目	R 40	0.2166	103.0			1.48	0.32
35年目	R 41	0.2083	103.0			1.48	0.31
36年目	R 42	0.2003	103.0			1.48	0.30
37年目	R 43	0.1926	103.0			1.48	0.29
38年目	R 44	0.1852	103.0			1.48	0.27
39年目	R 45	0.1780	103.0			1.48	0.26
40年目	R 46	0.1712	103.0			1.48	0.25
41年目	R 47	0.1646	103.0			1.48	0.24
42年目	R 48	0.1583	103.0			1.48	0.23
43年目	R 49	0.1522	103.0			1.48	0.23
44年目	R 50	0.1463	103.0			1.48	0.22
45年目	R 51	0.1407	103.0			1.48	0.21
46年目	R 52	0.1353	103.0			1.48	0.20
47年目	R 53	0.1301	103.0			1.48	0.19
48年目	R 54	0.1251	103.0			1.48	0.19
49年目	R 55	0.1203	103.0	-21.73	-2.61	1.48	0.18
合計				174.86	172.70	74.09	27.22
単純事業費計				196.59		74.09	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表（事業全体）

箇所名： 一般国道158号 大野油坂道路(大野・大野東区間)

年次	年度 (基準年) R 1	総走行台キロの年次別伸び率 (近畿内陸ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間便益 (億円)					走行経費便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	R 6	0.99915	0.98628	1.00658	0.99808	0.8219	103.0	7.75	2.52	9.30	19.57	16.08	1.09	0.10	0.51	1.69	1.39	0.91	0.75	22.17	18.22
1年目	R 7	0.99914	0.98609	1.00653	0.99807	0.7903	103.0	7.74	2.49	9.36	19.59	15.48	1.09	0.10	0.51	1.70	1.34	0.91	0.72	22.19	17.54
2年目	R 8	0.99914	0.98590	1.00649	0.99807	0.7599	103.0	7.74	2.45	9.42	19.61	14.90	1.09	0.10	0.51	1.70	1.29	0.91	0.69	22.21	16.88
3年目	R 9	0.99914	0.98570	1.00645	0.99806	0.7307	103.0	7.73	2.42	9.48	19.63	14.34	1.09	0.09	0.52	1.70	1.24	0.90	0.66	22.23	16.24
4年目	R 10	0.99914	0.98549	1.00641	0.99806	0.7026	103.0	7.72	2.38	9.54	19.65	13.81	1.08	0.09	0.52	1.70	1.19	0.90	0.63	22.25	15.63
5年目	R 11	0.99914	0.98528	1.00637	0.99806	0.6756	103.0	7.72	2.35	9.60	19.67	13.29	1.08	0.09	0.52	1.70	1.15	0.90	0.61	22.27	15.04
6年目	R 12	0.99197	0.99076	0.99801	0.99265	0.6496	103.0	7.71	2.31	9.66	19.69	12.79	1.08	0.09	0.53	1.70	1.10	0.90	0.58	22.29	14.48
7年目	R 13	0.99190	0.99067	0.99800	0.99259	0.6246	103.0	7.65	2.29	9.64	19.59	12.23	1.07	0.09	0.53	1.69	1.06	0.89	0.56	22.17	13.85
8年目	R 14	0.99183	0.99059	0.99800	0.99254	0.6006	103.0	7.59	2.27	9.62	19.48	11.70	1.06	0.09	0.53	1.68	1.01	0.89	0.53	22.05	13.24
9年目	R 15	0.99177	0.99050	0.99800	0.99248	0.5775	103.0	7.52	2.25	9.61	19.38	11.19	1.06	0.09	0.52	1.67	0.96	0.88	0.51	21.93	12.66
10年目	R 16	0.99170	0.99041	0.99799	0.99242	0.5553	103.0	7.46	2.23	9.59	19.28	10.71	1.05	0.09	0.52	1.66	0.92	0.87	0.48	21.81	12.11
11年目	R 17	0.99163	0.99031	0.99799	0.99237	0.5339	103.0	7.40	2.21	9.57	19.18	10.24	1.04	0.09	0.52	1.65	0.88	0.87	0.46	21.69	11.58
12年目	R 18	0.99156	0.99022	0.99798	0.99231	0.5134	103.0	7.34	2.19	9.55	19.07	9.79	1.03	0.09	0.52	1.64	0.84	0.86	0.44	21.57	11.07
13年目	R 19	0.99149	0.99012	0.99798	0.99225	0.4936	103.0	7.28	2.16	9.53	18.97	9.36	1.02	0.08	0.52	1.63	0.80	0.85	0.42	21.45	10.59
14年目	R 20	0.99141	0.99002	0.99798	0.99219	0.4746	103.0	7.21	2.14	9.51	18.87	8.95	1.01	0.08	0.52	1.62	0.77	0.85	0.40	21.33	10.12
15年目	R 21	0.99134	0.98992	0.99797	0.99213	0.4564	103.0	7.15	2.12	9.49	18.77	8.56	1.00	0.08	0.52	1.61	0.73	0.84	0.38	21.21	9.68
16年目	R 22	0.99126	0.98982	0.99797	0.99206	0.4388	103.0	7.09	2.10	9.47	18.66	8.19	1.00	0.08	0.52	1.59	0.70	0.83	0.37	21.09	9.25
17年目	R 23	0.99119	0.98971	0.99796	0.99200	0.4220	103.0	7.03	2.08	9.45	18.56	7.83	0.99	0.08	0.52	1.58	0.67	0.83	0.35	20.97	8.85
18年目	R 24	0.99111	0.98961	0.99796	0.99194	0.4057	103.0	6.97	2.06	9.43	18.46	7.49	0.98	0.08	0.52	1.57	0.64	0.82	0.33	20.85	8.46
19年目	R 25	0.99103	0.98950	0.99796	0.99187	0.3901	103.0	6.91	2.04	9.41	18.35	7.16	0.97	0.08	0.51	1.56	0.61	0.81	0.32	20.73	8.09
20年目	R 26	0.99095	0.98939	0.99795	0.99180	0.3751	103.0	6.84	2.02	9.39	18.25	6.85	0.96	0.08	0.51	1.55	0.58	0.81	0.30	20.61	7.73
21年目	R 27	0.99086	0.98927	0.99795	0.99174	0.3607	103.0	6.78	1.99	9.37	18.15	6.55	0.95	0.08	0.51	1.54	0.56	0.80	0.29	20.49	7.39
22年目	R 28	0.99078	0.98916	0.99794	0.99167	0.3468	103.0	6.72	1.97	9.36	18.05	6.26	0.94	0.08	0.51	1.53	0.53	0.79	0.28	20.37	7.06
23年目	R 29	0.99069	0.98904	0.99794	0.99160	0.3335	103.0	6.66	1.95	9.34	17.94	5.98	0.93	0.08	0.51	1.52	0.51	0.79	0.26	20.25	6.75
24年目	R 30	0.99061	0.98892	0.99793	0.99153	0.3207	103.0	6.60	1.93	9.32	17.84	5.72	0.93	0.08	0.51	1.51	0.48	0.78	0.25	20.13	6.46
25年目	R 31	0.99052	0.98879	0.99793	0.99145	0.3083	103.0	6.53	1.91	9.30	17.74	5.47	0.92	0.07	0.51	1.50	0.46	0.77	0.24	20.01	6.17
26年目	R 32	0.99043	0.98867	0.99793	0.99138	0.2965	103.0	6.47	1.89	9.28	17.64	5.23	0.91	0.07	0.51	1.49	0.44	0.77	0.23	19.89	5.90
27年目	R 33	0.99034	0.98854	0.99792	0.99130	0.2851	103.0	6.41	1.87	9.26	17.53	5.00	0.90	0.07	0.51	1.48	0.42	0.76	0.22	19.77	5.64
28年目	R 34	0.99024	0.98840	0.99792	0.99123	0.2741	103.0	6.35	1.84	9.24	17.43	4.78	0.89	0.07	0.50	1.47	0.40	0.75	0.21	19.65	5.39
29年目	R 35	0.99014	0.98827	0.99791	0.99115	0.2636	103.0	6.29	1.82	9.22	17.33	4.57	0.88	0.07	0.50	1.46	0.38	0.75	0.20	19.53	5.15
30年目	R 36	0.99005	0.98813	0.99791	0.99107	0.2534	103.0	6.22	1.80	9.20	17.23	4.37	0.87	0.07	0.50	1.45	0.37	0.74	0.19	19.41	4.92
31年目	R 37	0.98995	0.98798	0.99790	0.99099	0.2437	103.0	6.16	1.78	9.18	17.12	4.17	0.86	0.07	0.50	1.44	0.35	0.73	0.18	19.29	4.70
32年目	R 38	0.98984	0.98784	0.99790	0.99091	0.2343	103.0	6.10	1.76	9.16	17.02	3.99	0.86	0.07	0.50	1.43	0.33	0.73	0.17	19.17	4.49
33年目	R 39	0.98974	0.98769	0.99790	0.99083	0.2253	103.0	6.04	1.74	9.14	16.92	3.81	0.85	0.07	0.50	1.41	0.32	0.72	0.16	19.05	4.29
34年目	R 40	0.98963	0.98754	0.99789	0.99074	0.2166	103.0	5.98	1.72	9.12	16.82	3.64	0.84	0.07	0.50	1.40	0.30	0.71	0.15	18.93	4.10
35年目	R 41	0.98953	0.98738	0.99789	0.99065	0.2083	103.0	5.91	1.69	9.11	16.71	3.48	0.83	0.07	0.50	1.39	0.29	0.71	0.15	18.81	3.92
36年目	R 42	0.98941	0.98722	0.99788	0.99057	0.2003	103.0	5.85	1.67	9.09	16.61	3.33	0.82	0.07	0.50	1.38	0.28	0.70	0.14	18.69	3.74
37年目	R 43	0.98930	0.98705	0.99788	0.99048	0.1926	103.0	5.79	1.65	9.07	16.51	3.18	0.81	0.06	0.50	1.37	0.26	0.69	0.13	18.58	3.58
38年目	R 44	0.98919	0.98688	0.99787	0.99039	0.1852	103.0	5.73	1.63	9.05	16.41	3.04	0.80	0.06	0.49	1.36	0.25	0.69	0.13	18.46	3.42
39年目	R 45	0.98907	0.98671	0.99787	0.99029	0.1780	103.0	5.67	1.61	9.03	16.30	2.90	0.80	0.06	0.49	1.35	0.24	0.68	0.12	18.34	3.26
40年目	R 46	0.98895	0.98653	0.99786	0.99020	0.1712	103.0	5.60	1.59	9.01	16.20	2.77	0.79	0.06	0.49	1.34	0.23	0.67	0.12	18.22	3.12
41年目	R 47	0.98882	0.98634	0.99786	0.99010	0.1646	103.0	5.54	1.57	8.99	16.10	2.65	0.78	0.06	0.49	1.33	0.22	0.67	0.11	18.10	2.98
42年目	R 48	0.98870	0.98615	0.99785	0.99000	0.1583	103.0	5.48	1.54	8.97	16.00	2.53	0.77	0.06	0.49	1.32	0.21	0.66	0.10	17.98	2.85
43年目	R 49	0.98857	0.98596	0.99785	0.98990	0.1522	103.0	5.42	1.52	8.95	15.89	2.42	0.76	0.06	0.49	1.31	0.20	0.65	0.10	17.86	2.72
44年目	R 50	0.98844	0.98576	0.99785	0.98980	0.1463	103.0	5.36	1.50	8.93	15.79	2.31	0.75	0.06	0.49	1.30	0.19	0.65	0.09	17.74	2.59
45年目	R 51	0.98830	0.98555	0.99784	0.98969	0.1407	103.0	5.29	1.48	8.91	15.69	2.21	0.74	0.06	0.49	1.29	0.18	0.64	0.09	17.62	2.48
46年目	R 52	0.98816	0.98534	0.99784	0.98958	0.1353	103.0	5.23	1.46	8.89	15.59	2.11	0.73	0.06	0.49	1.28	0.17	0.63	0.09	17.50	2.37
47年目	R 53	0.98802	0.98513	0.99783	0.98947	0.1301	103.0	5.17	1.44	8.87	15.48	2.01	0.73	0.06	0.48	1.27	0.16	0.63	0.08	17.38	2.26
48年目	R 54	0.98787	0.98490	0.99783	0.98936	0.1251	103.0	5.11	1.42	8.86	15.38	1.92	0.72	0.06	0.48	1.26	0.16	0.62	0.08	17.26	2.16
49年目	R 55	0.98773	0.98467	0.99782	0.98925	0.1203	103.0	5.05	1.39	8.84	15.28	1.84	0.71	0.05	0.48	1.25	0.15	0.61	0.07	17.14	2.06
合 計								327.06	96.22	463.68	886.96	339.19	45.91	3.75	25.33	74.99	28.94	38.74	15.12	1,000.69	383.25

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名： 一般国道158号 大野油坂道路(大野・大野東区間)

年次	年度 (基準年) R 1	総走行台キロの年次別伸び率 (近畿内陸ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間便益 (億円)					走行経費便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	R 6	0.99915	0.98628	1.00658	0.99808	0.8219	103.0	7.75	2.52	9.30	19.57	16.08	1.09	0.10	0.51	1.69	1.39	0.91	0.75	22.17	18.22
1年目	R 7	0.99914	0.98609	1.00653	0.99807	0.7903	103.0	7.74	2.49	9.36	19.59	15.48	1.09	0.10	0.51	1.70	1.34	0.91	0.72	22.19	17.54
2年目	R 8	0.99914	0.98590	1.00649	0.99807	0.7599	103.0	7.74	2.45	9.42	19.61	14.90	1.09	0.10	0.51	1.70	1.29	0.91	0.69	22.21	16.88
3年目	R 9	0.99914	0.98570	1.00645	0.99806	0.7307	103.0	7.73	2.42	9.48	19.63	14.34	1.09	0.09	0.52	1.70	1.24	0.90	0.66	22.23	16.24
4年目	R 10	0.99914	0.98549	1.00641	0.99806	0.7026	103.0	7.72	2.38	9.54	19.65	13.81	1.08	0.09	0.52	1.70	1.19	0.90	0.63	22.25	15.63
5年目	R 11	0.99914	0.98528	1.00637	0.99806	0.6756	103.0	7.72	2.35	9.60	19.67	13.29	1.08	0.09	0.52	1.70	1.15	0.90	0.61	22.27	15.04
6年目	R 12	0.99197	0.99076	0.99801	0.99265	0.6496	103.0	7.71	2.31	9.66	19.69	12.79	1.08	0.09	0.53	1.70	1.10	0.90	0.58	22.29	14.48
7年目	R 13	0.99190	0.99067	0.99800	0.99259	0.6246	103.0	7.65	2.29	9.64	19.59	12.23	1.07	0.09	0.53	1.69	1.06	0.89	0.56	22.17	13.85
8年目	R 14	0.99183	0.99059	0.99800	0.99254	0.6006	103.0	7.59	2.27	9.62	19.48	11.70	1.06	0.09	0.53	1.68	1.01	0.89	0.53	22.05	13.24
9年目	R 15	0.99177	0.99050	0.99800	0.99248	0.5775	103.0	7.52	2.25	9.61	19.38	11.19	1.06	0.09	0.52	1.67	0.96	0.88	0.51	21.93	12.66
10年目	R 16	0.99170	0.99041	0.99799	0.99242	0.5553	103.0	7.46	2.23	9.59	19.28	10.71	1.05	0.09	0.52	1.66	0.92	0.87	0.48	21.81	12.11
11年目	R 17	0.99163	0.99031	0.99799	0.99237	0.5339	103.0	7.40	2.21	9.57	19.18	10.24	1.04	0.09	0.52	1.65	0.88	0.87	0.46	21.69	11.58
12年目	R 18	0.99156	0.99022	0.99798	0.99231	0.5134	103.0	7.34	2.19	9.55	19.07	9.79	1.03	0.09	0.52	1.64	0.84	0.86	0.44	21.57	11.07
13年目	R 19	0.99149	0.99012	0.99798	0.99225	0.4936	103.0	7.28	2.16	9.53	18.97	9.36	1.02	0.08	0.52	1.63	0.80	0.85	0.42	21.45	10.59
14年目	R 20	0.99141	0.99002	0.99798	0.99219	0.4746	103.0	7.21	2.14	9.51	18.87	8.95	1.01	0.08	0.52	1.62	0.77	0.85	0.40	21.33	10.12
15年目	R 21	0.99134	0.98992	0.99797	0.99213	0.4564	103.0	7.15	2.12	9.49	18.77	8.56	1.00	0.08	0.52	1.61	0.73	0.84	0.38	21.21	9.68
16年目	R 22	0.99126	0.98982	0.99797	0.99206	0.4388	103.0	7.09	2.10	9.47	18.66	8.19	1.00	0.08	0.52	1.59	0.70	0.83	0.37	21.09	9.25
17年目	R 23	0.99119	0.98971	0.99796	0.99200	0.4220	103.0	7.03	2.08	9.45	18.56	7.83	0.99	0.08	0.52	1.58	0.67	0.83	0.35	20.97	8.85
18年目	R 24	0.99111	0.98961	0.99796	0.99194	0.4057	103.0	6.97	2.06	9.43	18.46	7.49	0.98	0.08	0.52	1.57	0.64	0.82	0.33	20.85	8.46
19年目	R 25	0.99103	0.98950	0.99796	0.99187	0.3901	103.0	6.91	2.04	9.41	18.35	7.16	0.97	0.08	0.51	1.56	0.61	0.81	0.32	20.73	8.09
20年目	R 26	0.99095	0.98939	0.99795	0.99180	0.3751	103.0	6.84	2.02	9.39	18.25	6.85	0.96	0.08	0.51	1.55	0.58	0.81	0.30	20.61	7.73
21年目	R 27	0.99086	0.98927	0.99795	0.99174	0.3607	103.0	6.78	1.99	9.37	18.15	6.55	0.95	0.08	0.51	1.54	0.56	0.80	0.29	20.49	7.39
22年目	R 28	0.99078	0.98916	0.99794	0.99167	0.3468	103.0	6.72	1.97	9.36	18.05	6.26	0.94	0.08	0.51	1.53	0.53	0.79	0.28	20.37	7.06
23年目	R 29	0.99069	0.98904	0.99794	0.99160	0.3335	103.0	6.66	1.95	9.34	17.94	5.98	0.93	0.08	0.51	1.52	0.51	0.79	0.26	20.25	6.75
24年目	R 30	0.99061	0.98892	0.99793	0.99153	0.3207	103.0	6.60	1.93	9.32	17.84	5.72	0.93	0.08	0.51	1.51	0.48	0.78	0.25	20.13	6.46
25年目	R 31	0.99052	0.98879	0.99793	0.99145	0.3083	103.0	6.53	1.91	9.30	17.74	5.47	0.92	0.07	0.51	1.50	0.46	0.77	0.24	20.01	6.17
26年目	R 32	0.99043	0.98867	0.99793	0.99138	0.2965	103.0	6.47	1.89	9.28	17.64	5.23	0.91	0.07	0.51	1.49	0.44	0.77	0.23	19.89	5.90
27年目	R 33	0.99034	0.98854	0.99792	0.99130	0.2851	103.0	6.41	1.87	9.26	17.53	5.00	0.90	0.07	0.51	1.48	0.42	0.76	0.22	19.77	5.64
28年目	R 34	0.99024	0.98840	0.99792	0.99123	0.2741	103.0	6.35	1.84	9.24	17.43	4.78	0.89	0.07	0.50	1.47	0.40	0.75	0.21	19.65	5.39
29年目	R 35	0.99014	0.98827	0.99791	0.99115	0.2636	103.0	6.29	1.82	9.22	17.33	4.57	0.88	0.07	0.50	1.46	0.38	0.75	0.20	19.53	5.15
30年目	R 36	0.99005	0.98813	0.99791	0.99107	0.2534	103.0	6.22	1.80	9.20	17.23	4.37	0.87	0.07	0.50	1.45	0.37	0.74	0.19	19.41	4.92
31年目	R 37	0.98995	0.98798	0.99790	0.99099	0.2437	103.0	6.16	1.78	9.18	17.12	4.17	0.86	0.07	0.50	1.44	0.35	0.73	0.18	19.29	4.70
32年目	R 38	0.98984	0.98784	0.99790	0.99091	0.2343	103.0	6.10	1.76	9.16	17.02	3.99	0.86	0.07	0.50	1.43	0.33	0.73	0.17	19.17	4.49
33年目	R 39	0.98974	0.98769	0.99790	0.99083	0.2253	103.0	6.04	1.74	9.14	16.92	3.81	0.85	0.07	0.50	1.41	0.32	0.72	0.16	19.05	4.29
34年目	R 40	0.98963	0.98754	0.99789	0.99074	0.2166	103.0	5.98	1.72	9.12	16.82	3.64	0.84	0.07	0.50	1.40	0.30	0.71	0.15	18.93	4.10
35年目	R 41	0.98953	0.98738	0.99789	0.99065	0.2083	103.0	5.91	1.69	9.11	16.71	3.48	0.83	0.07	0.50	1.39	0.29	0.71	0.15	18.81	3.92
36年目	R 42	0.98941	0.98722	0.99788	0.99057	0.2003	103.0	5.85	1.67	9.09	16.61	3.33	0.82	0.07	0.50	1.38	0.28	0.70	0.14	18.69	3.74
37年目	R 43	0.98930	0.98705	0.99788	0.99048	0.1926	103.0	5.79	1.65	9.07	16.51	3.18	0.81	0.06	0.50	1.37	0.26	0.69	0.13	18.58	3.58
38年目	R 44	0.98919	0.98688	0.99787	0.99039	0.1852	103.0	5.73	1.63	9.05	16.41	3.04	0.80	0.06	0.49	1.36	0.25	0.69	0.13	18.46	3.42
39年目	R 45	0.98907	0.98671	0.99787	0.99029	0.1780	103.0	5.67	1.61	9.03	16.30	2.90	0.80	0.06	0.49	1.35	0.24	0.68	0.12	18.34	3.26
40年目	R 46	0.98895	0.98653	0.99786	0.99020	0.1712	103.0	5.60	1.59	9.01	16.20	2.77	0.79	0.06	0.49	1.34	0.23	0.67	0.12	18.22	3.12
41年目	R 47	0.98882	0.98634	0.99786	0.99010	0.1646	103.0	5.54	1.57	8.99	16.10	2.65	0.78	0.06	0.49	1.33	0.22	0.67	0.11	18.10	2.98
42年目	R 48	0.98870	0.98615	0.99785	0.99000	0.1583	103.0	5.48	1.54	8.97	16.00	2.53	0.77	0.06	0.49	1.32	0.21	0.66	0.10	17.98	2.85
43年目	R 49	0.98857	0.98596	0.99785	0.98990	0.1522	103.0	5.42	1.52	8.95	15.89	2.42	0.76	0.06	0.49	1.31	0.20	0.65	0.10	17.86	2.72
44年目	R 50	0.98844	0.98576	0.99785	0.98980	0.1463	103.0	5.36	1.50	8.93	15.79	2.31	0.75	0.06	0.49	1.30	0.19	0.65	0.09	17.74	2.59
45年目	R 51	0.98830	0.98555	0.99784	0.98969	0.1407	103.0	5.29	1.48	8.91	15.69	2.21	0.74	0.06	0.49	1.29	0.18	0.64	0.09	17.62	2.48
46年目	R 52	0.98816	0.98534	0.99784	0.98958	0.1353	103.0	5.23	1.46	8.89	15.59	2.11	0.73	0.06	0.49	1.28	0.17	0.63	0.09	17.50	2.37
47年目	R 53	0.98802	0.98513	0.99783	0.98947	0.1301	103.0	5.17	1.44	8.87	15.48	2.01	0.73	0.06	0.48	1.27	0.16	0.63	0.08	17.38	2.26
48年目	R 54	0.98787	0.98490	0.99783	0.98936	0.1251	103.0	5.11	1.42	8.86	15.38	1.92	0.72	0.06	0.48	1.26	0.16	0.62	0.08	17.26	2.16
49年目	R 55	0.98773	0.98467	0.99782	0.98925	0.1203	103.0	5.05	1.39	8.84	15.28	1.84	0.71	0.05	0.48	1.25	0.15	0.61	0.07	17.14	2.06
合 計								327.06	96.22	463.68	886.96	339.19	45.91	3.75	25.33	74.99	28.94	38.74	15.12	1,000.69	383.25
