

(再評価)

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	北海道横断自動車道 根室線 本別～釧路
事業主体	北海道開発局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	(一体評価 北海道横断自動車道 根室線 本別JCT～根室IC) 全体：費用便益比(B/C)= 1.3 (経済的純現在価値(B-C)=1,741億円、経済的内部収益率(EIRR)= 5.1%) 残事業：費用便益比(B/C)= 2.6 (経済的純現在価値(B-C)=1,064億円、経済的内部収益率(EIRR)=13.2%) (本別～釧路) 全体：費用便益比(B/C)= 0.9 (経済的純現在価値(B-C)= -263億円、経済的内部収益率(EIRR)= 3.7%) 残事業：費用便益比(B/C)= 5.6 (経済的純現在価値(B-C)= -844億円、経済的内部収益率(EIRR)=33.1%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	<input type="checkbox"/> 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	
		<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		<input type="checkbox"/> 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	
		<input type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
	<input checked="" type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	対象空港：釧路空港 対象自治体：釧路・根室圏 ※整備後は一体評価区間である本別JCT～根室IC間の効果も含む	
	物流効率化の支援	<input checked="" type="checkbox"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	対象港湾：釧路港 対象自治体：釧路・根室圏、十勝圏 所要時間の短縮：釧路港～本別町間、釧路港～根室市間 ※整備後は一体評価区間である本別JCT～根室IC間の効果も含む
<input checked="" type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上		対象農水産品：さんま(厚岸町ほか) 主な出荷先：苫小牧港から関東方面、札幌中央卸売市場など道央の市場 ※整備後は一体評価区間である本別JCT～根室IC間の効果も含む	
<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する			

1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
		<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
		<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	対象拠点都市：釧路市～根室市、釧路市～帯広市、釧路市～苫小牧市 ※整備後は一体評価区間である本別JCT～根室IC間の効果も含む
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	対象日常活動圏中心都市：釧路市～根室市、釧路市～帯広市、釧路市～苫小牧市 ※整備後は一体評価区間である本別JCT～根室IC間の効果も含む
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	主要な観光地：道の駅阿寒丹頂の里、道の駅厚岸グルメパーク、阿寒湖温泉、屈斜路湖、春国岱、納沙布岬等 ※整備後は一体評価区間である本別JCT～根室IC間の効果も含む
		<input type="checkbox"/> 特別立法に基づく事業である	
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
		<input type="checkbox"/> 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業である	
	2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上に該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる
<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される			
無電柱化による美しい町並みの形成		<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	三次医療施設：市立釧路総合病院 対象自治体：根室市、旧阿寒町 所要時間の短縮：根室市～市立釧路総合病院間、旧阿寒町～市立釧路総合病院間 ※整備後は一体評価区間である本別JCT～根室IC間の効果も含む	

3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる <input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	第一次緊急輸送道路として位置づけあり
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	代替する緊急輸送道路：国道38号、国道44号 ※整備後は一体評価区間である本別JCT～根室IC間の効果も含む
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	
		<input type="checkbox"/> 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する	
		<input type="checkbox"/> 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす	
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：43,093(t-CO2/年) ※整備後は一体評価区間である本別JCT～根室IC間の効果も含む
	生活環境の改善・保全	<input type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
北海道横断自動車道 (根室線)	本別JCT～根室IC	L=115.3km	二次改築	B P

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
5,200～16,500	2	北海道開発局

① 費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和4年度			
単純合計	3,954億円	1,051億円	427億円	5,431億円
うち残事業分	690億円	322億円	63億円	1,074億円
基準年における 現在価値(C)	5,862億円	446億円	75億円	6,383億円
うち残事業分	575億円	104億円	7.8億円	686億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和4年度			
供用年	平成16年度, 平成22年度, 平成27年度, 平成28年度, 令和元年度, 令和2年度, 令和7年度, 令和15年度			
単年便益 (初年便益)	7.0億円	2.1億円	0.44億円	9.5億円
基準年における 現在価値(B)	6,490億円	1,359億円	275億円	8,124億円
うち残事業分	1,423億円	274億円	54億円	1,751億円

③ 結果

費用便益比(事業全体)	1.3
経済的純現在価値(事業全体)	1,741億円
経済的内部収益率(事業全体)	5.1%
費用便益比(残事業)	2.6
経済的純現在価値(残事業)	1,064億円
経済的内部収益率(残事業)	13.2%

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	5,200~16,500	±10%	1.1~1.4
事業費	3,954億円	±10%	1.3~1.3
事業期間	39年	±20%	1.3~1.3

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	5,200~9,400	±10%	2.2~2.9
事業費	690億円	±10%	2.4~2.8
事業期間	10年	±20%	2.5~2.6

交通状況の変化(事業全体)

事業名:本別JCT~根室IC

(推計時点 R22年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 115.3km	交通量	[台/日]	0	7,800	
	走行時間	[分]	0.0	96.9	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	158.10	
②主な 周辺道路	現道: 国道38号 78.0km	交通量	[台/日]	9,200	7,100
		走行時間	[分]	135.3	124.4
		走行時間費用	[億円/年]	262.04	182.89
	現道: 国道44号 47.3km	交通量	[台/日]	8,000	3,300
		走行時間	[分]	97.0	80.5
		走行時間費用	[億円/年]	152.32	49.80
	国道240号 15.7km	交通量	[台/日]	7,500	5,400
		走行時間	[分]	21.7	20.8
		走行時間費用	[億円/年]	32.37	22.46
	一)厚岸 昆布森線 21.7km	交通量	[台/日]	1,000	100
		走行時間	[分]	46.1	43.6
		走行時間費用	[億円/年]	8.73	0.50
③その他道路合計 26,125.3km	走行時間費用	[億円/年]	20,060.17	19,856.66	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計:26,403.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	20,515.63	20,270.41	245.22

事業名：本別JCT～根室IC

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)】



交通状況の変化(残事業)

事業名:本別JCT~根室IC

(推計時点 R22年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 41.7km	交通量	[台/日]	0	7,700	
	走行時間	[分]	0.0	33.5	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	52.99	
②主な 周辺道路	現道: 国道38号 78.0km	交通量	[台/日]	7,600	7,100
		走行時間	[分]	126.8	124.4
		走行時間費用	[億円/年]	200.61	182.89
	現道: 国道44号 47.3km	交通量	[台/日]	6,100	3,300
		走行時間	[分]	89.9	80.5
		走行時間費用	[億円/年]	105.49	49.80
	国道240号 15.7km	交通量	[台/日]	10,000	5,400
		走行時間	[分]	22.9	20.8
		走行時間費用	[億円/年]	47.39	22.46
	一)厚岸 昆布森線 21.7km	交通量	[台/日]	1,300	100
		走行時間	[分]	48.2	43.6
		走行時間費用	[億円/年]	12.78	0.50
③その他道路合計 26,198.9km	走行時間費用	[億円/年]	19,988.51	19,961.77	

走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
-------------------	-------------------	---------------------

合計:26,403.3km	走行時間短縮便益 [億円/年]	20,354.78	20,270.41	84.36
---------------	-----------------	-----------	-----------	-------

事業名：本別JCT～根室IC

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)】



費用便益分析の条件

事業名:本別JCT～根室IC

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)	■	
	その他	□	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和4年	
交通	交通流の推計時点	1時点のみ推計	■(R22)
		複数時点での推計	□
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	■
		整備の有無のいずれかのみ推計	□有 □無
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	■ (H27センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	□
		その他()	□
	開発交通量の考慮	無	■
		有	□
有の場合のみ		考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	□	
	転換率式を用いた配分	□	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	■	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	□	
	簡易手法	□	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	□
		山間部海岸部で併行道路が少ない	□
		その他()	
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
その他()	□		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	■	
	採用理由を記載 交通容量未満・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の生ずる加重平均速度を用いた。		
	最終配分の速度	□	
	採用理由を記載		
その他()	□		

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	()%
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	()日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
考慮する		<input checked="" type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載 当該地域の直近3か年(令和元年~令和3年)における最低気温0℃以下かつ積雪1cm以上を満たす日数とし、98日と設定	(98)日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載 Vmax、Vminについて低減		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表(事業全体)

				維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)					
				単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)	
				0.160		115.3		18.46	
年次	年度	割引率 4.0%	GDP デフレ率	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-10年目	H 6	2.9987	114.30	0.30	0.80				
- 9年目	H 7	2.8834	113.70	0.32	0.83				
- 8年目	H 8	2.7725	113.20	1.16	2.90				
- 7年目	H 9	2.6658	114.20	2.62	6.24				
- 6年目	H 10	2.5633	113.60	8.84	20.32				
- 5年目	H 11	2.4647	112.00	52.03	116.68				
- 4年目	H 12	2.3699	110.70	73.33	159.97				
- 3年目	H 13	2.2788	109.40	80.08	169.97				
- 2年目	H 14	2.1911	107.60	61.32	127.25				
- 1年目	H 15	2.1068	106.10	126.74	256.45				
供用開始年次	H 16	2.0258	105.00	140.57	276.36	0.26	0.51		
1年目	H 17	1.9479	103.70	114.10	218.40	0.26	0.50		
2年目	H 18	1.8730	103.00	228.39	423.21	0.26	0.48		
3年目	H 19	1.8009	102.10	240.46	432.19	0.26	0.47		
4年目	H 20	1.7317	101.60	241.51	419.46	0.26	0.45		
5年目	H 21	1.6651	100.30	211.97	358.58	0.26	0.44		
供用開始(6年目)	H 22	1.6010	98.60	157.67	260.87	1.46	2.41		
7年目	H 23	1.5395	97.20	151.43	244.40	1.46	2.35		
8年目	H 24	1.4802	96.40	240.07	375.63	1.46	2.28		
9年目	H 25	1.4233	96.40	203.59	306.30	1.46	2.19		
10年目	H 26	1.3686	98.70	143.07	202.16	1.46	2.06		
供用開始(11年目)	H 27	1.3159	100.20	99.26	132.84	5.38	7.20		
供用開始(12年目)	H 28	1.2653	100.30	98.89	127.12	8.81	11.33		
13年目	H 29	1.2167	100.50	101.09	124.71	8.81	10.87		
14年目	H 30	1.1699	100.40	110.05	130.67	8.81	10.46		
供用開始(15年目)	R 1	1.1249	101.20	96.73	109.56	9.69	10.97		
供用開始(16年目)	R 2	1.0816	101.90	91.82	99.31	10.78	11.66		
17年目	R 3	1.0400	101.90	96.69	100.56	10.78	11.21		
18年目	R 4	1.0000	101.90	90.00	90.00	10.78	10.78		
19年目	R 5	0.9615	101.90	96.98	93.25	10.78	10.36		
20年目	R 6	0.9246	101.90	115.05	106.37	10.78	9.96		
供用開始(21年目)	R 7	0.8890	101.90	61.18	54.39	13.43	11.94		
22年目	R 8	0.8548	101.90	77.10	65.91	13.43	11.48		
23年目	R 9	0.8219	101.90	61.91	50.88	13.43	11.04		
24年目	R 10	0.7903	101.90	71.82	56.76	13.43	10.61		
25年目	R 11	0.7599	101.90	58.49	44.45	13.43	10.21		
26年目	R 12	0.7307	101.90	49.19	35.94	13.43	9.81		
27年目	R 13	0.7026	101.90	63.79	44.82	13.43	9.44		
28年目	R 14	0.6756	101.90	34.08	23.03	13.43	9.07		
供用開始(29年目)	R 15	0.6496	101.90			16.79	10.90		
30年目	R 16	0.6246	101.90			16.79	10.48		
31年目	R 17	0.6006	101.90			16.79	10.08		
32年目	R 18	0.5775	101.90			16.79	9.69		
33年目	R 19	0.5553	101.90			16.79	9.32		
34年目	R 20	0.5339	101.90			16.79	8.96		
35年目	R 21	0.5134	101.90			16.79	8.62		
36年目	R 22	0.4936	101.90			16.79	8.29		
37年目	R 23	0.4746	101.90			16.79	7.97		
38年目	R 24	0.4564	101.90			16.79	7.66		
39年目	R 25	0.4388	101.90			16.79	7.37		
40年目	R 26	0.4220	101.90			16.79	7.08		
41年目	R 27	0.4057	101.90			16.79	6.81		
42年目	R 28	0.3901	101.90			16.79	6.55		
43年目	R 29	0.3751	101.90			16.79	6.30		
44年目	R 30	0.3607	101.90			16.79	6.05		
45年目	R 31	0.3468	101.90			16.79	5.82		
46年目	R 32	0.3335	101.90			16.79	5.60		
47年目	R 33	0.3207	101.90			16.79	5.38		
48年目	R 34	0.3083	101.90			16.79	5.18		
49年目	R 35	0.2965	101.90			16.79	4.98		
50年目	R 36	0.2851	101.90			16.79	4.79		
51年目	R 37	0.2741	101.90			16.79	4.60		
52年目	R 38	0.2636	101.90			16.79	4.42		
53年目	R 39	0.2534	101.90			16.79	4.25		
54年目	R 40	0.2437	101.90			16.79	4.09		
55年目	R 41	0.2343	101.90			16.79	3.93		
56年目	R 42	0.2253	101.90			16.79	3.78	49.67	11.19
57年目	R 43	0.2166	101.90			16.79	3.64		
58年目	R 44	0.2083	101.90			16.79	3.50		
59年目	R 45	0.2003	101.90			16.79	3.36		
60年目	R 46	0.1926	101.90			16.79	3.23		
61年目	R 47	0.1852	101.90			16.79	3.11	123.35	22.85
62年目	R 48	0.1780	101.90			16.79	2.99	136.11	24.23
63年目	R 49	0.1712	101.90			16.79	2.87		
64年目	R 50	0.1646	101.90			16.79	2.76		
65年目	R 51	0.1583	101.90			16.79	2.66	51.57	8.16
66年目	R 52	0.1522	101.90			16.79	2.55	3.35	0.51
67年目	R 53	0.1463	101.90			16.79	2.46		
68年目	R 54	0.1407	101.90			16.79	2.36		
69年目	R 55	0.1353	101.90			16.79	2.27		
70年目	R 56	0.1301	101.90			16.79	2.18		
71年目	R 57	0.1251	101.90			16.79	2.10	62.72	7.85
72年目	R 58	0.1203	101.90			16.79	2.02		
73年目	R 59	0.1157	101.90			16.79	1.94		
74年目	R 60	0.1112	101.90			16.79	1.87		
75年目	R 61	0.1069	101.90			16.79	1.79		
76年目	R 62	0.1028	101.90			16.79	1.73		
77年目	R 63	0.0989	101.90			16.79	1.66		
78年目	R 64	0.0951	101.90	-84.72	-7.85	16.79	1.60		
合計				3,868.99	5,861.69	1,051.00	446.17	426.78	74.78
単純事業費計				3,953.71		1,051.00		426.78	

注1)事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、

必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:北海道横断自動車道(根室線)本別JCT~根室IC

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.159	41.7	6.61

年次	年度	割引率 4.0%	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
- 2年目	R 5	0.9615	101.90	96.98	93.25				
- 1年目	R 6	0.9246	101.90	115.05	106.37				
供用開始年次	R 7	0.8890	101.90	61.18	54.39	2.65	2.36		
1年目	R 8	0.8548	101.90	77.10	65.91	2.65	2.27		
2年目	R 9	0.8219	101.90	61.91	50.88	2.65	2.18		
3年目	R 10	0.7903	101.90	71.82	56.76	2.65	2.10		
4年目	R 11	0.7599	101.90	58.49	44.45	2.65	2.02		
5年目	R 12	0.7307	101.90	49.19	35.94	2.65	1.94		
6年目	R 13	0.7026	101.90	63.79	44.82	2.65	1.87		
7年目	R 14	0.6756	101.90	34.08	23.03	2.65	1.79		
供用開始(8年目)	R 15	0.6496	101.90			6.01	3.90		
9年目	R 16	0.6246	101.90			6.01	3.75		
10年目	R 17	0.6006	101.90			6.01	3.61		
11年目	R 18	0.5775	101.90			6.01	3.47		
12年目	R 19	0.5553	101.90			6.01	3.34		
13年目	R 20	0.5339	101.90			6.01	3.21		
14年目	R 21	0.5134	101.90			6.01	3.09		
15年目	R 22	0.4936	101.90			6.01	2.97		
16年目	R 23	0.4746	101.90			6.01	2.85		
17年目	R 24	0.4564	101.90			6.01	2.74		
18年目	R 25	0.4388	101.90			6.01	2.64		
19年目	R 26	0.4220	101.90			6.01	2.54		
20年目	R 27	0.4057	101.90			6.01	2.44		
21年目	R 28	0.3901	101.90			6.01	2.34		
22年目	R 29	0.3751	101.90			6.01	2.25		
23年目	R 30	0.3607	101.90			6.01	2.17		
24年目	R 31	0.3468	101.90			6.01	2.08		
25年目	R 32	0.3335	101.90			6.01	2.00		
26年目	R 33	0.3207	101.90			6.01	1.93		
27年目	R 34	0.3083	101.90			6.01	1.85		
28年目	R 35	0.2965	101.90			6.01	1.78		
29年目	R 36	0.2851	101.90			6.01	1.71		
30年目	R 37	0.2741	101.90			6.01	1.65		
31年目	R 38	0.2636	101.90			6.01	1.58		
32年目	R 39	0.2534	101.90			6.01	1.52		
33年目	R 40	0.2437	101.90			6.01	1.46		
34年目	R 41	0.2343	101.90			6.01	1.41		
35年目	R 42	0.2253	101.90			6.01	1.35		
36年目	R 43	0.2166	101.90			6.01	1.30		
37年目	R 44	0.2083	101.90			6.01	1.25		
38年目	R 45	0.2003	101.90			6.01	1.20		
39年目	R 46	0.1926	101.90			6.01	1.16		
40年目	R 47	0.1852	101.90			6.01	1.11		
41年目	R 48	0.1780	101.90			6.01	1.07		
42年目	R 49	0.1712	101.90			6.01	1.03		
43年目	R 50	0.1646	101.90			6.01	0.99		
44年目	R 51	0.1583	101.90			6.01	0.95		
45年目	R 52	0.1522	101.90			6.01	0.91		
46年目	R 53	0.1463	101.90			6.01	0.88		
47年目	R 54	0.1407	101.90			6.01	0.85		
48年目	R 55	0.1353	101.90			6.01	0.81		
49年目	R 56	0.1301	101.90			6.01	0.78		
50年目	R 57	0.1251	101.90			6.01	0.75	62.72	7.85
51年目	R 58	0.1203	101.90			6.01	0.72		
52年目	R 59	0.1157	101.90			6.01	0.70		
53年目	R 60	0.1112	101.90			6.01	0.67		
54年目	R 61	0.1069	101.90			6.01	0.64		
55年目	R 62	0.1028	101.90			6.01	0.62		
56年目	R 63	0.0989	101.90			6.01	0.59		
57年目	R 64	0.0951	101.90	-9.79	-0.93	6.01	0.57		
合計				679.80	574.86	321.69	103.73	62.72	7.85
単純事業費計				689.59		321.69		62.72	

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、

必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:北海道横断自動車道(根室線) 本別JCT~根室IC

年次	年度 (基準年) R4	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)			合計 (億円)			
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車		乗用車類	小型貨物	普通貨物	①	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	割引率 4.0%	
供用開始年次	H 16	0.98873	0.95725	0.95369	0.95369	2.0258	105.00	3.17	0.95	2.85	6.97	13.71	1.04	0.23	0.80	2.07	4.06	0.44	0.86	9.48	18.64
1年目	H 17	0.95398	0.95904	0.99176	0.95871	1.9479	103.70	3.14	0.91	2.72	6.77	12.95	1.02	0.22	0.76	2.01	3.84	0.43	0.82	9.20	17.62
2年目	H 18	0.96105	0.96660	1.00122	0.96624	1.8730	103.00	2.99	0.87	2.70	6.56	12.16	0.98	0.21	0.76	1.94	3.60	0.41	0.76	8.92	16.53
3年目	H 19	0.93682	0.94276	0.97826	0.94238	1.8009	102.10	2.87	0.84	2.70	6.42	11.54	0.94	0.20	0.76	1.90	3.42	0.40	0.72	8.72	15.67
4年目	H 20	0.95463	0.96129	0.99943	0.96086	1.7317	101.60	2.69	0.80	2.64	6.13	10.65	0.88	0.19	0.74	1.81	3.15	0.38	0.65	8.32	14.45
5年目	H 21	0.94893	0.95625	0.99632	0.95578	1.6651	100.30	2.57	0.76	2.64	5.98	10.11	0.84	0.18	0.74	1.77	2.99	0.36	0.61	8.10	13.71
供用開始(6年目)	H 22	1.01616	1.03299	0.99374	1.01555	1.6010	98.60	4.34	1.14	4.90	10.37	17.16	1.38	0.23	1.29	2.91	4.81	0.60	0.99	13.87	22.95
7年目	H 23	1.04134	1.05759	1.01863	1.04074	1.5395	97.20	4.41	1.17	4.87	10.45	16.86	1.41	0.24	1.28	2.93	4.73	0.61	0.96	13.98	22.56
8年目	H 24	1.01834	1.03335	0.99677	1.01778	1.4802	96.40	4.59	1.24	4.96	10.79	16.88	1.46	0.26	1.30	3.02	4.73	0.63	0.99	14.44	22.60
9年目	H 25	1.00898	1.02303	0.98802	1.00845	1.4233	96.40	4.67	1.26	4.94	10.90	16.80	1.49	0.26	1.30	3.06	4.60	0.64	0.96	14.60	21.96
10年目	H 26	1.02076	1.03423	0.99997	1.02024	1.3686	96.70	4.71	1.31	4.88	10.91	15.42	1.50	0.27	1.28	3.06	4.32	0.65	0.91	14.62	20.85
供用開始(11年目)	H 27	0.99546	0.97919	0.99872	0.99346	1.3159	100.20	24.08	4.10	21.24	49.43	86.15	6.72	0.67	5.19	12.58	16.84	2.52	3.37	64.53	86.36
供用開始(12年目)	H 28	0.99544	0.97874	0.99872	0.99341	1.2653	100.30	20.68	4.27	20.90	48.06	83.06	6.71	0.67	5.04	12.53	16.84	2.52	3.37	64.53	86.36
13年目	H 29	0.99542	0.97828	0.99872	0.99337	1.2167	100.50	20.36	4.21	20.64	47.64	82.46	6.64	0.66	5.00	12.52	16.84	2.52	3.37	64.53	86.36
14年目	H 30	0.99540	0.97780	0.99872	0.99333	1.1699	100.40	20.04	4.14	20.38	47.16	81.86	6.56	0.66	4.93	12.50	16.84	2.52	3.37	64.53	86.36
供用開始(15年目)	R 1	0.99538	0.97730	0.99872	0.99328	1.1249	101.20	88.49	15.21	61.73	164.52	193.28	12.41	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
供用開始(16年目)	R 2	0.99536	0.97677	0.99872	0.99324	1.0816	101.90	97.06	16.40	65.13	178.59	193.16	12.25	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
17年目	R 3	0.99534	0.97622	0.99871	0.99319	1.0400	101.90	96.61	16.02	65.04	177.68	184.78	12.05	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
18年目	R 4	0.99531	0.97564	0.99871	0.99314	1.0000	101.90	96.16	15.64	64.96	176.76	176.76	11.87	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
19年目	R 5	0.99529	0.97503	0.99871	0.99310	0.9615	101.90	95.71	15.26	64.88	175.85	169.08	11.69	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
20年目	R 6	0.99527	0.97439	0.99871	0.99305	0.9246	101.90	95.26	14.88	64.79	174.93	161.74	11.51	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
供用開始(21年目)	R 7	0.99525	0.97372	0.99871	0.99300	0.8890	101.90	117.38	18.20	82.23	217.81	193.63	15.51	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
22年目	R 8	0.99523	0.97301	0.99871	0.99295	0.8548	101.90	116.82	17.72	82.12	216.67	185.21	15.33	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
23年目	R 9	0.99520	0.97226	0.99870	0.99290	0.8219	101.90	116.26	17.24	82.02	215.52	177.14	15.16	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
24年目	R 10	0.99518	0.97147	0.99870	0.99285	0.7903	101.90	115.71	16.76	81.91	214.38	169.43	15.00	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
25年目	R 11	0.99516	0.97063	0.99870	0.99280	0.7599	101.90	115.15	16.29	81.81	213.24	162.04	14.84	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
26年目	R 12	0.99514	0.96980	0.99870	0.99275	0.7307	101.90	114.59	15.81	81.70	212.10	154.96	14.67	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
27年目	R 13	0.99511	0.96896	0.99870	0.99270	0.7026	101.90	113.90	15.34	81.59	210.96	147.83	14.51	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
28年目	R 14	0.99509	0.96811	0.99870	0.99265	0.6745	101.90	113.22	14.87	81.48	209.81	140.70	14.35	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
供用開始(29年目)	R 15	0.99507	0.96727	0.99870	0.99260	0.6464	101.90	112.54	14.40	81.37	208.66	133.57	14.19	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
30年目	R 16	0.99506	0.96642	0.99870	0.99255	0.6183	101.90	111.86	13.93	81.26	207.51	126.44	14.03	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
31年目	R 17	0.99504	0.96557	0.99870	0.99250	0.5902	101.90	111.18	13.46	81.15	206.36	119.31	13.87	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
32年目	R 18	0.99503	0.96472	0.99870	0.99245	0.5621	101.90	110.50	12.99	81.04	205.21	112.20	13.71	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
33年目	R 19	0.99501	0.96387	0.99870	0.99240	0.5340	101.90	109.82	12.52	80.93	204.06	105.10	13.55	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
34年目	R 20	0.99500	0.96302	0.99870	0.99235	0.5059	101.90	109.14	12.05	80.82	202.91	98.00	13.39	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
35年目	R 21	0.99499	0.96217	0.99870	0.99230	0.4778	101.90	108.46	11.58	80.71	201.76	90.90	13.23	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
36年目	R 22	0.99498	0.96132	0.99870	0.99225	0.4497	101.90	107.78	11.11	80.60	200.61	83.80	13.07	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
37年目	R 23	0.99497	0.96047	0.99870	0.99220	0.4216	101.90	107.10	10.64	80.49	199.46	76.70	12.91	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
38年目	R 24	0.99496	0.95962	0.99870	0.99215	0.3935	101.90	106.42	10.17	80.38	198.31	69.60	12.75	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
39年目	R 25	0.99495	0.95877	0.99870	0.99210	0.3654	101.90	105.74	9.70	80.27	197.16	62.50	12.59	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
40年目	R 26	0.99494	0.95792	0.99870	0.99205	0.3373	101.90	105.06	9.23	80.16	196.01	55.40	12.43	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
41年目	R 27	0.99493	0.95707	0.99870	0.99200	0.3092	101.90	104.38	8.76	80.05	194.86	48.30	12.27	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
42年目	R 28	0.99492	0.95622	0.99870	0.99195	0.2811	101.90	103.70	8.29	79.94	193.71	41.20	12.11	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
43年目	R 29	0.99491	0.95537	0.99870	0.99190	0.2530	101.90	103.02	7.82	79.83	192.56	34.10	11.95	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
44年目	R 30	0.99490	0.95452	0.99870	0.99185	0.2249	101.90	102.34	7.35	79.72	191.41	27.00	11.79	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
45年目	R 31	0.99489	0.95367	0.99870	0.99180	0.1968	101.90	101.66	6.88	79.61	190.26	20.00	11.63	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
46年目	R 32	0.99488	0.95282	0.99870	0.99175	0.1687	101.90	100.98	6.41	79.50	189.11	13.00	11.47	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
47年目	R 33	0.99487	0.95197	0.99870	0.99170	0.1406	101.90	100.30	5.94	79.39	187.96	6.00	11.31	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
48年目	R 34	0.99486	0.95112	0.99870	0.99165	0.1125	101.90	99.62	5.47	79.28	186.81	0.00	11.15	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
49年目	R 35	0.99485	0.95027	0.99870	0.99160	0.0844	101.90	98.94	5.00	79.17	185.66	0.00	11.00	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
50年目	R 36	0.99484	0.94942	0.99870	0.99155	0.0563	101.90	98.26	4.53	79.06	184.51	0.00	10.84	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
51年目	R 37	0.99483	0.94857	0.99870	0.99150	0.0282	101.90	97.58	4.06	78.95	183.36	0.00	10.68	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
52年目	R 38	0.99482	0.94772	0.99870	0.99145	0.0001	101.90	96.90	3.59	78.84	182.21	0.00	10.52	1.18	35.50	40.21	7.50	8.50	208.42	236.07	
53年目	R 39	0.99481	0.94687	0.99870	0.99140																

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名:北海道横断自動車道(根室線)本別JCT~根室IC

年次	年度 (基準年)	総走行台数の年次別伸び率 (北海道ブロック)				割戻率 4.0%	GDP デフレ率	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 ①~③	現在価値 割戻率4.0%
供用開始年次	R 7	0.99525	0.97372	0.99871	0.99300	0.8890	101.90	22.57	3.70	17.52	43.79	38.93	5.74	0.50	3.75	9.99	8.88	2.11	1.88	55.89	49.69
1年目	R 8	0.99523	0.97301	0.99871	0.99295	0.8548	101.90	22.46	3.60	17.50	43.57	37.24	5.71	0.49	3.74	9.94	8.50	2.10	1.79	55.60	47.53
2年目	R 9	0.99520	0.97226	0.99870	0.99290	0.8219	101.90	22.36	3.51	17.48	43.34	35.62	5.68	0.47	3.74	9.90	8.13	2.08	1.71	55.32	45.47
3年目	R 10	0.99518	0.97147	0.99870	0.99285	0.7903	101.90	22.25	3.41	17.45	43.11	34.07	5.66	0.46	3.73	9.85	7.79	2.07	1.63	55.03	43.49
4年目	R 11	0.99516	0.97063	0.99870	0.99280	0.7599	101.90	22.14	3.31	17.43	42.88	32.59	5.63	0.45	3.73	9.81	7.45	2.05	1.56	54.74	41.60
5年目	R 12	0.99401	0.98507	0.99820	0.99354	0.7307	101.90	22.03	3.21	17.41	42.66	31.17	5.60	0.43	3.72	9.76	7.13	2.04	1.49	54.46	39.79
6年目	R 13	0.99397	0.98484	0.99820	0.99349	0.7026	101.90	21.90	3.17	17.38	42.45	29.82	5.57	0.43	3.72	9.71	6.83	2.02	1.42	54.18	38.07
7年目	R 14	0.99393	0.98461	0.99820	0.99345	0.6756	101.90	21.77	3.12	17.35	42.23	28.53	5.54	0.42	3.71	9.67	6.53	2.01	1.36	53.91	36.42
供用開始(8年目)	R 15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	0.6496	101.90	49.71	7.32	30.64	87.67	56.95	9.80	0.82	5.53	16.16	10.49	3.19	2.07	107.02	69.52
9年目	R 16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	0.6246	101.90	49.41	7.21	30.59	87.20	54.47	9.74	0.81	5.52	16.07	10.04	3.16	1.98	106.44	66.48
10年目	R 17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	0.6006	101.90	49.10	7.09	30.53	86.73	52.09	9.68	0.80	5.51	15.99	9.60	3.14	1.89	105.86	63.58
11年目	R 18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	0.5775	101.90	48.80	6.98	30.47	86.25	49.81	9.62	0.79	5.50	15.91	9.19	3.12	1.80	105.28	60.80
12年目	R 19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	0.5553	101.90	48.50	6.87	30.42	85.78	47.63	9.56	0.77	5.49	15.83	8.79	3.10	1.72	104.71	58.14
13年目	R 20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	0.5339	101.90	48.19	6.75	30.36	85.31	45.55	9.50	0.76	5.48	15.74	8.40	3.08	1.64	104.13	55.59
14年目	R 21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	0.5134	101.90	47.89	6.64	30.31	84.83	43.55	9.44	0.75	5.47	15.66	8.04	3.06	1.57	103.55	53.16
15年目	R 22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	0.4936	101.90	47.59	6.52	30.25	84.36	41.64	9.38	0.73	5.46	15.58	7.69	3.04	1.50	102.98	50.83
16年目	R 23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	0.4746	101.90	47.17	6.47	30.23	83.87	39.81	9.30	0.73	5.45	15.49	7.35	3.02	1.43	102.38	48.59
17年目	R 24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	0.4564	101.90	46.76	6.42	30.21	83.39	38.06	9.22	0.72	5.45	15.39	7.03	3.00	1.37	101.78	46.45
18年目	R 25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	0.4388	101.90	46.35	6.36	30.19	82.90	36.38	9.14	0.72	5.45	15.30	6.72	2.97	1.30	101.18	44.40
19年目	R 26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	0.4220	101.90	45.93	6.31	30.17	82.42	34.78	9.06	0.71	5.44	15.21	6.42	2.95	1.25	100.58	42.45
20年目	R 27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	0.4057	101.90	45.52	6.26	30.15	81.93	33.24	8.98	0.70	5.44	15.12	6.13	2.93	1.19	99.98	40.56
21年目	R 28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	0.3901	101.90	45.11	6.21	30.13	81.44	31.77	8.90	0.70	5.44	15.03	5.86	2.91	1.13	99.38	38.77
22年目	R 29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	0.3751	101.90	44.69	6.15	30.11	80.96	30.37	8.81	0.69	5.43	14.94	5.60	2.89	1.08	98.78	37.05
23年目	R 30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	0.3607	101.90	44.28	6.10	30.09	80.47	29.03	8.73	0.69	5.43	14.85	5.36	2.87	1.03	98.19	35.42
24年目	R 31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	0.3468	101.90	43.87	6.05	30.07	79.99	27.74	8.65	0.68	5.43	14.76	5.12	2.84	0.99	97.59	33.84
25年目	R 32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	0.3335	101.90	43.45	5.99	30.05	79.50	26.51	8.57	0.67	5.42	14.67	4.89	2.82	0.94	96.99	32.35
26年目	R 33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	0.3207	101.90	43.04	5.94	30.03	79.01	25.34	8.49	0.67	5.42	14.58	4.67	2.80	0.90	96.39	30.91
27年目	R 34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	0.3083	101.90	42.63	5.89	30.01	78.53	24.21	8.41	0.66	5.41	14.48	4.47	2.78	0.86	95.79	29.53
28年目	R 35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	0.2965	101.90	42.21	5.84	29.99	78.04	23.14	8.32	0.66	5.41	14.39	4.27	2.76	0.82	95.19	28.22
29年目	R 36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	0.2851	101.90	41.80	5.78	29.97	77.56	22.11	8.24	0.65	5.41	14.30	4.08	2.74	0.78	94.59	26.97
30年目	R 37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	0.2741	101.90	41.39	5.73	29.95	77.07	21.12	8.16	0.65	5.40	14.21	3.90	2.71	0.74	93.99	25.76
31年目	R 38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	0.2636	101.90	40.97	5.68	29.93	76.58	20.19	8.08	0.64	5.40	14.12	3.72	2.69	0.71	93.40	24.62
32年目	R 39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	0.2534	101.90	40.56	5.62	29.91	76.10	19.28	8.00	0.63	5.40	14.03	3.55	2.67	0.68	92.80	23.51
33年目	R 40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	0.2437	101.90	40.15	5.57	29.89	75.61	18.43	7.92	0.63	5.39	13.94	3.40	2.65	0.65	92.20	22.47
34年目	R 41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	0.2343	101.90	39.73	5.52	29.87	75.13	17.60	7.84	0.62	5.39	13.85	3.24	2.63	0.62	91.60	21.46
35年目	R 42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	0.2253	101.90	39.32	5.47	29.85	74.64	16.82	7.75	0.62	5.39	13.76	3.10	2.61	0.59	91.00	20.50
36年目	R 43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	0.2166	101.90	38.91	5.41	29.83	74.15	16.06	7.67	0.61	5.38	13.66	2.96	2.58	0.56	90.40	19.58
37年目	R 44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	0.2083	101.90	38.49	5.36	29.81	73.67	15.34	7.59	0.60	5.38	13.57	2.83	2.56	0.53	89.80	18.71
38年目	R 45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	0.2003	101.90	38.08	5.31	29.79	73.18	14.66	7.51	0.60	5.38	13.48	2.70	2.54	0.51	89.20	17.87
39年目	R 46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	0.1926	101.90	37.67	5.26	29.77	72.70	14.00	7.43	0.59	5.37	13.39	2.58	2.52	0.49	88.61	17.07
40年目	R 47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	0.1852	101.90	37.25	5.20	29.75	72.21	13.37	7.35	0.59	5.37	13.30	2.46	2.50	0.46	88.01	16.30
41年目	R 48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	0.1780	101.90	36.84	5.15	29.73	71.72	12.77	7.27	0.58	5.36	13.21	2.35	2.48	0.44	87.41	15.56
42年目	R 49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	0.1712	101.90	36.43	5.10	29.71	71.24	12.20	7.18	0.57	5.36	13.12	2.25	2.45	0.42	86.81	14.86
43年目	R 50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	0.1646	101.90	36.01	5.04	29.69	70.75	11.65	7.10	0.57	5.36	13.03	2.14	2.43	0.40	86.21	14.19
44年目	R 51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	0.1583	101.90	35.60	4.99	29.67	70.26	11.12	7.02	0.56	5.35	12.94	2.05	2.41	0.38	85.61	13.55
45年目	R 52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	0.1522	101.90	35.19	4.94	29.65	69.78	10.62	6.94	0.56	5.35	12.85	1.96	2.39	0.36	85.01	12.94
46年目	R 53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	0.1463	101.90	34.77	4.89	29.63	69.29	10.14	6.86	0.55	5.35	12.75	1.87	2.37	0.35	84.41	12.35
47年目	R 54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	0.1407	101.90	34.36	4.83	29.61	68.81	9.68	6.78	0.54	5.34	12.66	1.78	2.35	0.33	83.82	11.79
48年目	R 55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	0.1353	101.90	33.95	4.78	29.59	68.32	9.24	6.70	0.54	5.34	12.57	1.70	2.32	0.31	83.22	11.26
49年目	R 56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	0.1301	101.90	33.54	4.73	29.57	67.83	8.83	6.61	0.53	5.34	12.48	1.62	2.30	0.30	82.62	10.75
50年目	R 57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	0.1251	101.90	33.12	4.67	29.55	67.35	8.43	6.53	0.53	5.33	12.39	1.55	2.28	0.29	82.02	10.26
51年目	R 58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	0.1203	101.90	32.71	4.62	29.53	66.86	8.04	6.45	0.52	5.33	12.30	1.48	2.26	0.27	81.42	9.79
52年目	R 59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	0.1157															

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
北海道横断自動車道 (根室線)	本別～釧路	L=65.0km	高規格 (直轄高速)	B P

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
5,900～9,400	2	北海道開発局

① 費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和 4 年度			
単純合計	2,331億円	494億円		2,824億円
うち残事業分	137億円	133億円		269億円
基準年における 現在価値 (C)	3,573億円	196億円		3,769億円
うち残事業分	129億円	53億円		182億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和 4 年度			
供用年	令和 7 年度			
単年便益 (初年便益)	150億円	35億円	6.7億円	192億円
基準年における 現在価値 (B)	2,739億円	649億円	118億円	3,506億円
うち残事業分	809億円	179億円	37億円	1,025億円

③ 結果

費用便益比(事業全体)	0.9
経済的純現在価値(事業全体)	-263億円
経済的内部収益率(事業全体)	3.7%
費用便益比(残事業)	5.6
経済的純現在価値(残事業)	844億円
経済的内部収益率(残事業)	33.1%

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	5,900~9,400	±10%	0.8~1.1
事業費	2,331億円	±10%	0.9~0.9
事業期間	22年	±20%	0.9~0.9

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	8,300~9,400	±10%	4.8~6.5
事業費	137億円	±10%	5.3~6.1
事業期間	2年	±20%	5.6~5.6

交通状況の変化(事業全体)

事業名:本別～釧路


(推計時点 R22年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等]	交通量	[台/日]	0	6,900	
	走行時間	[分]	0.0	56.1	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	83.37	
65.0km					
②主な 周辺道路	現道: 国道38号	交通量	[台/日]	8,800	6,500
		走行時間	[分]	110.5	100.1
		走行時間費用	[億円/年]	209.10	135.03
	64.2km				
	国道274号	交通量	[台/日]	2,500	500
		走行時間	[分]	41.0	38.0
		走行時間費用	[億円/年]	22.73	3.55
	31.2km				
	国道392号	交通量	[台/日]	2,700	500
		走行時間	[分]	44.9	42.3
		走行時間費用	[億円/年]	25.93	4.22
	34.8km				
	国道240号	交通量	[台/日]	7,500	5,400
		走行時間	[分]	21.7	20.8
		走行時間費用	[億円/年]	32.58	22.46
	15.7km				
	国道336号	交通量	[台/日]	1,500	700
		走行時間	[分]	12.2	12.0
		走行時間費用	[億円/年]	3.87	1.63
	11.9km				
	一)直別 共栄線	交通量	[台/日]	1,800	500
走行時間		[分]	40.9	38.9	
走行時間費用		[億円/年]	15.95	4.12	
29.4km					
③その他道路合計 26,151.1km		走行時間費用	[億円/年]	20,099.48	20,016.03

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計: 26,403.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	20,409.64	20,270.41	139.23

事業名:本別～釧路

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)】

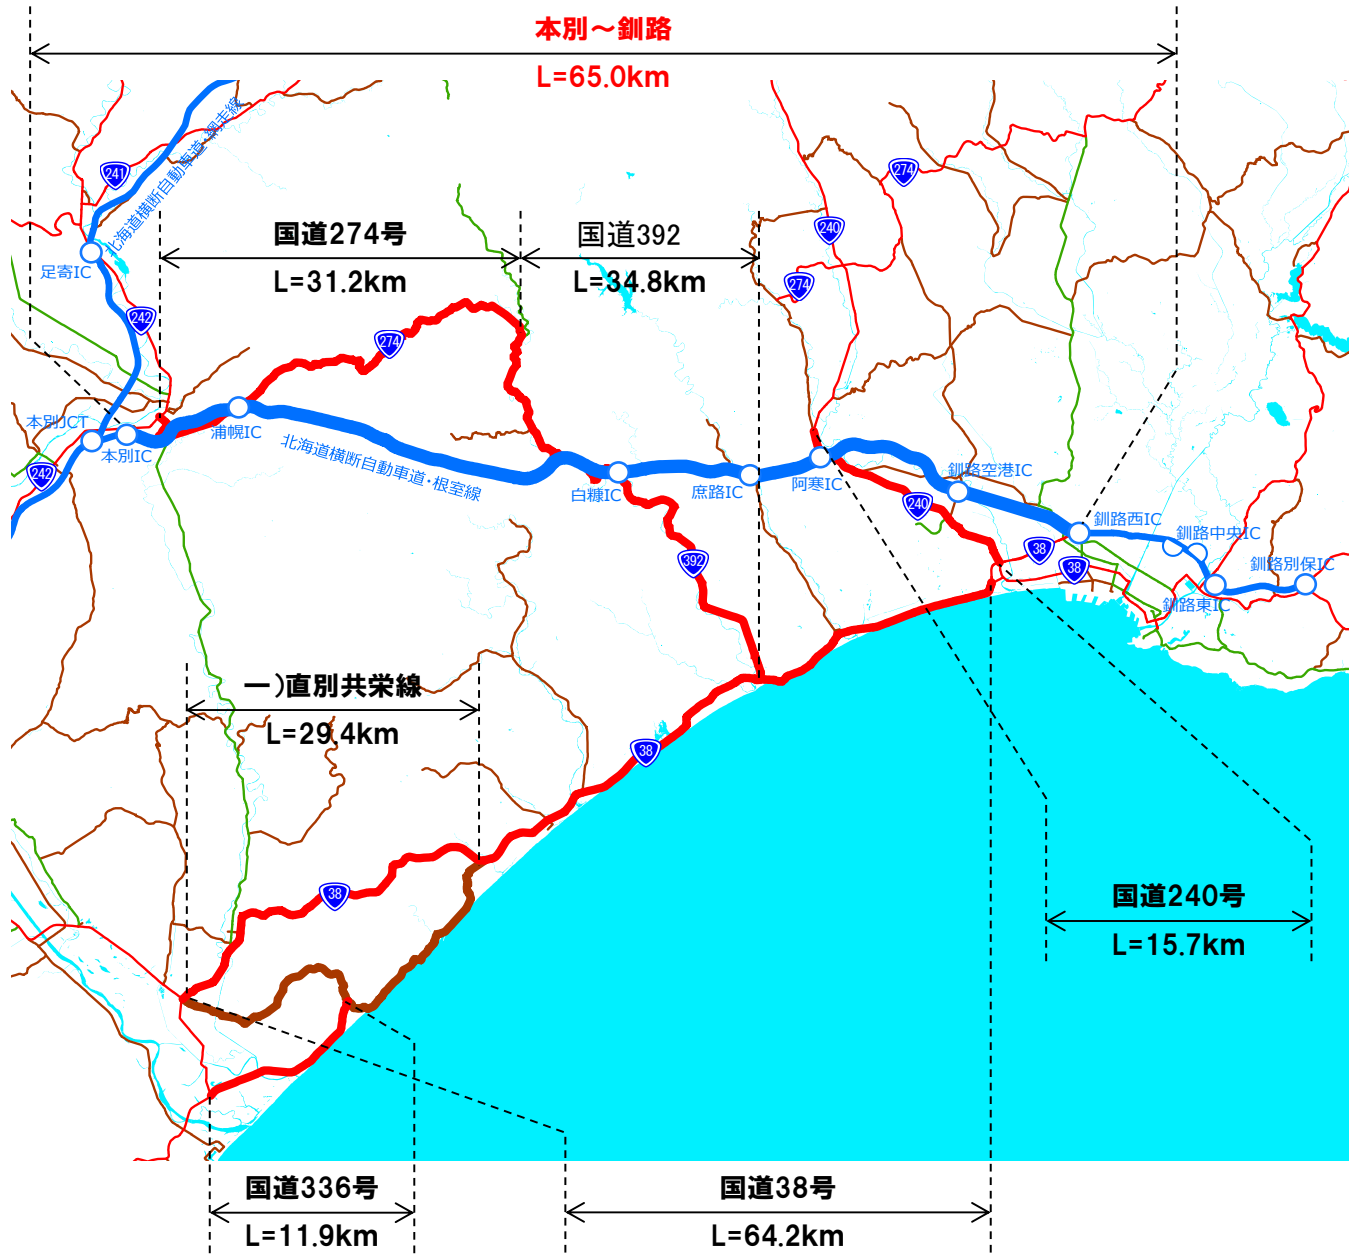

交通状況の変化(残事業)

事業名:本別～釧路


(推計時点 R22年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等]	交通量	[台/日]	0	8,800	
	走行時間	[分]	0.0	14.8	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	27.21	
17.0km					
②主な 周辺道路	現道: 国道38号	交通量	[台/日]	7,100	6,500
		走行時間	[分]	102.5	100.1
		走行時間費用	[億円/年]	151.78	135.03
	64.2km				
	国道274号	交通量	[台/日]	600	500
		走行時間	[分]	38.2	38.0
		走行時間費用	[億円/年]	4.97	3.55
	31.2km				
	国道392号	交通量	[台/日]	700	500
		走行時間	[分]	42.5	42.3
		走行時間費用	[億円/年]	6.07	4.22
	34.8km				
	国道240号	交通量	[台/日]	10,100	5,400
		走行時間	[分]	22.9	20.8
		走行時間費用	[億円/年]	47.72	22.46
	15.7km				
	国道336号	交通量	[台/日]	700	700
		走行時間	[分]	12.0	12.0
		走行時間費用	[億円/年]	1.84	1.63
	11.9km				
	一)直別 共栄線	交通量	[台/日]	800	500
		走行時間	[分]	39.3	38.9
		走行時間費用	[億円/年]	6.95	4.12
	29.4km				
③その他道路合計 26,199.1km		走行時間費用	[億円/年]	20,092.23	20,072.19

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計: 26,403.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	20,311.56	20,270.41	41.14

事業名:本別～釧路

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)】

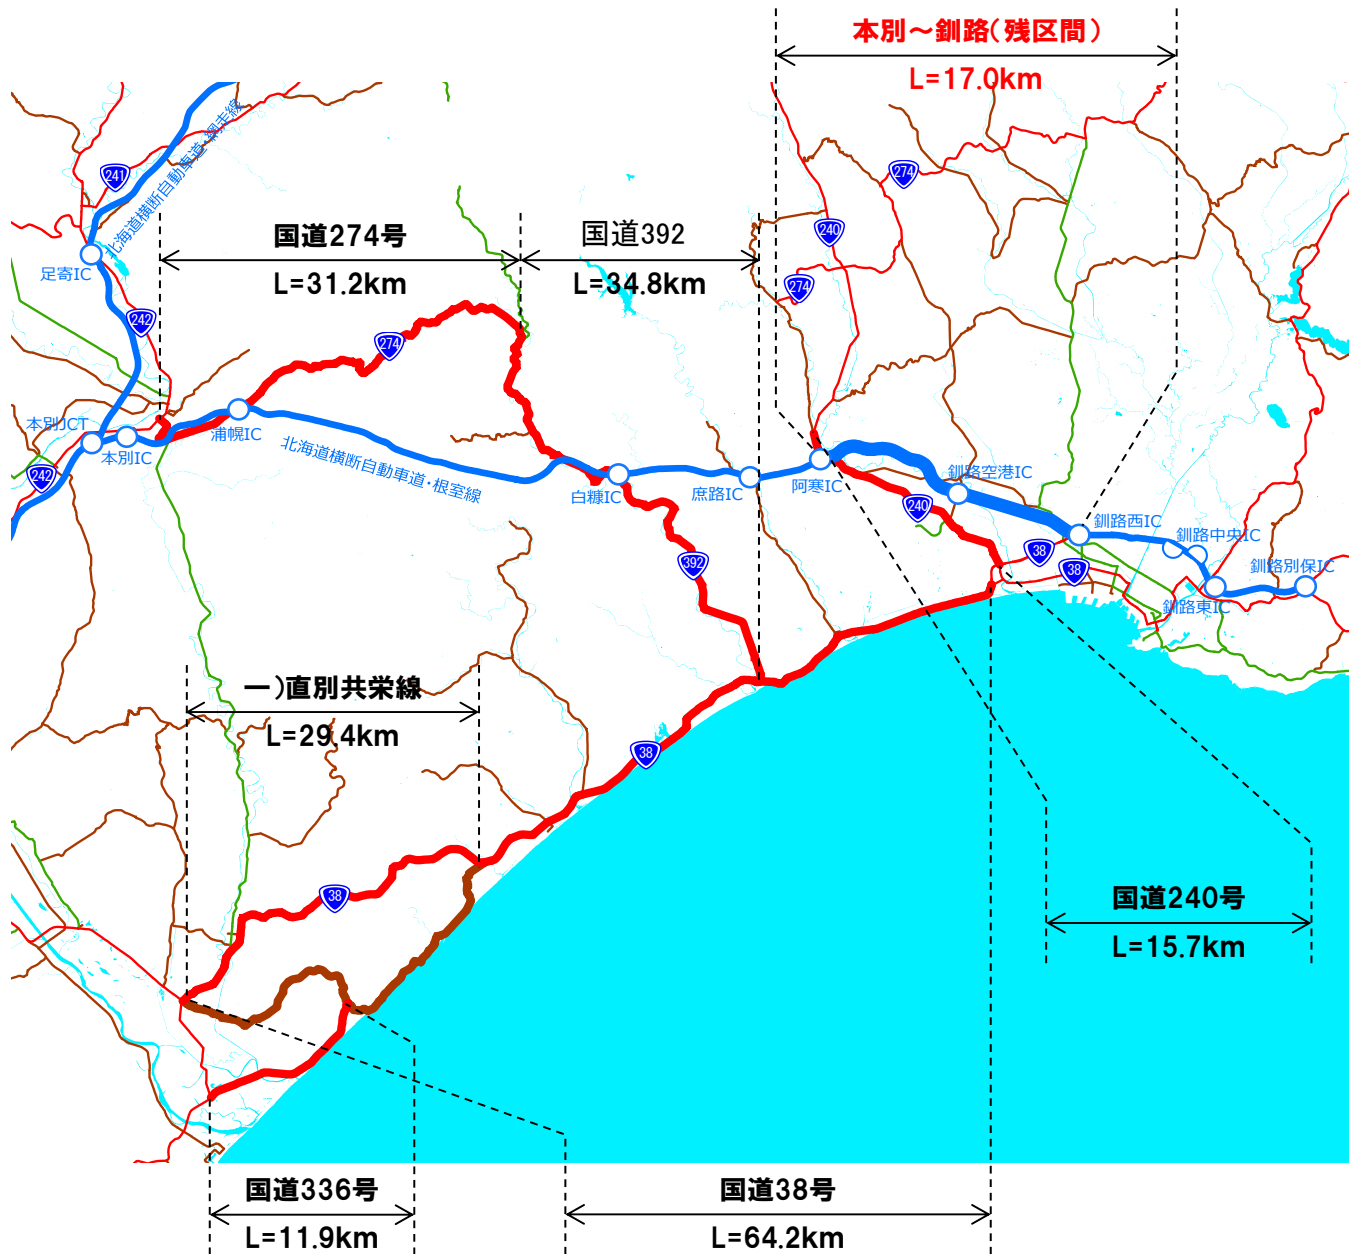

費用便益分析の条件

事業名: 本別～釧路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和4年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (R22)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
交通 配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
		その他()	
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
その他()	<input type="checkbox"/>		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通容量未満・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の生ずる加重平均速度を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
その他()	<input type="checkbox"/>		

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	()%
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	()日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
考慮する		<input checked="" type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載 当該地域の直近3か年(令和元年～令和3年)における最低気温0℃以下かつ積雪1cm以上を満たす日数とし、98日と設定	(98)日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載 Vmax、Vminについて低減		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表(事業全体)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:北海道横断自動車道(根室線)本別～釧路

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.167	65.0	10.86

年次	年度	割引率 4.0%	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-22年目	H 15	2.1068	106.10	70.57	142.79				
-21年目	H 16	2.0258	105.00	73.37	144.24				
-20年目	H 17	1.9479	103.70	38.07	72.86				
-19年目	H 18	1.8730	103.00	161.40	299.08				
-18年目	H 19	1.8009	102.10	197.80	355.52				
-17年目	H 20	1.7317	101.60	224.08	389.18				
-16年目	H 21	1.6651	100.30	186.87	316.13				
-15年目	H 22	1.6010	98.60	143.45	237.35				
-14年目	H 23	1.5395	97.20	138.78	223.99				
-13年目	H 24	1.4802	96.40	213.77	334.47				
-12年目	H 25	1.4233	96.40	141.17	212.39				
-11年目	H 26	1.3686	98.70	114.08	161.20				
-10年目	H 27	1.3159	100.20	44.46	59.49				
-9年目	H 28	1.2653	100.30	44.98	57.83				
-8年目	H 29	1.2167	100.50	47.22	58.25				
-7年目	H 30	1.1699	100.40	53.71	63.78				
-6年目	R 1	1.1249	101.20	72.55	82.17				
-5年目	R 2	1.0816	101.90	80.91	87.51				
-4年目	R 3	1.0400	101.90	82.00	85.28				
-3年目	R 4	1.0000	101.90	64.91	64.91				
-2年目	R 5	0.9615	101.90	69.00	66.34				
-1年目	R 6	0.9246	101.90	67.55	62.46				
供用開始年次	R 7	0.8890	101.90			9.87	8.78		
1年目	R 8	0.8548	101.90			9.87	8.44		
2年目	R 9	0.8219	101.90			9.87	8.11		
3年目	R 10	0.7903	101.90			9.87	7.80		
4年目	R 11	0.7599	101.90			9.87	7.50		
5年目	R 12	0.7307	101.90			9.87	7.21		
6年目	R 13	0.7026	101.90			9.87	6.94		
7年目	R 14	0.6756	101.90			9.87	6.67		
8年目	R 15	0.6496	101.90			9.87	6.41		
9年目	R 16	0.6246	101.90			9.87	6.17		
10年目	R 17	0.6006	101.90			9.87	5.93		
11年目	R 18	0.5775	101.90			9.87	5.70		
12年目	R 19	0.5553	101.90			9.87	5.48		
13年目	R 20	0.5339	101.90			9.87	5.27		
14年目	R 21	0.5134	101.90			9.87	5.07		
15年目	R 22	0.4936	101.90			9.87	4.87		
16年目	R 23	0.4746	101.90			9.87	4.69		
17年目	R 24	0.4564	101.90			9.87	4.51		
18年目	R 25	0.4388	101.90			9.87	4.33		
19年目	R 26	0.4220	101.90			9.87	4.17		
20年目	R 27	0.4057	101.90			9.87	4.01		
21年目	R 28	0.3901	101.90			9.87	3.85		
22年目	R 29	0.3751	101.90			9.87	3.70		
23年目	R 30	0.3607	101.90			9.87	3.56		
24年目	R 31	0.3468	101.90			9.87	3.42		
25年目	R 32	0.3335	101.90			9.87	3.29		
26年目	R 33	0.3207	101.90			9.87	3.17		
27年目	R 34	0.3083	101.90			9.87	3.04		
28年目	R 35	0.2965	101.90			9.87	2.93		
29年目	R 36	0.2851	101.90			9.87	2.81		
30年目	R 37	0.2741	101.90			9.87	2.71		
31年目	R 38	0.2636	101.90			9.87	2.60		
32年目	R 39	0.2534	101.90			9.87	2.50		
33年目	R 40	0.2437	101.90			9.87	2.41		
34年目	R 41	0.2343	101.90			9.87	2.31		
35年目	R 42	0.2253	101.90			9.87	2.22		
36年目	R 43	0.2166	101.90			9.87	2.14		
37年目	R 44	0.2083	101.90			9.87	2.06		
38年目	R 45	0.2003	101.90			9.87	1.98		
39年目	R 46	0.1926	101.90			9.87	1.90		
40年目	R 47	0.1852	101.90			9.87	1.83		
41年目	R 48	0.1780	101.90			9.87	1.76		
42年目	R 49	0.1712	101.90			9.87	1.69		
43年目	R 50	0.1646	101.90			9.87	1.63		
44年目	R 51	0.1583	101.90			9.87	1.56		
45年目	R 52	0.1522	101.90			9.87	1.50		
46年目	R 53	0.1463	101.90			9.87	1.44		
47年目	R 54	0.1407	101.90			9.87	1.39		
48年目	R 55	0.1353	101.90			9.87	1.34		
49年目	R 56	0.1301	101.90	-32.42	-4.22	9.87	1.28		
合計				2,298.29	3,573.01	493.64	196.09	0.00	0.00
単純事業費計				2,330.71		493.64		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、詳細事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:北海道横断自動車道(根室線)本別～釧路

年次	年度	割引率 4.0%	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
- 2年目	R 5	0.9615	101.90	69.00	66.34				
- 1年目	R 6	0.9246	101.90	67.55	62.46				
供用開始年次	R 7	0.8890	101.90			2.65	2.36		
1年目	R 8	0.8548	101.90			2.65	2.27		
2年目	R 9	0.8219	101.90			2.65	2.18		
3年目	R 10	0.7903	101.90			2.65	2.10		
4年目	R 11	0.7599	101.90			2.65	2.02		
5年目	R 12	0.7307	101.90			2.65	1.94		
6年目	R 13	0.7026	101.90			2.65	1.87		
7年目	R 14	0.6756	101.90			2.65	1.79		
8年目	R 15	0.6496	101.90			2.65	1.72		
9年目	R 16	0.6246	101.90			2.65	1.66		
10年目	R 17	0.6006	101.90			2.65	1.59		
11年目	R 18	0.5775	101.90			2.65	1.53		
12年目	R 19	0.5553	101.90			2.65	1.47		
13年目	R 20	0.5339	101.90			2.65	1.42		
14年目	R 21	0.5134	101.90			2.65	1.36		
15年目	R 22	0.4936	101.90			2.65	1.31		
16年目	R 23	0.4746	101.90			2.65	1.26		
17年目	R 24	0.4564	101.90			2.65	1.21		
18年目	R 25	0.4388	101.90			2.65	1.16		
19年目	R 26	0.4220	101.90			2.65	1.12		
20年目	R 27	0.4057	101.90			2.65	1.08		
21年目	R 28	0.3901	101.90			2.65	1.04		
22年目	R 29	0.3751	101.90			2.65	1.00		
23年目	R 30	0.3607	101.90			2.65	0.96		
24年目	R 31	0.3468	101.90			2.65	0.92		
25年目	R 32	0.3335	101.90			2.65	0.89		
26年目	R 33	0.3207	101.90			2.65	0.85		
27年目	R 34	0.3083	101.90			2.65	0.82		
28年目	R 35	0.2965	101.90			2.65	0.79		
29年目	R 36	0.2851	101.90			2.65	0.76		
30年目	R 37	0.2741	101.90			2.65	0.73		
31年目	R 38	0.2636	101.90			2.65	0.70		
32年目	R 39	0.2534	101.90			2.65	0.67		
33年目	R 40	0.2437	101.90			2.65	0.65		
34年目	R 41	0.2343	101.90			2.65	0.62		
35年目	R 42	0.2253	101.90			2.65	0.60		
36年目	R 43	0.2166	101.90			2.65	0.57		
37年目	R 44	0.2083	101.90			2.65	0.55		
38年目	R 45	0.2003	101.90			2.65	0.53		
39年目	R 46	0.1926	101.90			2.65	0.51		
40年目	R 47	0.1852	101.90			2.65	0.49		
41年目	R 48	0.1780	101.90			2.65	0.47		
42年目	R 49	0.1712	101.90			2.65	0.45		
43年目	R 50	0.1646	101.90			2.65	0.44		
44年目	R 51	0.1583	101.90			2.65	0.42		
45年目	R 52	0.1522	101.90			2.65	0.40		
46年目	R 53	0.1463	101.90			2.65	0.39		
47年目	R 54	0.1407	101.90			2.65	0.37		
48年目	R 55	0.1353	101.90			2.65	0.36		
49年目	R 56	0.1301	101.90			2.65	0.35		
合計				136.55	128.80	132.73	52.72	0.00	0.00
単純事業費計				136.55		132.73		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、詳細事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:北海道横断自動車道(根室線)本別～釧路

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				割引率 4.0% (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 (1)×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (2)×(A)	③	現在価値 (3)×(A)	便益合計 (1)~(3)	現在価値 割引率4.0%
供用開始年次	R 7	0.99525	0.97372	0.99871	0.99300	0.8890	101.90	74.43	10.23	64.94	149.61	133.00	18.65	1.45	15.22	35.33	31.40	6.66	5.92	191.59	170.32
1年目	R 8	0.99523	0.97301	0.99871	0.99295	0.8548	101.90	74.08	9.97	64.85	148.90	127.28	18.56	1.41	15.20	35.18	30.07	6.61	5.65	190.69	163.00
2年目	R 9	0.99520	0.97226	0.99870	0.99290	0.8219	101.90	73.73	9.70	64.77	148.19	121.80	18.47	1.38	15.19	35.03	28.79	6.57	5.40	189.79	155.99
3年目	R 10	0.99518	0.97147	0.99870	0.99285	0.7903	101.90	73.37	9.43	64.69	147.49	116.56	18.38	1.34	15.17	34.89	27.57	6.52	5.15	188.89	149.28
4年目	R 11	0.99516	0.97063	0.99870	0.99280	0.7599	101.90	73.02	9.16	64.60	146.78	111.54	18.29	1.30	15.15	34.74	26.40	6.47	4.92	187.99	142.86
5年目	R 12	0.99401	0.98507	0.99820	0.99354	0.7307	101.90	72.66	8.89	64.52	146.07	106.74	18.21	1.26	15.13	34.59	25.28	6.43	4.70	187.09	136.71
6年目	R 13	0.99397	0.98484	0.99820	0.99349	0.7026	101.90	72.23	8.76	64.40	145.39	102.15	18.10	1.24	15.10	34.44	24.20	6.38	4.49	186.21	130.83
7年目	R 14	0.99393	0.98461	0.99820	0.99345	0.6756	101.90	71.79	8.62	64.29	144.70	97.76	17.99	1.22	15.07	34.28	23.16	6.34	4.29	185.33	125.21
8年目	R 15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	0.6496	101.90	71.36	8.49	64.17	144.02	93.56	17.88	1.20	15.04	34.13	22.17	6.30	4.09	184.45	119.82
9年目	R 16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	0.6246	101.90	70.92	8.36	64.05	143.34	89.53	17.77	1.19	15.02	33.97	21.22	6.26	3.91	183.57	114.66
10年目	R 17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	0.6006	101.90	70.49	8.23	63.94	142.65	85.68	17.66	1.17	14.99	33.82	20.31	6.22	3.73	182.69	109.72
11年目	R 18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	0.5775	101.90	70.05	8.09	63.82	141.97	81.99	17.55	1.15	14.96	33.66	19.44	6.18	3.57	181.81	104.99
12年目	R 19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	0.5553	101.90	69.62	7.96	63.71	141.28	78.45	17.44	1.13	14.94	33.51	18.61	6.14	3.41	180.92	100.47
13年目	R 20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	0.5339	101.90	69.18	7.83	63.59	140.60	75.07	17.33	1.11	14.91	33.35	17.81	6.09	3.25	180.04	96.13
14年目	R 21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	0.5134	101.90	68.74	7.69	63.47	139.91	71.83	17.22	1.09	14.88	33.20	17.04	6.05	3.11	179.16	91.98
15年目	R 22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	0.4936	101.90	68.31	7.56	63.36	139.23	68.72	17.11	1.07	14.85	33.04	16.31	6.01	2.97	178.28	88.00
16年目	R 23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	0.4746	101.90	67.72	7.50	63.32	138.53	65.75	16.97	1.06	14.84	32.87	15.60	5.97	2.83	177.38	84.18
17年目	R 24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	0.4564	101.90	67.12	7.44	63.27	137.84	62.91	16.82	1.06	14.83	32.71	14.93	5.93	2.70	176.47	80.54
18年目	R 25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	0.4388	101.90	66.53	7.38	63.23	137.14	60.18	16.67	1.05	14.82	32.54	14.28	5.88	2.58	175.56	77.04
19年目	R 26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	0.4220	101.90	65.94	7.32	63.19	136.44	57.58	16.52	1.04	14.81	32.37	13.66	5.84	2.46	174.66	73.71
20年目	R 27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	0.4057	101.90	65.34	7.26	63.15	135.75	55.07	16.37	1.03	14.81	32.21	13.07	5.80	2.35	173.75	70.49
21年目	R 28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	0.3901	101.90	64.75	7.19	63.11	135.05	52.68	16.22	1.02	14.80	32.04	12.50	5.75	2.24	172.84	67.43
22年目	R 29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	0.3751	101.90	64.16	7.13	63.07	134.35	50.40	16.07	1.01	14.79	31.87	11.96	5.71	2.14	171.94	64.49
23年目	R 30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	0.3607	101.90	63.56	7.07	63.02	133.66	48.21	15.93	1.00	14.78	31.70	11.44	5.67	2.04	171.03	61.69
24年目	R 31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	0.3468	101.90	62.97	7.01	62.98	132.96	46.11	15.78	0.99	14.77	31.54	10.94	5.63	1.95	170.12	59.00
25年目	R 32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	0.3335	101.90	62.38	6.95	62.94	132.27	44.11	15.63	0.99	14.76	31.37	10.46	5.58	1.86	169.22	56.43
26年目	R 33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	0.3207	101.90	61.78	6.89	62.90	131.57	42.19	15.48	0.98	14.75	31.20	10.01	5.54	1.78	168.31	53.98
27年目	R 34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	0.3083	101.90	61.19	6.83	62.86	130.87	40.35	15.33	0.97	14.74	31.04	9.57	5.50	1.69	167.41	51.61
28年目	R 35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	0.2965	101.90	60.60	6.77	62.81	130.18	38.60	15.18	0.96	14.73	30.87	9.15	5.45	1.62	166.50	49.37
29年目	R 36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	0.2851	101.90	60.00	6.71	62.77	129.48	36.91	15.03	0.95	14.72	30.70	8.75	5.41	1.54	165.59	47.21
30年目	R 37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	0.2741	101.90	59.41	6.64	62.73	128.78	35.30	14.89	0.94	14.71	30.53	8.37	5.37	1.47	164.69	45.14
31年目	R 38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	0.2636	101.90	58.82	6.58	62.69	128.09	33.76	14.74	0.93	14.70	30.37	8.00	5.33	1.40	163.78	43.17
32年目	R 39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99191	0.2534	101.90	58.22	6.52	62.65	127.39	32.28	14.59	0.93	14.69	30.20	7.65	5.28	1.34	162.87	41.27
33年目	R 40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	0.2437	101.90	57.63	6.46	62.60	126.70	30.88	14.44	0.92	14.68	30.03	7.32	5.24	1.28	161.97	39.47
34年目	R 41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	0.2343	101.90	57.04	6.40	62.56	126.00	29.52	14.29	0.91	14.67	29.87	7.00	5.20	1.22	161.06	37.74
35年目	R 42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	0.2253	101.90	56.44	6.34	62.52	125.30	28.23	14.14	0.90	14.66	29.70	6.69	5.15	1.16	160.16	36.08
36年目	R 43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	0.2166	101.90	55.85	6.28	62.48	124.61	26.99	13.99	0.89	14.65	29.53	6.40	5.11	1.11	159.25	34.49
37年目	R 44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	0.2083	101.90	55.26	6.22	62.44	123.91	25.81	13.84	0.88	14.64	29.36	6.12	5.07	1.06	158.34	32.98
38年目	R 45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	0.2003	101.90	54.66	6.15	62.39	123.21	24.68	13.70	0.87	14.63	29.20	5.85	5.03	1.01	157.44	31.53
39年目	R 46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	0.1926	101.90	54.07	6.09	62.35	122.52	23.60	13.55	0.86	14.62	29.03	5.59	4.98	0.96	156.53	30.15
40年目	R 47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	0.1852	101.90	53.48	6.03	62.31	121.82	22.56	13.40	0.86	14.61	28.86	5.35	4.94	0.91	155.62	28.82
41年目	R 48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	0.1780	101.90	52.89	5.97	62.27	121.12	21.56	13.25	0.85	14.60	28.70	5.11	4.90	0.87	154.72	27.54
42年目	R 49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	0.1712	101.90	52.29	5.91	62.23	120.43	20.62	13.10	0.84	14.59	28.53	4.88	4.85	0.83	153.81	26.33
43年目	R 50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	0.1646	101.90	51.70	5.85	62.18	119.73	19.71	12.95	0.83	14.58	28.36	4.67	4.81	0.79	152.90	25.17
44年目	R 51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	0.1583	101.90	51.11	5.79	62.14	119.04	18.84	12.80	0.82	14.57	28.19	4.46	4.77	0.75	152.00	24.06
45年目	R 52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	0.1522	101.90	50.51	5.73	62.10	118.34	18.01	12.66	0.81	14.56	28.03	4.27	4.73	0.72	151.09	23.00
46年目	R 53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	0.1463	1														

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名:北海道横断自動車道(根室線)本別～釧路

年次	年度 (基準年) R4	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				割引率 4.0% (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 (1)×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (2)×(A)	③	現在価値 (3)×(A)	便益合計 (1)~(3)	割引率4.0%
供用開始年次	R 7	0.99525	0.97372	0.99871	0.99300	0.8890	101.90	23.02	3.70	17.71	44.43	39.50	5.65	0.47	3.70	9.81	8.72	2.09	1.86	56.34	50.08
1年目	R 8	0.99523	0.97301	0.99871	0.99295	0.8548	101.90	22.92	3.60	17.69	44.20	37.79	5.62	0.46	3.69	9.77	8.35	2.08	1.77	56.05	47.91
2年目	R 9	0.99520	0.97226	0.99870	0.99290	0.8219	101.90	22.81	3.51	17.66	43.98	36.14	5.59	0.44	3.69	9.72	7.99	2.06	1.69	55.76	45.83
3年目	R 10	0.99518	0.97147	0.99870	0.99285	0.7903	101.90	22.70	3.41	17.64	43.75	34.57	5.56	0.43	3.68	9.68	7.65	2.05	1.62	55.47	43.84
4年目	R 11	0.99516	0.97063	0.99870	0.99280	0.7599	101.90	22.59	3.31	17.62	43.52	33.07	5.54	0.42	3.68	9.63	7.32	2.03	1.54	55.18	41.93
5年目	R 12	0.99401	0.98507	0.99820	0.99354	0.7307	101.90	22.48	3.21	17.59	43.29	31.63	5.51	0.41	3.67	9.59	7.01	2.02	1.47	54.89	40.11
6年目	R 13	0.99397	0.98484	0.99820	0.99349	0.7026	101.90	22.34	3.17	17.56	43.07	30.26	5.48	0.40	3.67	9.54	6.71	2.00	1.41	54.62	38.38
7年目	R 14	0.99393	0.98461	0.99820	0.99345	0.6756	101.90	22.21	3.12	17.53	42.86	28.95	5.44	0.40	3.66	9.50	6.42	1.99	1.35	54.35	36.72
8年目	R 15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	0.6496	101.90	22.07	3.07	17.50	42.64	27.70	5.41	0.39	3.65	9.45	6.14	1.98	1.29	54.08	35.13
9年目	R 16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	0.6246	101.90	21.94	3.02	17.47	42.43	26.50	5.38	0.38	3.65	9.41	5.88	1.97	1.23	53.80	33.60
10年目	R 17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	0.6006	101.90	21.80	2.97	17.44	42.21	25.35	5.35	0.38	3.64	9.36	5.62	1.95	1.17	53.53	32.15
11年目	R 18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	0.5775	101.90	21.67	2.93	17.40	42.00	24.26	5.31	0.37	3.63	9.32	5.38	1.94	1.12	53.26	30.76
12年目	R 19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	0.5553	101.90	21.53	2.88	17.37	41.79	23.20	5.28	0.37	3.63	9.27	5.15	1.93	1.07	52.98	29.42
13年目	R 20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	0.5339	101.90	21.40	2.83	17.34	41.57	22.20	5.25	0.36	3.62	9.22	4.93	1.91	1.02	52.71	28.14
14年目	R 21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	0.5134	101.90	21.27	2.78	17.31	41.36	21.23	5.21	0.35	3.61	9.18	4.71	1.90	0.98	52.44	26.92
15年目	R 22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	0.4936	101.90	21.13	2.73	17.28	41.14	20.31	5.18	0.35	3.61	9.13	4.51	1.89	0.93	52.16	25.75
16年目	R 23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	0.4746	101.90	20.95	2.71	17.27	40.93	19.42	5.14	0.34	3.60	9.08	4.31	1.87	0.89	51.88	24.62
17年目	R 24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	0.4564	101.90	20.76	2.69	17.25	40.71	18.58	5.09	0.34	3.60	9.03	4.12	1.86	0.85	51.60	23.55
18年目	R 25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	0.4388	101.90	20.58	2.67	17.24	40.49	17.77	5.05	0.34	3.60	8.98	3.94	1.85	0.81	51.32	22.52
19年目	R 26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	0.4220	101.90	20.40	2.65	17.23	40.27	17.00	5.00	0.34	3.60	8.93	3.77	1.83	0.77	51.04	21.54
20年目	R 27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	0.4057	101.90	20.21	2.62	17.22	40.06	16.25	4.96	0.33	3.60	8.88	3.60	1.82	0.74	50.76	20.59
21年目	R 28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	0.3901	101.90	20.03	2.60	17.21	39.84	15.54	4.91	0.33	3.59	8.83	3.45	1.81	0.70	50.48	19.69
22年目	R 29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	0.3751	101.90	19.85	2.58	17.20	39.62	14.86	4.87	0.33	3.59	8.78	3.29	1.79	0.67	50.20	18.83
23年目	R 30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	0.3607	101.90	19.66	2.56	17.19	39.41	14.21	4.82	0.32	3.59	8.73	3.15	1.78	0.64	49.92	18.01
24年目	R 31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	0.3468	101.90	19.48	2.54	17.17	39.19	13.59	4.78	0.32	3.58	8.68	3.01	1.77	0.61	49.64	17.21
25年目	R 32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	0.3335	101.90	19.30	2.51	17.16	38.97	13.00	4.73	0.32	3.58	8.63	2.88	1.75	0.58	49.36	16.46
26年目	R 33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	0.3207	101.90	19.11	2.49	17.15	38.75	12.43	4.69	0.32	3.58	8.58	2.75	1.74	0.56	49.08	15.74
27年目	R 34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	0.3083	101.90	18.93	2.47	17.14	38.54	11.88	4.64	0.31	3.58	8.53	2.63	1.73	0.53	48.79	15.04
28年目	R 35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	0.2965	101.90	18.74	2.45	17.13	38.32	11.36	4.60	0.31	3.57	8.48	2.51	1.71	0.51	48.51	14.38
29年目	R 36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	0.2851	101.90	18.56	2.42	17.12	38.10	10.86	4.55	0.31	3.57	8.43	2.40	1.70	0.48	48.23	13.75
30年目	R 37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	0.2741	101.90	18.38	2.40	17.11	37.89	10.38	4.51	0.30	3.57	8.38	2.30	1.69	0.46	47.95	13.14
31年目	R 38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	0.2636	101.90	18.19	2.38	17.09	37.67	9.93	4.46	0.30	3.57	8.33	2.20	1.67	0.44	47.67	12.57
32年目	R 39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	0.2534	101.90	18.01	2.36	17.08	37.45	9.49	4.42	0.30	3.57	8.28	2.10	1.66	0.42	47.39	12.01
33年目	R 40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	0.2437	101.90	17.83	2.34	17.07	37.24	9.07	4.37	0.30	3.56	8.23	2.01	1.65	0.40	47.11	11.48
34年目	R 41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	0.2343	101.90	17.64	2.31	17.06	37.02	8.67	4.33	0.29	3.56	8.18	1.92	1.63	0.38	46.83	10.97
35年目	R 42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	0.2253	101.90	17.46	2.29	17.05	36.80	8.29	4.28	0.29	3.56	8.13	1.83	1.62	0.36	46.55	10.49
36年目	R 43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	0.2166	101.90	17.28	2.27	17.04	36.58	7.92	4.24	0.29	3.56	8.08	1.75	1.60	0.35	46.27	10.02
37年目	R 44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	0.2083	101.90	17.09	2.25	17.03	36.37	7.58	4.19	0.29	3.55	8.03	1.67	1.59	0.33	45.99	9.58
38年目	R 45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	0.2003	101.90	16.91	2.23	17.01	36.15	7.24	4.15	0.28	3.55	7.98	1.60	1.58	0.32	45.71	9.16
39年目	R 46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	0.1926	101.90	16.73	2.20	17.00	35.93	6.92	4.10	0.28	3.55	7.93	1.53	1.56	0.30	45.43	8.75
40年目	R 47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	0.1852	101.90	16.54	2.18	16.99	35.72	6.61	4.06	0.28	3.55	7.88	1.46	1.55	0.29	45.15	8.36
41年目	R 48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	0.1780	101.90	16.36	2.16	16.98	35.50	6.32	4.01	0.27	3.54	7.83	1.39	1.54	0.27	44.86	7.99
42年目	R 49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	0.1712	101.90	16.18	2.14	16.97	35.28	6.04	3.97	0.27	3.54	7.78	1.33	1.52	0.26	44.58	7.63
43年目	R 50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	0.1646	101.90	15.99	2.11	16.96	35.06	5.77	3.92	0.27	3.54	7.73	1.27	1.51	0.25	44.30	7.29
44年目	R 51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	0.1583	101.90	15.81	2.09	16.95	34.85	5.52	3.88	0.27	3.54	7.68	1.22	1.50	0.24	44.02	6.97
45年目	R 52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	0.1522	101.90	15.63	2.07	16.93	34.63	5.27	3.83	0.26	3.53	7.63	1.16	1.48	0.23	43.74	6.66
46年目	R 53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	0.1463	101.90	15.44	2.05	16.92	34.41	5.03	3.79	0.26	3.53	7.58	1.11	1.47	0.22	43.46	6.36
47年目	R 54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	0.1407	101.90	15.26	2.03	16.91	34.20	4.81	3.74	0.26	3.53	7.53	1.06	1.46	0.20	43.18	6.08
48年目	R 55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	0.1353	101.90	15.07	2.00	16.90	33.98	4.60	3.70	0.25	3.53	7.48	1.01	1.44	0.20	42.90	5.80
49年目	R 56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	0.1301	101.90	14.89	1.98	16.89	33.76	4.39	3.65	0.25	3.52	7.43	0.97	1.43	0.19	42.62	5.54
合計								963.12	130.06	860.75	1,953.93	809.30	236.13	16.50	179.62	432.26	179.17	87.94	36.98	2,474.14	1,025.46
