

(再評価)

別紙1

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道47号 新庄古口道路
事業主体	東北地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	<b>【費用】</b> 730億円(残事業=211億円) ※基準年において現在価値化した額 <b>【便益】</b> 780億円(残事業=663億円) ※基準年において現在価値化した額 ・走行時間短縮便益: 662億円(残事業=564億円) ・走行経費減少便益: 100億円(残事業= 83億円) ・交通事故減少便益: 17億円(残事業= 16億円)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力 円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間b(当該区間/並行区間)について: 一般国道47号 新庄古口道路 並行区間等(当該区間)の渋滞損失時間: 15.8万人・時間/年 並行区間等(当該区間)の渋滞損失削減率: 約10割削減
	<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
	<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
	<input type="checkbox"/> 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	
	■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	新庄駅(新幹線駅)へのアクセス性が向上(戸沢村~新庄駅 現況: 29分⇒整備後: 25分、4分短縮) / H27道路交通センサス
	■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	山形空港(第二種空港)へのアクセス性が向上(戸沢村~山形空港 現況: 57分⇒整備後: 53分、4分短縮) / H27道路交通センサス
	物流効率化の支援	■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる 酒田港(重要港湾)へのアクセス性が向上(新庄市~酒田港 現況: 80分⇒整備後: 76分、4分短縮) / H27道路交通センサス ■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上 特用林産品 たらすの芽: 東京卸売市場取扱量25.4t/年(R3年度・全国シェア1位) なめこ: 東京卸売市場取扱量887t/年(R3年度・全国シェア1位)
<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する		

1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
		<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
		<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り	
		<input checked="" type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	地域高規格道路「新庄酒田道路」の一部
		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	新庄市～酒田市(現況:72分⇒整備後:68分、4分短縮)／H27道路交通センサス
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	新庄市へのアクセス性が向上(戸沢村～新庄市 現況:28分⇒整備後:24分、4分短縮)／H27道路交通センサス
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	最上川舟下りへのアクセス性が向上(山形空港～最上川舟下り 現況:56分⇒整備後:52分、4分短縮)／H27道路交通センサス
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り		
	<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する		
安全で安心できる暮らしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	第三次医療施設 日本海総合病院へのアクセス性が向上(新庄市～日本海総合病院 現況:68分⇒整備後:64分、4分短縮)／H27道路交通センサス	

3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input checked="" type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	孤立の恐れのある地区：戸沢村蔵岡地区
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	第1次緊急輸送道路（山形県緊急輸送道路ネットワーク計画）
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	国道47号、代替する区間：新庄市松本～戸沢村古口
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	防災点検要対策箇所：1箇所
<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	事前通行規制 1.0km（連続雨量150mm）、 特殊通行規制 0.9km（河川氾濫）、 運搬排雪区間に伴う通行規制 上り合計 4.0km 下り合計 3.7km		
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：630（t-CO2/年）
	生活環境の改善・保全	<input type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道47号	新庄古口道路	L=10.6km	地域高規格	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
16,600	4	東北地方整備局

## ① 費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和4年度			
単純合計	527億円	238億円		766億円
うち残事業分	156億円	188億円		344億円
基準年における 現在価値 (C)	636億円	94億円		730億円
うち残事業分	138億円	73億円		211億円

## ② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和4年度			
供用年	令和6年度、令和10年度			
単年便益 (初年便益)	22億円	5.2億円	0.71億円	28億円
基準年における 現在価値 (B)	662億円	100億円	17億円	780億円
うち残事業分	564億円	83億円	16億円	663億円

# 交通状況の変化

様式-3①

事業名：一般国道47号 新庄古口道路（全体）

（推計時点 R22年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 （一般国道47号 新庄古口道路） 延長：10.6km	交通量 <sup>※1</sup>	[台/日]	0	16,600	
	走行時間 <sup>※2</sup>	[分]	0	8	
	走行時間費用 <sup>※3</sup>	[億円/年]	0.00	28.45	
②主な周辺道路 <sup>※4</sup>	現道 一般国道47号 ：12.14km	交通量	[台/日]	10,700	1,500
		走行時間	[分]	27	16
		走行時間費用	[億円/年]	64.30	5.22
	一般国道458号 ：7.90km	交通量	[台/日]	3,000	2,900
		走行時間	[分]	12	12
		走行時間費用	[億円/年]	7.22	6.93
	（主）新庄戸沢線 ：12.39km	交通量	[台/日]	3,400	1,500
		走行時間	[分]	22	22
		走行時間費用	[億円/年]	15.36	7.26
	（主）新庄舟形線 ：7.83km	交通量	[台/日]	1,000	300
		走行時間	[分]	13	13
		走行時間費用	[億円/年]	3.16	0.78
	（一）曲川新庄線 ：7.02km	交通量	[台/日]	2,900	2,700
		走行時間	[分]	11	11
		走行時間費用	[億円/年]	6.13	5.74
③その他道路合計 ：8434.04km		走行時間費用	[億円/年]	23,291.34	23,297.39

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：	：8491.92km	走行時間短縮便益 [億円/年]	23,387.51	23,351.77	35.74

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること



# 交通状況の変化

様式-3①

事業名：一般国道47号 新庄古口道路（残事業）

（推計時点 R22年）


			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 (一般国道47号 新庄古口道路) 延長：10.6km (うち暫定二車供用：4.6km)	交通量 <sup>※1</sup>	[台/日]	3,000	16,600	
	走行時間 <sup>※2</sup>	[分]	4	8	
	走行時間費用 <sup>※3</sup>	[億円/年]	2.48	28.45	
②主な周辺道路 <sup>※4</sup>	現道 一般国道47号 ：12.14km	交通量	[台/日]	9,900	1,500
		走行時間	[分]	27	16
		走行時間費用	[億円/年]	58.84	5.22
	一般国道458号 ：7.90km	交通量	[台/日]	3,000	2,900
		走行時間	[分]	12	12
		走行時間費用	[億円/年]	7.21	6.93
	(主)新庄戸沢線 ：12.39km	交通量	[台/日]	3,700	1,500
		走行時間	[分]	22	22
		走行時間費用	[億円/年]	16.90	7.26
	(主)新庄舟形線 ：7.83km	交通量	[台/日]	400	300
		走行時間	[分]	13	13
		走行時間費用	[億円/年]	1.25	0.78
(一)曲川新庄線 ：7.02km	交通量	[台/日]	2,800	2,700	
	走行時間	[分]	11	11	
	走行時間費用	[億円/年]	5.89	5.74	
③その他道路合計 ：8434.04km		走行時間費用	[億円/年]	23,290.11	23,297.39

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：	：8491.92km	走行時間短縮便益 [億円/年]	23,382.68	23,351.77	30.91

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)

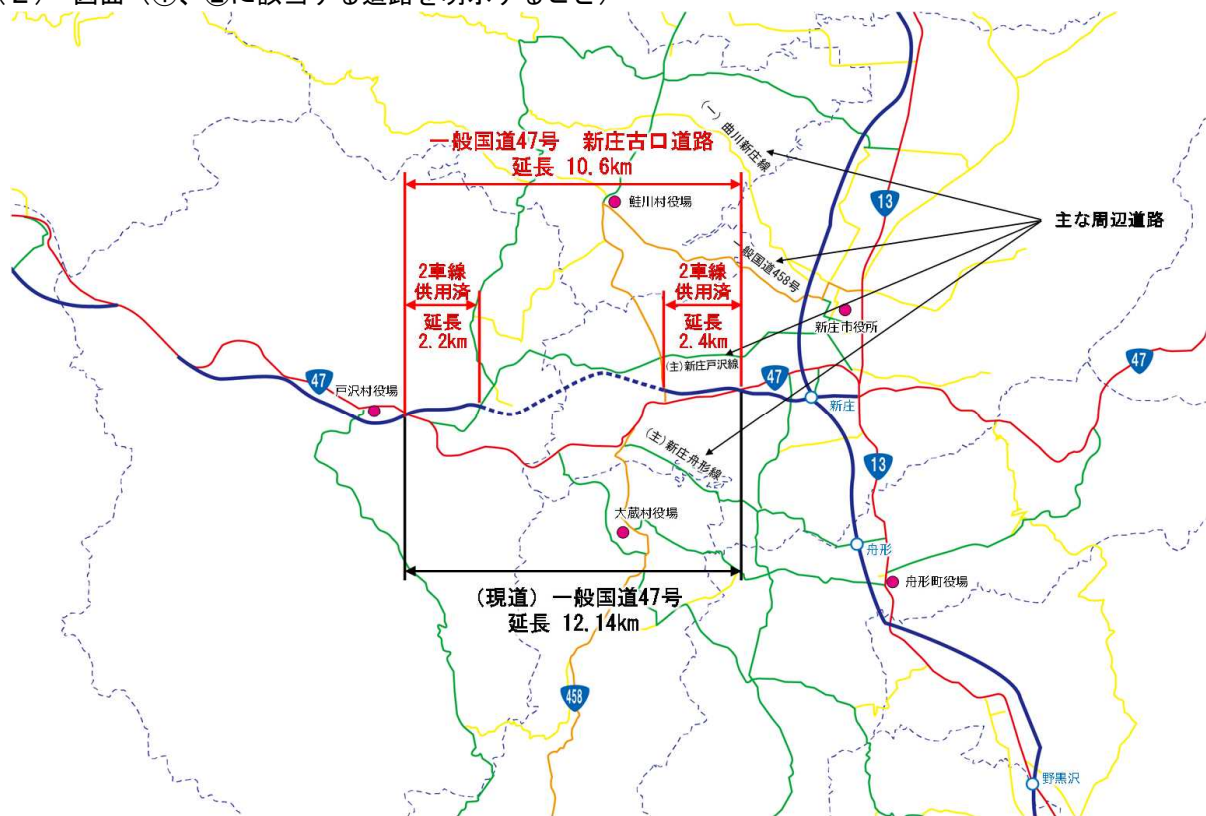



# 費用便益分析の条件

事業名:一般国道47号 新庄古口道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和4年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (R22)
		複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	いずれかのみ推計の場合		いずれかのみ推計とした理由を記載
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
		その他( )	<input type="checkbox"/>
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
		有	<input type="checkbox"/>
有の場合のみ		考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載 ( )台トリップ/日	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量推計結果について、交通容量(Qmax)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)内の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
その他( )		<input type="checkbox"/>	

事業名:一般国道47号 新庄古口道路

(3)

		項目	チェック欄	
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
	採用した休日係数		( ) %	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 並行する現道区間の全面通行止め日数より設定 (H29~R3平均)	( 0.28 ) 日
	とり止め交通を考慮する		<input type="checkbox"/>	
	冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 当該区間を管理する新庄国道維持出張所の除雪稼働日数により設定 (R1~R3平均)	( 101 ) 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 旅行速度調査より道路種別に応じて冬期旅行速度低下率を算出し、配分速度を補正	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他 ( )	<input type="checkbox"/>	
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				



費用の現在価値算定表

箇所名: 一般国道47号 新庄古口道路(全体)

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単価(億円)
0.51	10.6	5.43

年次	年度	割戻率 4%	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-23年目	H 13	2.2788	109.4	0.48	1.02				
-22年目	H 14	2.1911	107.6	0.48	1.00				
-21年目	H 15	2.1068	106.1	0.48	0.97				
-20年目	H 16	2.0258	105.0	0.48	0.94				
-19年目	H 17	1.9479	103.7	0.95	1.82				
-18年目	H 18	1.8730	103.0	1.14	2.11				
-17年目	H 19	1.8009	102.1	2.48	4.46				
-16年目	H 20	1.7317	101.6	11.40	19.80				
-15年目	H 21	1.6651	100.3	27.85	47.11				
-14年目	H 22	1.6010	98.6	19.36	32.03				
-13年目	H 23	1.5395	97.2	12.68	20.46				
-12年目	H 24	1.4802	96.4	44.71	69.96				
-11年目	H 25	1.4233	96.4	16.51	24.84				
-10年目	H 26	1.3686	98.7	17.32	24.47				
-9年目	H 27	1.3159	100.2	20.35	27.23				
-8年目	H 28	1.2653	100.3	22.35	28.73				
-7年目	H 29	1.2167	100.5	31.69	39.09				
-6年目	H 30	1.1699	100.4	29.98	35.60				
-5年目	R 1	1.1249	101.2	27.02	30.61				
-4年目	R 2	1.0816	101.9	27.49	29.73				
-3年目	R 3	1.0400	101.9	35.00	36.40				
-2年目	R 4	1.0000	101.9	21.22	21.22				
-1年目	R 5	0.9615	101.9	14.18	13.63				
供用開始年次	R 6	0.9246	101.9	40.91	37.83	2.77	2.56		
1年目	R 7	0.8890	101.9	36.36	32.32	2.77	2.46		
2年目	R 8	0.8548	101.9	34.55	29.53	2.77	2.37		
3年目	R 9	0.8219	101.9	30.00	24.66	2.77	2.28		
供用開始年次	R 10	0.7903	101.9			4.94	3.90		
5年目	R 11	0.7599	101.9			4.94	3.75		
6年目	R 12	0.7307	101.9			4.94	3.61		
7年目	R 13	0.7026	101.9			4.94	3.47		
8年目	R 14	0.6756	101.9			4.94	3.34		
9年目	R 15	0.6496	101.9			4.94	3.21		
10年目	R 16	0.6246	101.9			4.94	3.08		
11年目	R 17	0.6006	101.9			4.94	2.96		
12年目	R 18	0.5775	101.9			4.94	2.85		
13年目	R 19	0.5553	101.9			4.94	2.74		
14年目	R 20	0.5339	101.9			4.94	2.64		
15年目	R 21	0.5134	101.9			4.94	2.53		
16年目	R 22	0.4936	101.9			4.94	2.44		
17年目	R 23	0.4746	101.9			4.94	2.34		
18年目	R 24	0.4564	101.9			4.94	2.25		
19年目	R 25	0.4388	101.9			4.94	2.17		
20年目	R 26	0.4220	101.9			4.94	2.08		
21年目	R 27	0.4057	101.9			4.94	2.00		
22年目	R 28	0.3901	101.9			4.94	1.93		
23年目	R 29	0.3751	101.9			4.94	1.85		
24年目	R 30	0.3607	101.9			4.94	1.78		
25年目	R 31	0.3468	101.9			4.94	1.71		
26年目	R 32	0.3335	101.9			4.94	1.65		
27年目	R 33	0.3207	101.9			4.94	1.58		
28年目	R 34	0.3083	101.9			4.94	1.52		
29年目	R 35	0.2965	101.9			4.94	1.46		
30年目	R 36	0.2851	101.9			4.94	1.41		
31年目	R 37	0.2741	101.9			4.94	1.35		
32年目	R 38	0.2636	101.9			4.94	1.30		
33年目	R 39	0.2534	101.9			4.94	1.25		
34年目	R 40	0.2437	101.9			4.94	1.20		
35年目	R 41	0.2343	101.9			4.94	1.16		
36年目	R 42	0.2253	101.9			4.94	1.11		
37年目	R 43	0.2166	101.9			4.94	1.07		
38年目	R 44	0.2083	101.9			4.94	1.03		
39年目	R 45	0.2003	101.9			4.94	0.99		
40年目	R 46	0.1926	101.9			4.94	0.95		
41年目	R 47	0.1852	101.9			4.94	0.91		
42年目	R 48	0.1780	101.9			4.94	0.88		
43年目	R 49	0.1712	101.9			4.94	0.85		
44年目	R 50	0.1646	101.9			4.94	0.81		
45年目	R 51	0.1583	101.9			4.94	0.78		
46年目	R 52	0.1522	101.9			4.94	0.75		
47年目	R 53	0.1463	101.9			4.94	0.72		
48年目	R 54	0.1407	101.9			4.94	0.69		
49年目	R 55	0.1353	101.9	-12.86	-1.74	4.94	0.67		
合計				514.56	635.83	238.16	94.39		

単純事業費計	527.42	238.16		
--------	--------	--------	--	--

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)  
 注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

箇所名:一般国道47号 新庄古口道路(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割引率 4%	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-1年目	R 5	0.9615	101.9	14.18	13.63				
供用開始年次	R 6	0.9246	101.9	40.91	37.83	1.55	1.44		
1年目	R 7	0.8890	101.9	36.36	32.32	1.55	1.38		
2年目	R 8	0.8548	101.9	34.55	29.53	1.55	1.33		
3年目	R 9	0.8219	101.9	30.00	24.66	1.55	1.28		
供用開始年次	R 10	0.7903	101.9			3.95	3.13		
5年目	R 11	0.7599	101.9			3.95	3.01		
6年目	R 12	0.7307	101.9			3.95	2.89		
7年目	R 13	0.7026	101.9			3.95	2.78		
8年目	R 14	0.6756	101.9			3.95	2.67		
9年目	R 15	0.6496	101.9			3.95	2.57		
10年目	R 16	0.6246	101.9			3.95	2.47		
11年目	R 17	0.6006	101.9			3.95	2.38		
12年目	R 18	0.5775	101.9			3.95	2.28		
13年目	R 19	0.5553	101.9			3.95	2.20		
14年目	R 20	0.5339	101.9			3.95	2.11		
15年目	R 21	0.5134	101.9			3.95	2.03		
16年目	R 22	0.4936	101.9			3.95	1.95		
17年目	R 23	0.4746	101.9			3.95	1.88		
18年目	R 24	0.4564	101.9			3.95	1.80		
19年目	R 25	0.4388	101.9			3.95	1.74		
20年目	R 26	0.4220	101.9			3.95	1.67		
21年目	R 27	0.4057	101.9			3.95	1.60		
22年目	R 28	0.3901	101.9			3.95	1.54		
23年目	R 29	0.3751	101.9			3.95	1.48		
24年目	R 30	0.3607	101.9			3.95	1.43		
25年目	R 31	0.3468	101.9			3.95	1.37		
26年目	R 32	0.3335	101.9			3.95	1.32		
27年目	R 33	0.3207	101.9			3.95	1.27		
28年目	R 34	0.3083	101.9			3.95	1.22		
29年目	R 35	0.2965	101.9			3.95	1.17		
30年目	R 36	0.2851	101.9			3.95	1.13		
31年目	R 37	0.2741	101.9			3.95	1.08		
32年目	R 38	0.2636	101.9			3.95	1.04		
33年目	R 39	0.2534	101.9			3.95	1.00		
34年目	R 40	0.2437	101.9			3.95	0.96		
35年目	R 41	0.2343	101.9			3.95	0.93		
36年目	R 42	0.2253	101.9			3.95	0.89		
37年目	R 43	0.2166	101.9			3.95	0.86		
38年目	R 44	0.2083	101.9			3.95	0.82		
39年目	R 45	0.2003	101.9			3.95	0.79		
40年目	R 46	0.1926	101.9			3.95	0.76		
41年目	R 47	0.1852	101.9			3.95	0.73		
42年目	R 48	0.1780	101.9			3.95	0.70		
43年目	R 49	0.1712	101.9			3.95	0.68		
44年目	R 50	0.1646	101.9			3.95	0.65		
45年目	R 51	0.1583	101.9			3.95	0.63		
46年目	R 52	0.1522	101.9			3.95	0.60		
47年目	R 53	0.1463	101.9			3.95	0.58		
48年目	R 54	0.1407	101.9			3.95	0.56		
49年目	R 55	0.1353	101.9	0.00	0.00	3.95	0.54		
合計				156.00	137.97	188.13	73.32		
単純事業費計				156.00		188.13			

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名: 一般国道47号 新庄古口道路(全体)

年次	年度 (基準年) R4	総走行台キロの年次別伸び率 (南東北ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	割引率4%
供用開始年次	R 6	0.99616	0.98297	1.01063	0.99621	0.9246	101.9	13.76	2.67	5.82	22.25	20.57	2.75	0.44	2.00	5.19	4.80	0.71	0.66	28.15	26.03
1年目	R 7	0.99615	0.98268	1.01052	0.99620	0.8890	101.9	13.71	2.66	5.80	22.17	19.71	2.74	0.44	1.99	5.17	4.60	0.71	0.63	28.05	24.94
2年目	R 8	0.99613	0.98237	1.01041	0.99618	0.8548	101.9	13.66	2.65	5.78	22.09	18.88	2.73	0.44	1.98	5.15	4.40	0.71	0.61	27.95	23.89
3年目	R 9	0.99612	0.98206	1.01030	0.99617	0.8219	101.9	13.61	2.64	5.76	22.01	18.09	2.72	0.44	1.97	5.13	4.22	0.71	0.58	27.85	22.89
供用開始年次	R 10	0.99610	0.98173	1.01019	0.99615	0.7903	101.9	19.30	4.88	14.04	38.22	30.21	2.88	0.46	1.99	5.33	4.21	0.92	0.73	44.47	35.15
5年目	R 11	0.99609	0.98139	1.01009	0.99614	0.7599	101.9	19.23	4.86	13.99	38.08	28.94	2.87	0.46	1.98	5.31	4.04	0.92	0.70	44.31	33.68
6年目	R 12	0.99607	0.98104	1.00999	0.99612	0.7307	101.9	19.16	4.84	13.94	37.94	27.72	2.86	0.46	1.97	5.29	3.87	0.92	0.67	44.15	32.26
7年目	R 13	0.99408	0.98904	1.00886	0.99562	0.7026	101.9	19.05	4.81	13.86	37.72	26.50	2.84	0.46	1.96	5.26	3.70	0.92	0.65	43.90	30.85
8年目	R 14	0.99404	0.98892	1.00878	0.99560	0.6756	101.9	18.94	4.78	13.78	37.50	25.34	2.82	0.46	1.95	5.23	3.53	0.92	0.62	43.65	29.49
9年目	R 15	0.99400	0.98880	1.00871	0.99558	0.6496	101.9	18.83	4.75	13.70	37.28	24.22	2.80	0.46	1.94	5.20	3.38	0.92	0.60	43.40	28.20
10年目	R 16	0.99397	0.98867	1.00863	0.99557	0.6246	101.9	18.72	4.72	13.62	37.06	23.15	2.78	0.46	1.93	5.17	3.23	0.92	0.57	43.15	26.95
11年目	R 17	0.99393	0.98854	1.00856	0.99555	0.6006	101.9	18.61	4.69	13.54	36.84	22.13	2.76	0.46	1.92	5.14	3.09	0.92	0.55	42.90	25.77
12年目	R 18	0.99389	0.98841	1.00848	0.99553	0.5775	101.9	18.50	4.66	13.46	36.62	21.15	2.74	0.46	1.91	5.11	2.95	0.92	0.53	42.65	24.63
13年目	R 19	0.99386	0.98827	1.00841	0.99551	0.5553	101.9	18.39	4.63	13.38	36.40	20.21	2.72	0.46	1.90	5.08	2.82	0.92	0.51	42.40	23.54
14年目	R 20	0.99382	0.98813	1.00834	0.99549	0.5339	101.9	18.28	4.60	13.30	36.18	19.32	2.70	0.46	1.89	5.05	2.70	0.92	0.49	42.15	22.51
15年目	R 21	0.99378	0.98799	1.00827	0.99546	0.5134	101.9	18.17	4.57	13.22	35.96	18.46	2.68	0.46	1.88	5.02	2.58	0.92	0.47	41.90	21.51
16年目	R 22	0.99374	0.98784	1.00821	0.99544	0.4936	101.9	18.06	4.54	13.14	35.74	17.64	2.66	0.46	1.87	4.99	2.46	0.92	0.45	41.65	20.55
17年目	R 23	0.99067	0.99180	0.99989	0.99271	0.4746	101.9	17.89	4.50	13.02	35.41	16.81	2.64	0.46	1.85	4.95	2.35	0.91	0.43	41.27	19.59
18年目	R 24	0.99059	0.99174	0.99989	0.99266	0.4564	101.9	17.72	4.46	12.90	35.08	16.01	2.62	0.46	1.83	4.91	2.24	0.90	0.41	40.89	18.66
19年目	R 25	0.99050	0.99167	0.99989	0.99260	0.4388	101.9	17.55	4.42	12.78	34.75	15.25	2.60	0.46	1.81	4.87	2.14	0.89	0.39	40.51	17.78
20年目	R 26	0.99041	0.99160	0.99989	0.99255	0.4220	101.9	17.38	4.38	12.66	34.42	14.53	2.58	0.46	1.79	4.83	2.04	0.88	0.37	40.13	16.94
21年目	R 27	0.99031	0.99153	0.99989	0.99249	0.4057	101.9	17.21	4.34	12.54	34.09	13.83	2.56	0.46	1.77	4.79	1.94	0.87	0.35	39.75	16.12
22年目	R 28	0.99022	0.99145	0.99989	0.99243	0.3901	101.9	17.04	4.30	12.42	33.76	13.17	2.54	0.46	1.75	4.75	1.85	0.87	0.34	39.38	15.36
23年目	R 29	0.99012	0.99138	0.99989	0.99238	0.3751	101.9	16.87	4.26	12.30	33.43	12.54	2.52	0.46	1.73	4.71	1.77	0.86	0.32	39.00	14.63
24年目	R 30	0.99002	0.99131	0.99989	0.99232	0.3607	101.9	16.70	4.22	12.18	33.10	11.94	2.50	0.46	1.71	4.67	1.68	0.86	0.31	38.63	13.93
25年目	R 31	0.98992	0.99123	0.99989	0.99226	0.3468	101.9	16.53	4.18	12.06	32.77	11.36	2.48	0.46	1.69	4.63	1.61	0.85	0.29	38.25	13.26
26年目	R 32	0.98982	0.99115	0.99989	0.99220	0.3335	101.9	16.36	4.14	11.94	32.44	10.82	2.46	0.46	1.67	4.59	1.53	0.85	0.28	37.88	12.63
27年目	R 33	0.98972	0.99107	0.99989	0.99214	0.3207	101.9	16.19	4.10	11.82	32.11	10.30	2.44	0.46	1.65	4.55	1.46	0.84	0.27	37.50	12.03
28年目	R 34	0.98961	0.99099	0.99989	0.99207	0.3083	101.9	16.02	4.06	11.70	31.78	9.80	2.42	0.46	1.63	4.51	1.39	0.84	0.26	37.13	11.45
29年目	R 35	0.98950	0.99091	0.99989	0.99201	0.2965	101.9	15.85	4.02	11.58	31.45	9.32	2.40	0.46	1.61	4.47	1.33	0.83	0.25	36.75	10.90
30年目	R 36	0.98939	0.99083	0.99989	0.99195	0.2851	101.9	15.68	3.98	11.46	31.12	8.87	2.38	0.46	1.59	4.43	1.26	0.83	0.24	36.38	10.37
31年目	R 37	0.98927	0.99074	0.99989	0.99188	0.2741	101.9	15.51	3.94	11.34	30.79	8.44	2.36	0.46	1.57	4.39	1.20	0.82	0.22	36.00	9.86
32年目	R 38	0.98916	0.99066	0.99989	0.99181	0.2636	101.9	15.34	3.90	11.22	30.46	8.03	2.34	0.46	1.55	4.35	1.15	0.82	0.22	35.63	9.40
33年目	R 39	0.98904	0.99057	0.99989	0.99175	0.2534	101.9	15.17	3.86	11.10	30.13	7.63	2.32	0.46	1.53	4.31	1.09	0.81	0.21	35.25	8.93
34年目	R 40	0.98892	0.99048	0.99989	0.99168	0.2437	101.9	15.00	3.82	10.98	29.80	7.26	2.30	0.46	1.51	4.27	1.04	0.81	0.20	34.88	8.50
35年目	R 41	0.98879	0.99039	0.99989	0.99161	0.2343	101.9	14.83	3.78	10.86	29.47	6.90	2.28	0.46	1.49	4.23	0.99	0.80	0.19	34.50	8.08
36年目	R 42	0.98867	0.99029	0.99989	0.99154	0.2253	101.9	14.66	3.74	10.74	29.14	6.57	2.26	0.46	1.47	4.19	0.94	0.80	0.18	34.13	7.69
37年目	R 43	0.98854	0.99020	0.99989	0.99146	0.2166	101.9	14.49	3.70	10.62	28.81	6.24	2.24	0.45	1.45	4.14	0.90	0.79	0.17	33.74	7.31
38年目	R 44	0.98840	0.99010	0.99989	0.99139	0.2083	101.9	14.32	3.66	10.50	28.48	5.93	2.22	0.45	1.43	4.10	0.85	0.79	0.16	33.37	6.94
39年目	R 45	0.98827	0.99000	0.99989	0.99132	0.2003	101.9	14.15	3.62	10.38	28.15	5.64	2.20	0.44	1.41	4.05	0.81	0.78	0.16	32.98	6.61
40年目	R 46	0.98813	0.98990	0.99989	0.99124	0.1926	101.9	13.98	3.58	10.26	27.82	5.36	2.18	0.44	1.39	4.01	0.77	0.78	0.15	32.61	6.28
41年目	R 47	0.98799	0.98980	0.99989	0.99116	0.1852	101.9	13.81	3.54	10.14	27.49	5.09	2.16	0.43	1.37	3.96	0.73	0.77	0.14	32.22	5.96
42年目	R 48	0.98784	0.98969	0.99989	0.99108	0.1780	101.9	13.64	3.50	10.02	27.16	4.83	2.14	0.43	1.35	3.92	0.70	0.77	0.14	31.85	5.67
43年目	R 49	0.98769	0.98959	0.99989	0.99100	0.1712	101.9	13.47	3.46	9.90	26.83	4.59	2.12	0.42	1.33	3.87	0.66	0.76	0.13	31.46	5.38
44年目	R 50	0.98754	0.98948	0.99989	0.99092	0.1646	101.9	13.30	3.42	9.78	26.50	4.36	2.10	0.42	1.31	3.83	0.63	0.76	0.13	31.09	5.12
45年目	R 51	0.98738	0.98936	0.99989	0.99084	0.1583	101.9	13.13	3.38	9.66	26.17	4.14	2.08	0.41	1.29	3.78	0.60	0.75	0.12	30.70	4.86
46年目	R 52	0.98722	0.98925	0.99989	0.99075	0.1522	101.9	12.96	3.34	9.54	25.84	3.93	2.06	0.41	1.27	3.74	0.57	0.75	0.11	30.33	4.61
47年目	R 53	0.98705	0.98913	0.99989	0.99067	0.1463	101.9	12.79	3.30	9.42	25.51	3.73	2.04	0.40	1.25	3.69</					

## 便益の現在価値算定表

箇所名:一般国道47号 新庄古口道路(残事業)

年次	年度 (基準年) R4	総走行台キロの年次別伸び率 (南東北ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	割引率4%
供用開始年次	R 6	0.99616	0.98297	1.01063	0.99621	0.9246	101.9	10.74	1.94	4.28	16.96	15.68	2.23	0.38	1.64	4.25	3.93	0.61	0.56	21.82	20.17
1年目	R 7	0.99615	0.98268	1.01052	0.99620	0.8890	101.9	10.70	1.93	4.26	16.89	15.02	2.22	0.38	1.63	4.23	3.76	0.61	0.54	21.73	19.32
2年目	R 8	0.99613	0.98237	1.01041	0.99618	0.8548	101.9	10.66	1.92	4.24	16.82	14.38	2.21	0.38	1.62	4.21	3.60	0.61	0.52	21.64	18.50
3年目	R 9	0.99612	0.98206	1.01030	0.99617	0.8219	101.9	10.62	1.91	4.22	16.75	13.77	2.20	0.38	1.61	4.19	3.44	0.61	0.50	21.55	17.71
供用開始年次	R 10	0.99610	0.98173	1.01019	0.99615	0.7903	101.9	16.32	4.15	12.50	32.97	26.06	2.36	0.40	1.63	4.39	3.47	0.82	0.65	38.18	30.18
5年目	R 11	0.99609	0.98139	1.01009	0.99614	0.7599	101.9	16.26	4.13	12.45	32.84	24.96	2.35	0.40	1.62	4.37	3.32	0.82	0.62	38.03	28.90
6年目	R 12	0.99607	0.98104	1.00999	0.99612	0.7307	101.9	16.20	4.11	12.40	32.71	23.90	2.34	0.40	1.61	4.35	3.18	0.82	0.60	37.88	27.68
7年目	R 13	0.99408	0.98904	1.00886	0.99562	0.7026	101.9	16.11	4.09	12.33	32.53	22.86	2.33	0.40	1.60	4.33	3.04	0.82	0.58	37.68	26.48
8年目	R 14	0.99404	0.98892	1.00878	0.99560	0.6756	101.9	16.02	4.07	12.26	32.35	21.86	2.32	0.40	1.59	4.31	2.91	0.82	0.55	37.48	25.32
9年目	R 15	0.99400	0.98880	1.00871	0.99558	0.6496	101.9	15.93	4.05	12.19	32.17	20.90	2.31	0.40	1.58	4.29	2.79	0.82	0.53	37.28	24.22
10年目	R 16	0.99397	0.98867	1.00863	0.99557	0.6246	101.9	15.84	4.03	12.12	31.99	19.98	2.30	0.40	1.57	4.27	2.67	0.82	0.51	37.08	23.16
11年目	R 17	0.99393	0.98854	1.00856	0.99555	0.6006	101.9	15.75	4.01	12.05	31.81	19.11	2.29	0.40	1.56	4.25	2.55	0.82	0.49	36.88	22.15
12年目	R 18	0.99389	0.98841	1.00848	0.99553	0.5775	101.9	15.66	3.99	11.98	31.63	18.27	2.28	0.40	1.55	4.23	2.44	0.82	0.47	36.68	21.18
13年目	R 19	0.99386	0.98827	1.00841	0.99551	0.5553	101.9	15.57	3.97	11.91	31.45	17.46	2.27	0.40	1.54	4.21	2.34	0.82	0.46	36.48	20.26
14年目	R 20	0.99382	0.98813	1.00834	0.99549	0.5339	101.9	15.48	3.95	11.84	31.27	16.70	2.26	0.40	1.53	4.19	2.24	0.82	0.44	36.28	19.38
15年目	R 21	0.99378	0.98799	1.00827	0.99546	0.5134	101.9	15.39	3.93	11.77	31.09	15.96	2.25	0.40	1.52	4.17	2.14	0.82	0.42	36.08	18.52
16年目	R 22	0.99374	0.98784	1.00821	0.99544	0.4936	101.9	15.30	3.91	11.70	30.91	15.26	2.24	0.40	1.51	4.15	2.05	0.82	0.40	35.88	17.71
17年目	R 23	0.99067	0.99180	0.99989	0.99271	0.4746	101.9	15.16	3.87	11.59	30.62	14.53	2.22	0.40	1.50	4.12	1.96	0.82	0.39	35.56	16.88
18年目	R 24	0.99059	0.99174	0.99989	0.99266	0.4564	101.9	15.02	3.83	11.48	30.33	13.84	2.20	0.40	1.49	4.09	1.87	0.82	0.37	35.24	16.08
19年目	R 25	0.99050	0.99167	0.99989	0.99260	0.4388	101.9	14.88	3.79	11.37	30.04	13.18	2.18	0.40	1.48	4.06	1.78	0.82	0.36	34.92	15.32
20年目	R 26	0.99041	0.99160	0.99989	0.99255	0.4220	101.9	14.74	3.75	11.26	29.75	12.55	2.16	0.40	1.47	4.03	1.70	0.82	0.35	34.60	14.60
21年目	R 27	0.99031	0.99153	0.99989	0.99249	0.4057	101.9	14.60	3.71	11.15	29.46	11.95	2.14	0.40	1.46	4.00	1.62	0.82	0.33	34.28	13.90
22年目	R 28	0.99022	0.99145	0.99989	0.99243	0.3901	101.9	14.46	3.67	11.04	29.17	11.38	2.12	0.40	1.45	3.97	1.55	0.82	0.32	33.96	13.25
23年目	R 29	0.99012	0.99138	0.99989	0.99238	0.3751	101.9	14.32	3.63	10.93	28.88	10.83	2.10	0.40	1.44	3.94	1.48	0.82	0.31	33.64	12.62
24年目	R 30	0.99002	0.99131	0.99989	0.99232	0.3607	101.9	14.18	3.59	10.82	28.59	10.31	2.08	0.40	1.43	3.91	1.41	0.82	0.30	33.32	12.02
25年目	R 31	0.98992	0.99123	0.99989	0.99226	0.3468	101.9	14.04	3.55	10.71	28.30	9.81	2.06	0.40	1.42	3.88	1.35	0.82	0.28	33.00	11.44
26年目	R 32	0.98982	0.99115	0.99989	0.99220	0.3335	101.9	13.90	3.51	10.60	28.01	9.34	2.04	0.40	1.41	3.85	1.28	0.82	0.27	32.68	10.89
27年目	R 33	0.98972	0.99107	0.99989	0.99214	0.3207	101.9	13.76	3.47	10.49	27.72	8.89	2.02	0.40	1.40	3.82	1.23	0.82	0.26	32.36	10.38
28年目	R 34	0.98961	0.99099	0.99989	0.99207	0.3083	101.9	13.62	3.43	10.38	27.43	8.46	2.00	0.40	1.39	3.79	1.17	0.82	0.25	32.04	9.88
29年目	R 35	0.98950	0.99091	0.99989	0.99201	0.2965	101.9	13.48	3.39	10.27	27.14	8.05	1.98	0.40	1.38	3.76	1.11	0.82	0.24	31.72	9.40
30年目	R 36	0.98939	0.99083	0.99989	0.99195	0.2851	101.9	13.34	3.35	10.16	26.85	7.65	1.96	0.40	1.37	3.73	1.06	0.82	0.23	31.40	8.94
31年目	R 37	0.98927	0.99074	0.99989	0.99188	0.2741	101.9	13.20	3.31	10.05	26.56	7.28	1.94	0.40	1.36	3.70	1.01	0.82	0.22	31.08	8.51
32年目	R 38	0.98916	0.99066	0.99989	0.99181	0.2636	101.9	13.06	3.27	9.94	26.27	6.92	1.92	0.40	1.35	3.67	0.97	0.82	0.22	30.76	8.11
33年目	R 39	0.98904	0.99057	0.99989	0.99175	0.2534	101.9	12.92	3.23	9.83	25.98	6.58	1.90	0.40	1.34	3.64	0.92	0.81	0.21	30.43	7.71
34年目	R 40	0.98892	0.99048	0.99989	0.99168	0.2437	101.9	12.78	3.19	9.72	25.69	6.26	1.88	0.40	1.33	3.61	0.88	0.81	0.20	30.11	7.34
35年目	R 41	0.98879	0.99039	0.99989	0.99161	0.2343	101.9	12.64	3.15	9.61	25.40	5.95	1.86	0.40	1.32	3.58	0.84	0.80	0.19	29.78	6.98
36年目	R 42	0.98867	0.99029	0.99989	0.99154	0.2253	101.9	12.50	3.11	9.50	25.11	5.66	1.84	0.40	1.31	3.55	0.80	0.80	0.18	29.46	6.64
37年目	R 43	0.98854	0.99020	0.99989	0.99146	0.2166	101.9	12.36	3.07	9.39	24.82	5.38	1.82	0.40	1.30	3.52	0.76	0.79	0.17	29.13	6.31
38年目	R 44	0.98840	0.99010	0.99989	0.99139	0.2083	101.9	12.22	3.03	9.28	24.53	5.11	1.80	0.40	1.29	3.49	0.73	0.79	0.16	28.81	6.00
39年目	R 45	0.98827	0.99000	0.99989	0.99132	0.2003	101.9	12.08	2.99	9.17	24.24	4.86	1.78	0.40	1.28	3.46	0.69	0.78	0.16	28.48	5.71
40年目	R 46	0.98813	0.98990	0.99989	0.99124	0.1926	101.9	11.94	2.95	9.06	23.95	4.61	1.76	0.40	1.27	3.43	0.66	0.78	0.15	28.16	5.42
41年目	R 47	0.98799	0.98980	0.99989	0.99116	0.1852	101.9	11.80	2.91	8.95	23.66	4.38	1.74	0.40	1.26	3.40	0.63	0.77	0.14	27.83	5.15
42年目	R 48	0.98784	0.98969	0.99989	0.99108	0.1780	101.9	11.66	2.87	8.84	23.37	4.16	1.72	0.40	1.25	3.37	0.60	0.77	0.14	27.51	4.90
43年目	R 49	0.98769	0.98959	0.99989	0.99100	0.1712	101.9	11.52	2.83	8.73	23.08	3.95	1.70	0.40	1.23	3.33	0.57	0.76	0.13	27.17	4.65
44年目	R 50	0.98754	0.98948	0.99989	0.99092	0.1646	101.9	11.38	2.79	8.62	22.79	3.75	1.68	0.40	1.22	3.30	0.54	0.76	0.13	26.85	4.42
45年目	R 51	0.98738	0.98936	0.99989	0.99084	0.1583	101.9	11.24	2.75	8.51	22.50	3.56	1.66	0.40	1.20	3.26	0.52	0.75	0.12	26.51	4.20
46年目	R 52	0.98722	0.98925	0.99989	0.99075	0.1522	101.9	11.10	2.71	8.40	22.21	3.38	1.64	0.40	1.19	3.23	0.49	0.75	0.11	26.19	3.98
47年目	R 53	0.98705	0.98913	0.99989	0.99067	0.1463	101.9	10.96	2.67	8.29	21.92	3.21	1.62	0.40	1.17	3.19	0.47	0.74	0.11	25.85	3.79
48年目	R 54	0.98688	0.98901	0.99989	0.99058	0.1407	101.9	10.82	2.63	8.18	21.63	3.04	1.60	0.40	1.16	3.16	0.44	0.74	0.10	25.53	3.58
49年目	R 55	0.98671	0.98889	0.99989	0.99049	0.1353	101.9	10.68	2.59	8.07	21.34	2.89	1.58	0.39	1.14	3.11	0.42	0.73	0.10	25.18	3.41
合計								674.91	166.68	498.89	1,340.48	563.83	101.46	19.91	70.97	192.34	83.38	39.35	16.04	1,572.17	663.25
