

<石川県内の状況>

1. 石川県管理の20水系27河川において、氾濫による浸水被害を確認（概ね浸水解消）。被害の詳細等調査中。
このうち町野川水系町野川で2箇所の堤防決壊を確認。1箇所では緊急応急復旧工事を実施中。河原田川水系河原田川において国が権限代行により復旧工事中の区間で河岸侵食箇所の緊急応急復旧工事を実施中。
2. 石川県内では、県管理の北河内ダム（町野川水系）、小屋ダム（鶴飼川水系）、ハケ川ダム（ハケ川水系）で洪水調節を実施。

<全国の状況>

3. 国管理の最上川水系最上川（山形県戸沢村）で、本川からの逆流を防止するゲート設備の不具合により、農地浸水が発生（浸水解消）。ゲート設備の機能回復済。
4. 多目的ダム1ダムで事前放流を実施（15ダムで事前放流の基準に達したが、14ダムは既に水位が低下していた）。40ダムで洪水調節を実施 [うち0ダムで継続中]

輪島市（わじまし）内における
石川県管理河川の状況

【浸水被害】 概ね浸水解消

① 河原田川（かわらだがわ）水系
河原田川（かわらだがわ）

② 塚田川（つかたがわ）水系
塚田川（つかたがわ）

【施設等被害】

③ 緊急応急復旧工実施中
町野川（まちのがわ）水系
町野川（まちのがわ）

④ 緊急応急復旧工実施中
河原田川（かわらだがわ）水系
河原田川（かわらだがわ）



山形県内における
国管理河川の状況

【浸水被害】 設備の機能回復済
浸水解消

⑪ 最上川（もがみがわ）水系
最上川（もがみがわ）

珠洲市（すずし）内における石川県管理河川の状況

【浸水被害】 概ね浸水解消

⑥ 竹中川（たけなががわ）水系
竹中川（たけなががわ）

⑦ 鶴若川（はんにやがわ）水系
鶴若川（はんにやがわ）

七尾市（ななおし）内における石川県管理河川の状況

【浸水被害】 概ね浸水解消

⑨ 衣川（ころもがわ）水系
衣川（ころもがわ）

⑩ 熊木川（くまきがわ）水系
熊木川（くまきがわ）

令和6年9月20日からの大雨による土砂災害発生状況

土砂災害発生件数

40件

- 土石流等 : 19件
- 地すべり : 5件
- がけ崩れ : 16件

【被害状況】

- 人的被害 : 死者 7名
行方不明者 1名
負傷者 1名
安否不明者 2名
- 人家被害 : 全壊 1戸
一部損壊 1戸

※石川県は人的・人家被害確認中

9/21 地すべり わじまし まちのましかわにし
⑤石川県輪島市町野町川西



9/21 土石流等 わじまし ふてがわまち
⑥石川県輪島市久手川町



9/21 土石流等 わじまし まちのまちてらじ
①石川県輪島市町野町寺地



9/21 土石流等 わじまし まちのまちなみときくに
②石川県輪島市町野町南時国



9/21 土石流等 すずし おおたにまち
③石川県珠洲市大谷町



9/21 がけ崩れ すずし わかやま まちひろぐり
④石川県珠洲市若山町広栗



発生件数内訳	
石川県	36件
宮城県	1件
山形県	1件
新潟県	1件
熊本県	1件



凡例
● : 土砂災害発生箇所(石川県)

※これは速報であり、今後数値等が変わる可能性があります。

令和6年9月20日からの大雨における水道施設の被害と対応状況等について

○2市1町の主要な浄水場自体は稼働可能な状況であり、順次、水道本管の通水状況を確認中。
○道路啓開や停電が必要な箇所については、関係部局・機関と連携して、順次断水解消を進めている。

県	市町村	断水戸数（戸）		断水期間	被害状況	応急給水状況	復旧対応状況
		最大	現在				
石川県	わじまし 輪島市	3,236	3,043	9/21～	停電等の影響により水道施設が機能停止、水管橋・送水管の破損等	実施中	- 輪島浄水場、地原浄水場、南志見仮浄水場は稼働中。門前地区が復電。大沢浄水場、西円山浄水場は停電により停止中。 - 町野浄水場は停電解消に伴い機能回復し、町野配水池へ送水開始（9/24）。 - 輪島浄水場から第1配水池への送水管修繕完了（9/26）。 - 久手川仮設ポンプが土砂崩落により被災。 - その他、水道施設の被害について詳細調査実施中。
	すずし 珠洲市	1,750	1,253	9/21～	停電の影響によりポンプ・水位計等の水道施設が機能停止、水管橋の破損等	実施中	- 宝立浄水場は稼働中。宝立、飯田、正院配水池に加え、三崎地区一部通水（9/26）。 - 若山地区の若山配水池まで送水可。一部通水（9/26）。 - 大谷、高屋は停電により停止中。土砂崩落により現地調査不可。折戸浄水場は復電。
	のとちょう 能登町	230	210	9/22～	停電の影響によりポンプ等の水道施設が機能停止	実施中	五十里浄水場は停電解消に伴い稼働中。桐畑、小間生も復電。
合計		5,216	4,506				

●断水状況（令和6年9月27日 13時00分時点）


<凡例>

断水発生中

断水解消

応急給水実施中

（注）断水戸数には、能登半島地震に伴う早期復旧が困難な建物倒壊地域等における断水戸数が含まれる可能性がある。

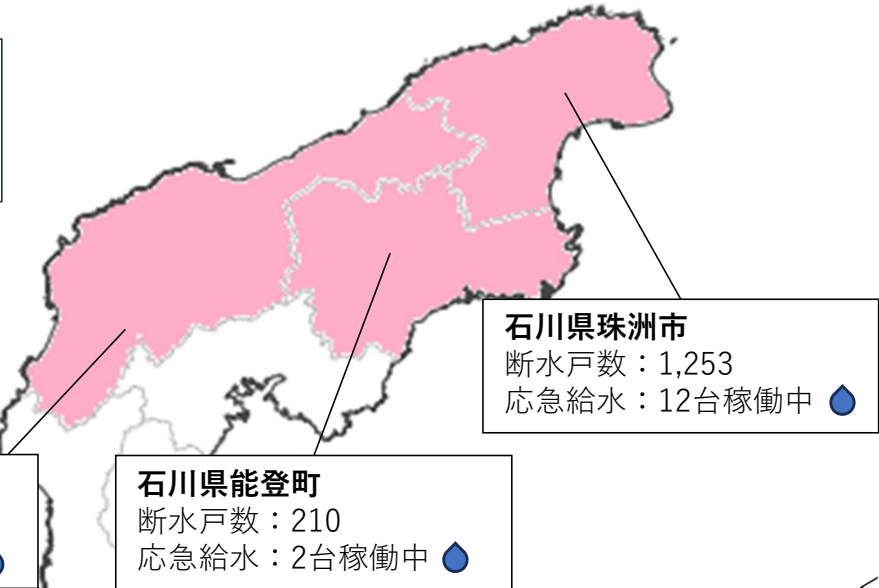

●被災状況等




9月20日から大雨による下水道施設の被害と対応状況等について

- 道路啓開や停電解消が必要な箇所については、関係部局・機関と連携して対応を実施し、機能停止した処理場・ポンプ場について、機能確保済み
- 被災自治体へ石川県および県内市町の職員による被害状況調査の支援や国からTEC-FORCE(上下水)や上下水道復興支援室の職員を派遣し、水道の復旧に遅れないよう、早期機能確保に向けて技術的支援を実施

●被害のあった下水道施設

県	市町村名	施設名	被害時の状況	現在の対応状況
石川県	わじまし 輪島市	もんぜんまちすいしつかんり 門前町水質管理センター	浸水によりポンプ機能停止	機能確保済み（応急復旧完了）
石川県	わじまし 輪島市	わじましじょうか 輪島市浄化センター	停電により機能停止	機能確保済み（応急復旧完了）
石川県	わじまし 輪島市	管路	一部破損	機能確保済み（バキューム車による対応実施中）
石川県	わじまし 輪島市	マンホールポンプ 10基	浸水により機能停止	5基 機能確保済み（応急復旧完了） 5基 応急対応中（仮設ポンプ等の手配中）
石川県	すずし 珠洲市	くまたんおすいちゅうけい 熊谷汚水中継ポンプ場	機器の故障により機能停止	機能確保済み（応急復旧完了）
石川県	すずし 珠洲市	マンホールポンプ 16基	浸水により機能停止	応急対応中（仮設ポンプ等の手配中）
石川県	すずし 珠洲市	管路	一部破損	応急対応中（仮設ポンプ等の手配中）

●被害のあった下水道施設の位置

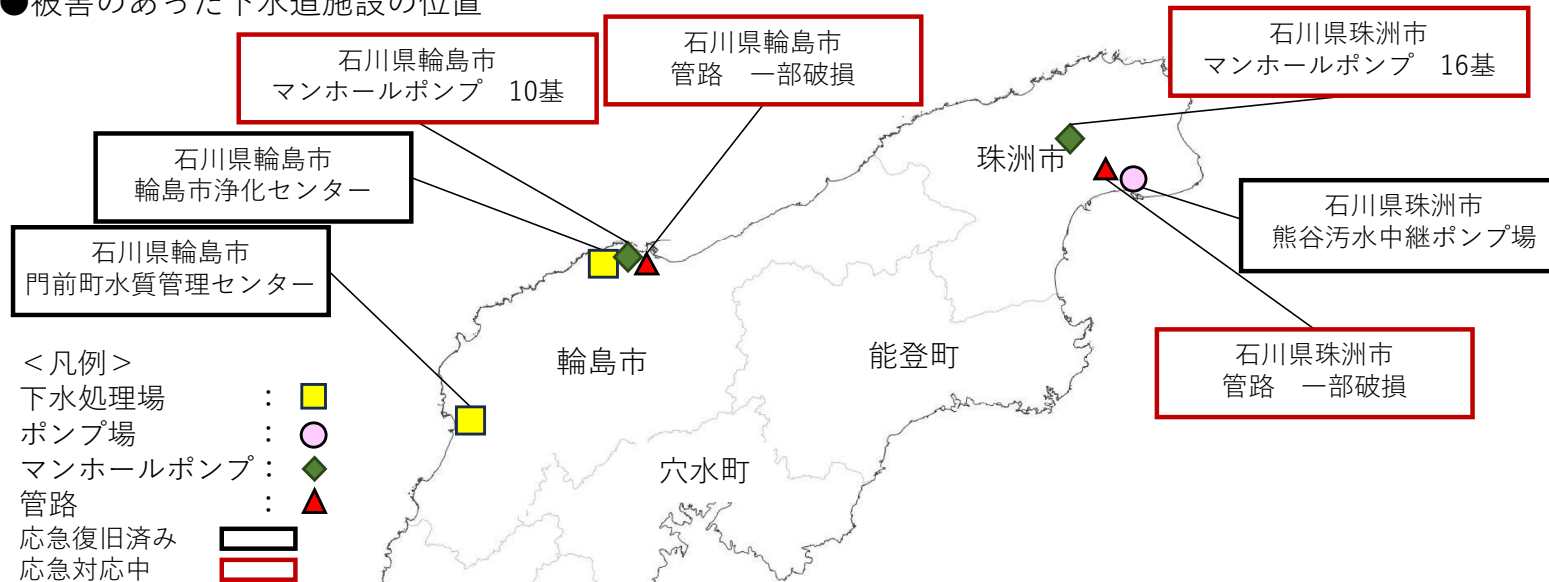

●石川県輪島市管路の被災状況



一部破損した仮設管路（管の抜け）

孤立解消に向けた緊急復旧(道路啓開)の進捗状況

R6.9.26 17時時点

STEP1(9/21)発災日

能越道から、各役所(輪島市、能登町、珠洲市)までのアクセスを確保

STEP2(9/22)

沿岸部へのアクセスを優先的に確保

STEP3(9/22~)

多数の孤立集落がある沿岸部等のアクセス確保に向けて啓開を実施

→ 9/25までに幹線道路の啓開は概ね完了、ラストマイルを啓開中

■孤立力所数

(9/22 16:00時点) (9/23 15:00時点) (9/24 16:00時点) (9/25 15:00時点) (9/26 16:00時点)
115力所→14地区56力所→12地区46力所→7地区16力所→3地区4力所



自治体への支援状況

輪島市と珠洲市の要請を受け、国直轄で啓開中(9/26 17:00時点)

- ・輪島市道6力所(1力所 啓開済)
- ・珠洲市道2力所

ライフライン関係

電力、通信、上下水道の各機関の要請を受け、16区間(うち直轄実施5区間)に優先着手(啓開完了3~7区間)

令和6年9月20日から大雨による鉄道の主な被害状況について

令和6年9月27日11:30時点

○新潟県内において、施設被害により1事業者1路線で運転見合わせ中



輪島港

(石川県輪島市)

○河川より土砂等が流入



小型船だまり

→ 港湾利用への
影響を確認中




マリンタウン岸壁

→ 港湾利用への
影響を確認中



海岸護岸の一部が被災
(応急復旧を準備中)

※特記した施設以外は港湾利用への影響なし

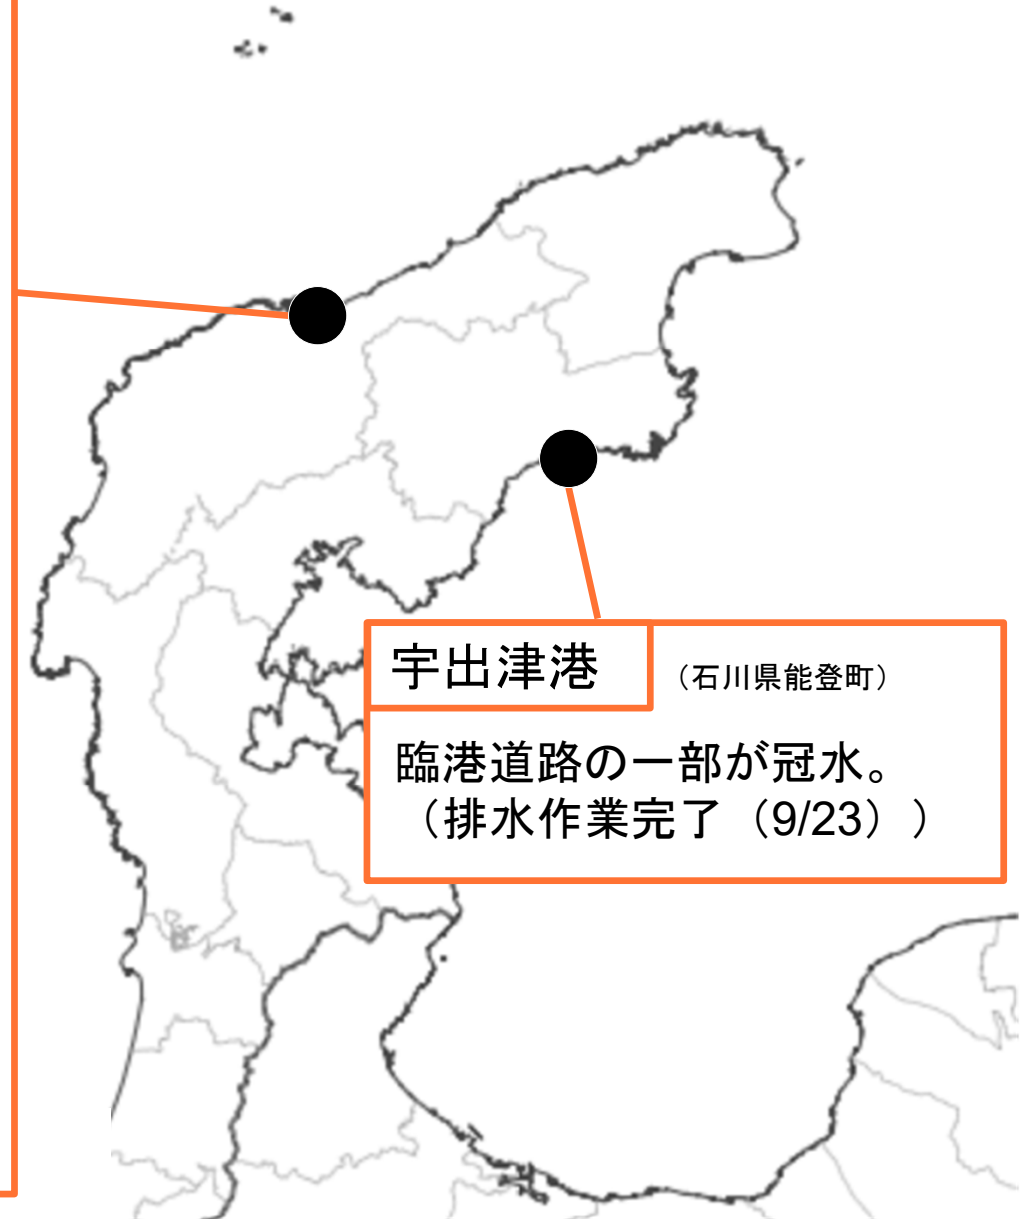

宇出津港

(石川県能登町)

臨港道路の一部が冠水。
(排水作業完了 (9/23))

TEC-FORCEの活動状況(R6年9月20日からの大雨)

総数 175名派遣 (のべ633人・日)

リエゾン 12名
JETT 3名
被災状況調査班等 160名
先遣班 10名
先遣調査班 3名
応急対策班 4名
高度技術指導班 17名 (河川、砂防、上下水道、下水)
被災状況調査班 36名 (河川・ 9班)
28名 (砂防・ 7班)
56名 (道路・ 14班)
1名 (港湾・ 1班)
1名 (広域調査 (Car-SAT))
4名 (ドローン)

北陸地方整備局等 10名



輪島市
リエゾン 2名
先遣調査班 3名
高度技術指導班 15名 (河川、砂防、上下水)
被災状況調査班 12名 (河川)
被災状況調査班 8名 (砂防)
被災状況調査班 20名 (道路)


珠洲市
リエゾン 3名
応急対策班 2名
高度技術指導班 1名 (下水)
被災状況調査班 12名 (河川)
被災状況調査班 8名 (砂防)
被災状況調査班 20名 (道路)
被災状況調査班 1名 (港湾)
被災状況調査班 4名 (ドローン)

能登町
リエゾン 2名
被災状況調査班 12名 (河川)
被災状況調査班 4名 (砂防)
被災状況調査班 16名 (道路)

穴水町
被災状況調査班 4名 (砂防)



石川県庁
リエゾン 5名
JETT 3名
高度技術指導班 1名 (河川)
被災状況調査班 4名 (砂防)

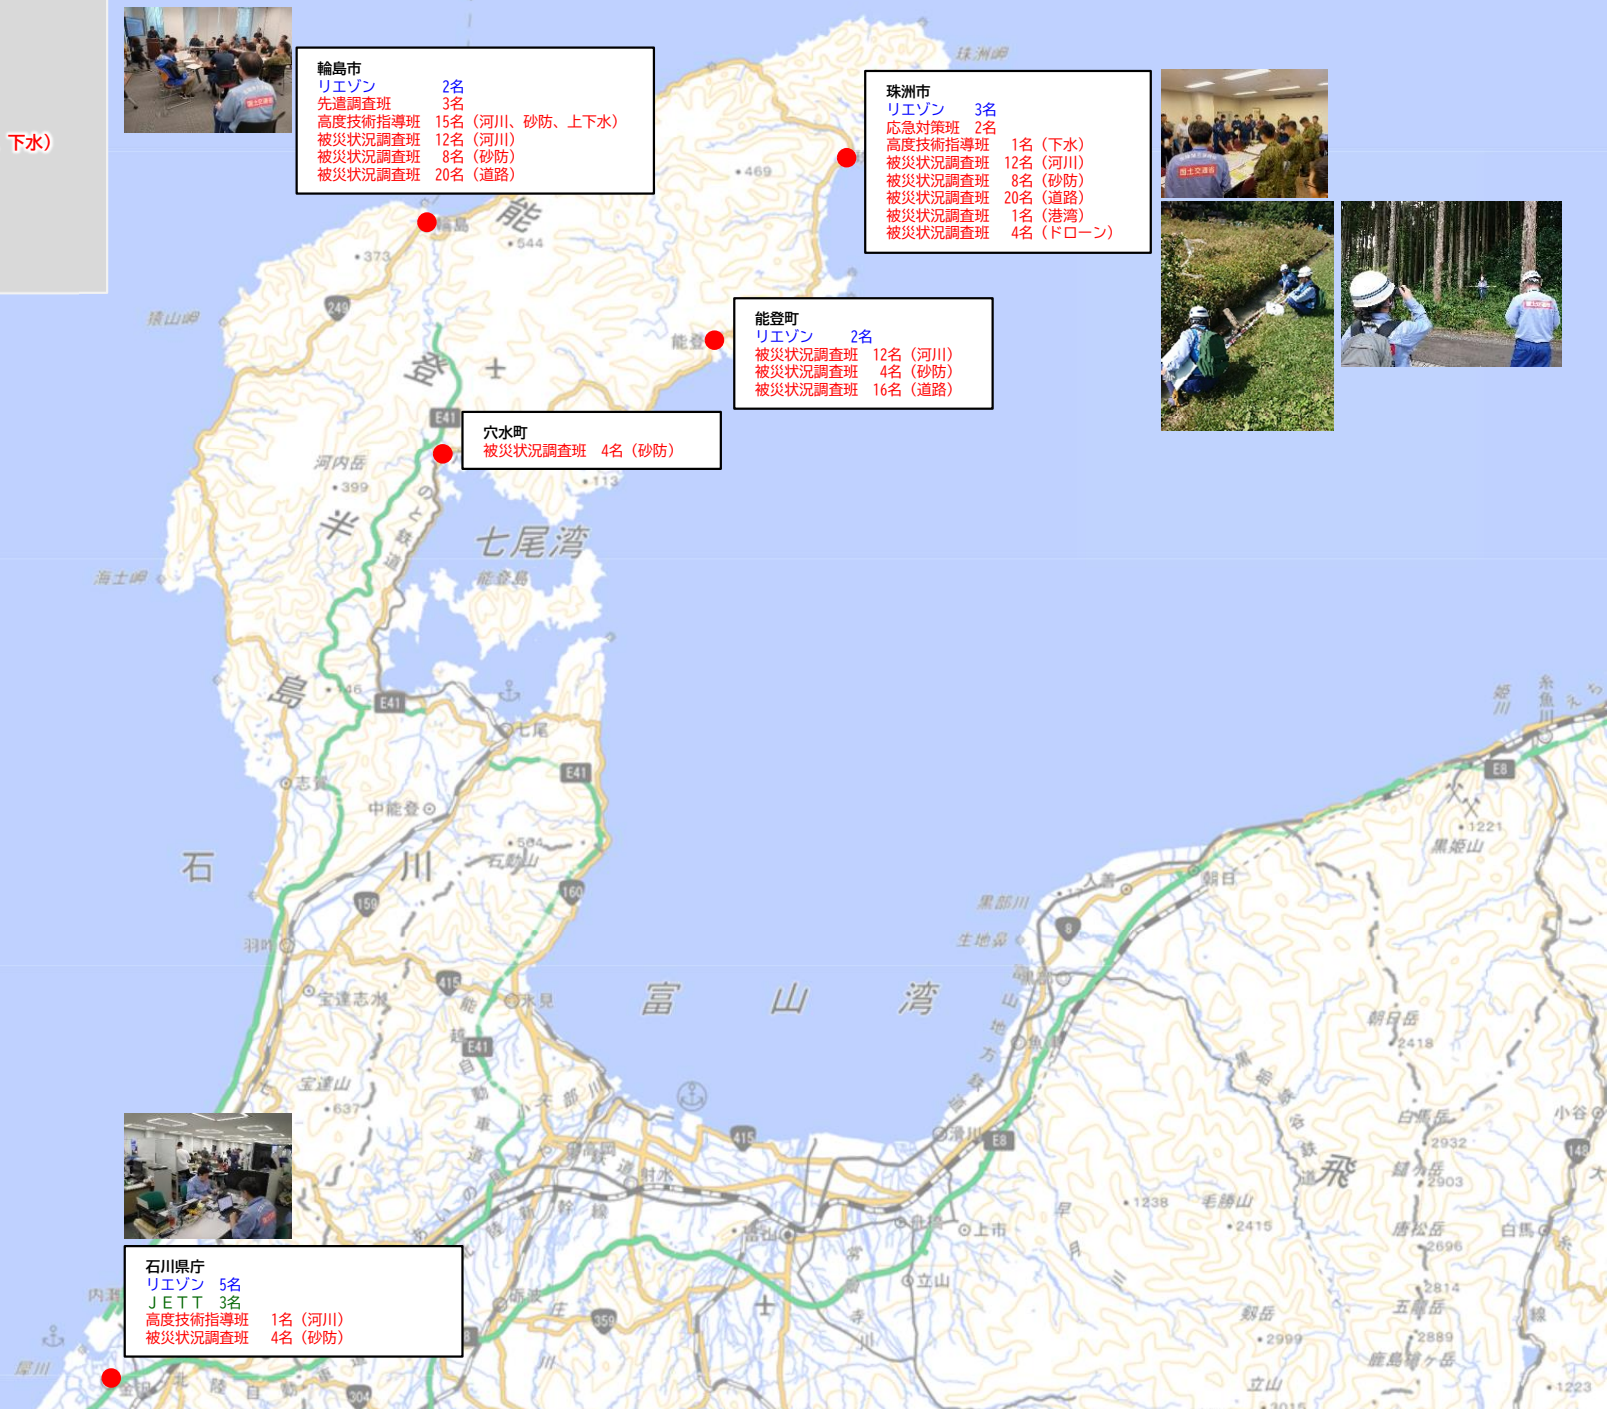

災害対策用機械等の派遣状況(R6年9月20日からの大雨)

・総数 33台 (のべ220台・日)
照明車 12台 (うち電源支援4台)
散水車(給水装置付) 2台
対策本部車 1台
待機支援車 1台
衛星インターネット装置 4台
モバイル映像伝送装置 5台
Car-SAT 1台
ドローン 7台

<凡例>

□: 前進配備 (プッシュ型派遣・直轄対応含む)
□: 自治体要請
●: 派遣中
●: 派遣終了

石川県 輪島市
・照明車 N=5台 (稼働中)
・ドローン N=1台 (稼働中)

石川県 珠洲市
・照明車 N=1台 (待機中) ※電源支援
・散水車(給水装置付) N=1台 (稼働中)
・対策本部車 N=1台 (稼働中)
・待機支援車 N=1台 (稼働中)
・衛星インターネット装置 N=2台 (待機中)
・モバイル映像伝送装置 N=2台 (待機中)
・ドローン N=4台 (稼働中)

石川県 能登町
・ドローン N=2台 (稼働中)

石川県 七尾市
・照明車 N=1台 (待機中)
・照明車 N=3台 (待機中) ※電源支援
・モバイル映像伝送装置 N=2台 (待機中)

石川県 宝達志水町
・衛星インターネット装置 N=1台 (稼働中)

富山県 富山市 (富山防災センター)
・照明車 2台 (待機中)
・散水車(給水機能付) 1台 (待機中)
・モバイル映像伝送装置 1台 (待機中)
・衛星インターネット装置 1台 (待機中)

