

＜石川県内の状況＞

- 1. 石川県管理の21水系28河川において、氾濫による浸水被害を確認（浸水解消）。
このうち町野川水系町野川で2箇所の堤防決壊を確認、緊急応急復旧工事完了。河原田川水系河原田川の権限代行により地震災の復旧工事を実施している区間で河岸
侵食箇所の緊急応急復旧工事を完了。
塚田川水系塚田川、南志見川水系南志見川、町野川水系町野川・鈴屋川、珠洲大谷川水系珠洲大谷川の4水系5河川で国が権限代行による応急復旧工事を実施中。
- 2. 石川県内では、県管理の北河内ダム（町野川水系）、小屋ダム（鵜飼川水系）、ハケ川ダム（ハケ川水系）で洪水調節を実施。

＜全国の状況＞

- 3. 国管理の最上川水系最上川（山形県戸沢村）で、本川からの逆流を防止するゲート設備の不具合により、農地浸水が発生（浸水解消）。ゲート設備の機能回復済。
- 4. 多目的ダム1ダムで事前放流を実施（15ダムで事前放流の基準に達したが、14ダムは既に水位が低下していた）。40ダムで洪水調節を実施。



緊急応急復旧工事の状況



権限代行による国の対応状況



令和6年9月20日からの大雨による土砂災害発生状況

土砂災害発生件数

272件

土石流等

: 86件

地すべり

: 26件

がけ崩れ

: 160件



※これは速報であり、今後数値等が変わる可能性があります。

令和6年9月20日から大雨における水道施設の被害と対応状況等について

令和6年11月1日

13:00時点

- 2市の主要な浄水場は稼働可能な状況であり、順次、水道本管の復旧を進めている。
- 埋設管の復旧を行う他、早期断水解消のため、配水池への運搬送水や露出配管による復旧等により、応急対応を実施。
- 断水解消できていない地区については、集落単位での応急給水により、きめ細やかに住民に水を供給し、水を身近で利用できる体制を確保済み。

県	市町村	断水戸数(戸)		断水期間	応急給水状況
		最大	現在※		
石川県	わがまち 輪島市	3,236	361	9/21～	9台稼働中
	すずし 珠洲市	1,750	241	9/21～	3台稼働中
	のとうよう 能登町	230	0	9/22～10/9	終了
	合計	5,216	602		12台稼働中

※断水戸数には11月1日に断水解消見込みの戸数を含む



<仮設水槽への給水
(珠洲市折戸)>



<受水槽への給水
(珠洲市折戸)>

<輪島市街
水道管損傷
順次通水試験を実施>

<輪島市大沢地区
停電によりポンプ施設停止
(住民2次避難中)>

<輪島市門前地区
土砂崩れにより水道管破損
順次通水試験を実施>

<輪島市門前地区
11/1断水解消見込み>

<輪島市南志見地区
断水解消(10/27)>

<輪島市鶴巣地区
土砂崩れによる水道管破損
順次通水試験を実施>

<輪島市惣領地区
断水解消(10/19)>

<輪島市金蔵・大西山地区
11/1断水解消見込み>

<珠洲市大谷地区>
浄水場沈砂池への土砂流入
水道管破損
可搬式浄水装置による応急復旧予定

<珠洲市高屋地区>
浄水場停止
土砂崩れによる水道管破損
通水試験実施予定


<珠洲市日置地区>
断水解消(10/30)>

<珠洲市馬縹地区>
一部断水解消(10/25)>



<土砂崩落のため迂回ルートへ露出配管の
設置により応急復旧(珠洲市上戸町)>

●断水戸数の推移 ※各時点での断水戸数

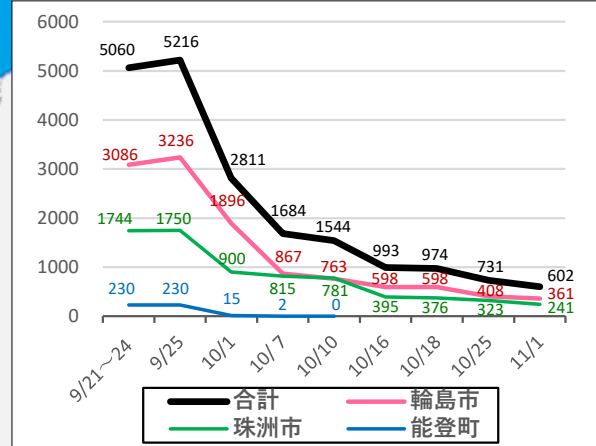

<配水池への給水(運搬送水)により早期復旧(輪島市惣領)>



<凡例>
大雨による断水
地震による断水
※建物倒壊地域等
断水解消
※生活用水としての通水含む
給水エリア
浄水場(稼働停止)
浄水場(稼働中)


9月20日から大雨による下水道施設の被害と対応状況等について

- 道路啓開や停電解消が必要な箇所については、関係部局・機関と連携して対応を実施し、機能停止した処理場・ポンプ場について、機能確保済み
- 被災自治体へ石川県および県内市町の職員による被害状況調査の支援に加え、国からTEC-FORCE(上下水)や上下水道復興支援室の職員を派遣し、水道の復旧に遅れないよう、早期機能確保に向けて技術的支援を実施

●被害のあった下水道施設

県	市町村名	施設名	被害時の状況	現在の対応状況
石川県	わじまし 輪島市	もんぜんまちすいしつかんり 門前町水質管理センター	浸水によりポンプ機能停止	機能確保済み（応急復旧完了）
石川県	わじまし 輪島市	わじましじょうか 輪島市浄化センター	停電により機能停止	機能確保済み（応急復旧完了）
石川県	わじまし 輪島市	管路	一部破損	機能確保済み（バキューム車による汚水の吸引・運搬）
石川県	わじまし 輪島市	マンホールポンプ 10基	浸水により機能停止	7基 機能確保済み（応急復旧完了） 3基 汚水の発生なし（仮設ポンプ等の手配済）
石川県	すずし 珠洲市	くまんとんおすいちゅうけい 熊谷汚水中継ポンプ場	機器の故障により機能停止	機能確保済み（応急復旧完了）
石川県	すずし 珠洲市	マンホールポンプ 16基	浸水により機能停止	機能確保済み（応急復旧完了）
石川県	すずし 珠洲市	管路	一部破損	機能確保済み（バキューム車による汚水の吸引・運搬）

●被害のあった下水道施設の位置

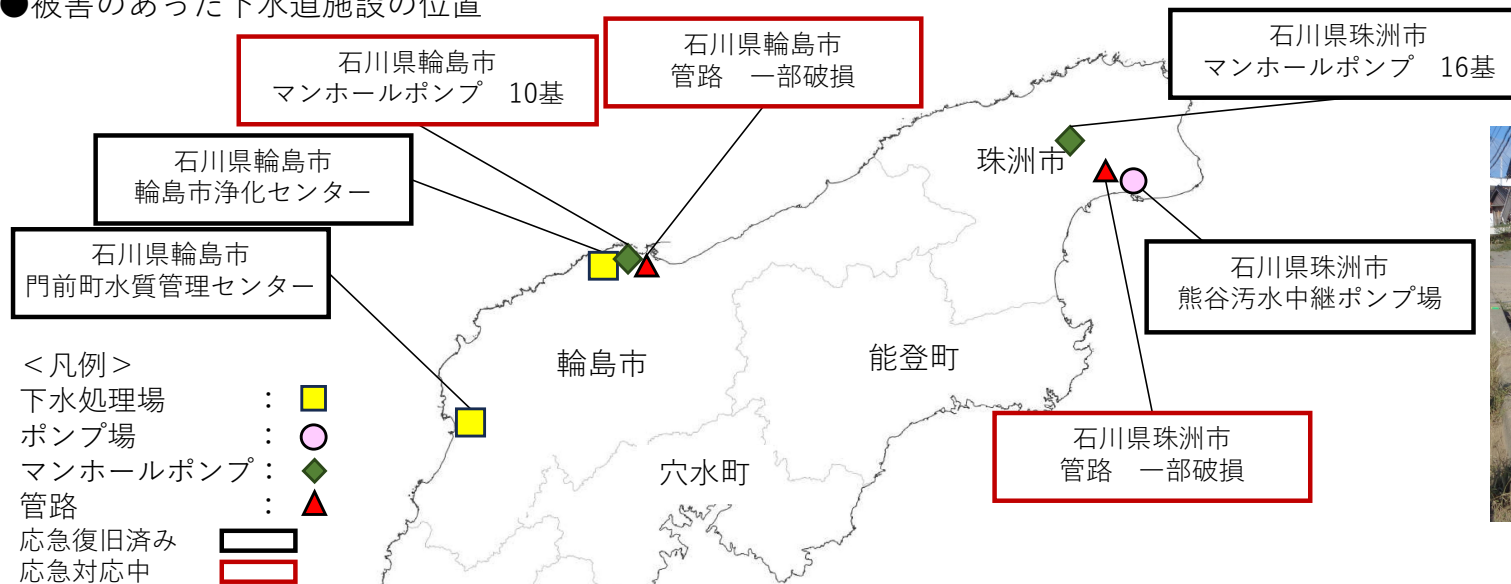

●石川県輪島市対応状況



バキューム車による汚水の吸引・運搬

■県道以上の通行止め（被災）箇所数

	1/1 (地震直後)	9/22 (大雨直後)	10/24時点
大雨による通行止 (R6. 9. 20～)	—	48箇所	24箇所※
地震による通行止 (R6. 1. 1)	87箇所	13箇所	13箇所

※通行止24箇所のうち、11箇所において緊急車両通行可

- 市町が管理する道路の被災状況（10/16時点確認）
- ・輪島市：162路線
 - ・珠洲市：通行可能マップを市HPで公表
 - ・能登町：4箇所

写真①



至 輪島市街地

R6. 9. 25撮影

至 輪島市門前町

県道38号輪島浦上線(輪島市鶴入町地先)

写真②



R6. 9. 28撮影

県道272号上黒丸大谷線(珠洲市大谷町地先)

凡 例

通行可			自動車専用道路
			一般道
通行止	大雨		一般道(緊急車両のみ通行可)
			一般道
	地震		一般道
道の駅			営業中、トイレ使用可
			時短営業、トイレ使用可
			休業中、トイレ使用可
			休業中、トイレ使用不可

○通行可能な路線においても、部分的に段差、道路幅が狭い箇所、迂回等がありますので、走行には十分注意してください。
また、異常気象等により通行止めになる場合があります。

○道路復旧見える化マップもご覧ください。
<https://www.mlit.go.jp/road/r6noto/index4.html>


孤立解消に向けた緊急復旧(道路啓開)の進捗状況

R6.10.25 15時時点

- STEP1(9/21) 発災日
- STEP2(9/22)
- STEP3(9/22～)

能越道から、各役所(輪島市、能登町、珠洲市)までのアクセスを確保
沿岸部へのアクセスを優先的に確保
多数の孤立集落がある沿岸部等のアクセス確保に向けて啓開を実施
→9/25までに幹線道路の啓開は概ね完了
→9/27までのラストマイルの道路啓開等により、集落の孤立は実質的に解消

■孤立力所数
(9/22 16:00時点) (9/23 15:00時点) (9/24 16:00時点)
115力所→14地区56力所→12地区46力所
(9/25 15:00時点) (9/26 16:00時点) (9/27 16:00時点)
→7地区16力所→3地区4力所→ **実質解消**

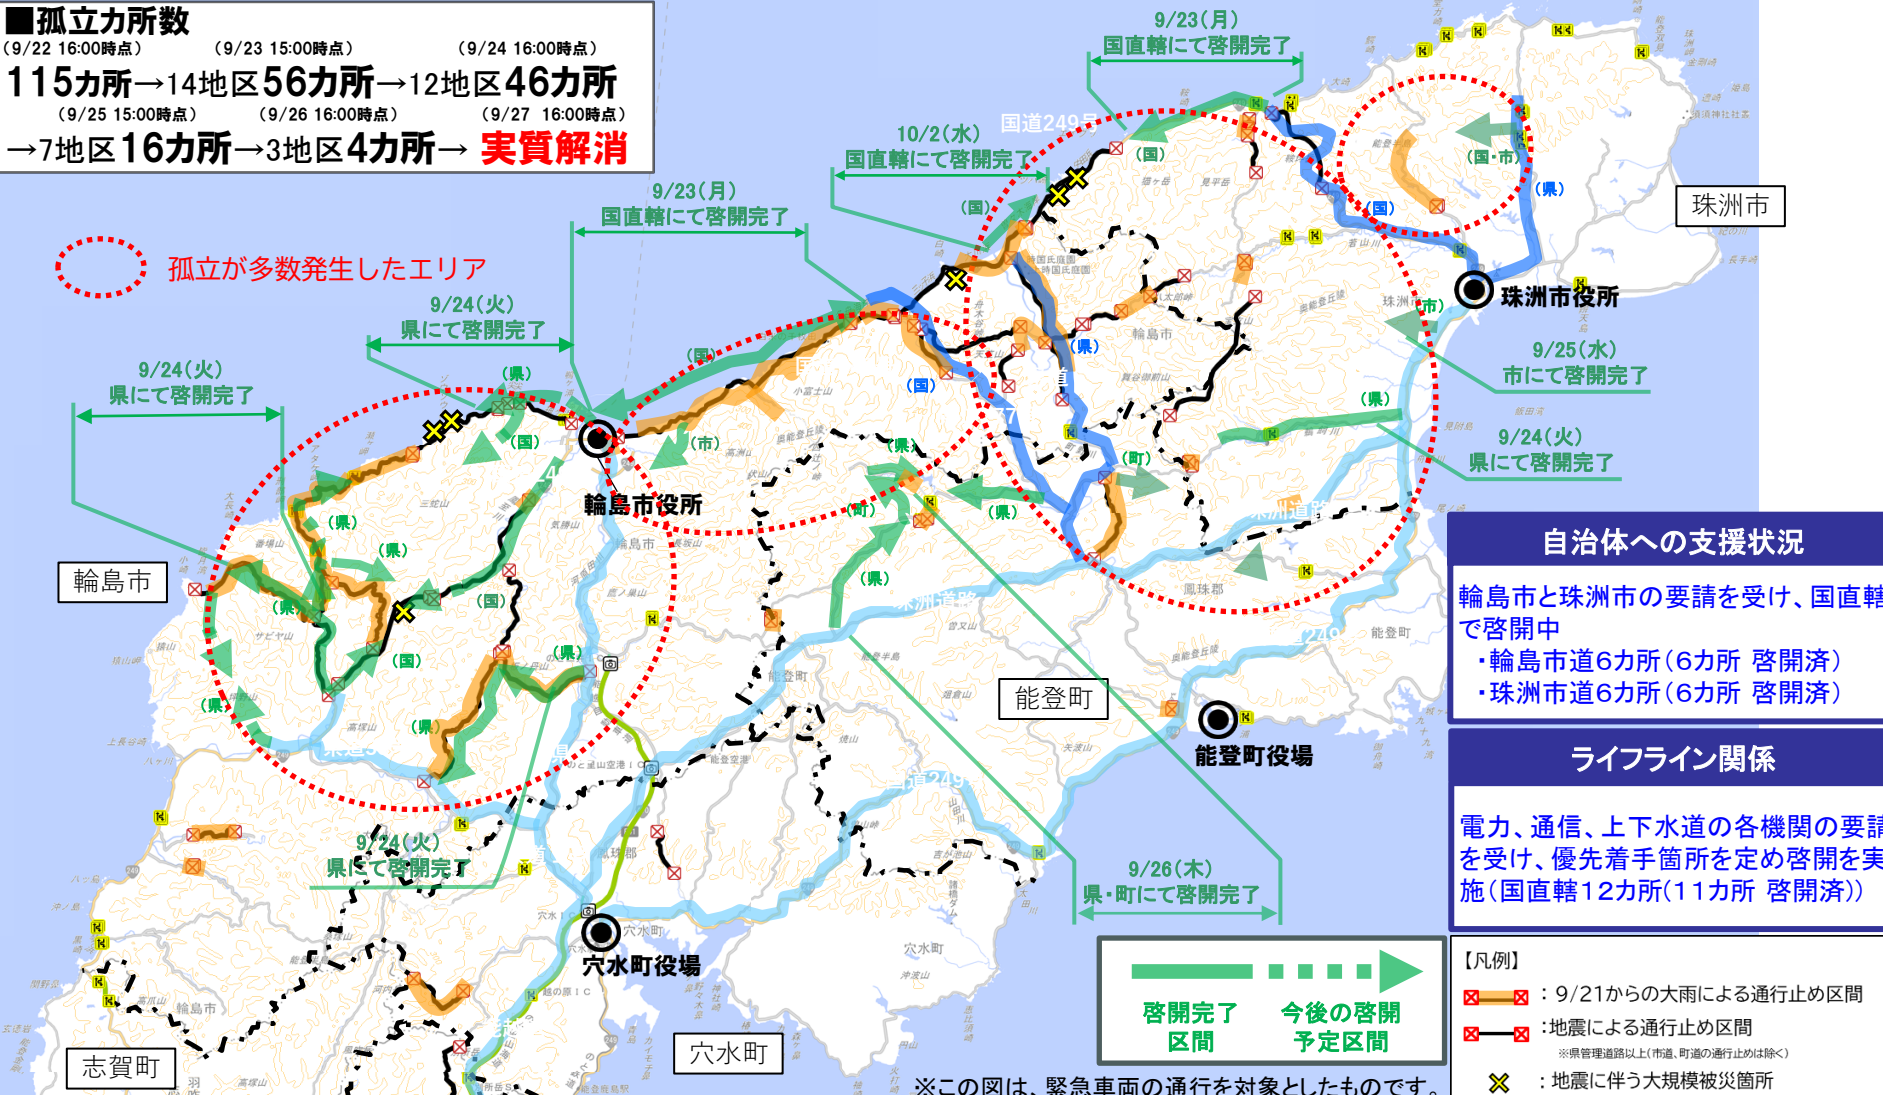

輪島港

(石川県輪島市)

○河川より土砂等が流入



小型船だまり

➡ 港湾利用への影響がないことを確認




マリンタウン岸壁

➡ 一部水深の浅い箇所あり
(応急復旧作業を実施中)



海岸護岸の一部が被災(応急復旧完了(10/15))

※特記した施設以外は港湾利用への影響なし

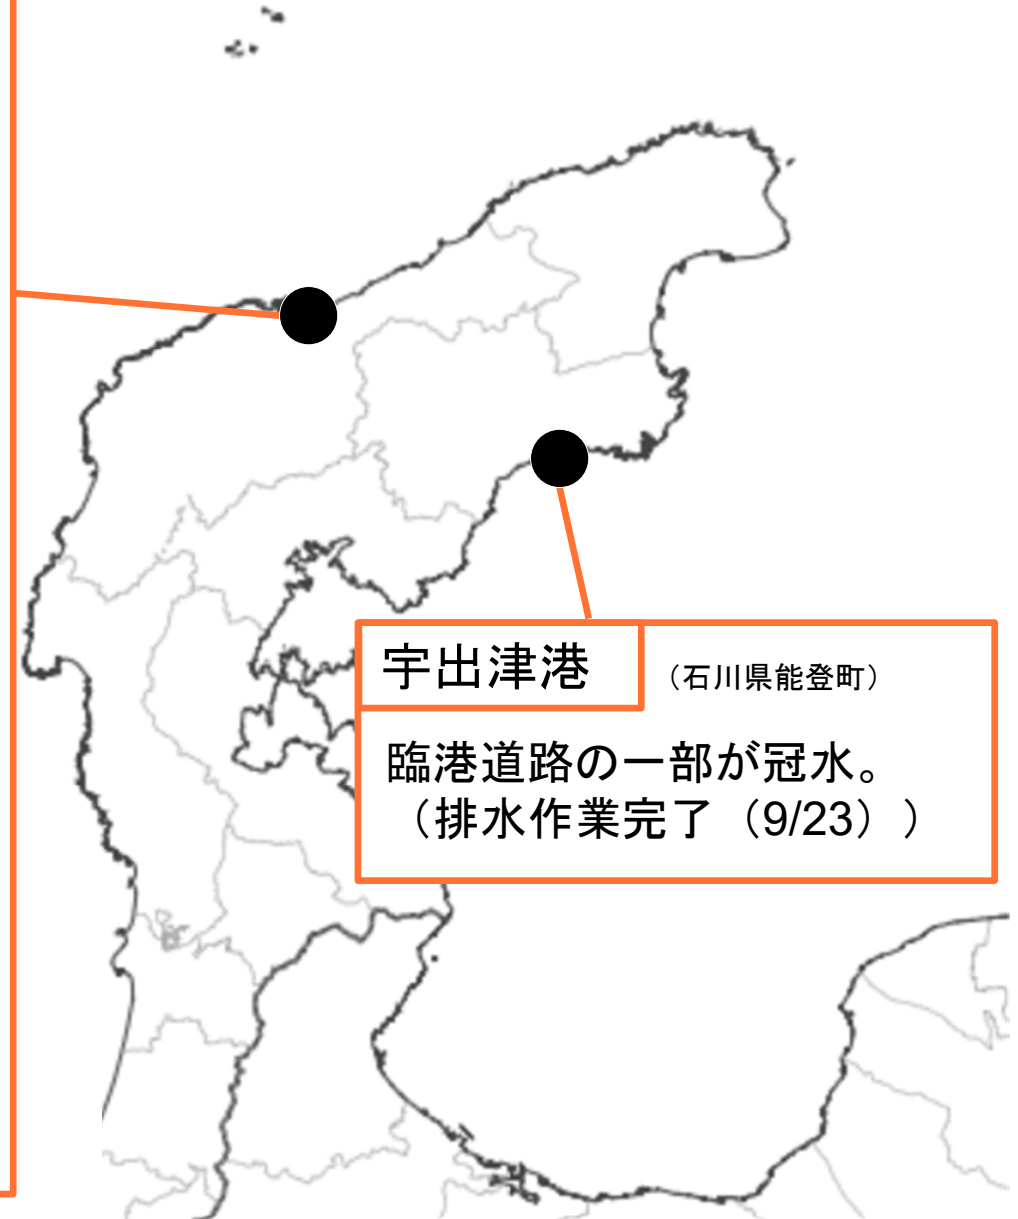

宇出津港

(石川県能登町)

臨港道路の一部が冠水。
(排水作業完了(9/23))

【都市局】 令和6年9月20日からの大雨に関する被害状況

【凡例】

公 都市公園

鳳来山公園（石川県輪島市）



【被害状況】土砂崩落

※公園区域内の治山事業箇所を含む土砂が崩落し、民家へ流入
※崩落土砂の撤去作業を実施

被災箇所数

都市公園： 1 件

※人的被害無し

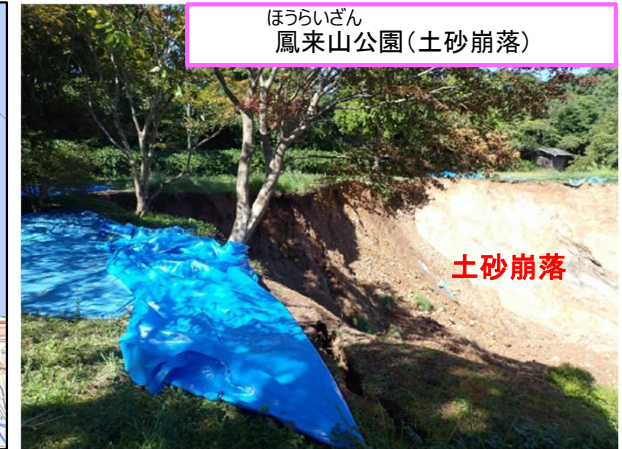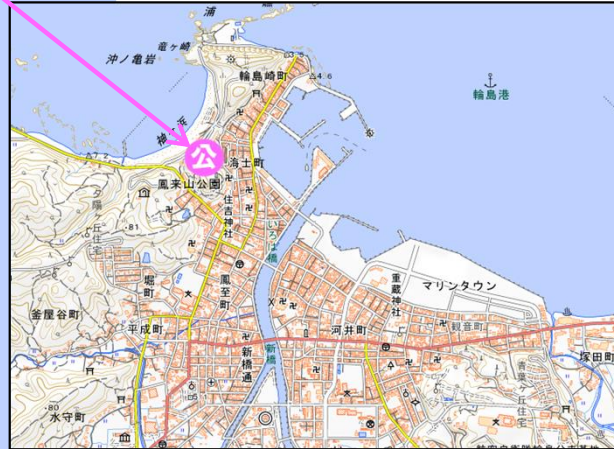

ほうらいざん
鳳来山公園(土砂崩落)

土砂崩落
