

事務連絡
令和4年2月3日

都道府県下水道担当課長 殿
政令指定都市下水道担当部長 殿
（上記、各地方整備局等経由）
市町村下水道担当部長・課長 殿
（上記、各都道府県経由）
日本下水道事業団事業課長 殿
都市再生機構下水道担当課長 殿

国土交通省水管理・国土保全局下水道部
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐

下水道工事における安全対策の徹底（その6）について （令和4年1月28日静岡県沼津市発注の工事に伴う死亡事故）

本年1月28日、静岡県沼津市発注の開削工法による下水管路の布設工事（夜間施工）において、深さ約2.5mの掘削穴の埋め戻し作業中に、管頂部まで（約2.1mの深さまで）埋め戻した状態で、土留め矢板を引き抜いた後、埋め戻し土を敷き均すために作業員が掘削穴へ下りた際に、側面の土砂が崩落し、その作業員が生き埋めとなり、意識不明により救急搬送されましたが、死亡するという事故が発生しました。


本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等について確認の上、改めて事務連絡を発出します。

発注者におかれましては、下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いします。

下水道工事における土砂崩落事故 (R4.1.28 静岡県沼津市)


- 発生日 : 令和4年1月28日(金) 午前1時30分頃
(夜間施工中)
- 発生場所 : 静岡県沼津市松長
- 報道 : あり
- 工事概要 : 下水道管渠布設工事 開削工 L=102.0m
- 事故内容 : 開削工法による下水管路の布設工事(夜間施工)において、深さ約2.5mの掘削穴の埋め戻し作業中に、管頂部まで(約2.1mの深さまで)埋め戻した状態で、土留め矢板を引き抜いた後、埋め戻し土を敷き均すために作業員が掘削穴へ下りた際に、側面の土砂が崩落し、その作業員が生き埋めとなり、意識不明により救急搬送されたが、死亡が確認された。

【位置図】

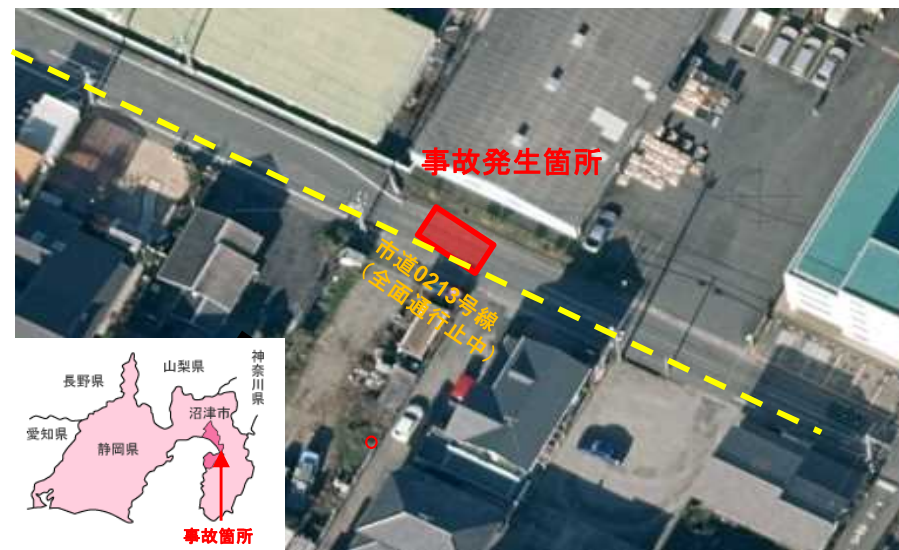


【状況図】

【断面図】

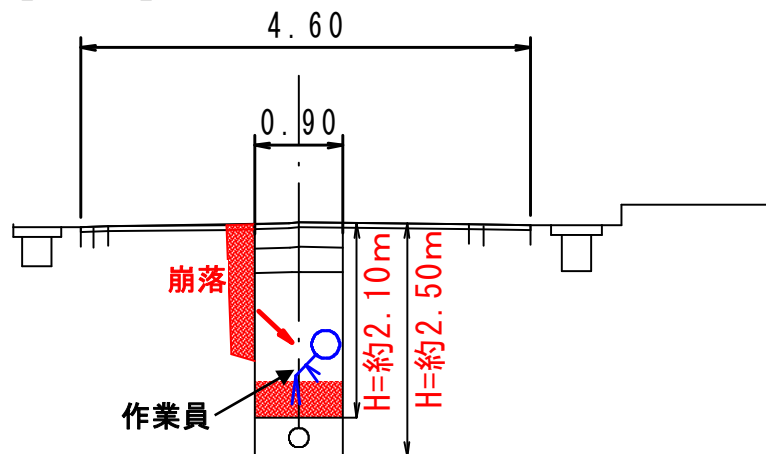

【状況写真】

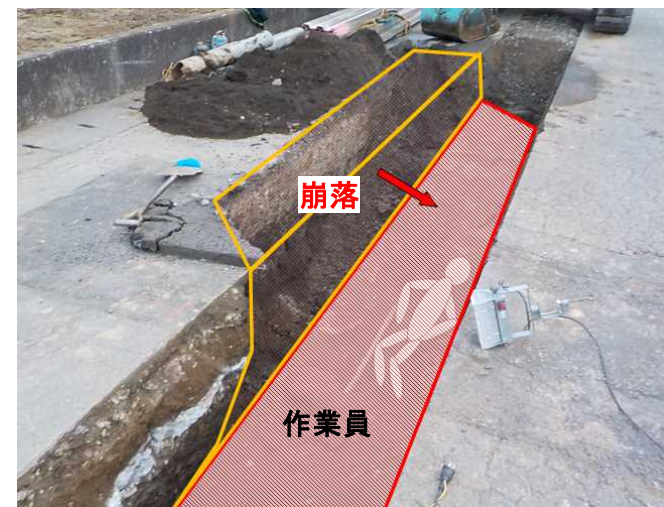

側面の土砂が崩落し、作業員が生き埋め

