

速報

(8/3 9:00現在)

今後の調査により、数値等が  
変わることがあります


# 平成16年7月福井豪雨災害資料

平成16年8月

河川局

あすわ

福井県管理の足羽川等で破堤 2箇所、護岸破損や溢水等多数。  
特に福井市内の破堤により 大きな被害。  
足羽川の国管理区間でも河道洗掘 3箇所。

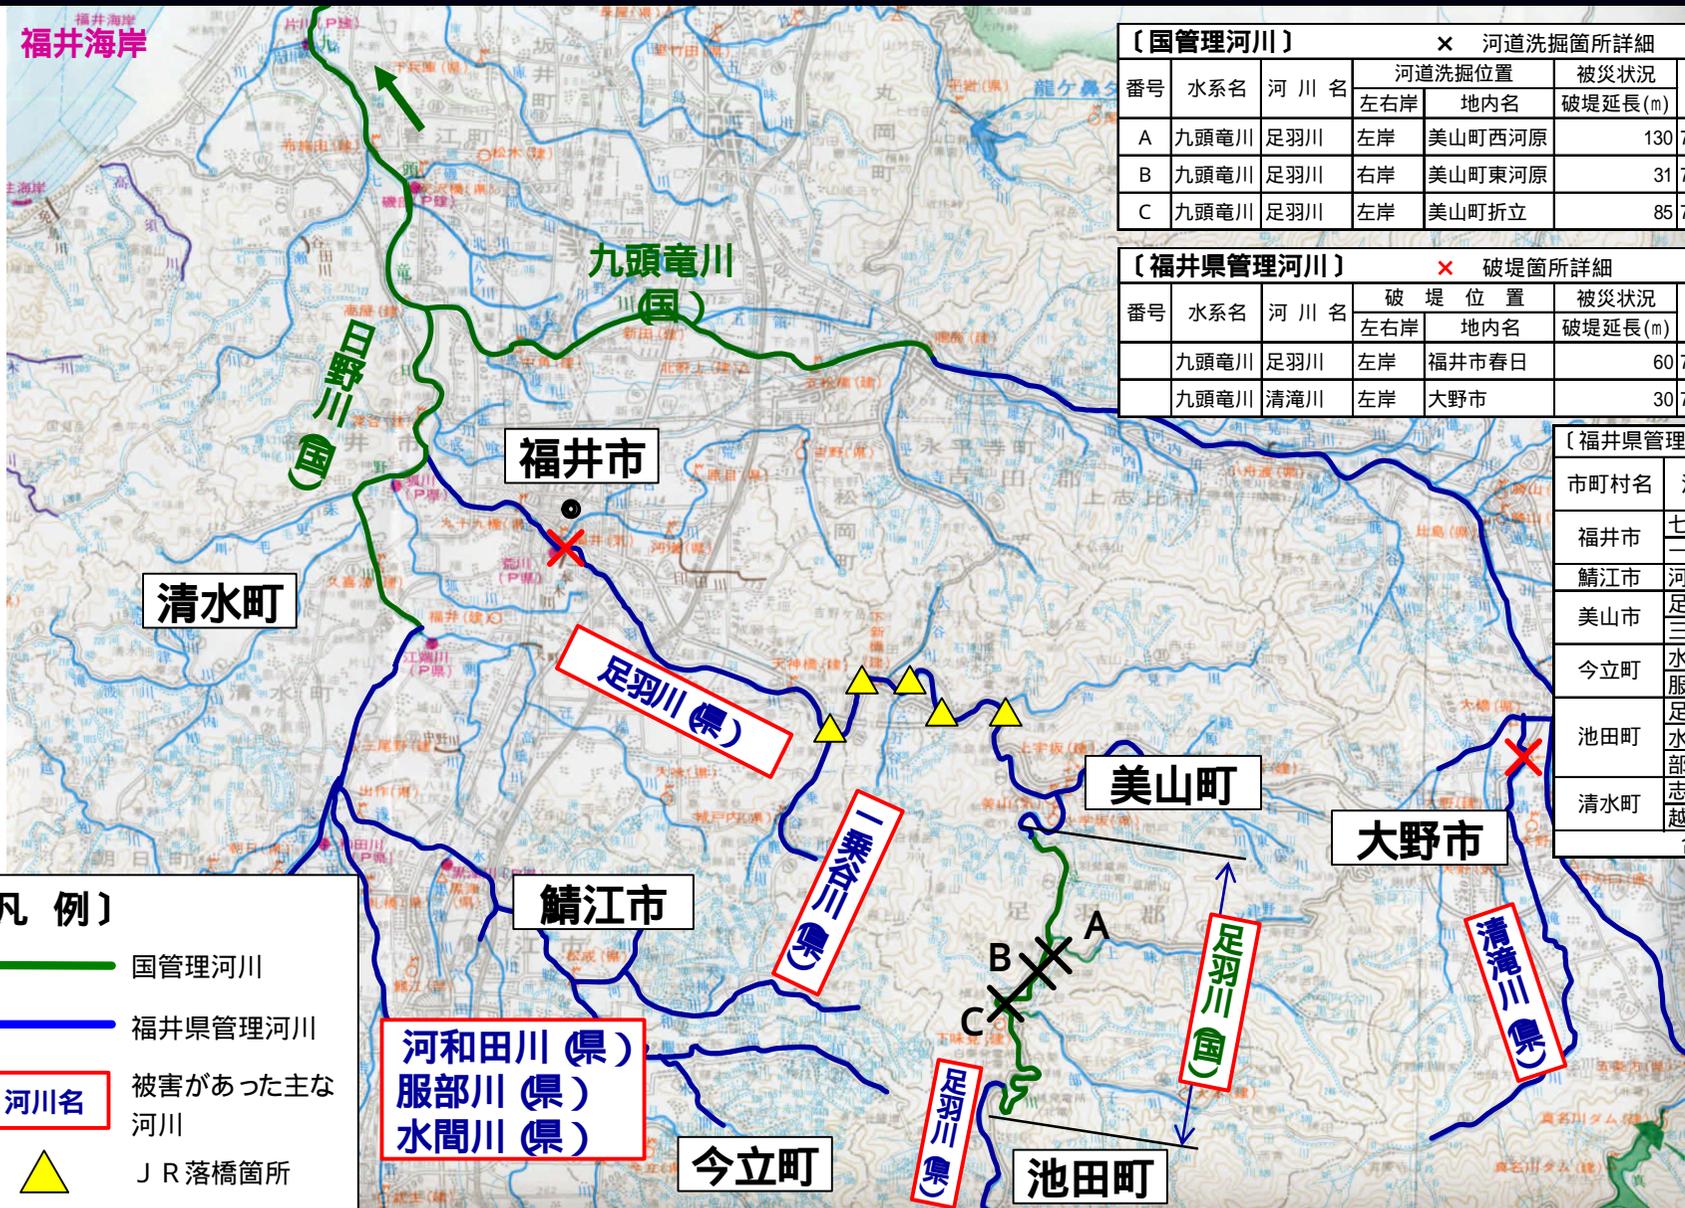

〔国管理河川〕 × 河道洗掘箇所詳細

| 番号 | 水系名  | 河川名 | 河道洗掘位置 |        | 被災状況<br>破堤延長(m) | 発生日時     |
|----|------|-----|--------|--------|-----------------|----------|
|    |      |     | 左右岸    | 地内名    |                 |          |
| A  | 九頭竜川 | 足羽川 | 左岸     | 美山町西河原 | 130             | 7月18日 不明 |
| B  | 九頭竜川 | 足羽川 | 右岸     | 美山町東河原 | 31              | 7月18日 不明 |
| C  | 九頭竜川 | 足羽川 | 左岸     | 美山町折立  | 85              | 7月18日 不明 |

〔福井県管理河川〕 × 破堤箇所詳細

| 番号 | 水系名  | 河川名 | 破堤位置 |       | 被災状況<br>破堤延長(m) | 発生日時         |
|----|------|-----|------|-------|-----------------|--------------|
|    |      |     | 左右岸  | 地内名   |                 |              |
|    | 九頭竜川 | 足羽川 | 左岸   | 福井市春日 | 60              | 7月18日 13:35頃 |
|    | 九頭竜川 | 清滝川 | 左岸   | 大野市   | 30              | 7月18日 不明     |

〔福井県管理河川〕 護岸破損


| 市町村名 | 河川名  | 箇所数 |
|------|------|-----|
| 福井市  | 七瀬川  | 1   |
| 福井市  | 一乗谷川 | 7   |
| 鯖江市  | 河和田川 | 10  |
| 美山市  | 足羽川  | 5   |
| 美山市  | 三万谷川 | 1   |
| 今立町  | 水間川  | 2   |
| 今立町  | 服部川  | 4   |
| 池田町  | 足羽川  | 1   |
| 池田町  | 水海川  | 1   |
| 池田町  | 部子川  | 2   |
| 清水町  | 志津川  | 1   |
| 清水町  | 越知川  | 1   |
| 合計   |      | 36  |

- 凡例)
- 国管理河川
  - 福井県管理河川
  - 河川名 被害があった主な河川
  - ▲ J R 落橋箇所

- 河和田川 (県)
- 服部川 (県)
- 水間川 (県)

# 死者3人、行方不明者2人、被害1万4000世帯以上の大被害

## 福井市内の被害状況

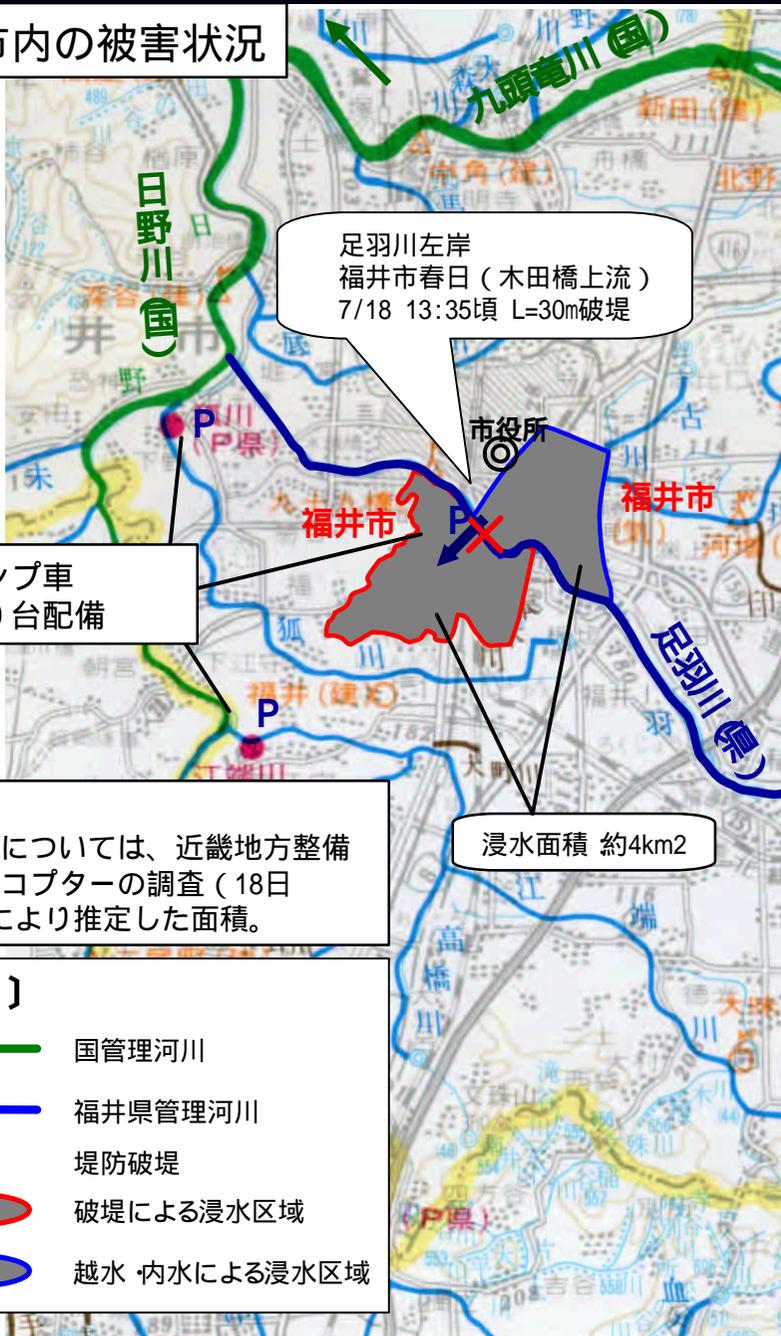

## 福井県 被害状況

| 市町村  | 人的被害 (人) |      | 住家被害 (棟) |     |      |       |       |
|------|----------|------|----------|-----|------|-------|-------|
|      | 死者       | 行方不明 | 全壊       | 半壊  | 一部破損 | 床上浸水  | 床下浸水  |
| 福井市  |          |      | 22       | 40  | 97   | 3,254 | 8,059 |
| 武生市  |          |      |          |     |      | 4     | 46    |
| 大野市  |          |      |          |     |      | 10    | 48    |
| 鯖江市  |          | 1    | 4        | 20  | 19   | 445   | 818   |
| 美山町  | 1        | 1    | 33       | 65  |      | 233   | 156   |
| 松岡町  |          |      |          |     |      | 2     | 5     |
| 永平寺町 |          |      |          |     |      |       | 10    |
| 今立町  | 1        |      | 2        | 6   | 1    | 353   | 584   |
| 池田町  |          |      | 4        | 10  | 1    | 20    | 91    |
| 朝日町  |          |      |          |     |      |       | 6     |
| 宮崎村  |          |      |          |     |      |       | 3     |
| 清水町  | 1        |      |          |     |      | 4     | 52    |
| 計    | 3        | 2    | 65       | 141 | 118  | 4,325 | 9,878 |

福井県調べ 8月2日9:00現在

破堤箇所付近



浸水状況



破堤箇所付近



破堤箇所付近



# 河川管理施設等の被災状況 (清滝川・足羽川・一乗谷川・河和田川)

## 他の地域の被害状況



清滝川左岸が破堤 大野市友江 (18日撮影)



足羽川右岸堤防が護岸破損 (19日撮影)



足羽川が越水し、堤内地を流下 美山町高田上空 (18日撮影)



一乗谷川を閉塞した土砂の撤去状況 (22日撮影)




一乗谷川が土石により閉塞したため、家屋を流下 福井市浄教寺町上空 (20日撮影)




河和田川が越水し、堤内地を流下 鯖江市河和田町上空 (19日撮影)

# 前線の停滞により狭い範囲に集中豪雨をもたらし、 福井県美山町を中心に豪雨を観測


累加レーダ雨量 (18日 0~ 24時)

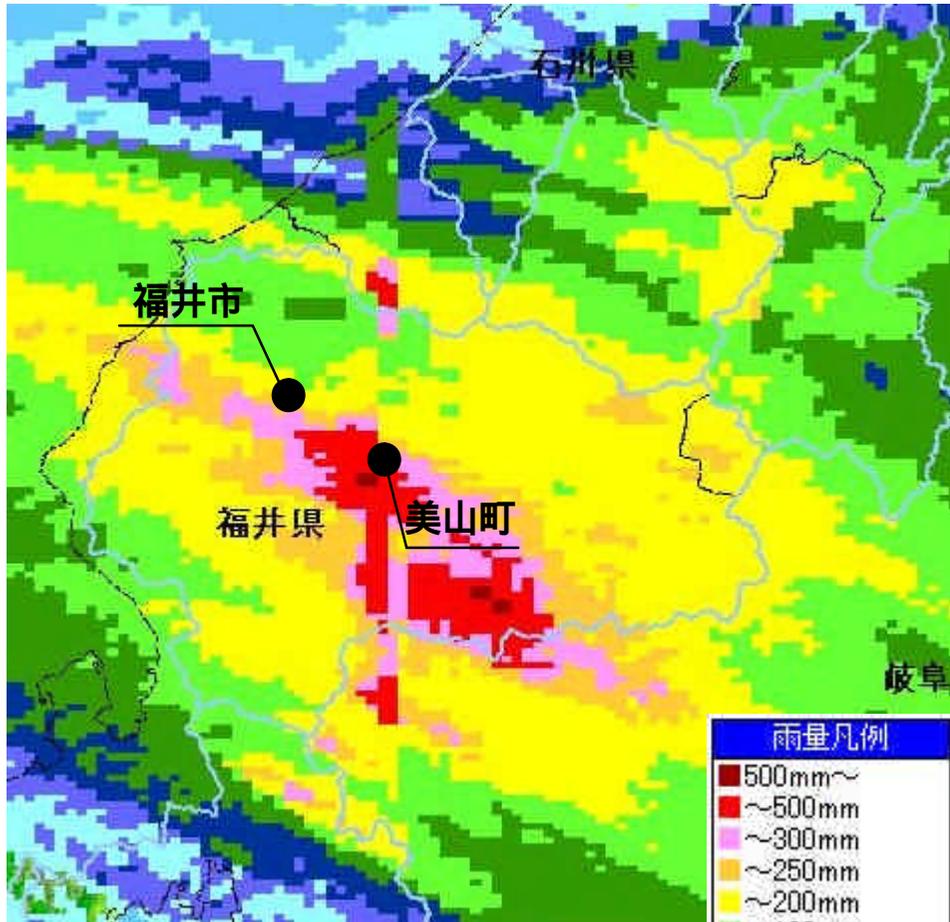


美山観測所 (気象庁)

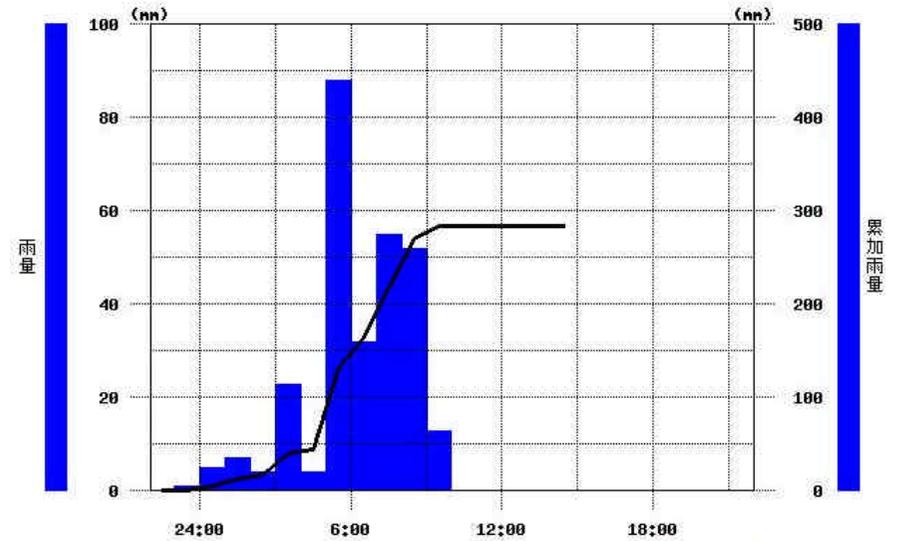

福井観測所 (気象庁)

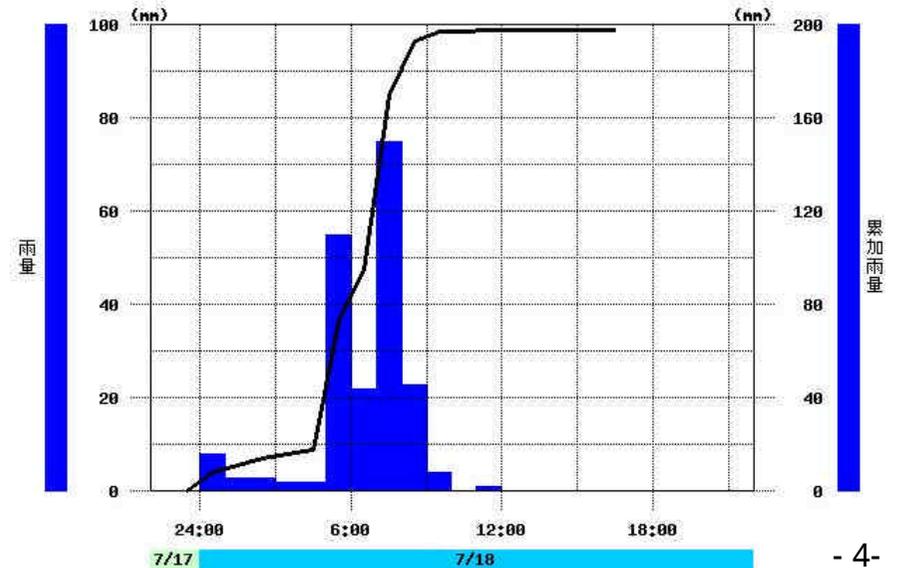

美山雨量観測所 (気象庁)における雨量データでは、1979年以降、最も多かった1986年の年最大時間雨量の約1.5倍を記録

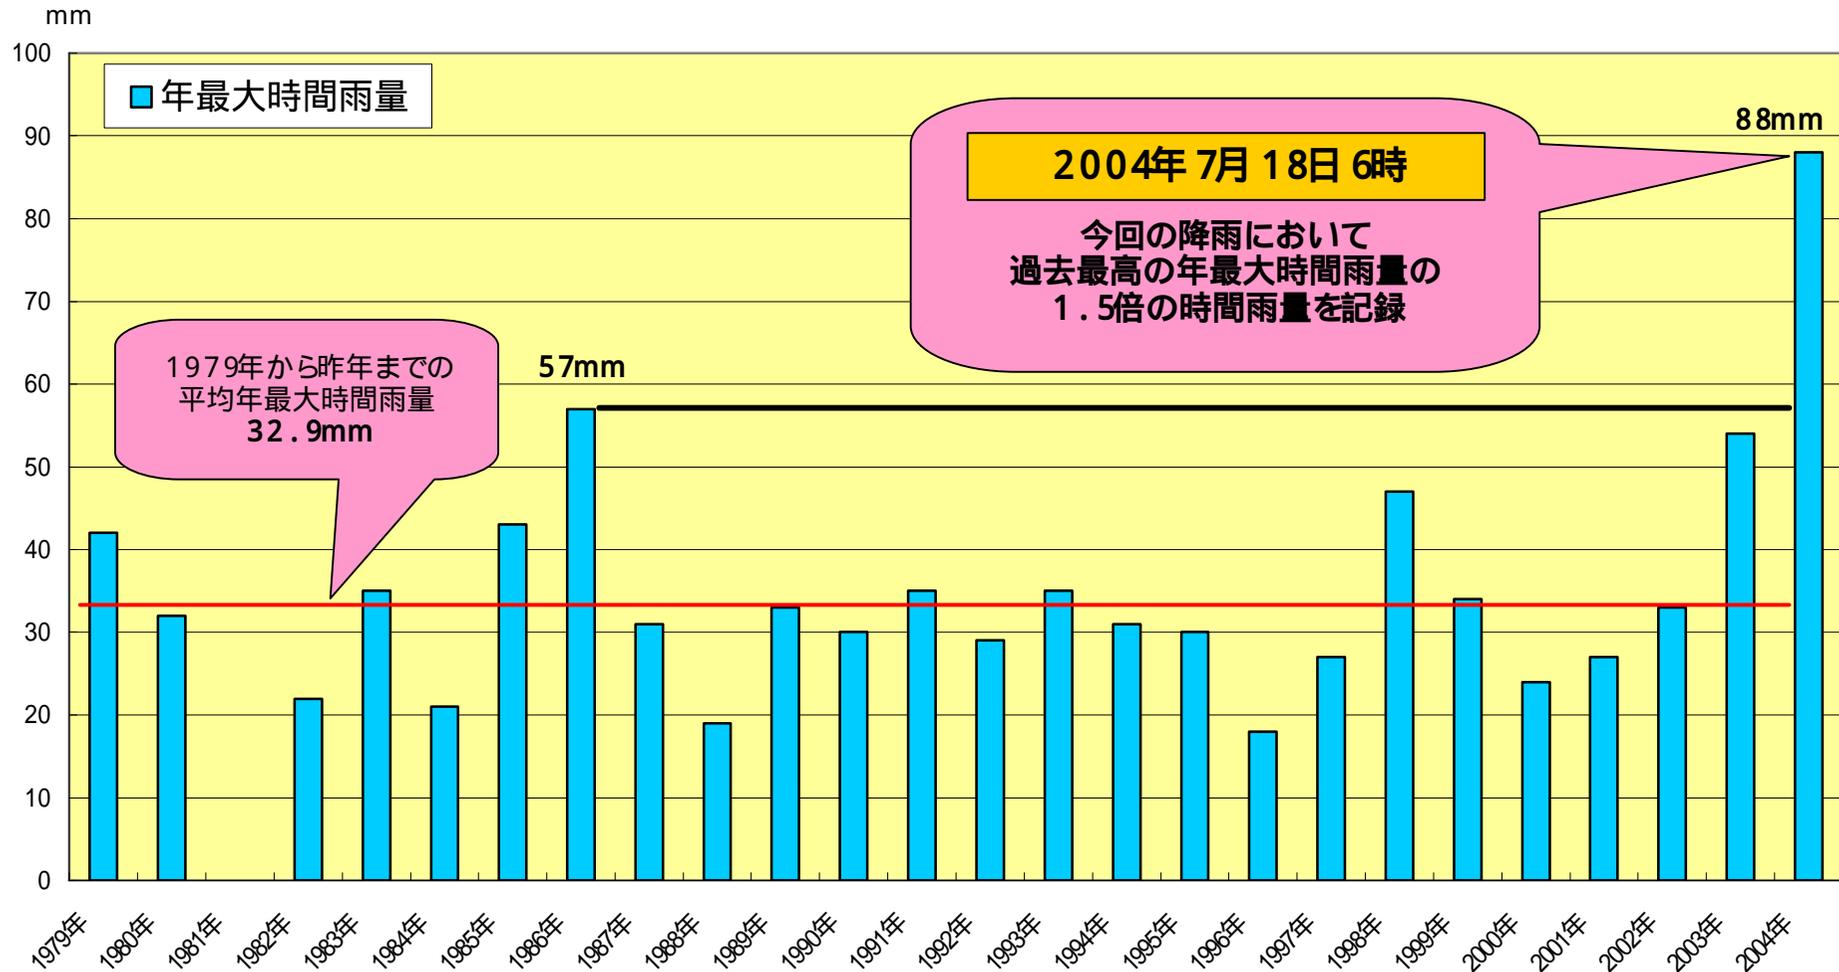


# 破堤箇所の災害復旧状況 (足羽川 福井市内) 20日 3時30分仮復旧完了

## 被災状況



## 復旧状況 (20日 3時30分仮復旧完了)

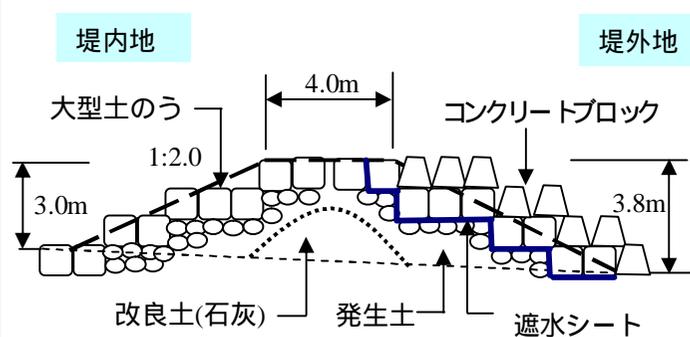

復旧工法



# 直轄管理区間の緊急復旧状況 (足羽川美山町西河原地先)

## 被災状況



21日撮影



22日撮影




21日撮影

## 復旧状況 (7月31日復旧完了)

堤内地

堤外地

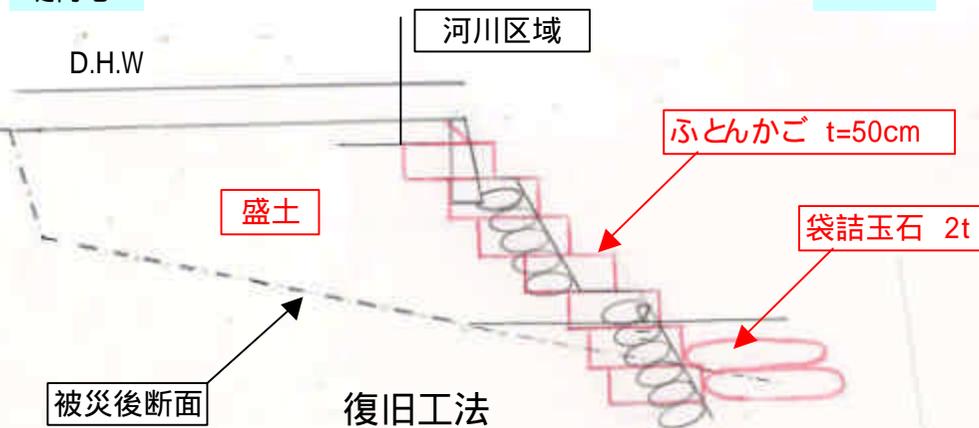

29日19時撮影
