

(再評価)

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道13号 福島西道路 (一般国道13号 福島西道路(Ⅱ期))
事業主体	東北地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	(一休評価 福島西道路) 全体:費用便益比(B/C)=1.7(経済的純現在価値(B-C)=1,698億円、経済的內部収益率(EIRR)=6.1%) 残事業:費用便益比(B/C)=2.8(経済的純現在価値(B-C)=451億円、経済的內部収益率(EIRR)=14.4%) (福島西道路Ⅱ期) 全体:費用便益比(B/C)=1.5(経済的純現在価値(B-C)=217億円、経済的內部収益率(EIRR)=6.3%) 残事業:費用便益比(B/C)=2.8(経済的純現在価値(B-C)=451億円、経済的內部収益率(EIRR)=14.4%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間b(当該区間/並行区間)について:一般国道13号 福島西道路(Ⅱ期) 並行区間等(当該区間)の渋滞損失時間:54.8万人・時間/年(一般国道13号 福島西道路(Ⅱ期)) 並行区間等(当該区間)の渋滞損失削減率:4割削減(一般国道13号 福島西道路(Ⅱ期))
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	福島市南部の交通容量を確保し、国道4号の交通混雑を解消(国道4号並行区間の混雑度 未整備時:1.13→整備時:0.92)
		<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	現道(国道4号・旧国道4号)を走行する路線バス(医大・蓬萊団地～福島駅東口:249便/日)の定時性が向上
		<input checked="" type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	現道(国道4号)の混雑緩和により、福島市南部・二本松方面から福島駅へのアクセスが向上
	<input type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる		
	物流効率化の支援	<input type="checkbox"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる <input type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる <input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	

政策目標	指 標 （対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠	
	災害への備え		
	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する		
	<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	第一次緊急輸送道路に指定（福島県地域防災計画）	
	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	東北縦貫自動車道（二本松IC～福島西IC）が通行止めとなった場合の代替路としての機能を強化	
	<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）		
	<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される <input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する		
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：2.257(t-CO2/年)
	生活環境の改善・保全	<input type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	
	<input type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率		
	<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある		
	<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される		
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道13号	福島西道路	L=14.0km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
28,900	4	東北地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和5年度			
単純合計	1,051億円	333億円	125億円	1,509億円
うち残事業分	221億円	101億円	—	322億円
基準年における 現在価値 (C)	2,096億円	179億円	28億円	2,303億円
うち残事業分	206億円	39億円	—	244億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和5年度			
供用年	平成22年度、令和9年度			
単年便益 (初年便益)	75億円	5.1億円	1.6億円	82億円
基準年における 現在価値 (B)	3,722億円	198億円	81億円	4,001億円
うち残事業分	690億円	-12億円	17億円	695億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	1.7
経済的純現在価値（事業全体）	1,698億円
経済的内部収益率（事業全体）	6.1%
費用便益比（残事業）	2.8
経済的純現在価値（残事業）	451億円
経済的内部収益率（残事業）	14.4%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析（全事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	28,900台/日	±10%	1.6~1.9
事業費	1,051億円	±10%	1.7~1.8
事業期間	45年	±20%	1.7~1.7

④ 感度分析（残事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	28,900台/日	±10%	2.6~3.0
事業費	221億円	±10%	2.6~3.1
事業期間	3年	±20%	2.7~2.9

交通状況の変化

様式-3①

事業名：一般国道13号福島西道路（全体）


（推計時点 R22年）

			整備なし(A)	整備あり(B)				
①新設・改築道路 福島西道路 延長：14.0km	交通量 ^{※1}	[台/日]	0	28,900				
	走行時間 ^{※2}	[分]	0	18				
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	0.00	99.16				
②主な周辺道路 ^{※4}	現道 一般国道4号・ 一般国道13号 ：13.3km	交通量	[台/日]	40,900	31,600			
		走行時間	[分]	26	23			
		走行時間費用	[億円/年]	212.59	148.68			
	(主)福島飯坂線 ：3.1km	交通量	[台/日]	22,900	13,000			
		走行時間	[分]	9	8			
		走行時間費用	[億円/年]	41.02	21.10			
	一般国道115号 ：2.5km	交通量	[台/日]	23,800	19,400			
		走行時間	[分]	3	3			
		走行時間費用	[億円/年]	15.65	11.94			
	東北自動車道 ：20.2km	交通量	[台/日]	43,100	42,200			
		走行時間	[分]	13	13			
		走行時間費用	[億円/年]	130.08	126.75			
一般国道114号 ：8.0km	交通量	[台/日]	12,600	11,600				
	走行時間	[分]	15	14				
	走行時間費用	[億円/年]	34.67	29.79				
③その他道路合計 ：3638.17km	走行時間費用	[億円/年]	7,676.66	7,562.98				
合計：3699.27km			走行時間費用 整備なし(A)	8,110.67	走行時間費用 整備あり(B)	8,000.40	走行時間短縮便益 (A - B)	110.27

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

事業名：一般国道13号福島西道路（全体）

(2) 図面（①、②）に該当する道路を明示すること

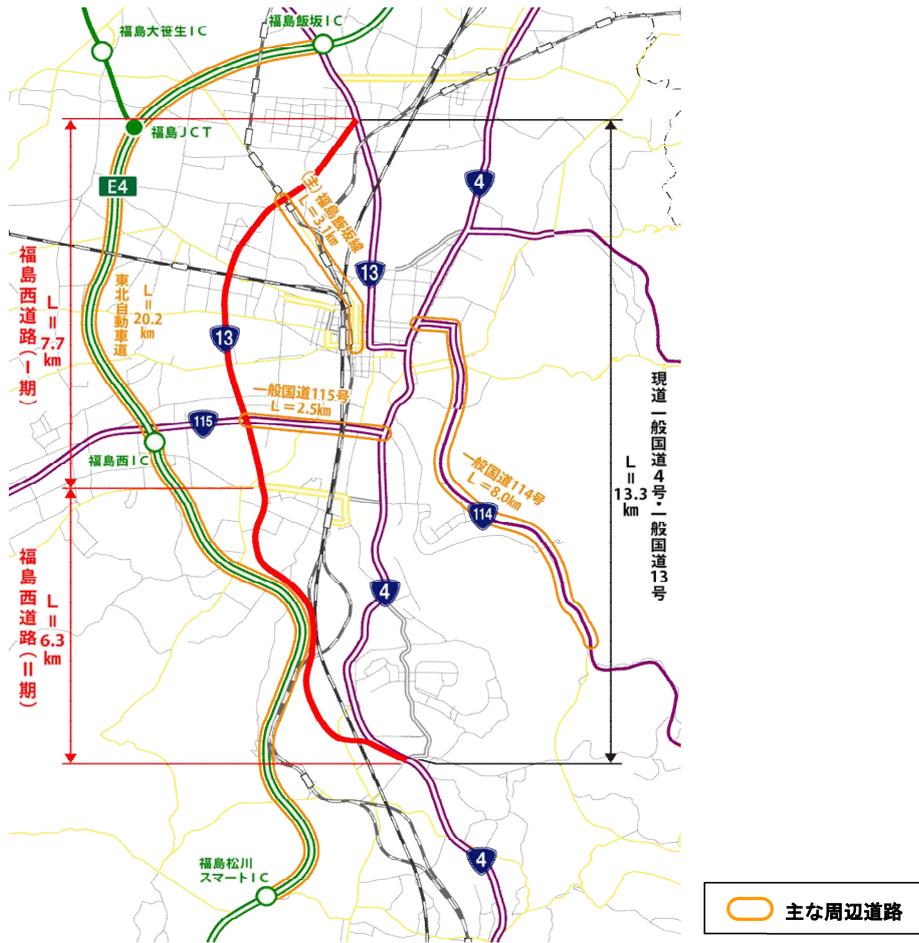

交通状況の変化

様式-3①

事業名：一般国道13号福島西道路（残事業）

（推計時点 R22年）


			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 福島西道路 延長：14.0km (うち開通済み7.7km)	交通量 ^{※1}	[台/日]	25,600	28,900	
	走行時間 ^{※2}	[分]	10	18	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	47.89	99.16	
②主な周辺道路 ^{※4}	現道 一般国道4号・ 一般国道13号 ：13.3km	交通量	[台/日]	37,900	31,600
		走行時間	[分]	25	23
		走行時間費用	[億円/年]	193.29	148.68
	(主)福島飯坂線 ：3.1km	交通量	[台/日]	17,000	13,000
		走行時間	[分]	9	8
		走行時間費用	[億円/年]	30.12	21.10
	一般国道115号 ：2.5km	交通量	[台/日]	20,400	19,400
		走行時間	[分]	3	3
		走行時間費用	[億円/年]	12.90	11.94
	東北自動車道 ：20.2km	交通量	[台/日]	42,700	42,200
		走行時間	[分]	13	13
		走行時間費用	[億円/年]	128.55	126.75
一般国道114号 ：8.0km	交通量	[台/日]	12,200	11,600	
	走行時間	[分]	14	14	
	走行時間費用	[億円/年]	32.92	29.79	
③その他道路合計 ：3638.17km	走行時間費用	[億円/年]	7,592.33	7,562.98	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：3699.27km	走行時間短縮便益	[億円/年]	8,038.00	8,000.40	37.60

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

事業名：一般国道13号福島西道路（残事業）

(2) 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

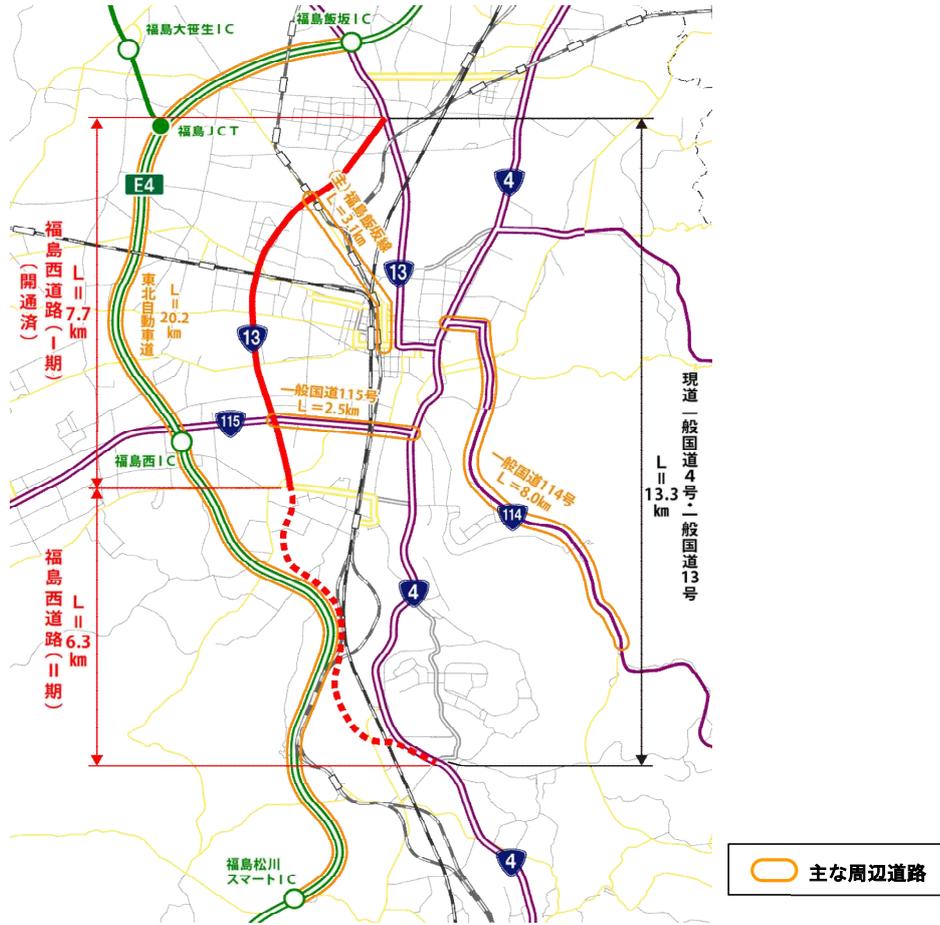

費用便益分析の条件

事業名：一般国道13号福島西道路(全体・残事業)

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和5年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (R22年)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
	その他()		
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量推計結果について、交通容量(Qmax)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線等が 混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速 度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
	その他()	<input type="checkbox"/>	

(3)

		項目	チェック欄	
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
	とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載		<input type="checkbox"/>	
	冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 福島国道維持出張所の除雪稼働日数により設定(R2~R4平均)	(41) 日
	冬期の走行速度と交通容量の関係 旅行速度調査より道路種別に応じて冬期旅行速度低下率を算出し、配分速度を補正			
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他 ()	<input type="checkbox"/>	
	車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>	
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道13号福島西道路(全体)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

		単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)			
		0.85		14.0		6.03			
年次	年度	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-45年目	S 57	4.9931	98.9	0.20	1.03				
-44年目	S 58	4.8010	99.8	0.50	2.45				
-43年目	S 59	4.6164	101.8	4.00	18.47				
-42年目	S 60	4.4388	102.6	3.00	13.21				
-41年目	S 61	4.2681	104.4	2.86	11.90				
-40年目	S 62	4.1039	104.1	13.20	52.97				
-39年目	S 63	3.9461	104.7	15.80	60.62				
-38年目	H 1	3.7943	107.5	21.25	76.35				
-37年目	H 2	3.6484	109.9	25.94	87.66				
-36年目	H 3	3.5081	112.5	30.46	96.69				
-35年目	H 4	3.3731	114.1	42.08	126.64				
-34年目	H 5	3.2434	114.4	53.07	153.17				
-33年目	H 6	3.1187	114.3	48.60	134.99				
-32年目	H 7	2.9987	113.7	55.14	148.04				
-31年目	H 8	2.8834	113.2	56.39	146.22				
-30年目	H 9	2.7725	114.2	52.82	130.54				
-29年目	H 10	2.6658	113.6	25.78	61.59				
-28年目	H 11	2.5633	112.0	25.33	59.02				
-27年目	H 12	2.4647	110.7	17.33	39.28				
-26年目	H 13	2.3699	109.4	11.54	25.45				
-25年目	H 14	2.2788	107.6	19.18	41.35				
-24年目	H 15	2.1911	106.1	14.30	30.06				
-23年目	H 16	2.1068	105.0	23.42	47.84				
-22年目	H 17	2.0258	103.7	11.52	22.91				
-21年目	H 18	1.9479	103.0	23.84	45.90				
-20年目	H 19	1.8730	102.1	5.87	10.96				
-19年目	H 20	1.8009	101.6	13.00	23.46				
-18年目	H 21	1.7317	100.3	2.17	3.81				
供用開始年次	H 22	1.6651	98.6	0.00	0.00	3.46	5.95		
-16年目	H 23	1.6010	97.2	0.00	0.00	3.46	5.81		
-15年目	H 24	1.5395	96.4	0.48	0.77	3.46	5.63		
-14年目	H 25	1.4802	96.4	2.38	3.72	3.46	5.41		
-13年目	H 26	1.4233	98.7	2.83	4.15	3.46	5.08		
-12年目	H 27	1.3686	100.2	2.98	4.14	3.46	4.82		
-11年目	H 28	1.3159	100.2	7.33	9.80	3.46	4.63		
-10年目	H 29	1.2653	100.5	9.45	12.11	3.46	4.44		
-9年目	H 30	1.2167	100.4	13.13	16.20	3.46	4.27		
-8年目	R 1	1.1699	101.2	24.14	28.41	3.46	4.08		
-7年目	R 2	1.1249	101.9	23.88	26.83	3.46	3.89		
-6年目	R 3	1.0816	101.8	37.00	40.02	3.46	3.75		
-5年目	R 4	1.0400	101.8	42.89	44.60	3.46	3.60		
-4年目	R 5	1.0000	101.8	45.25	45.25	3.46	3.46		
-3年目	R 6	0.9615	101.8	87.33	83.96	3.46	3.33		
-2年目	R 7	0.9246	101.8	81.18	75.06	3.46	3.20		
-1年目	R 8	0.8890	101.8	52.36	46.55	3.46	3.08		
供用開始年次	R 9	0.8548	101.8			5.48	4.69		
1年目	R 10	0.8219	101.8			5.48	4.51		
2年目	R 11	0.7903	101.8			5.48	4.33		
3年目	R 12	0.7599	101.8			5.48	4.17		
4年目	R 13	0.7307	101.8			5.48	4.01		
5年目	R 14	0.7026	101.8			5.48	3.85		
6年目	R 15	0.6756	101.8			5.48	3.70		
7年目	R 16	0.6496	101.8			5.48	3.56		
8年目	R 17	0.6246	101.8			5.48	3.42		
9年目	R 18	0.6006	101.8			5.48	3.29		
10年目	R 19	0.5775	101.8			5.48	3.17		
11年目	R 20	0.5553	101.8			5.48	3.04		
12年目	R 21	0.5339	101.8			5.48	2.93		
13年目	R 22	0.5134	101.8			5.48	2.81		
14年目	R 23	0.4936	101.8			5.48	2.71		
15年目	R 24	0.4746	101.8			5.48	2.60		
16年目	R 25	0.4564	101.8			5.48	2.50		
17年目	R 26	0.4388	101.8			5.48	2.41		
18年目	R 27	0.4220	101.8			5.48	2.31		
19年目	R 28	0.4057	101.8			5.48	2.22		
20年目	R 29	0.3901	101.8			5.48	2.14		
21年目	R 30	0.3751	101.8			5.48	2.06		
22年目	R 31	0.3607	101.8			5.48	1.98		
23年目	R 32	0.3468	101.8			5.48	1.90		
24年目	R 33	0.3335	101.8			5.48	1.83		
25年目	R 34	0.3207	101.8			5.48	1.76		
26年目	R 35	0.3083	101.8			5.48	1.69		
27年目	R 36	0.2965	101.8			5.48	1.63		
28年目	R 37	0.2851	101.8			5.48	1.56		
29年目	R 38	0.2741	101.8			5.48	1.50		
30年目	R 39	0.2636	101.8			5.48	1.45		
31年目	R 40	0.2534	101.8			5.48	1.39		
32年目	R 41	0.2437	101.8			5.48	1.34		
33年目	R 42	0.2343	101.8			5.48	1.28	20.75	4.86
34年目	R 43	0.2253	101.8			5.48	1.24	103.75	23.37
35年目	R 44	0.2166	101.8			5.48	1.19		
36年目	R 45	0.2083	101.8			5.48	1.14		
37年目	R 46	0.2003	101.8			5.48	1.10		
38年目	R 47	0.1926	101.8			5.48	1.06		
39年目	R 48	0.1852	101.8			5.48	1.02		
40年目	R 49	0.1780	101.8			5.48	0.98		
41年目	R 50	0.1712	101.8			5.48	0.94		
42年目	R 51	0.1646	101.8			5.48	0.90		
43年目	R 52	0.1583	101.8			5.48	0.87		
44年目	R 53	0.1522	101.8			5.48	0.83		
45年目	R 54	0.1463	101.8			5.48	0.80		
46年目	R 55	0.1407	101.8			5.48	0.77		
47年目	R 56	0.1353	101.8			5.48	0.74		
48年目	R 57	0.1301	101.8			5.48	0.71		
49年目	R 58	0.1251	101.8	-148.28	-18.55	5.48	0.69		
合計				902.91	2095.63	332.97	179.13	124.50	28.24
単純事業費計				1051.19		332.97		124.50	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道13号福島西道路(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
								0.35	2.22
								6.3	
-3年目	R 6	0.9615	101.8	87.33	83.96				
-2年目	R 7	0.9246	101.8	81.18	75.06				
-1年目	R 8	0.8890	101.8	52.36	46.55				
供用開始年次	R 9	0.8548	101.8			2.02	1.73		
1年目	R 10	0.8219	101.8			2.02	1.66		
2年目	R 11	0.7903	101.8			2.02	1.59		
3年目	R 12	0.7599	101.8			2.02	1.53		
4年目	R 13	0.7307	101.8			2.02	1.47		
5年目	R 14	0.7026	101.8			2.02	1.42		
6年目	R 15	0.6756	101.8			2.02	1.36		
7年目	R 16	0.6496	101.8			2.02	1.31		
8年目	R 17	0.6246	101.8			2.02	1.26		
9年目	R 18	0.6006	101.8			2.02	1.21		
10年目	R 19	0.5775	101.8			2.02	1.17		
11年目	R 20	0.5553	101.8			2.02	1.12		
12年目	R 21	0.5339	101.8			2.02	1.08		
13年目	R 22	0.5134	101.8			2.02	1.04		
14年目	R 23	0.4936	101.8			2.02	1.00		
15年目	R 24	0.4746	101.8			2.02	0.96		
16年目	R 25	0.4564	101.8			2.02	0.92		
17年目	R 26	0.4388	101.8			2.02	0.89		
18年目	R 27	0.4220	101.8			2.02	0.85		
19年目	R 28	0.4057	101.8			2.02	0.82		
20年目	R 29	0.3901	101.8			2.02	0.79		
21年目	R 30	0.3751	101.8			2.02	0.76		
22年目	R 31	0.3607	101.8			2.02	0.73		
23年目	R 32	0.3468	101.8			2.02	0.70		
24年目	R 33	0.3335	101.8			2.02	0.67		
25年目	R 34	0.3207	101.8			2.02	0.65		
26年目	R 35	0.3083	101.8			2.02	0.62		
27年目	R 36	0.2965	101.8			2.02	0.60		
28年目	R 37	0.2851	101.8			2.02	0.58		
29年目	R 38	0.2741	101.8			2.02	0.55		
30年目	R 39	0.2636	101.8			2.02	0.53		
31年目	R 40	0.2534	101.8			2.02	0.51		
32年目	R 41	0.2437	101.8			2.02	0.49		
33年目	R 42	0.2343	101.8			2.02	0.47		
34年目	R 43	0.2253	101.8			2.02	0.45		
35年目	R 44	0.2166	101.8			2.02	0.44		
36年目	R 45	0.2083	101.8			2.02	0.42		
37年目	R 46	0.2003	101.8			2.02	0.40		
38年目	R 47	0.1926	101.8			2.02	0.39		
39年目	R 48	0.1852	101.8			2.02	0.37		
40年目	R 49	0.1780	101.8			2.02	0.36		
41年目	R 50	0.1712	101.8			2.02	0.35		
42年目	R 51	0.1646	101.8			2.02	0.33		
43年目	R 52	0.1583	101.8			2.02	0.32		
44年目	R 53	0.1522	101.8			2.02	0.31		
45年目	R 54	0.1463	101.8			2.02	0.30		
46年目	R 55	0.1407	101.8			2.02	0.28		
47年目	R 56	0.1353	101.8			2.02	0.27		
48年目	R 57	0.1301	101.8			2.02	0.26		
49年目	R 58	0.1251	101.8			2.02	0.25		
合計									
単純事業費計				220.28	205.50	100.91	38.54	0.00	0.00

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道13号福島西道路(全体)

年次	年度 (基準年) R5	総走行台キロの年次別伸び率 (南東北ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計 (億円)			
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 22	0.98504	0.96232	1.00423	0.98372	1.6651	98.6	56.05	11.99	7.01	75.05	129.02	3.50	0.62	0.93	5.05	8.68	1.62	2.79	81.72	140.49
-16年目	H 23	1.01413	1.00851	0.99656	1.01096	1.6010	97.2	56.84	12.09	6.99	75.92	127.30	3.55	0.63	0.93	5.11	8.57	1.64	2.75	82.67	138.62
-15年目	H 24	1.03934	1.03377	1.02171	1.03621	1.5395	96.4	59.08	12.50	7.14	78.72	127.98	3.69	0.65	0.95	5.29	8.60	1.70	2.76	85.71	139.34
-14年目	H 25	1.01647	1.01120	0.99959	1.01351	1.4802	96.4	60.05	12.64	7.14	79.83	124.78	3.75	0.66	0.95	5.36	8.38	1.72	2.69	86.91	135.85
-13年目	H 26	1.00719	1.00214	0.99081	1.00436	1.4233	98.7	60.48	12.67	7.07	80.22	117.76	3.78	0.66	0.94	5.38	7.90	1.73	2.54	87.33	128.20
-12年目	H 27	1.01902	1.01407	1.00279	1.01626	1.3686	100.2	61.63	12.85	7.09	81.57	113.42	3.85	0.67	0.94	5.46	7.59	1.76	2.45	88.79	123.46
-11年目	H 28	0.99628	0.98501	1.01162	0.99632	1.3159	100.2	61.40	12.66	7.17	81.23	108.60	3.84	0.66	0.95	5.45	7.29	1.75	2.34	88.43	118.23
-10年目	H 29	0.99626	0.98479	1.01148	0.99631	1.2653	100.5	61.17	12.47	7.25	80.89	103.67	3.83	0.65	0.96	5.44	6.97	1.74	2.23	88.07	112.87
-9年目	H 30	0.99625	0.98455	1.01135	0.99630	1.2167	100.4	60.94	12.28	7.33	80.55	99.37	3.82	0.64	0.97	5.43	6.70	1.73	2.13	87.71	108.20
-8年目	R 1	0.99623	0.98431	1.01122	0.99628	1.1699	101.2	60.71	12.09	7.41	80.21	94.39	3.81	0.63	0.98	5.42	6.38	1.72	2.02	87.35	102.79
-7年目	R 2	0.99622	0.98406	1.01110	0.99627	1.1249	101.9	60.48	11.90	7.49	79.87	89.76	3.80	0.62	0.99	5.41	6.08	1.71	1.92	86.99	97.76
-6年目	R 3	0.99620	0.98380	1.01098	0.99625	1.0816	101.8	60.25	11.71	7.57	79.53	86.02	3.79	0.61	1.00	5.40	5.84	1.70	1.84	86.63	93.70
-5年目	R 4	0.99619	0.98353	1.01086	0.99624	1.0400	101.8	60.02	11.52	7.65	79.19	82.36	3.78	0.60	1.01	5.39	5.61	1.69	1.76	86.27	89.73
-4年目	R 5	0.99618	0.98326	1.01074	0.99623	1.0000	101.8	59.79	11.33	7.73	78.85	78.85	3.77	0.59	1.02	5.38	5.38	1.68	1.68	85.91	85.91
-3年目	R 6	0.99616	0.98297	1.01063	0.99621	0.9615	101.8	59.56	11.14	7.81	78.51	75.49	3.76	0.58	1.03	5.37	5.16	1.67	1.61	85.55	82.26
-2年目	R 7	0.99615	0.98268	1.01052	0.99620	0.9246	101.8	59.33	10.95	7.89	78.17	72.28	3.75	0.57	1.04	5.36	4.96	1.66	1.53	85.19	78.77
-1年目	R 8	0.99613	0.98237	1.01041	0.99618	0.8890	101.8	59.10	10.76	7.97	77.83	69.19	3.74	0.56	1.05	5.35	4.76	1.65	1.47	84.83	75.42
供用開始年次	R 9	0.99612	0.98206	1.01030	0.99617	0.8548	101.8	90.40	18.28	9.63	118.31	101.13	4.86	0.58	-0.46	4.98	4.26	2.59	2.21	125.88	107.60
1年目	R 10	0.99610	0.98173	1.01019	0.99615	0.8219	101.8	90.05	17.95	9.73	117.73	96.76	4.85	0.57	-0.47	4.95	4.07	2.58	2.12	125.26	102.95
2年目	R 11	0.99609	0.98139	1.01009	0.99614	0.7903	101.8	89.70	17.62	9.83	117.15	92.58	4.84	0.56	-0.48	4.92	3.89	2.57	2.03	124.64	98.50
3年目	R 12	0.99607	0.98104	1.00999	0.99612	0.7599	101.8	89.35	17.29	9.93	116.57	88.58	4.83	0.55	-0.49	4.89	3.72	2.56	1.95	124.02	94.25
4年目	R 13	0.99606	0.98074	1.00986	0.99611	0.7307	101.8	88.93	17.10	10.01	115.94	84.72	4.80	0.54	-0.49	4.85	3.54	2.55	1.86	123.34	90.12
5年目	R 14	0.99604	0.98042	1.00978	0.99609	0.7026	101.8	88.31	16.91	10.09	115.31	81.02	4.77	0.53	-0.49	4.81	3.38	2.54	1.78	122.66	86.18
6年目	R 15	0.99603	0.98010	1.00971	0.99608	0.6756	101.8	87.79	16.72	10.17	114.68	77.48	4.74	0.52	-0.49	4.77	3.22	2.53	1.71	121.98	82.41
7年目	R 16	0.99602	0.98000	1.00963	0.99607	0.6496	101.8	87.27	16.53	10.25	114.05	74.09	4.71	0.51	-0.49	4.73	3.07	2.52	1.64	121.30	78.80
8年目	R 17	0.99601	0.98000	1.00956	0.99606	0.6246	101.8	86.75	16.34	10.33	113.42	70.84	4.68	0.50	-0.49	4.69	2.93	2.51	1.57	120.62	75.34
9年目	R 18	0.99600	0.98000	1.00950	0.99605	0.6006	101.8	86.23	16.15	10.41	112.79	67.74	4.65	0.49	-0.49	4.65	2.79	2.50	1.50	119.94	72.03
10年目	R 19	0.99599	0.98000	1.00944	0.99604	0.5775	101.8	85.71	15.96	10.49	112.16	64.77	4.62	0.48	-0.49	4.61	2.66	2.49	1.44	119.26	68.87
11年目	R 20	0.99598	0.98000	1.00938	0.99603	0.5553	101.8	85.19	15.77	10.57	111.53	61.93	4.59	0.47	-0.49	4.57	2.54	2.48	1.38	118.58	65.85
12年目	R 21	0.99597	0.98000	1.00932	0.99602	0.5339	101.8	84.67	15.58	10.65	110.90	59.21	4.56	0.46	-0.49	4.53	2.42	2.47	1.32	117.90	62.95
13年目	R 22	0.99596	0.98000	1.00926	0.99601	0.5134	101.8	84.15	15.39	10.73	110.27	56.61	4.53	0.45	-0.49	4.49	2.31	2.46	1.26	117.22	60.18
14年目	R 23	0.99595	0.98000	1.00920	0.99600	0.4936	101.8	83.37	15.27	10.73	109.37	53.99	4.49	0.45	-0.49	4.45	2.20	2.44	1.20	116.26	57.39
15年目	R 24	0.99594	0.98000	1.00914	0.99599	0.4746	101.8	82.59	15.15	10.73	108.47	51.48	4.45	0.45	-0.49	4.41	2.09	2.42	1.15	115.30	54.72
16年目	R 25	0.99593	0.98000	1.00908	0.99598	0.4564	101.8	81.81	15.03	10.73	107.57	49.09	4.41	0.45	-0.49	4.37	1.99	2.40	1.10	114.34	52.18
17年目	R 26	0.99592	0.98000	1.00902	0.99597	0.4388	101.8	81.03	14.91	10.73	106.67	46.81	4.37	0.45	-0.49	4.33	1.90	2.38	1.04	113.38	49.75
18年目	R 27	0.99591	0.98000	1.00896	0.99596	0.4220	101.8	80.25	14.79	10.73	105.77	44.63	4.33	0.45	-0.49	4.29	1.81	2.36	1.00	112.42	47.44
19年目	R 28	0.99590	0.98000	1.00890	0.99595	0.4057	101.8	79.47	14.67	10.73	104.87	42.55	4.29	0.45	-0.49	4.25	1.72	2.34	0.95	111.46	45.22
20年目	R 29	0.99589	0.98000	1.00884	0.99594	0.3901	101.8	78.69	14.55	10.73	103.97	40.56	4.25	0.45	-0.49	4.21	1.64	2.32	0.91	110.50	43.11
21年目	R 30	0.99588	0.98000	1.00878	0.99593	0.3751	101.8	77.91	14.43	10.73	103.07	38.66	4.21	0.45	-0.49	4.17	1.56	2.30	0.86	109.54	41.08
22年目	R 31	0.99587	0.98000	1.00872	0.99592	0.3607	101.8	77.13	14.31	10.73	102.17	36.85	4.17	0.45	-0.49	4.13	1.49	2.28	0.82	108.58	39.16
23年目	R 32	0.99586	0.98000	1.00866	0.99591	0.3468	101.8	76.35	14.19	10.73	101.27	35.12	4.13	0.45	-0.49	4.09	1.42	2.26	0.78	107.62	37.32
24年目	R 33	0.99585	0.98000	1.00860	0.99590	0.3335	101.8	75.57	14.07	10.73	100.37	33.47	4.09	0.45	-0.49	4.05	1.35	2.24	0.75	106.66	35.57
25年目	R 34	0.99584	0.98000	1.00854	0.99589	0.3207	101.8	74.79	13.95	10.73	99.47	31.90	4.05	0.45	-0.49	4.01	1.29	2.22	0.71	105.70	33.90
26年目	R 35	0.99583	0.98000	1.00848	0.99588	0.3083	101.8	74.01	13.83	10.73	98.57	30.39	4.01	0.45	-0.49	3.97	1.22	2.20	0.68	104.74	32.29
27年目	R 36	0.99582	0.98000	1.00842	0.99587	0.2965	101.8	73.23	13.71	10.73	97.67	28.96	3.97	0.45	-0.49	3.93	1.17	2.18	0.65	103.78	30.78
28年目	R 37	0.99581	0.98000	1.00836	0.99586	0.2851	101.8	72.45	13.59	10.73	96.77	27.59	3.93	0.45	-0.49	3.89	1.11	2.16	0.62	102.82	29.32
29年目	R 38	0.99580	0.98000	1.00830	0.99585	0.2741	101.8	71.67	13.47	10.73	95.87	26.28	3.89	0.45	-0.49	3.85	1.06	2.14	0.59	101.86	27.93

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道13号福島西道路(残事業)

年度 (基準年) R5	R	総走行台キロの年次別伸び率 (南東北ブロック)				GDP デフレ率	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)		
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車		(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計																
供用開始年次	R 9	0.99612	0.98206	1.01030	0.99617	0.8548	101.8	31.53	7.71	1.58	40.82	34.89	1.13	0.03	-1.52	-0.36	-0.31	0.95	0.81	41.41	35.39
1年目	R 10	0.99610	0.98173	1.01019	0.99615	0.8219	101.8	31.41	7.57	1.60	40.58	33.35	1.13	0.03	-1.54	-0.38	-0.31	0.95	0.78	41.15	33.82
2年目	R 11	0.99609	0.98139	1.01009	0.99614	0.7903	101.8	31.29	7.43	1.62	40.34	31.88	1.13	0.03	-1.56	-0.40	-0.32	0.95	0.75	40.89	32.31
3年目	R 12	0.99607	0.98104	1.00999	0.99612	0.7599	101.8	31.17	7.29	1.64	40.10	30.47	1.13	0.03	-1.58	-0.42	-0.32	0.95	0.72	40.63	30.87
4年目	R 13	0.99408	0.98904	1.00886	0.99562	0.7307	101.8	30.99	7.21	1.65	39.85	29.12	1.12	0.03	-1.59	-0.44	-0.32	0.95	0.69	40.36	29.49
5年目	R 14	0.99404	0.98892	1.00878	0.99560	0.7026	101.8	30.81	7.13	1.66	39.60	27.82	1.11	0.03	-1.60	-0.46	-0.32	0.95	0.67	40.09	28.17
6年目	R 15	0.99400	0.98880	1.00871	0.99558	0.6756	101.8	30.63	7.05	1.67	39.35	26.58	1.10	0.03	-1.61	-0.48	-0.32	0.95	0.64	39.82	26.90
7年目	R 16	0.99397	0.98867	1.00863	0.99557	0.6496	101.8	30.45	6.97	1.68	39.10	25.40	1.09	0.03	-1.62	-0.50	-0.32	0.95	0.62	39.55	25.70
8年目	R 17	0.99393	0.98854	1.00856	0.99555	0.6246	101.8	30.27	6.89	1.69	38.85	24.27	1.08	0.03	-1.63	-0.52	-0.32	0.95	0.59	39.28	24.54
9年目	R 18	0.99389	0.98841	1.00848	0.99553	0.6006	101.8	30.09	6.81	1.70	38.60	23.18	1.07	0.03	-1.64	-0.54	-0.32	0.95	0.57	39.01	23.43
10年目	R 19	0.99386	0.98827	1.00841	0.99551	0.5775	101.8	29.91	6.73	1.71	38.35	22.15	1.06	0.03	-1.65	-0.56	-0.32	0.95	0.55	38.74	22.38
11年目	R 20	0.99382	0.98813	1.00834	0.99549	0.5553	101.8	29.73	6.65	1.72	38.10	21.16	1.05	0.03	-1.66	-0.58	-0.32	0.95	0.53	38.47	21.37
12年目	R 21	0.99378	0.98799	1.00827	0.99546	0.5339	101.8	29.55	6.57	1.73	37.85	20.21	1.04	0.03	-1.67	-0.60	-0.32	0.95	0.51	38.20	20.40
13年目	R 22	0.99374	0.98784	1.00821	0.99544	0.5134	101.8	29.37	6.49	1.74	37.60	19.30	1.03	0.03	-1.68	-0.62	-0.32	0.95	0.49	37.93	19.47
14年目	R 23	0.99370	0.98769	1.00814	0.99542	0.4936	101.8	29.19	6.41	1.74	37.35	18.40	1.02	0.03	-1.68	-0.63	-0.32	0.94	0.46	37.59	18.55
15年目	R 24	0.99366	0.98754	1.00807	0.99540	0.4746	101.8	29.01	6.33	1.74	37.10	17.54	1.01	0.03	-1.68	-0.64	-0.30	0.93	0.44	37.25	17.68
16年目	R 25	0.99362	0.98739	1.00800	0.99538	0.4564	101.8	28.83	6.25	1.74	36.85	16.72	1.00	0.03	-1.68	-0.65	-0.30	0.92	0.42	36.91	16.84
17年目	R 26	0.99358	0.98724	1.00793	0.99536	0.4388	101.8	28.65	6.17	1.74	36.60	15.94	0.99	0.03	-1.68	-0.66	-0.29	0.91	0.40	36.57	16.05
18年目	R 27	0.99354	0.98709	1.00786	0.99534	0.4220	101.8	28.47	6.09	1.74	36.35	15.19	0.98	0.03	-1.68	-0.67	-0.28	0.90	0.38	36.23	15.29
19年目	R 28	0.99350	0.98694	1.00779	0.99532	0.4057	101.8	28.29	6.01	1.74	36.10	14.48	0.97	0.03	-1.68	-0.68	-0.28	0.89	0.36	35.89	14.56
20年目	R 29	0.99346	0.98679	1.00772	0.99530	0.3901	101.8	28.11	5.93	1.74	35.85	13.79	0.96	0.03	-1.68	-0.69	-0.27	0.88	0.34	35.55	13.86
21年目	R 30	0.99342	0.98664	1.00765	0.99528	0.3751	101.8	27.93	5.85	1.74	35.60	13.14	0.95	0.03	-1.68	-0.70	-0.26	0.87	0.33	35.21	13.21
22年目	R 31	0.99338	0.98649	1.00758	0.99526	0.3607	101.8	27.75	5.77	1.74	35.35	12.52	0.94	0.03	-1.68	-0.71	-0.26	0.86	0.31	34.87	12.57
23年目	R 32	0.99334	0.98634	1.00751	0.99524	0.3468	101.8	27.57	5.69	1.74	35.10	11.93	0.93	0.03	-1.68	-0.72	-0.25	0.85	0.29	34.53	11.97
24年目	R 33	0.99330	0.98619	1.00744	0.99522	0.3335	101.8	27.39	5.61	1.74	34.85	11.37	0.92	0.03	-1.68	-0.73	-0.24	0.84	0.28	34.19	11.41
25年目	R 34	0.99326	0.98604	1.00737	0.99520	0.3207	101.8	27.21	5.53	1.74	34.60	10.83	0.91	0.03	-1.68	-0.74	-0.24	0.83	0.27	33.85	10.86
26年目	R 35	0.99322	0.98589	1.00730	0.99518	0.3083	101.8	27.03	5.45	1.74	34.35	10.31	0.90	0.03	-1.68	-0.75	-0.23	0.82	0.25	33.51	10.33
27年目	R 36	0.99318	0.98574	1.00723	0.99516	0.2965	101.8	26.85	5.37	1.74	34.10	9.82	0.89	0.03	-1.68	-0.76	-0.23	0.81	0.24	33.17	9.83
28年目	R 37	0.99314	0.98559	1.00716	0.99514	0.2851	101.8	26.67	5.29	1.74	33.85	9.35	0.88	0.03	-1.68	-0.77	-0.22	0.80	0.23	32.83	9.36
29年目	R 38	0.99310	0.98544	1.00709	0.99512	0.2741	101.8	26.49	5.21	1.74	33.60	8.90	0.87	0.03	-1.68	-0.78	-0.21	0.79	0.22	32.49	8.91
30年目	R 39	0.99306	0.98529	1.00702	0.99510	0.2636	101.8	26.31	5.13	1.74	33.35	8.48	0.86	0.03	-1.68	-0.79	-0.21	0.78	0.21	32.15	8.48
31年目	R 40	0.99302	0.98514	1.00695	0.99508	0.2534	101.8	26.13	5.05	1.74	33.10	8.07	0.85	0.03	-1.68	-0.80	-0.20	0.77	0.20	31.81	8.07
32年目	R 41	0.99298	0.98499	1.00688	0.99506	0.2437	101.8	25.95	4.97	1.74	32.85	7.68	0.84	0.03	-1.68	-0.81	-0.20	0.76	0.19	31.47	7.67
33年目	R 42	0.99294	0.98484	1.00681	0.99504	0.2343	101.8	25.77	4.89	1.74	32.60	7.31	0.83	0.03	-1.68	-0.82	-0.19	0.75	0.18	31.13	7.30
34年目	R 43	0.99290	0.98469	1.00674	0.99502	0.2253	101.8	25.59	4.81	1.74	32.35	6.96	0.82	0.03	-1.68	-0.83	-0.19	0.74	0.17	30.79	6.94
35年目	R 44	0.99286	0.98454	1.00667	0.99500	0.2166	101.8	25.41	4.73	1.74	32.10	6.62	0.81	0.03	-1.68	-0.84	-0.18	0.73	0.16	30.45	6.60
36年目	R 45	0.99282	0.98439	1.00660	0.99498	0.2083	101.8	25.23	4.65	1.74	31.85	6.30	0.80	0.03	-1.68	-0.85	-0.18	0.72	0.15	30.11	6.27
37年目	R 46	0.99278	0.98424	1.00653	0.99496	0.2003	101.8	25.05	4.57	1.74	31.60	5.99	0.79	0.03	-1.68	-0.86	-0.17	0.71	0.14	29.77	5.96
38年目	R 47	0.99274	0.98409	1.00646	0.99494	0.1926	101.8	24.87	4.49	1.74	31.35	5.70	0.78	0.03	-1.68	-0.87	-0.17	0.70	0.13	29.43	5.66
39年目	R 48	0.99270	0.98394	1.00639	0.99492	0.1852	101.8	24.69	4.41	1.74	31.10	5.42	0.77	0.03	-1.68	-0.88	-0.16	0.69	0.13	29.08	5.39
40年目	R 49	0.99266	0.98379	1.00632	0.99490	0.1780	101.8	24.51	4.33	1.74	30.85	5.15	0.76	0.03	-1.68	-0.89	-0.16	0.68	0.12	28.74	5.11
41年目	R 50	0.99262	0.98364	1.00625	0.99488	0.1712	101.8	24.33	4.25	1.74	30.60	4.90	0.75	0.03	-1.68	-0.90	-0.15	0.67	0.11	28.39	4.86
42年目	R 51	0.99258	0.98349	1.00618	0.99486	0.1646	101.8	24.15	4.17	1.74	30.35	4.66	0.74	0.03	-1.68	-0.91	-0.15	0.66	0.11	28.05	4.62
43年目	R 52	0.99254	0.98334	1.00611	0.99484	0.1583	101.8	23.97	4.09	1.74	30.10	4.43	0.73	0.03	-1.68	-0.92	-0.15	0.65	0.10	27.70	4.38
44年目	R 53	0.99250	0.98319	1.00604	0.99482	0.1522	101.8	23.79	4.01	1.74	29.85	4.21	0.72	0.03	-1.68	-0.93	-0.14	0.64	0.10	27.36	4.17
45年目	R 54	0.99246	0.98304	1.00597	0.99480	0.1463	101.8	23.61	3.93	1.74	29.60	4.00	0.71	0.03	-1.68	-0.94	-0.14	0.63	0.09	27.01	3.95
46年目	R 55	0.99242	0.98289	1.00590	0.99478	0.1407	101.8	23.43	3.85	1.74	29.35	3.80	0.70	0.03	-1.68	-0.95	-0.13	0.62	0.09	26.67	3.76
47年目	R 56	0.99238	0.98274	1.00583	0.99476	0.1353	101.8	23.25	3.77	1.74	29.10	3.61	0.69	0.03	-1.68	-0.96					

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拓・BP・その他の別
一般国道13号	福島西道路 (Ⅱ期)	L=6.3km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
26,500	4	東北地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和5年度			
単純合計	433億円	101億円	—	534億円
うち残事業分	221億円	101億円	—	322億円
基準年における 現在価値 (C)	439億円	39億円	—	478億円
うち残事業分	206億円	39億円	—	244億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和5年度			
供用年	令和9年度			
単年便益 (初年便益)	41億円	-0.36億円	0.95億円	41億円
基準年における 現在価値 (B)	690億円	-12億円	17億円	695億円
うち残事業分	690億円	-12億円	17億円	695億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	1.5
経済的純現在価値（事業全体）	217億円
経済的内部収益率（事業全体）	6.3%
費用便益比（残事業）	2.8
経済的純現在価値（残事業）	451億円
経済的内部収益率（残事業）	14.4%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	26,500台/日	±10%	1.3~1.5
事業費	433億円	±10%	1.4~1.5
事業期間	15年	±20%	1.4~1.5

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	26,500台/日	±10%	2.6~3.0
事業費	221億円	±10%	2.6~3.1
事業期間	3年	±20%	2.7~2.9

交通状況の変化

様式-3①

事業名：一般国道13号福島西道路（Ⅱ期）（全体・残事業）

（推計時点 R22年）


			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 福島西道路（Ⅱ期） 延長：6.3km	交通量 ^{※1}	[台/日]	0	26,500	
	走行時間 ^{※2}	[分]	0	8	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	0.00	39.46	
②主な周辺道路 ^{※4}	現道 一般国道4号 ：5.3km	交通量	[台/日]	47,600	36,100
		走行時間	[分]	11	10
		走行時間費用	[億円/年]	104.62	70.89
	一般国道114号 ：8.0km	交通量	[台/日]	12,200	11,600
		走行時間	[分]	14	14
		走行時間費用	[億円/年]	33.31	29.79
	（県）水原福島線 ：8.4km	交通量	[台/日]	4,900	3,800
		走行時間	[分]	13	12
		走行時間費用	[億円/年]	12.63	8.81
	東北自動車道 ：10.2km	交通量	[台/日]	47,100	46,200
		走行時間	[分]	7	7
		走行時間費用	[億円/年]	72.99	70.99
	（県）南福島停車場線 ：2.2km	交通量	[台/日]	15,600	7,900
		走行時間	[分]	6	5
		走行時間費用	[億円/年]	16.53	7.30
③その他道路合計 ：3658.87km	走行時間費用	[億円/年]	7,797.92	7,773.16	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：3699.27km	走行時間短縮便益	[億円/年]	8,038.00	8,000.40	37.60

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

事業名：一般国道13号福島西道路（Ⅱ期）（全体・残事業）

（2） 図面（①、②）に該当する道路を明示すること

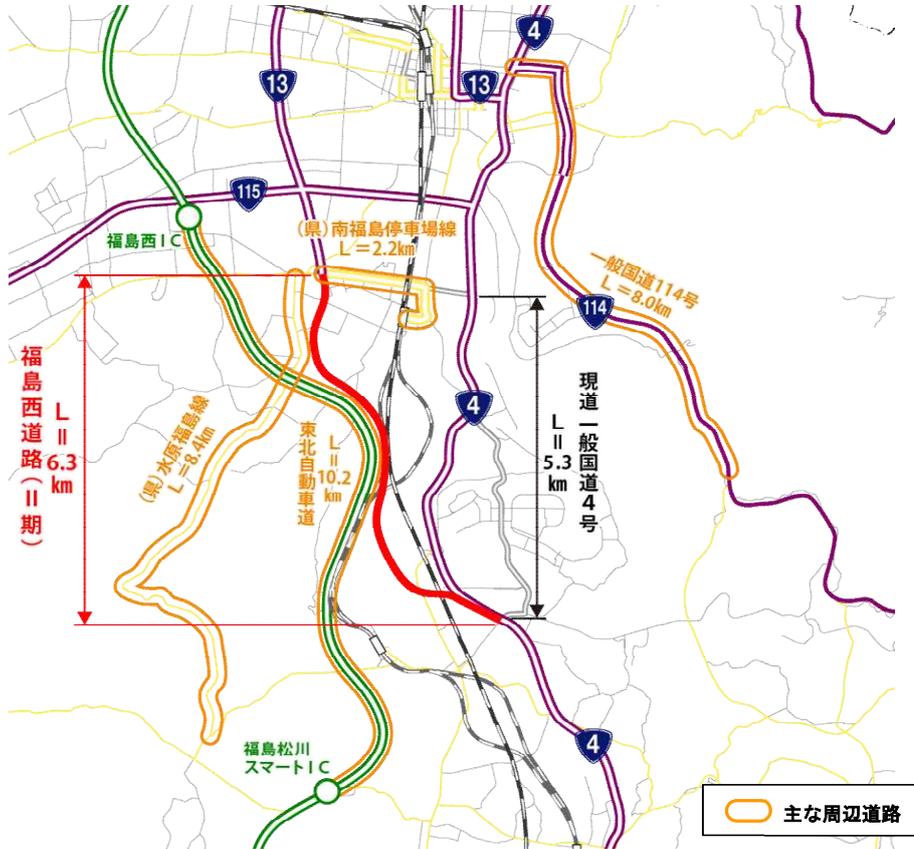

費用便益分析の条件

事業名：一般国道13号福島西道路(Ⅱ期)(全体・残事業)

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和5年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (R22年)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日	
		考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
		その他()	
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
	その他()	<input type="checkbox"/>	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量推計結果について、交通容量(Qmax)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
	その他()	<input type="checkbox"/>	

(3)

		項目	チェック欄	
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 福島国道維持出張所の除雪稼働日数により設定(R2~R4平均)	(41) 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 旅行速度調査より道路種別に応じて冬期旅行速度低下率を算出し、配分速度を補正	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他 ()	<input type="checkbox"/>	
	車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>	
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
	(考慮の場合、算出根拠を添付すること)			
その他				

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道13号福島西道路（Ⅱ期）（全体）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
				0.35		6.3		2.22	
-15年目	H 24	1.5395	96.4	0.48	0.77				
-14年目	H 25	1.4802	96.4	2.38	3.72				
-13年目	H 26	1.4233	98.7	2.83	4.15				
-12年目	H 27	1.3686	100.2	2.98	4.14				
-11年目	H 28	1.3159	100.2	7.33	9.80				
-10年目	H 29	1.2653	100.5	9.45	12.11				
-9年目	H 30	1.2167	100.4	13.13	16.20				
-8年目	R 1	1.1699	101.2	24.14	28.41				
-7年目	R 2	1.1249	101.9	23.88	26.83				
-6年目	R 3	1.0816	101.8	37.00	40.02				
-5年目	R 4	1.0400	101.8	42.89	44.60				
-4年目	R 5	1.0000	101.8	45.25	45.25				
-3年目	R 6	0.9615	101.8	87.33	83.96				
-2年目	R 7	0.9246	101.8	81.18	75.06				
-1年目	R 8	0.8890	101.8	52.36	46.55				
供用開始年次	R 9	0.8548	101.8			2.02	1.73		
1年目	R 10	0.8219	101.8			2.02	1.66		
2年目	R 11	0.7903	101.8			2.02	1.59		
3年目	R 12	0.7599	101.8			2.02	1.53		
4年目	R 13	0.7307	101.8			2.02	1.47		
5年目	R 14	0.7026	101.8			2.02	1.42		
6年目	R 15	0.6756	101.8			2.02	1.36		
7年目	R 16	0.6496	101.8			2.02	1.31		
8年目	R 17	0.6246	101.8			2.02	1.26		
9年目	R 18	0.6006	101.8			2.02	1.21		
10年目	R 19	0.5775	101.8			2.02	1.17		
11年目	R 20	0.5553	101.8			2.02	1.12		
12年目	R 21	0.5339	101.8			2.02	1.08		
13年目	R 22	0.5134	101.8			2.02	1.04		
14年目	R 23	0.4936	101.8			2.02	1.00		
15年目	R 24	0.4746	101.8			2.02	0.96		
16年目	R 25	0.4564	101.8			2.02	0.92		
17年目	R 26	0.4388	101.8			2.02	0.89		
18年目	R 27	0.4220	101.8			2.02	0.85		
19年目	R 28	0.4057	101.8			2.02	0.82		
20年目	R 29	0.3901	101.8			2.02	0.79		
21年目	R 30	0.3751	101.8			2.02	0.76		
22年目	R 31	0.3607	101.8			2.02	0.73		
23年目	R 32	0.3468	101.8			2.02	0.70		
24年目	R 33	0.3335	101.8			2.02	0.67		
25年目	R 34	0.3207	101.8			2.02	0.65		
26年目	R 35	0.3083	101.8			2.02	0.62		
27年目	R 36	0.2965	101.8			2.02	0.60		
28年目	R 37	0.2851	101.8			2.02	0.58		
29年目	R 38	0.2741	101.8			2.02	0.55		
30年目	R 39	0.2636	101.8			2.02	0.53		
31年目	R 40	0.2534	101.8			2.02	0.51		
32年目	R 41	0.2437	101.8			2.02	0.49		
33年目	R 42	0.2343	101.8			2.02	0.47		
34年目	R 43	0.2253	101.8			2.02	0.45		
35年目	R 44	0.2166	101.8			2.02	0.44		
36年目	R 45	0.2083	101.8			2.02	0.42		
37年目	R 46	0.2003	101.8			2.02	0.40		
38年目	R 47	0.1926	101.8			2.02	0.39		
39年目	R 48	0.1852	101.8			2.02	0.37		
40年目	R 49	0.1780	101.8			2.02	0.36		
41年目	R 50	0.1712	101.8			2.02	0.35		
42年目	R 51	0.1646	101.8			2.02	0.33		
43年目	R 52	0.1583	101.8			2.02	0.32		
44年目	R 53	0.1522	101.8			2.02	0.31		
45年目	R 54	0.1463	101.8			2.02	0.30		
46年目	R 55	0.1407	101.8			2.02	0.28		
47年目	R 56	0.1353	101.8			2.02	0.27		
48年目	R 57	0.1301	101.8			2.02	0.26		
49年目	R 58	0.1251	101.8	-19.52	-2.44	2.02	0.25		
合計				413.08	439.14	100.91	38.54		
単純事業費計				432.60		100.91			

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 一般国道13号福島西道路(Ⅱ期)(残事業)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.35	6.3	2.22

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-3年目	R 6	0.9615	101.8	87.33	83.96				
-2年目	R 7	0.9246	101.8	81.18	75.06				
-1年目	R 8	0.8890	101.8	52.36	46.55				
供用開始年次	R 9	0.8548	101.8			2.02	1.73		
1年目	R 10	0.8219	101.8			2.02	1.66		
2年目	R 11	0.7903	101.8			2.02	1.59		
3年目	R 12	0.7599	101.8			2.02	1.53		
4年目	R 13	0.7307	101.8			2.02	1.47		
5年目	R 14	0.7026	101.8			2.02	1.42		
6年目	R 15	0.6756	101.8			2.02	1.36		
7年目	R 16	0.6496	101.8			2.02	1.31		
8年目	R 17	0.6246	101.8			2.02	1.26		
9年目	R 18	0.6006	101.8			2.02	1.21		
10年目	R 19	0.5775	101.8			2.02	1.17		
11年目	R 20	0.5553	101.8			2.02	1.12		
12年目	R 21	0.5339	101.8			2.02	1.08		
13年目	R 22	0.5134	101.8			2.02	1.04		
14年目	R 23	0.4936	101.8			2.02	1.00		
15年目	R 24	0.4746	101.8			2.02	0.96		
16年目	R 25	0.4564	101.8			2.02	0.92		
17年目	R 26	0.4388	101.8			2.02	0.89		
18年目	R 27	0.4220	101.8			2.02	0.85		
19年目	R 28	0.4057	101.8			2.02	0.82		
20年目	R 29	0.3901	101.8			2.02	0.79		
21年目	R 30	0.3751	101.8			2.02	0.76		
22年目	R 31	0.3607	101.8			2.02	0.73		
23年目	R 32	0.3468	101.8			2.02	0.70		
24年目	R 33	0.3335	101.8			2.02	0.67		
25年目	R 34	0.3207	101.8			2.02	0.65		
26年目	R 35	0.3083	101.8			2.02	0.62		
27年目	R 36	0.2965	101.8			2.02	0.60		
28年目	R 37	0.2851	101.8			2.02	0.58		
29年目	R 38	0.2741	101.8			2.02	0.55		
30年目	R 39	0.2636	101.8			2.02	0.53		
31年目	R 40	0.2534	101.8			2.02	0.51		
32年目	R 41	0.2437	101.8			2.02	0.49		
33年目	R 42	0.2343	101.8			2.02	0.47		
34年目	R 43	0.2253	101.8			2.02	0.45		
35年目	R 44	0.2166	101.8			2.02	0.44		
36年目	R 45	0.2083	101.8			2.02	0.42		
37年目	R 46	0.2003	101.8			2.02	0.40		
38年目	R 47	0.1926	101.8			2.02	0.39		
39年目	R 48	0.1852	101.8			2.02	0.37		
40年目	R 49	0.1780	101.8			2.02	0.36		
41年目	R 50	0.1712	101.8			2.02	0.35		
42年目	R 51	0.1646	101.8			2.02	0.33		
43年目	R 52	0.1583	101.8			2.02	0.32		
44年目	R 53	0.1522	101.8			2.02	0.31		
45年目	R 54	0.1463	101.8			2.02	0.30		
46年目	R 55	0.1407	101.8			2.02	0.28		
47年目	R 56	0.1353	101.8			2.02	0.27		
48年目	R 57	0.1301	101.8			2.02	0.26		
49年目	R 58	0.1251	101.8	-0.59	-0.07	2.02	0.25		
合計				220.28	205.50	100.91	38.54		
単純事業費計				220.87		100.91			

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道13号福島西道路（Ⅱ期）（全体・残事業）

年次	年度 (基準年) R5	総走行台キロの年次別伸び率 (南東北ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	R 9	0.99612	0.98206	1.01030	0.99617	0.8548	101.8	31.53	7.71	1.58	40.82	34.89	1.13	0.03	-1.52	-0.36	-0.31	0.95	0.81	41.41	35.39
1年目	R 10	0.99610	0.98173	1.01019	0.99615	0.8219	101.8	31.41	7.57	1.60	40.58	33.35	1.13	0.03	-1.54	-0.38	-0.31	0.95	0.78	41.15	33.82
2年目	R 11	0.99609	0.98139	1.01009	0.99614	0.7903	101.8	31.29	7.43	1.62	40.34	31.88	1.13	0.03	-1.56	-0.40	-0.32	0.95	0.75	40.89	32.31
3年目	R 12	0.99607	0.98104	1.00999	0.99612	0.7599	101.8	31.17	7.29	1.64	40.10	30.47	1.13	0.03	-1.58	-0.42	-0.32	0.95	0.72	40.63	30.87
4年目	R 13	0.99408	0.98904	1.00886	0.99562	0.7307	101.8	30.99	7.21	1.65	39.85	29.12	1.12	0.03	-1.59	-0.44	-0.32	0.95	0.69	40.36	29.49
5年目	R 14	0.99404	0.98892	1.00878	0.99560	0.7026	101.8	30.81	7.13	1.66	39.60	27.82	1.11	0.03	-1.60	-0.46	-0.32	0.95	0.67	40.09	28.17
6年目	R 15	0.99400	0.98880	1.00871	0.99558	0.6756	101.8	30.63	7.05	1.67	39.35	26.58	1.10	0.03	-1.61	-0.48	-0.32	0.95	0.64	39.82	26.90
7年目	R 16	0.99397	0.98867	1.00863	0.99557	0.6496	101.8	30.45	6.97	1.68	39.10	25.40	1.09	0.03	-1.62	-0.50	-0.32	0.95	0.62	39.55	25.70
8年目	R 17	0.99393	0.98854	1.00856	0.99555	0.6246	101.8	30.27	6.89	1.69	38.85	24.27	1.08	0.03	-1.63	-0.52	-0.32	0.95	0.59	39.28	24.54
9年目	R 18	0.99389	0.98841	1.00848	0.99553	0.6006	101.8	30.09	6.81	1.70	38.60	23.18	1.07	0.03	-1.64	-0.54	-0.32	0.95	0.57	39.01	23.43
10年目	R 19	0.99386	0.98827	1.00841	0.99551	0.5775	101.8	29.91	6.73	1.71	38.35	22.15	1.06	0.03	-1.65	-0.56	-0.32	0.95	0.55	38.74	22.38
11年目	R 20	0.99382	0.98813	1.00834	0.99549	0.5553	101.8	29.73	6.65	1.72	38.10	21.16	1.05	0.03	-1.66	-0.58	-0.32	0.95	0.53	38.47	21.37
12年目	R 21	0.99378	0.98799	1.00827	0.99546	0.5339	101.8	29.55	6.57	1.73	37.85	20.21	1.04	0.03	-1.67	-0.60	-0.32	0.95	0.51	38.20	20.40
13年目	R 22	0.99374	0.98784	1.00821	0.99544	0.5134	101.8	29.37	6.49	1.74	37.60	19.30	1.03	0.03	-1.68	-0.62	-0.32	0.95	0.49	37.93	19.47
14年目	R 23	0.99367	0.98770	1.00814	0.99541	0.4936	101.8	29.19	6.41	1.74	37.38	18.40	1.02	0.03	-1.68	-0.63	-0.31	0.94	0.46	37.59	18.55
15年目	R 24	0.99359	0.98754	1.00807	0.99538	0.4746	101.8	28.83	6.39	1.74	36.96	17.54	1.01	0.03	-1.68	-0.64	-0.30	0.93	0.44	37.25	17.68
16年目	R 25	0.99350	0.98740	1.00800	0.99535	0.4564	101.8	28.56	6.34	1.74	36.64	16.72	1.00	0.03	-1.68	-0.65	-0.30	0.92	0.42	36.91	16.84
17年目	R 26	0.99341	0.98730	1.00793	0.99532	0.4388	101.8	28.29	6.29	1.74	36.32	15.94	0.99	0.03	-1.68	-0.66	-0.29	0.91	0.40	36.57	16.05
18年目	R 27	0.99331	0.98720	1.00786	0.99529	0.4220	101.8	28.02	6.24	1.74	36.00	15.19	0.98	0.03	-1.68	-0.67	-0.28	0.90	0.38	36.23	15.29
19年目	R 28	0.99322	0.98710	1.00779	0.99526	0.4057	101.8	27.75	6.19	1.74	35.68	14.48	0.97	0.03	-1.68	-0.68	-0.28	0.89	0.36	35.89	14.56
20年目	R 29	0.99312	0.98700	1.00772	0.99523	0.3901	101.8	27.48	6.14	1.74	35.36	13.79	0.96	0.03	-1.68	-0.69	-0.27	0.88	0.34	35.55	13.86
21年目	R 30	0.99302	0.98690	1.00765	0.99520	0.3751	101.8	27.21	6.09	1.74	35.04	13.14	0.95	0.03	-1.68	-0.70	-0.26	0.87	0.33	35.21	13.21
22年目	R 31	0.98992	0.99123	0.99989	0.99226	0.3607	101.8	26.94	6.04	1.74	34.72	12.52	0.94	0.03	-1.68	-0.71	-0.26	0.86	0.31	34.87	12.57
23年目	R 32	0.98982	0.99115	0.99989	0.99220	0.3468	101.8	26.67	5.99	1.74	34.40	11.93	0.93	0.03	-1.68	-0.72	-0.25	0.85	0.29	34.53	11.97
24年目	R 33	0.98972	0.99107	0.99989	0.99214	0.3335	101.8	26.40	5.94	1.74	34.08	11.37	0.92	0.03	-1.68	-0.73	-0.24	0.84	0.28	34.19	11.41
25年目	R 34	0.98961	0.99099	0.99989	0.99207	0.3207	101.8	26.13	5.89	1.74	33.76	10.83	0.91	0.03	-1.68	-0.74	-0.24	0.83	0.27	33.85	10.86
26年目	R 35	0.98950	0.99091	0.99989	0.99201	0.3083	101.8	25.86	5.84	1.74	33.44	10.31	0.90	0.03	-1.68	-0.75	-0.23	0.82	0.25	33.51	10.33
27年目	R 36	0.98939	0.99083	0.99989	0.99195	0.2965	101.8	25.59	5.79	1.74	33.12	9.82	0.89	0.03	-1.68	-0.76	-0.23	0.81	0.24	33.17	9.83
28年目	R 37	0.98927	0.99074	0.99989	0.99188	0.2851	101.8	25.32	5.74	1.74	32.80	9.35	0.88	0.03	-1.68	-0.77	-0.22	0.80	0.23	32.83	9.36
29年目	R 38	0.98916	0.99066	0.99989	0.99181	0.2741	101.8	25.05	5.69	1.74	32.48	8.90	0.87	0.03	-1.68	-0.78	-0.21	0.79	0.22	32.49	8.91
30年目	R 39	0.98904	0.99057	0.99989	0.99175	0.2636	101.8	24.78	5.64	1.74	32.16	8.48	0.86	0.03	-1.68	-0.79	-0.21	0.78	0.21	32.15	8.48
31年目	R 40	0.98892	0.99048	0.99989	0.99168	0.2534	101.8	24.51	5.59	1.74	31.84	8.07	0.85	0.03	-1.68	-0.80	-0.20	0.77	0.20	31.81	8.07
32年目	R 41	0.98879	0.99039	0.99989	0.99161	0.2437	101.8	24.24	5.54	1.74	31.52	7.68	0.84	0.03	-1.68	-0.81	-0.20	0.76	0.19	31.47	7.67
33年目	R 42	0.98867	0.99029	0.99989	0.99154	0.2343	101.8	23.97	5.49	1.74	31.20	7.31	0.83	0.03	-1.68	-0.82	-0.19	0.75	0.18	31.13	7.30
34年目	R 43	0.98854	0.99020	0.99989	0.99146	0.2253	101.8	23.70	5.44	1.74	30.88	6.96	0.82	0.03	-1.68	-0.83	-0.19	0.74	0.17	30.79	6.94
35年目	R 44	0.98840	0.99010	0.99989	0.99139	0.2166	101.8	23.43	5.39	1.74	30.56	6.62	0.81	0.03	-1.68	-0.84	-0.18	0.73	0.16	30.45	6.60
36年目	R 45	0.98827	0.99000	0.99989	0.99132	0.2083	101.8	23.16	5.34	1.74	30.24	6.30	0.80	0.03	-1.68	-0.85	-0.18	0.72	0.15	30.11	6.27
37年目	R 46	0.98813	0.98990	0.99989	0.99124	0.2003	101.8	22.89	5.29	1.74	29.92	5.99	0.79	0.03	-1.68	-0.86	-0.17	0.71	0.14	29.77	5.96
38年目	R 47	0.98799	0.98980	0.99989	0.99116	0.1926	101.8	22.62	5.24	1.74	29.60	5.70	0.78	0.03	-1.68	-0.87	-0.17	0.70	0.13	29.43	5.66
39年目	R 48	0.98784	0.98969	0.99989	0.99108	0.1852	101.8	22.34	5.19	1.74	29.27	5.42	0.77	0.03	-1.68	-0.88	-0.16	0.69	0.13	29.08	5.39
40年目	R 49	0.98769	0.98959	0.99989	0.99100	0.1780	101.8	22.07	5.14	1.74	28.95	5.15	0.76	0.03	-1.68	-0.89	-0.16	0.68	0.12	28.74	5.11
41年目	R 50	0.98754	0.98948	0.99989	0.99092	0.1712	101.8	21.79	5.09	1.74	28.62	4.90	0.75	0.03	-1.68	-0.90	-0.15	0.67	0.11	28.39	4.86
42年目	R 51	0.98738	0.98936	0.99989	0.99084	0.1646	101.8	21.52	5.04	1.74	28.30	4.66	0.74	0.03	-1.68	-0.91	-0.15	0.66	0.11	28.05	4.62
43年目	R 52	0.98722	0.98925	0.99989	0.99075	0.1583	101.8	21.24	4.99	1.74	27.97	4.43	0.73	0.03	-1.68	-0.92	-0.15	0.65	0.10	27.70	4.38
44年目	R 53	0.98705	0.98913	0.99989	0.99067	0.1522	101.8	20.97	4.94	1.74	27.65	4.21	0.72	0.03	-1.68	-0.93	-0.14	0.64	0.10	27.36	4.17
45年目	R 54	0.98688	0.98901	0.99989	0.99058	0.1463	101.8	20.69	4.89	1.74	27.32	4.00	0.71	0.03	-1.68	-0.94	-0.14	0.63	0.09	27.01	3.95
46年目	R 55	0.98671	0.98889	0.99989	0.99049	0.1407	101.8	20.42	4.84	1.74	27.00	3.80	0.70	0.03	-1.68	-0.95	-0.13	0.62	0.09	26.67	3.76
47年目	R 56	0.98653	0.98877	0.99989	0.99040	0.1353	101.8	20.14	4.79	1.74	26.67	3.61	0.69	0.03	-1.68	-0.96	-0.13	0.61	0.08	26.32	3.56
48年目	R 57	0.98635	0.98864	0.99989	0.99031	0.1301	101.8	19.87	4.74	1.74	26.35	3.43	0.68	0.03	-1.68	-0.97	-0.13	0.60	0.08	25.98	3.38
49年目	R 58	0.98616	0.98851	0.99989	0.99021	0.1251	101.8	19.59	4.69	1.74	26.02	3.26	0.67	0.03	-1.68	-0.98	-0.12	0.59	0.07	25.63	3.21
合 計								1,304.34	298.84	86.03	1,689.21	689.99	45.69	1.50	-83.03	-35.84	-11.88	40.84	16.75	1,694.21	694.86
