

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し ③設計方法の見直し 】


現場発生材の有効利用

工事名： 仙台空港ターミナル地区第一駐車場外復旧工事

概要： 工事により発生した碎石を排水構造物の基礎材に利用し縮減を図った。

効果：

- ・現場発生材を再利用し、材料費を縮減。
(縮減額 336千円、縮減率約 0.3%)

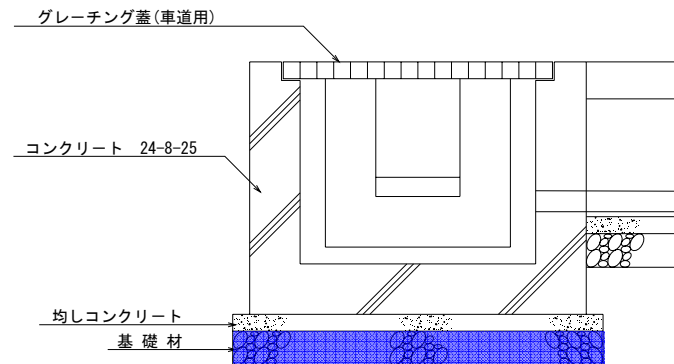

※その他、歩車道境界ブロック基礎等にも発生碎石を使用した。
